



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	20.IV 20												
						Č	P	S	N	P	Ú	S	Č					
1																		
2	„Oprava elektro vybavení kolektoru JM st. 7/1“	204 dny	16.04. 20	06.11. 20														
3																		
4	Vstupní jednání	0 dny	16.04. 20	16.04. 20														
5	Zpracování technologického postupu prací	35 dny	17.04. 20	22.05. 20														
6	Předání a převzetí staveniště	0 dny	06.05. 20	06.05. 20														
7	Výrobní dokumentace	117 dny	06.05. 20	31.08. 20 6														
8	Objednání materiálu	120 dny	16.04. 20	14.08. 20 4														
9	Seznámení se stávajícím stavem	10 dny	07.05. 20	17.05. 20 6														
10	Výroba držáků přístrojů	107 dny	17.05. 20	01.09. 20 9														
11	Výroba rozváděčů	115 dny	26.05. 20	18.09. 20														
12	Montáž kabelových tras	109 dny	18.05. 20	04.09. 20 9														
13	Montáž kabelů	100 dny	23.05. 20	31.08. 20 9														
14	Stavební úpravy	20 dny	18.09. 20	08.10. 20 11														
15	Strojní zařízení	25 dny	03.08. 20	28.08. 20														
16	Montáž a zapojení rozváděčů	20 dny	21.09. 20	11.10. 20 11														
17	Montáž a zapojení instrumentace a přístrojů	42 dny	10.08. 20	21.09. 20 9														
18	Přepojení stávajících a nových rozvodů- nutná součinnost KP a.s.- bude upřesněno	1 den?	12.10. 20	13.10. 20														
19	Demontážní práce	7 dny	13.10. 20	20.10. 20 18														
20	Kompletace	10 dny	20.10. 20	30.10. 20 19														
21	Zprovoznění, Oživení	22 dny	11.10. 20	02.11. 20 16														
22	Dokončovací práce	12 dny	20.10. 20	01.11. 20 19														
23	Zkoušky, revize, měření	7 dny	30.10. 20	06.11. 20 20														
24	Předání investorovi	0 dny	06.11. 20	06.11. 20 23														


16.04.

Projekt: Projekt5
Datum: 31.08. 20



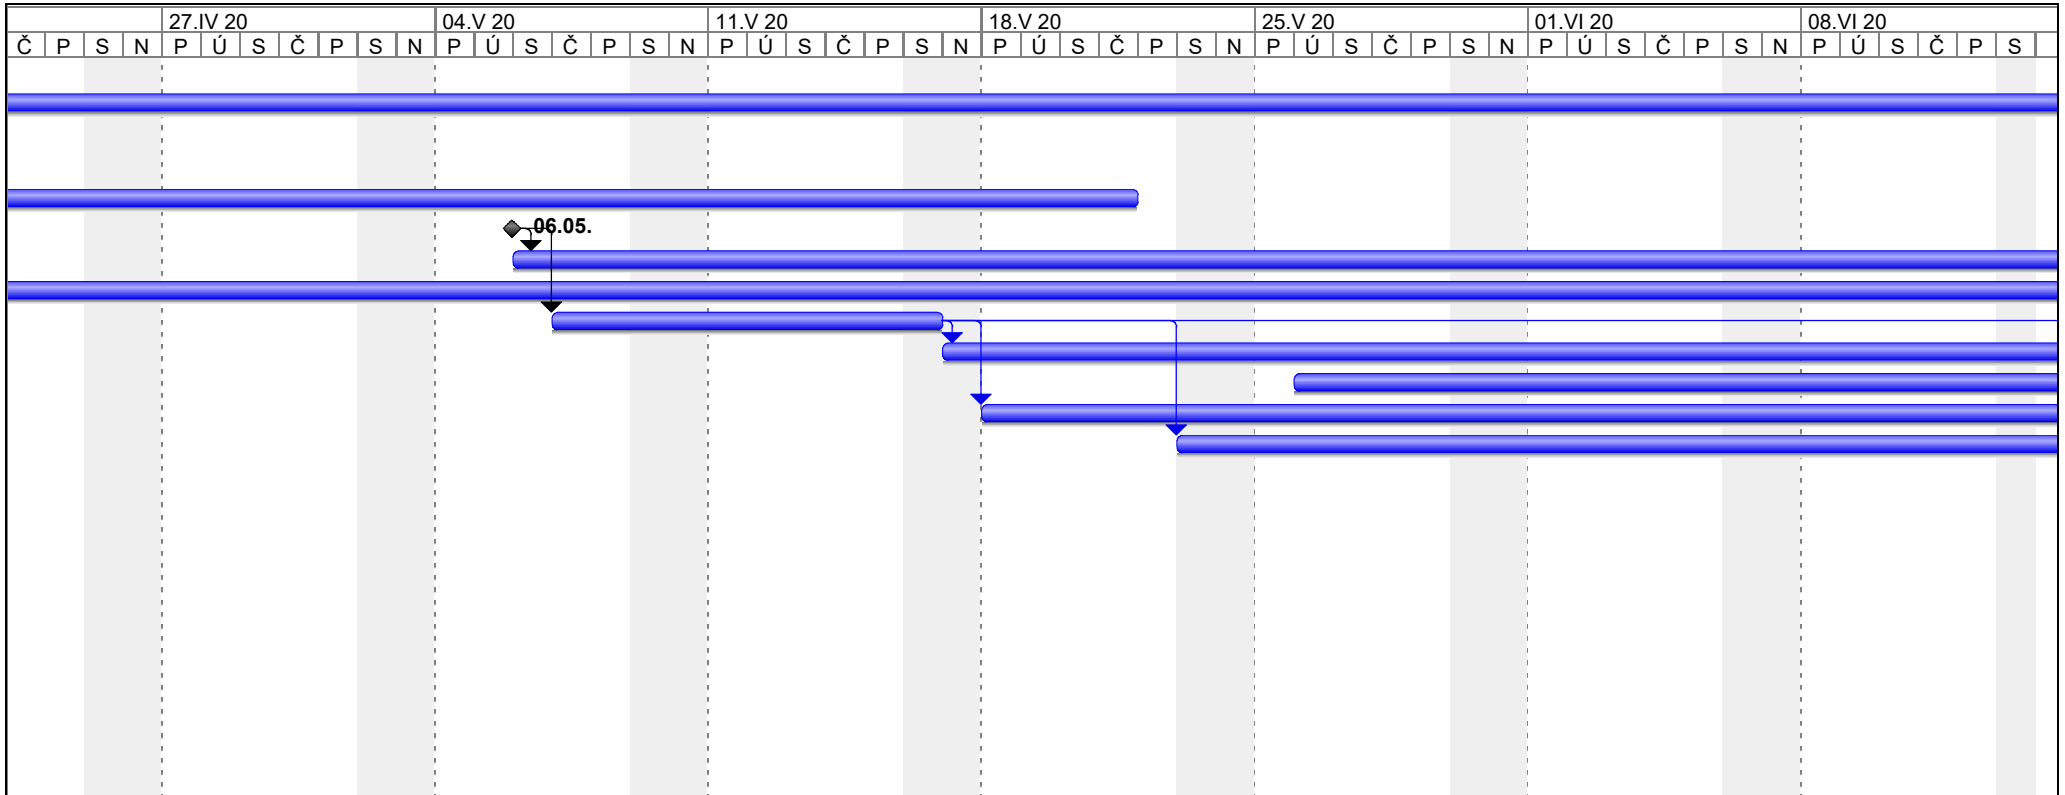



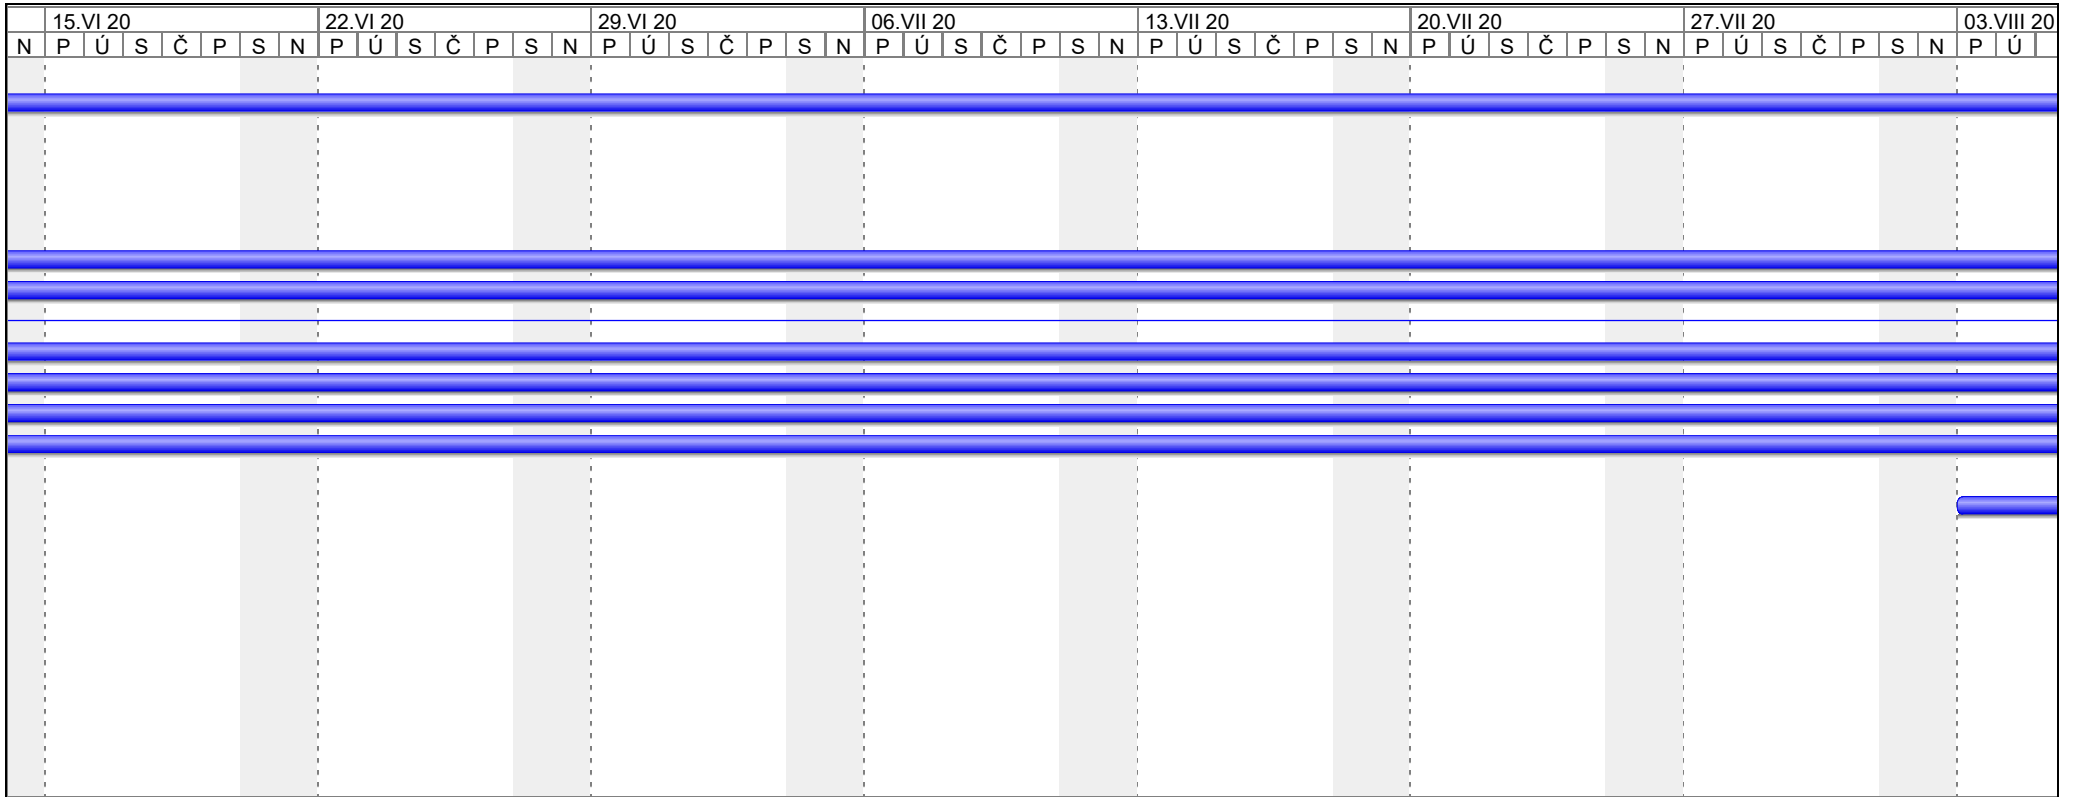




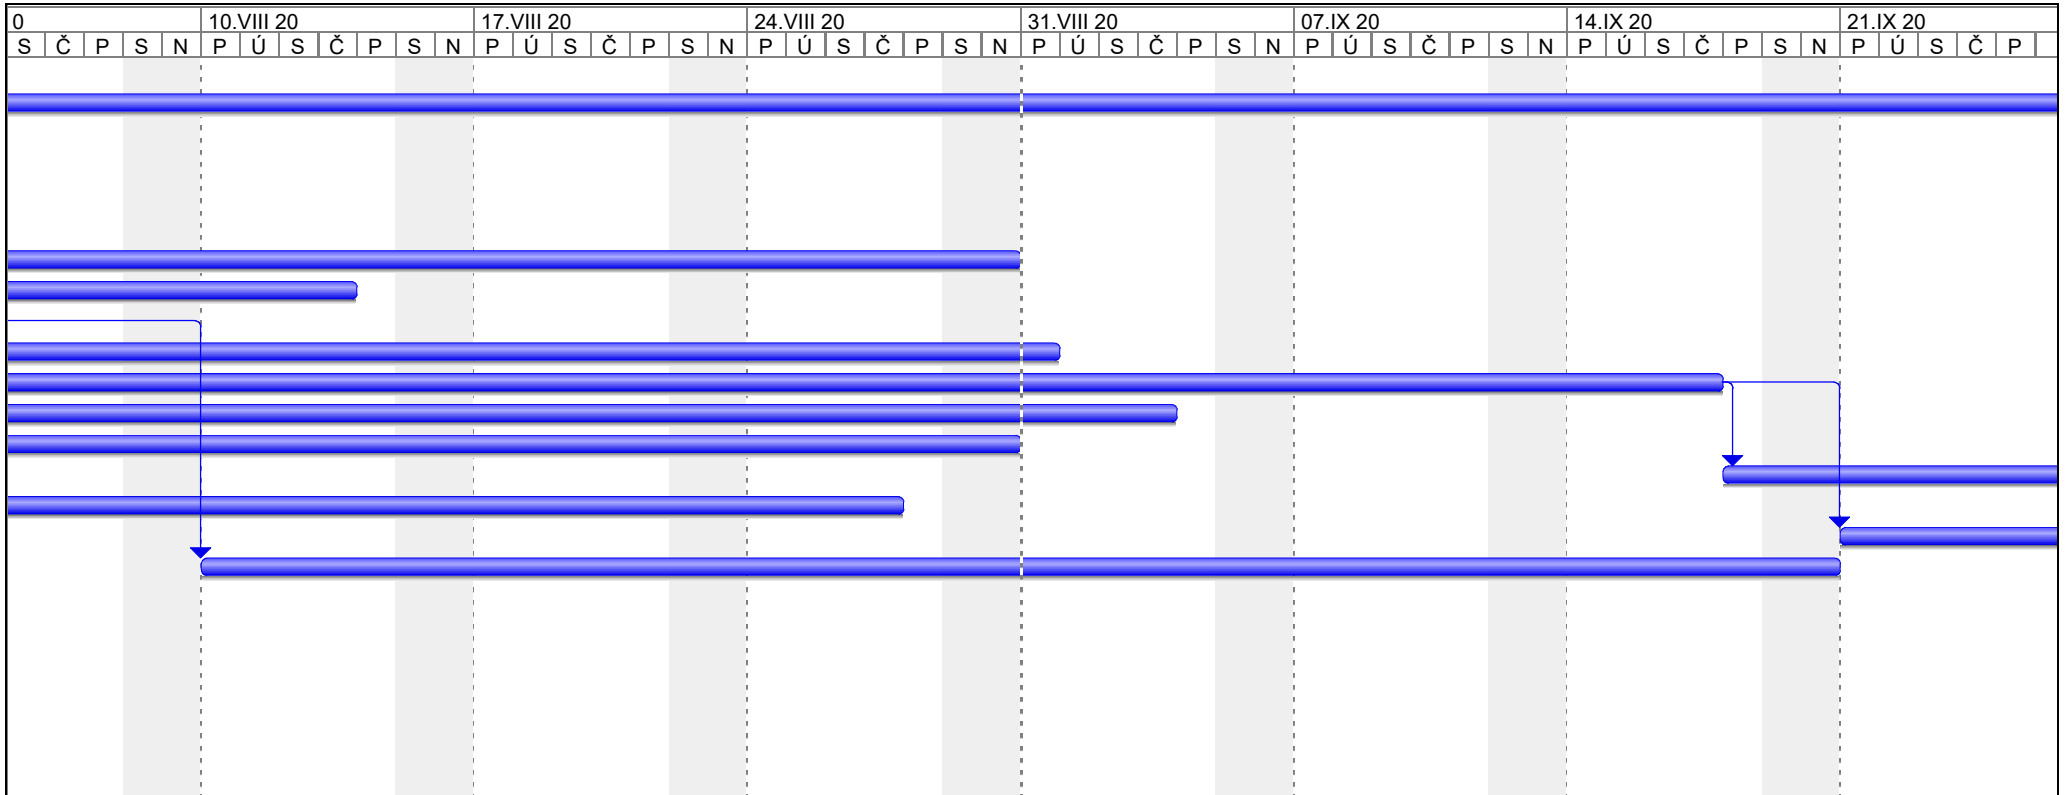


Projekt: Projekt5 Datum: 31.08. 20	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	




Projekt: Projekt5
Datum: 31.08. 20

Úkol		Milník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	



Projekt: Projekt5 Datum: 31.08. 20	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	

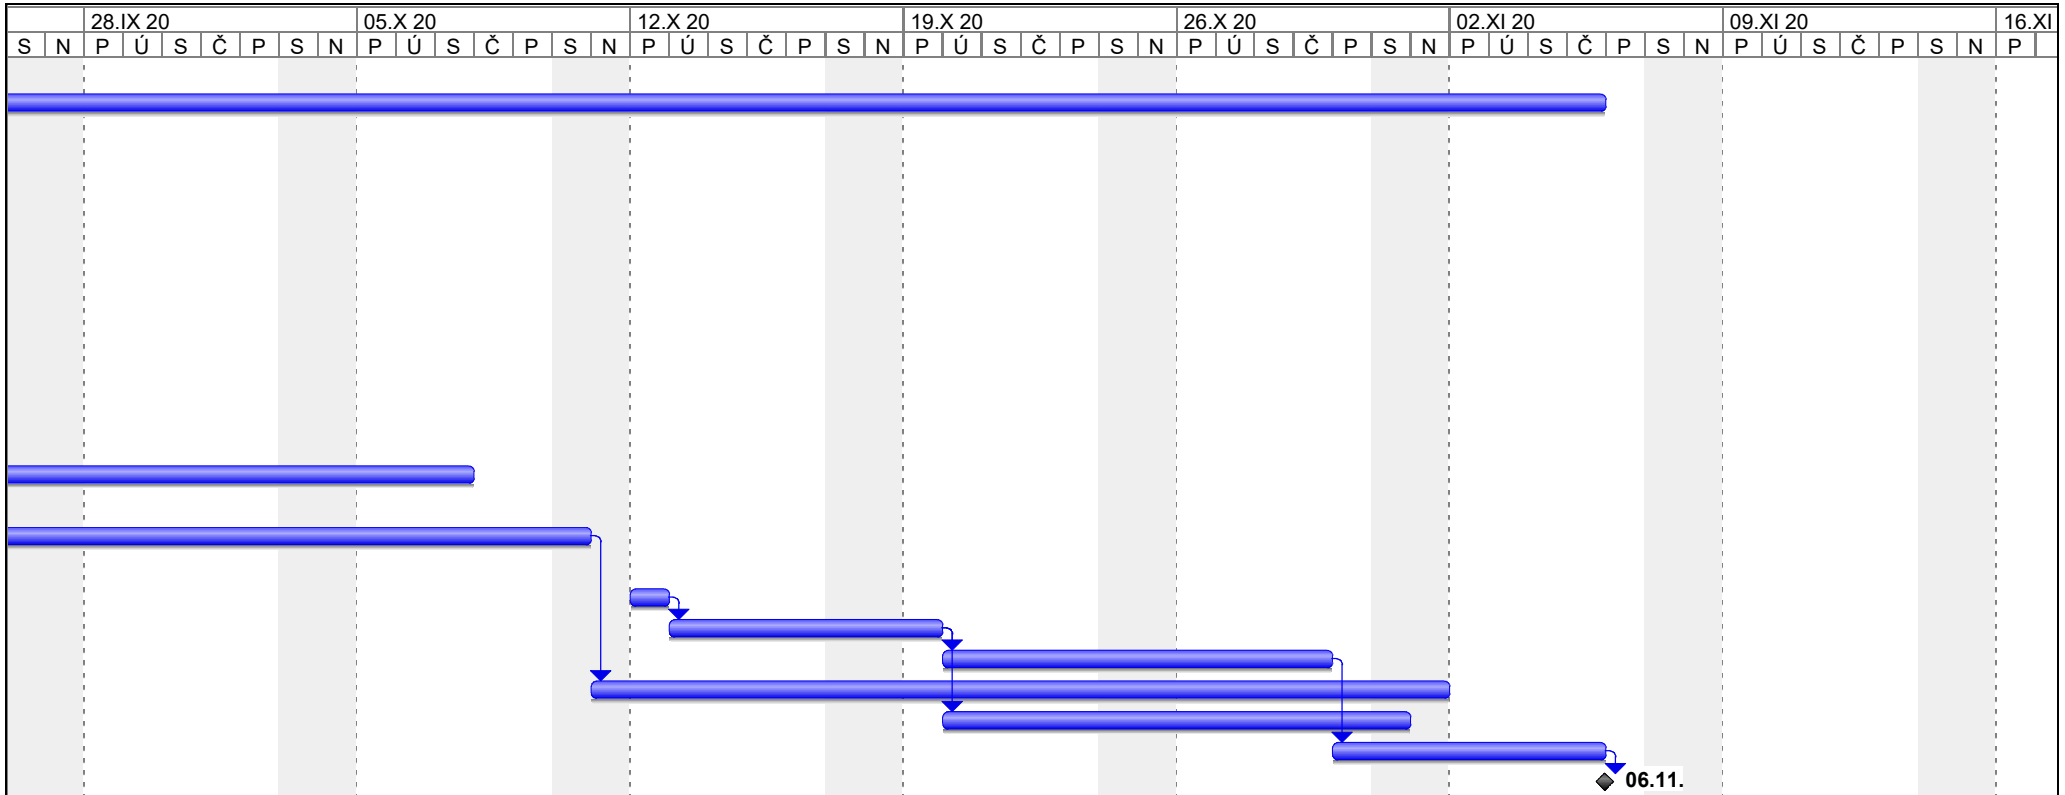

Projekt: Projekt5 Datum: 31.08. 20	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	
