


Příloha č.1 - Smluvní HMG - revize č.1 ze dne 1.8.2019										
D	Režim Úkolů	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtlet	3. čtvrtlet	1. čtvrtlet	3. čtvrtlet
1			Metro D - geologický průzkum - PAD 4	816 dny	04.06. 19	15.09. 21				
2		ZS/1	Základní stavební příprava území	816 dny	04.06. 19	28.07. 19				
3			Provoz ZS - realizační fáze	762 dny	28.07. 19	15.09. 21				
4			Projektové práce	816 dny	04.06. 19	15.09. 21				
5			Geodetické práce	816 dny	04.06. 19	15.09. 21				
6			Související stavební objekty	816 dny	04.06. 19	15.09. 21				
7		SO 11-01	Příprava území	10 dny	04.06. 19	14.06. 19				
8		SO 11-02	Vjezdy a výjezdy na staveništi	10 dny	09.06. 19	19.06. 19				
9			Kopané sondy pro ověření polohy, hloubky, nadloží DN1100	7 dny	28.06. 19	05.07. 19				
10			Projektová práce ochrany vodovodního přívaděče "Želivka"	14 dny	05.07. 19	19.07. 19				
11			Realizace ochrany vodovodního přívaděče "Želivka"	26 dny	19.07. 19	14.08. 19				
12			Technologická přestávka - zrání betonu	10 dny	14.08. 19	24.08. 19				
13		SO 11-03/30	Vodovodní přípojka staveništi PAD4	60 dny	14.06. 19	06.09. 19				
14		SO 11-04/30	Kanalizační přípojka staveništi PAD4	30 dny	14.06. 19	07.08. 19				
15		SO 11-06/40	El. přípojka VN staveništi PAD4	110 dny	14.06. 19	26.10. 19				
16			Zprovoznění trafostanice	0 dny	26.10. 19	26.10. 19				
17		SO 11-08	Ochrana pěšího provozu - není předmětem dodávky stavby	806 dny	14.06. 19	15.09. 21				
18		SO 11-09	Ochrana inženýrských sítí	806 dny	14.06. 19	15.09. 21				
19		SO 11-10	Demolice	10 dny	14.06. 19	24.06. 19				
20		SO 11-40	Provizorní dopravní značení	806 dny	14.06. 19	15.09. 21				
21		SO 11-75/20	Přeložka a ochrana VO v průběhu GP na PAD4	90 dny	14.06. 19	06.10. 19				
22			C. Stavební část	695 dny	24.08. 19	06.08. 21				
23			Realizace stavební jámy z převrtávaných pilot včetně převázky a dna	140 dny	24.08. 19	20.01. 20				
24			Mikropilotový deštník	10 dny	20.01. 20	30.01. 20				
25			Průzkumná štola	545 dny	30.01. 20	06.08. 21				

ID	Režim úkolu	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtlet	2. čtvrtlet	3. čtvrtlet	4. čtvrtlet	1. čtvrtlet	2. čtvrtlet	3. čtvrtlet	4. čtvrtlet
26			Ražba průzkumné štolý TYP 1	29 dny	30.01.20	28.02.20								
27			Ražba I. kaloty průzkumné štolý TYP2	37 dny	28.02.20	05.04.20								
28			Injektáž masivu - TYP 2	61 dny	17.04.20	17.06.20								
29			Ražba rozšíření na celou kalotu TYP 2	25 dny	23.06.20	18.07.20								
30			Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	01.03.20	01.03.20								
31			Ražba levé kaloty průzkumné štolý TYP 3 a TYP 4	115 dny	18.07.20	10.11.20								
32			Injektáž masivu - TYP 4	90 dny	24.11.20	03.03.21								
33			Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	01.07.20	01.07.20								
34			Ražba rozšíření na celou kalotu TYP 4	60 dny	11.03.21	10.05.21								
35			Ruční ražba geotechnické zarážky RI	28 dny	10.05.21	07.06.21								
36			Dokončovací práce	60 dny	07.06.21	06.08.21								
37			Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	01.11.20	01.11.20								
38	ZS		Zřízení staveniště - likvidace	30 dny	16.08.21	15.09.21								
39			E. Geologický průzkum	719 dny	24.08.19	30.08.21								
40			INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ SLEDOVÁNÍ VÝRUBU	635 dny	24.08.19	07.06.21								
41			Presiometrický vĕjíř PP1	6 dny	05.04.20	11.04.20								
42			Presiometrické a geofyzikální zkoušky PPINJ1 (před Injektáží)	6 dny	11.04.20	17.04.20								
43			Presiometrické a geofyzikální zkoušky PPINJ1 (po Injektáží)	6 dny	17.06.20	23.06.20								
44			Presiometrický vĕjíř PP2	6 dny	10.11.20	16.11.20								
45			Presiometrické a geofyzikální zkoušky PPINJ2 (před Injektáží)	8 dny	16.11.20	24.11.20								
46			Presiometrické a geofyzikální zkoušky PPINJ2 (po Injektáží)	8 dny	03.03.21	11.03.21								
47			Smykové a zatĕžovací zkoušky v geotechnické rozrálce	63 dny	07.06.21	09.08.21								
48			Dlouhé vrty ŠJ 1001 - ŠJ 1003	40 dny	21.06.21	31.07.21								
49			Laborka + měření ve vrtech	30 dny	31.07.21	30.08.21								

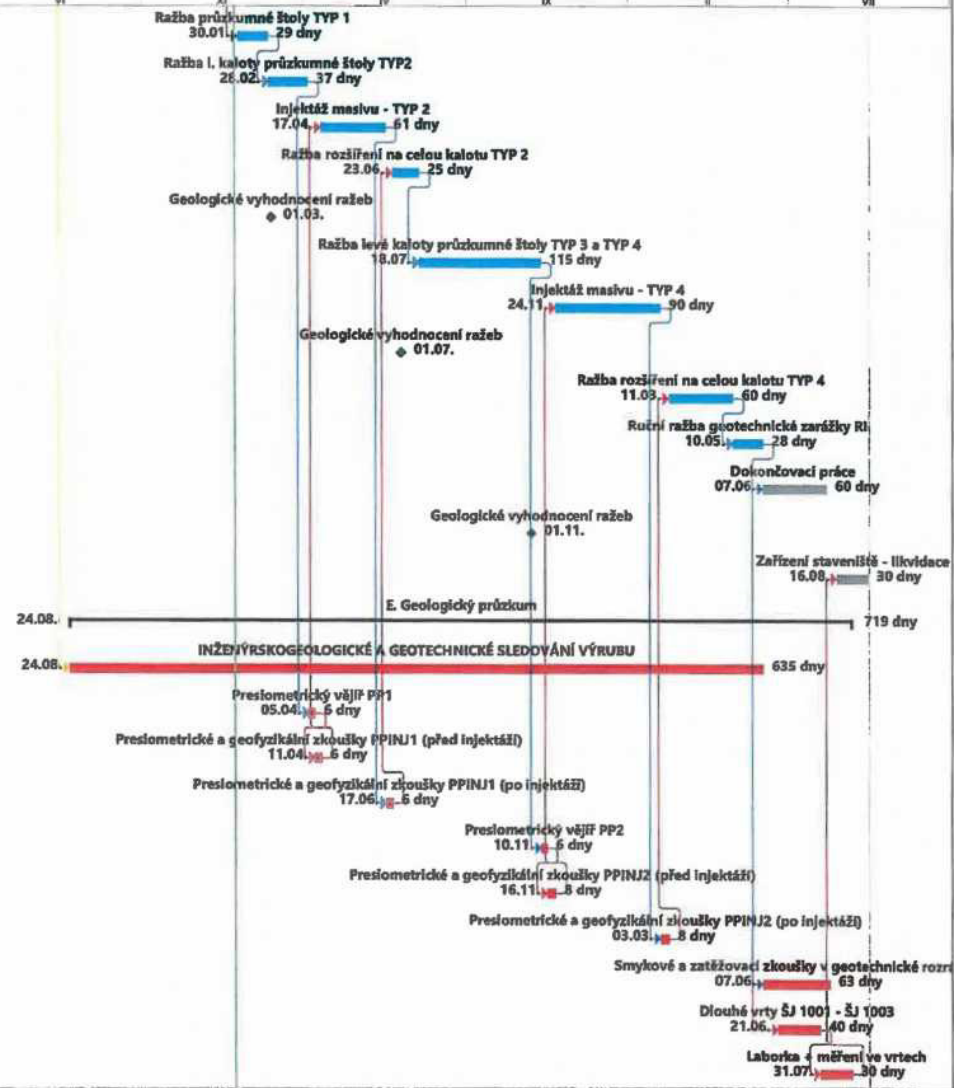

Projekt: Metro D - IGP Pad 4 Datum: 1.8.2019	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Nesaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Měřítko		Nesaktivní měřítko		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Nesaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější měřítko			
