

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

VALC, s.r.o.

se sídlem: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
IČO: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **DD Borohrádek – „Domky Na Květné“**.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“),

v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a se vznikem prací, jež nebudou provedeny (tzv. méněprací):

- a) Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem na dodatečné stavební práce podle tohoto odstavce, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ – práce podle změnového listu č. 2 a č. 3, a
 - b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle změnového listu č.1.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. a) a b) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
 3. V souvislosti s vícepracemi podle výše uvedených změnových listů dojde ke dále zdržení stavebních prací a k nutnému posunutí termínu plnění celkem o 4 měsíce.
 4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 5. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 2 639 618,48 Kč bez DPH. Měněpráce: 1 186 120,62 Kč bez DPH.
 6. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 4 016 542,68 Kč bez DPH Měněpráce: 90 197,54 Kč bez DPH.
 7. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
6 656 161,16 Kč bez DPH.
 8. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
1 276 318,16 Kč bez DPH.
 10. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:
5 379 843 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
Cena celkem bez DPH 62 819 843 Kč
(slovy: šedesát dva miliónů osm set devatenáct tisíc osm set čtyřicet tři korun českých bez DPH)
DPH 15% 9 422 976,45 Kč

Cena celkem včetně DPH 72 242 819,45 Kč

2. Článek 5 odst. 5.2 se mění takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace:

- dokončení stavebních prací, předání dokladů potřebných pro kolaudační prohlídku stavby: nejdéle do 18 měsíců ode dne zahájení provádění vlastní stavby dle 5.1,
- termín dokončení (předání díla) do 14 dní ode dne dokončení stavebních prací.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 7. 9. 2020, usnesením č.RK/28/1522/2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Harmonogram

Objednatel:



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman kraje

9.10.2020
Zhotovitel:



Ing. Pavel Valc

jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 10.08.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 1 Změna spodní stavby

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

IGP prokázal přítomnost organické zeminy (rašelina) bezprostředně pod základovou spárou vč. zavodnění základové spáry. Dále zjištěn v prostoru stavební jámy nevhodný materiál pro provádění zpětných zásypů pod stavebními objekty a komunikacemi. Hladina podzemní vody zasahuje úroveň dna výkopu.

Nevhodná zemina pod základovou spárou bude odtěžena a nahrazena vrstvami hrubého kameniva. Materiál nevhodný k provedení zpětných zásypů bude odvezen a uložen na skládku. Zásyp bude proveden ze štěrkopísku.

Po dobu provádění prací a po dobu trvání otevřené stavební jámy je nezbytné provádět čerpání spodní vody.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Výkop stavební jámy na úroveň základové spáry, využití výkopku na zásyp mezi základové pasy

Nové řešení:

Nevhodná zemina pod základovou spárou bude odtěžena a nahrazena vrstvami hrubého kameniva. Materiál nevhodný k provedení zpětných zásypů bude odvezen a uložen na skládku. Zásyp bude proveden ze štěrkopísku.

Viz dílčí kalkulace – položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Zajištění únosné základové spáry, provedení zásypu stavební jámy mezi základovými pasy vhodným materiálem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zapracováno do dokumentace skutečného stavu.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Inženýrsko-geologický průzkum

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Prodloužení doby výstavby – dva měsíce

Změna ceny díla:


Zvýšení celkové ceny díla o 3 926 345,14 Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Libor Klubal

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 10.08.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**IO 04 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO NÁHONU A VODNÍHO TOKU
ZL 2 Zatrubnění potoka**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Zhotovitel navrhuje v rámci provedení přeložky stávajícího vodního toku provedení zatrubnění nové trasy potoka. Zatrubnění je navrženo z trub TBH DN800 vč. provedení nového výústního objektu. V rámci zatrubnění bude vyřešeno i napojení dešťových svodů do potrubí.

Zatrubnění je zvoleno z důvodu snížení hladiny spodní vody ve stavební jámě a snížení zavodnění základové spáry a tím omezení možného vyplavení materiálu pod objektem, které je způsobeno pohybem vody obsažené v zemině.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení přeložky potoka spočívá v provedení nové trasy novým otevřeným korytem z kamenné rovnániny z lomového kamene vč. odpovídající skladbě zemního tělesa pod korytem.

Nové řešení:

Přeložka potoka bude vedena v betonovém potrubí TBH DN800. Bude zřízen nový výústní objekt a kontrolní šachta. Viz dílčí kalkulace – položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Zatrubněním bude snížena hladina spodní vody, která dle IGP dosahuje nad dno stavení jámy a dále bude eliminováno zvodnění podloží pod základy a základovou deskou objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zapracováno do dokumentace skutečného stavu.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.
Inženýrsko-geologický průzkum

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Prodloužení doby výstavby – **jeden měsíc**

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 342 805,37 Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Libor Klubal

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis: ..



ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 10.08.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**IO 03 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO ŘADU
IO 04 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO NAHONU A VODNÍHO TOKU
ZL 3 Přeložka STL plynovodu a kanalizačního řadu**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Objednatel požaduje provedení přeložky stávajícího vedení STL plynovodu v místě kolize jeho trasy s projektovanou přeložkou náhonu IO 04.

Dále navrhuje provedení přeložky kanalizačního řadu IO 03, vedoucího pod objektem SO01 do nové trasy
Dle stanoviska správce sítě kanalizačního řadu (Aqua Servis a.s.) požaduje provedení přeložky v horizontu 3 let.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Přeložka STL plynovodu není řešena.
Kanalizační řad dle PD je řešen vyvločkováním stávající kanalizace.

Nové řešení:

Přeložka STL plynovodu a kanalizační řadu do nové trasy.
Viz dílčí kalkulace – položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Stávající trasa STL plynovodu kříží novou trasu přeložky náhonu IO 04.
Správce sítě kanalizačního řadu (Aqua Servis a.s.) ve stanovisku ke stavebnímu povolení vzhledem k důležitosti dotčené kanalizační stoky IO 03 požaduje přeložku kanalizace v horizontu 3 let.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení a dokumentace pro změnu stavby před dokončením.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Prodloužení doby výstavby – jeden měsíc

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 1 110 692,49 Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Libor Klubal

Podpis: .



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 17.08.2020

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 17.08.2020


Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:





ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM
Akce: DD Borohrádek - "Domky Na Květné"

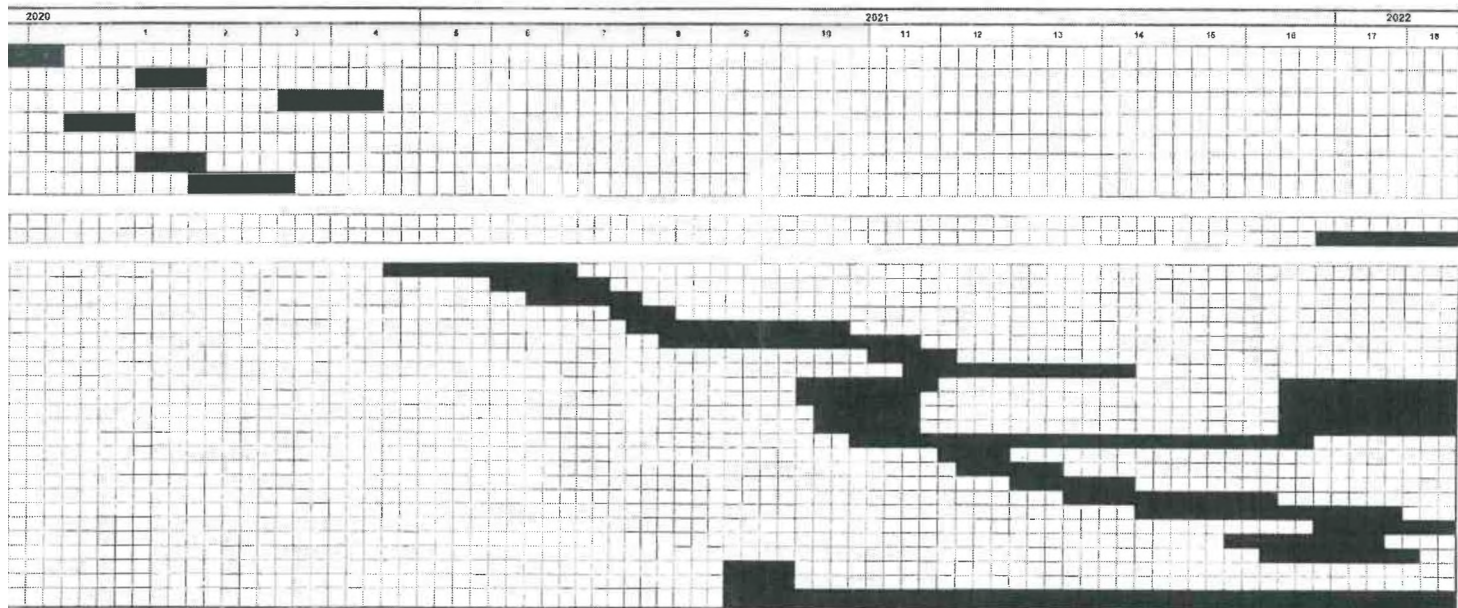

Adresa: DD Borohrádek										
Projektant: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ										
Objednatel: Valc s.r.o.										
Zhotovitel: Valc s.r.o.							STAV KE DNI :		02.09.2020	
ZMĚNOVÉ LISTY - PŘEHLED										
Číslo ZL	Obsah změnového listu	Odpočet	Přípočet	Součet	Podepsaná cena	Stav	TERMÍN - výv na HMG / končící přečíslení	Investor podpsal	Řeší	paragraf
1	Spodní stavba	-90 197,54	4 016 542,68	3 926 345,14	3 926 345,14	do RK	ano		Oma, Valc	6
2	Zatrubnění potoka	-405 599,62	748 404,99	342 805,37	342 805,37	do RK	ano		Oma, Valc	5
3	Přeložka STL plynu a kanalizace	-780 521,00	1 891 213,49	1 110 692,49	1 110 692,49	do RK	ano		Oma, Valc	5
ZL PODEPSANÉ A PŘED PODPÍSEM		-1 276 318,16	6 656 161,16	5 379 843,00	5 379 843,00					

flg.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Borohrádek - "Domky Na Květné"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	57 440 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	57 440 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 2 639 618,48 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 1 186 120,62 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 2 639 618,48 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 1 186 120,62 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 825 739,10 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	6,66 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	57 440 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 016 542,68 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 90 197,54 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 4 016 542,68 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 90 197,54 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 106 740,22 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	7,15 % ≤ 50,00 %		

**§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6**

Smluvní cena	57 440 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 2 639 618,48 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 186 120,62 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 016 542,68 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 90 197,54 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	5 379 843,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	9,37 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 6 656 161,16 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 276 318,16 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	5 379 843,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	57 440 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	62 819 843,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	62 819 843,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:
