



Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

č.j. Objednatele HSJI-1495-153/E-2018

č.j. Zhotovitele 201807201/1165/18/PS, AV.19005.1.110

uzavřené podle ust. § 2486 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava
Zastoupená: plk. Mgr. Jirí Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina
IČO: 708 85 184
DIČ: CZ70885184 (není plátce)
Bankovní spojení, č.ú: Česká národní banka; 15032881/0710
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)



2. Zhotovitel:

Společníci společnosti

IMOS + GEOSAN + Zlínstav – výstavba CPS Havlíčkův Brod

společnost založená na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2019 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

e-mail:

telefon:

fax: +420 548 129 390

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., č. ú.: 17018733/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211.

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zastoupený:

IČO: 281 69 522



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DIČ: CZ28169522

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459.

a

Třetí společník: Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupeny [redacted]

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5743.

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019 je změna sjednaného předmětu díla spočívající v provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce (tzv. vícepráce). Současně se strany dohodly na zúžení předmětu díla o stavební práce, které nebudou provedeny (tzv. méněpráce).

Předmět díla se tak mění v rozsahu stavebních prací, jejichž výčet a rozsah včetně ocenění je uveden v příloze tohoto dodatku označeném jako „Změnový položkový rozpočet“. V důsledku popsané změny sjednaného předmětu díla se současně mění celková cena díla. S ohledem na výše uvedené změny předmětu díla se v souladu s čl. VII. odst. 15. Smlouvy o dílo níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo mění takto:

Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 1. se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla se sjednává takto:

Cena díla bez DPH: 217 261 440,15 Kč

DPH 21% : 45 624 902,44 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 262 886 342,59 Kč

Slovy: Dvě stě šedesát dva milionů osm set osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých a padesát devět haléřů.

Rekapitulace ceny díla ke dni uzavření smlouvy:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4:

Cena díla bez DPH: 216 813 556,35 Kč

DPH 21%: 45 530 846,84 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 262 344 403,19 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 4:

Cena víceprací bez DPH: 2 811 824,42 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 2 363 940,62 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 447 883,80 Kč




Článek 3 Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy - registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: Změnový položkový rozpočet

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

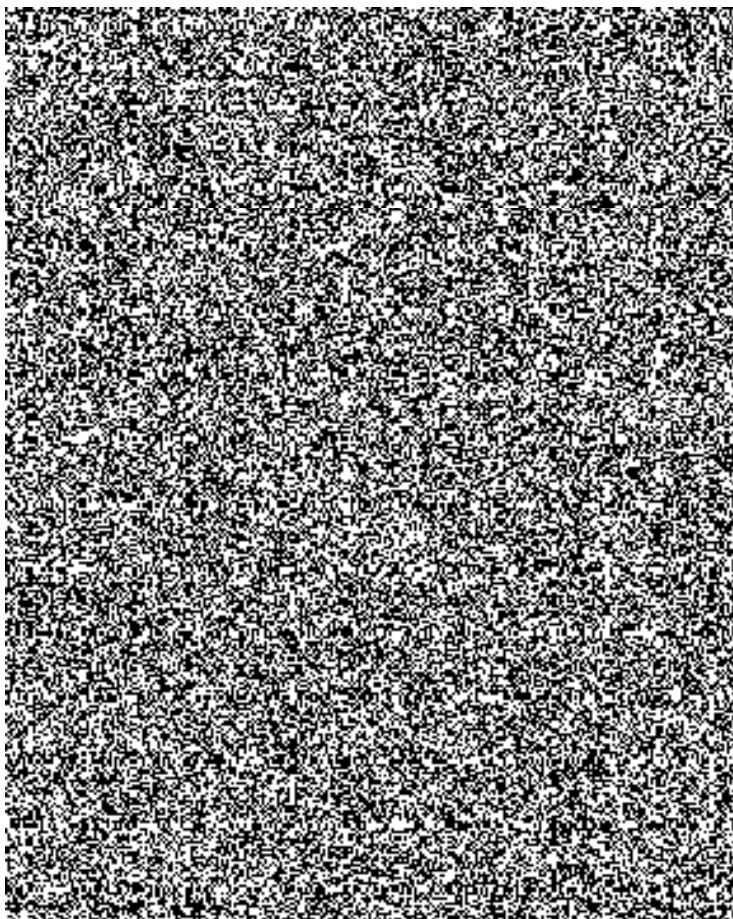

Příloha Dodatku č. 4 k SoD ev. č. HSJI-1495-153/E-2018 – Změnový položkový rozpočet

