



## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2 k POKYNU K REALIZACI č. 7

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22  
IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,  
místopředsedkyní představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

**a společnost**

### AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17  
IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.7 ze dne 21.2.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 2, **Rekonstrukce EPS** a bodu 5, **Rekonstrukce přenosů PTV**.

#### Obsah Změny:

1. K původnímu projektu Rekonstrukce nasávacích jednotek Objednatel požaduje v objektu Depo Zličín doplnit rekonstrukci systému EPS v kabelovém kanálu. Rekonstrukce EPS v kabelovém kanálu měla být provedena v rámci projektu KBS později, ale z důvodu havarijní situace je potřebné jí provést okamžitě. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.
2. Během realizace ve stanici MA se projevil zatékání do místnosti s nově instalovanou technologií, což může mít vliv na provoz technologie a uplatnění záruk. Objednatel se na doporučení Zhotovitele rozhodl situaci řešit realizací svodu možných budoucích průsaků do odpadu. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.
3. Na základě výsledků cvičení Blackout požaduje Objednatel změnit koncepci napájení systému PTV. Vlivem této změny koncepce je nutná změna napájecího rozvaděče ve st. VY, PN, KC a OP. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.
4. Objednatel požaduje ve všech projektech PTV doplnit v rozvaděčích napájecí panely EVOS.
5. Objednatel požaduje náhradu prvků v systémech PTV na konci svého životního cyklu za prvky novější, aktivně podporované výrobcem (snížení provozních nákladů). Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.

07. 348/14/D-TDM


6. Ve stanici BD požaduje Objednatel změnu místnosti MSR do jiné místnosti. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.
7. Objednatel po zkušenosti v jiném projektu s navrhovaným řešením vedení slaboproudého kabelu z výtahových kabin, požaduje změnu tohoto vedení na provedení „vlečný kabel“. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.
8. Objednatel požaduje ve všech projektech PTV nahrazení Cisco prvků FE za prvky s vyšší přenosovou kapacitou GE z důvodu vyšší propustnosti dat a umožnění připojování dalších prvků do TS, zejména kamer. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.

Výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.


Výše uvedená Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

Upravená realizační dokumentace se zpracovanou Změnou byla převzata Objednatelem včetně výkazu Výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu, který vyčísluje dopad této Změny na cenu Pokynu. Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **12 034 330,38 Kč** bez DPH.

V Praze dne 22. 08. 2014




Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Jaroslav Ďuriš,  
předseda představenstva




AŽD Praha s.r.o.  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Bc. Magdalena Češková,  
místopředsedkyně představenstva



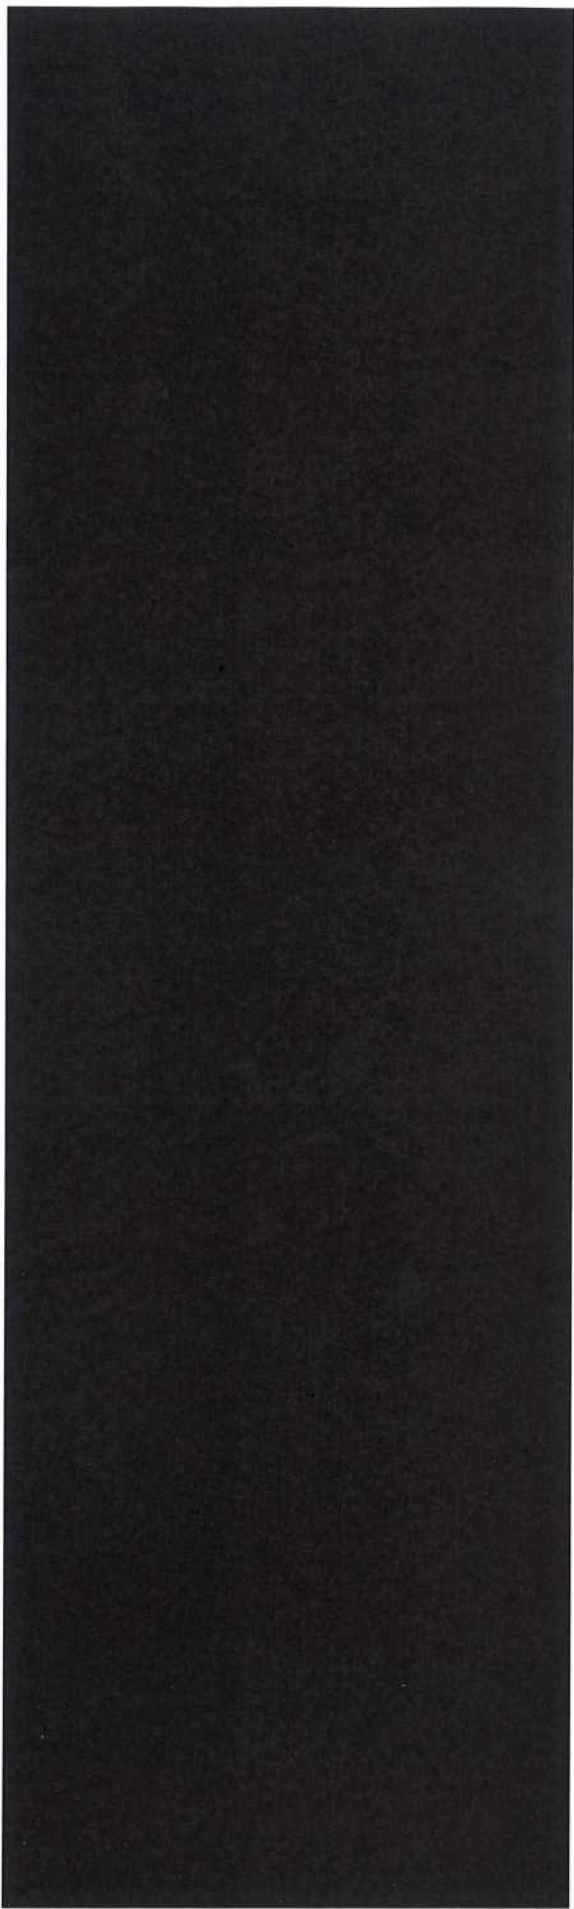

7

