



**Dodatek č. 5  
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky:  
„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1948/2018**

ISPROFOND: 521 372 0006

a

**SPOLEČNOST: „Nymburk – Mladá Boleslav“**

založená společenskou smlouvou ze dne 15. 2. 2018

se sídlem: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10,  
jejímiž účastníky jsou:

**1. AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

jako „vedoucí účastník“

a

## 2. TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35802723, IČ DPH: SK2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,  
spisová značka oddíl Sa, vložka 5590/B

**podnikající v České republice prostřednictvím organizační složky**  
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno  
IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka A 26126

zastoupena: **Ing. Dušanem Chovancem**, předsedou představenstva a  
**Ing. Markem Chomou**, členem představenstva

jako „další účastník“

a

## 3. SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12069

zastoupena: **Ing. Karlem Ryplem**, předsedou představenstva

jako „další účastník“

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., společnost „Nymburk – Mladá Boleslav“, Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha  
10

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **061-PVO/2018**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“) jsou následující skutečnosti:

- a) **Úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 7 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 4,97 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu Dodatku č. 5.

- b) **Úprava Doby pro dokončení a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.** Důvodem pro úpravu Doby pro dokončení a s tím související úpravu harmonogramu postupu prací je prodloužení doby plnění Všeobecného objektu SO 99-98-00 o dva měsíce

spočívající v dokončení vypořádání a administrace neuspokojených nároků Zhotovitele plynoucí ze změn a dodatečných požadavků Objednatele.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na následující změně termínu realizace Díla oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce:

#### Doba pro dokončení

**Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 31 měsíců od Data zahájení prací.**

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 19, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy, přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy a na doplnění nové přílohy č. 7 - Smluvní cena Díla. U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.

#### I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1948/2018, číslo smlouvy Zhotovitele: 061-PVO/2018, uzavřené dne 01. 06. 2018, ve znění jejích pozdějších dodatků, takto:

#### 1) Smluvní cena Díla

- a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2, č. 3 a č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) [redacted] bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) [redacted] bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) [redacted] bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) [redacted] bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) [redacted] bez DPH

**Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 5 Smlouvy celkem 15 259 099,88 Kč bez DPH**

- b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) [redacted] bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) [redacted] bez DPH

**Práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 5 Smlouvy celkem 1 384 905,40 Kč bez DPH**

#### Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 5:

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 335 154 195,85 Kč bez DPH

**Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5 + 16 644 005,28 Kč bez DPH**

**Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, činí 351 798 201,13 Kč bez DPH**

#### 2) Odstavec 19 Smlouvy

- ruší se stávající znění textu odstavce 19, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 7	Smluvní cena Díla - znění ke dni podpisu Dodatku č. 5

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, který je současně přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 7 Smlouvy – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové přílohy č. 7 – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 5 (současně přílohou č. 7 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1948/2018, číslo smlouvy Zhotovitele: 061-PVO/2018, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v **deseti (10)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **šest (6)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací  
- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 7 Smlouvy): Smluvní cena Díla  
- znění ke dni podpisu Dodatku č. 5

**Objednatel:**

V Praze dne 30 -10- 2020

**Zhotovitel:**

V Praze dne 22 -10- 2020

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.

V Bratislavě dne 23-10-2020

.....  
**Ing. Dušan Chovanec**  
předseda představenstva  
TSS GRADE, a. s.

.....  
**Ing. Marek Chroma**  
člen představenstva  
TSS GRADE, a. s.

V Praze dne 26-10-2020

.....  
**Ing. Karel Ryppl**  
předseda představenstva  
SILNICE GROUP a. s.



## **Příloha č. 4**

### **Harmonogram postupu prací**

*- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5*






**Příloha č. 7**  
**Smluvní cena Díla**

- znění ke dni podpisu Dodatku č. 5





ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2018		Půlrok 2, 2018		Půlrok 1, 2019		Půlrok 2, 2019		Půlrok 1, 2020		Půlrok 2, 2020		Půlrok 1, 2021		Půlrok 2, 2021		Půlrok 1, 2022		Půlrok 2, 2022		Půlrok 1, 2023		
					Ú	B	Ú	B	Ú	B	Ú	B	Ú	B	Ú	B	Ú	B	Ú	B	Ú	B	Ú	B	Ú	B	Ú
166	SO 99-98-00 Všeobecný objekt	953 dny	24.5.18	31.12.20																							

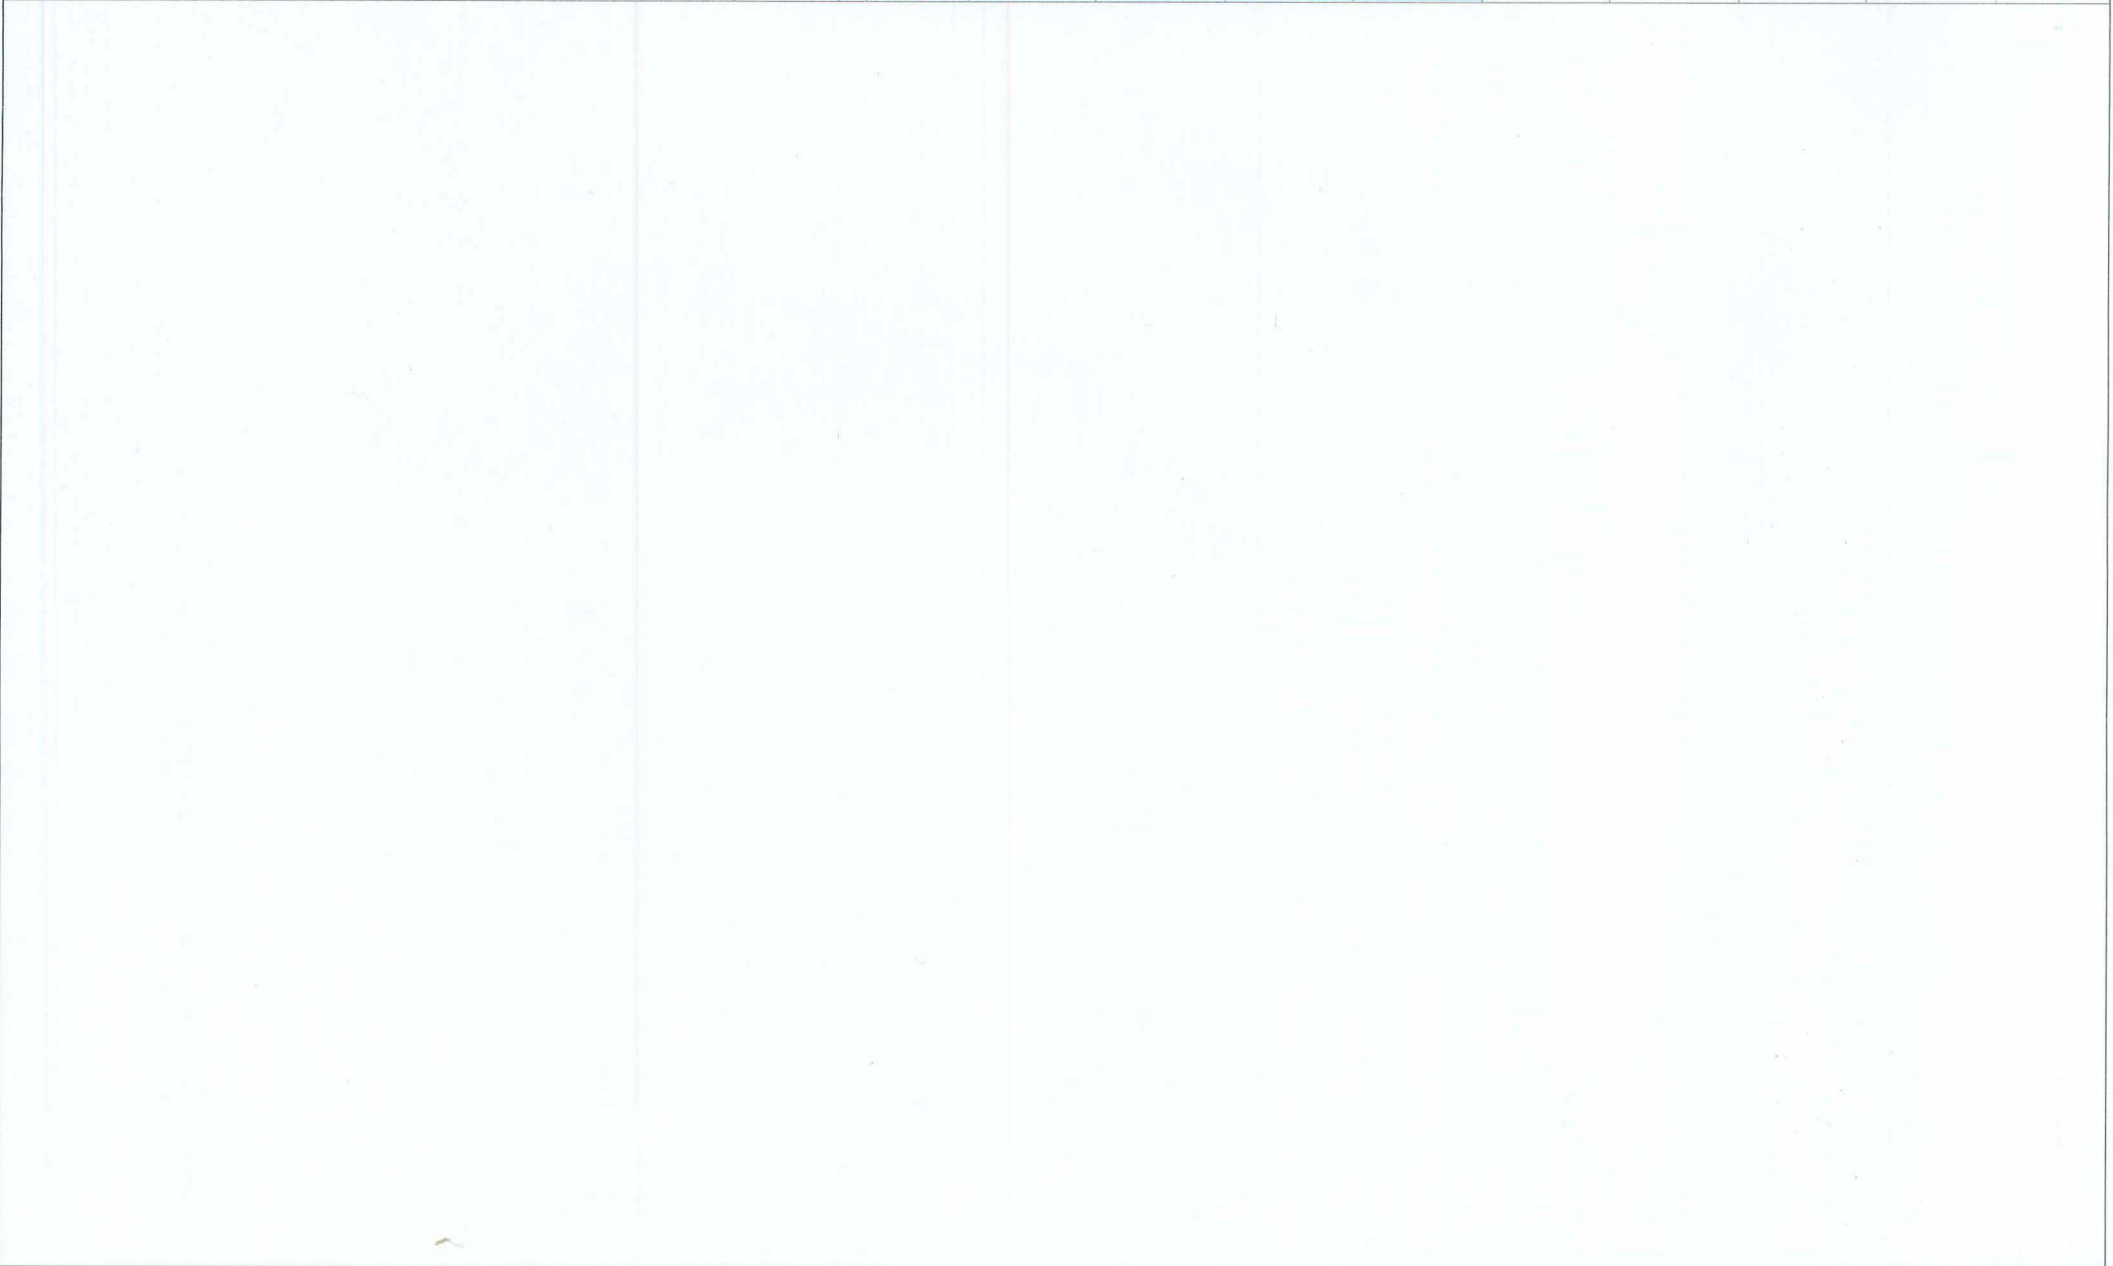

Projekt: HMG Zvýšení kapacity tra

Úkol		Souhrmný		Vnější milník		Neaktivní souhm		Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení		Souhm projektu		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhm		Průběh	
Milník		Vnější úkoly		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Úkol	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1226835

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 23cc6b1c-14b9-43f6-8757-e69e881cca49

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.11.2020 09:46:02



c2f66c64-4d3e-4353-9a2a-2f4fcc99e07d
