

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

ZLÍNSTAV, a.s.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 283 15 669
DIČ: CZ28315669 (plátce DPH)

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

č.II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 23. 03. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek**“ v k.ú. Moravská Ostrava z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle změnových listů v příloze č. 24 až 31 tohoto dodatku (včetně popisu důvodnosti těchto změn), kdy z důvodu těchto nepředvídatelných okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy se jedná o nepředvídatelné vícepráce a méněpráce (práce dané přílohou 24 až 31 tohoto dodatku). Za účelem přehlednosti, jsou v tomto dodatku č. 3 seřazeny také všechny změnové listy (přílohy smlouvy) z předchozích dodatků ke smlouvě – tj. přílohy č. 1 až 23 tohoto dodatku č. 3.

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 3 124 984,98 Kč bez DPH (tj. 1,84 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 2 276 744,73 Kč bez DPH (tj. 1,34 % původní ceny díla).

Čl.II. Předmět

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se nahrazuje textem následujícího znění:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - generální projektant stavby KWK PROMES arch. Robert Konieczny, ul. Rymera 3/5, 40-048 Katowice, projekční jednotka MS-projekce s.r.o., IČO: 258 72 494, Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, zpracována v 09/2019 (dále jen „**projektová dokumentace**“). Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné budovy městských jatek a její konverzi na galerii moderního umění. Objekt se skládá z celkem 5 na sebe navazujících částí označených písmeny „A – E“ různého historického stáří, součástí veřejné zakázky je i demolice části „D“ a její nová výstavba. Smluvní strany se současně dohodly oproti projektové dokumentaci realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 až 31 této smlouvy.“

2. Dosavadní Příloha č. 4 až 21 smlouvy se ruší a za přílohu č. 3 se vkládají tyto přílohy:

příloha č. 4 – změnový list č. 01a (Změna dimenze řízeného protlaku, doplnění cílové a startovací jámy) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3.

příloha č. 5 – změnový list č. 01b (Úprava dešťové kanalizace) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 3.

příloha č. 6 – změnový list č. 01c (Změna provedení dodatečné izolace zdiva) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 3.

příloha č. 7 – změnový list č. 01d (Navýšení bourací práce na základových konstrukcích budovy D) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 3.

příloha č. 8 – změnový list č. 01e (Prodloužení mikropilot pod objektem D) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 3.

příloha č. 9 – změnový list č. 01f (Bourání stěny) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 6 dodatku č. 3.

příloha č. 10 – změnový list č. 01g (Snižování úrovně pláňe uvnitř objektu) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 7 dodatku č. 3.

příloha č. 11 – změnový list č. 01h (Bourací práce ABCDE) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 8 dodatku č. 3.

příloha č. 12 – změnový list č. 01i (Bourací práce kanalizace) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 9 dodatku č. 3.

příloha č. 13 – změnový list č. 02a (Monitoring objektu) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 10 dodatku č. 3,

příloha č. 14 – změnový list č. 02c (Poplatek za kontaminovanou zeminu) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 11 dodatku č. 3,

příloha č. 15 – změnový list č. 02d (Bourací práce kanalizace) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 12 dodatku č. 3,

příloha č. 16 – změnový list č. 02e (Provedení ztužující stěny) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 13 dodatku č. 3,

příloha č. 17 – změnový list č. 02f (Odstranění ocelové nádrže a betonové jímky) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 14 dodatku č. 3,

příloha č. 18 – změnový list č. 02g (Zásyp kanalizace a vodovodní přípojky kamenivem) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 15 dodatku č. 3,

příloha č. 19 – změnový list č. 02h (Odpočet teplovodní přípojky) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 16 dodatku č. 3,

příloha č. 20 – změnový list č. 02i (Bourání podzemních jímek u objektu A) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 17 dodatku č. 3,

příloha č. 21 – změnový list č. 02j (Bourání k-cí v trase IS kanálů) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 18 dodatku č. 3,

příloha č. 22 – změnový list č. 02k (Úprava nestabilní stěny mezi objekty C a D) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 19 dodatku č. 3,

příloha č. 23 – změnový list č. 02m (Poplatek za kontaminovanou zeminu –biodegradace) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 20 dodatku č. 3,

příloha č. 24 – změnový list č. 03a (Revize betonových podlah) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 21 dodatku č. 3,

příloha č. 25 – změnový list č. 03b (Přechodová komora VZT) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 22 dodatku č. 3,

příloha č. 26 – změnový list č. 03c (Tryskání konstrukcí a protipožární nátěry) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 23 dodatku č. 3,

příloha č. 27 – změnový list č. 03d (Revize fasády) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 24 dodatku č. 3,

příloha č. 28 – změnový list č. 03e (Bourací a zednické práce ABCE) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 25 dodatku č. 3,

příloha č. 29 – změnový list č. 03f (Mikropiloty) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 26 dodatku č. 3,

příloha č. 30 – změnový list č. 03g (Příprava pro věnce A a B) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 27 dodatku č. 3,

příloha č. 31 – změnový list č. 03h (Bourání a provedení nového stropu) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 28 dodatku č. 3,

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Změnový list č.	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
01a	76 101,35	15 981,28	92 082,63
01b	28 068,96	5 894,48	33 963,44
01c	0,00	0,00	0,00
01d	472 223,54	99 166,94	571 390,48
01e	150 284,73	31 559,79	181 844,52

<i>01f</i>	<i>140 182,88</i>	<i>29 438,40</i>	<i>169 621,28</i>
<i>01g</i>	<i>388 144,00</i>	<i>81 510,24</i>	<i>469 654,24</i>
<i>01h</i>	<i>138 272,10</i>	<i>29 037,14</i>	<i>167 309,24</i>
<i>01i</i>	<i>42 016,75</i>	<i>8 823,52</i>	<i>50 840,27</i>
<i>Celkem ZL 01a-i</i>	<i>1 435 294,31</i>	<i>301 411,81</i>	<i>1 736 706,12</i>
<i>02a</i>	<i>63 231,00</i>	<i>13 278,51</i>	<i>76 509,51</i>
<i>02c</i>	<i>6 995 642,97</i>	<i>1 469 085,02</i>	<i>8 464 727,99</i>
<i>02d</i>	<i>171 728,36</i>	<i>36 062,96</i>	<i>207 791,32</i>
<i>02e</i>	<i>25 504,86</i>	<i>5 356,03</i>	<i>30 860,89</i>
<i>02f</i>	<i>170 018,72</i>	<i>35 703,93</i>	<i>205 722,65</i>
<i>02g</i>	<i>136 673,64</i>	<i>28 701,46</i>	<i>165 375,10</i>
<i>02h</i>	<i>-141 205,00</i>	<i>-29 653,05</i>	<i>-170 858,05</i>
<i>02i</i>	<i>223 702,27</i>	<i>46 977,48</i>	<i>270 679,75</i>
<i>02j</i>	<i>59 580,43</i>	<i>12 511,89</i>	<i>72 092,32</i>
<i>02k</i>	<i>78 748,88</i>	<i>16 537,27</i>	<i>95 286,15</i>
<i>02m</i>	<i>1 041 675,68</i>	<i>218 751,89</i>	<i>1 260 427,57</i>
<i>Celkem ZL 02a-m</i>	<i>8 825 301,81</i>	<i>1 853 313,38</i>	<i>10 678 615,19</i>
<i>03a</i>	<i>-12 457,42</i>	<i>-2 616,06</i>	<i>-15 073,48</i>
<i>03b</i>	<i>13 652,26</i>	<i>2 866,97</i>	<i>16 519,23</i>
<i>03c</i>	<i>154 573,68</i>	<i>32 460,47</i>	<i>187 034,15</i>
<i>03d</i>	<i>-23 901,13</i>	<i>-5 019,24</i>	<i>-28 920,37</i>
<i>03e</i>	<i>85 053,45</i>	<i>17 861,22</i>	<i>102 914,67</i>
<i>03f</i>	<i>108 511,50</i>	<i>22 787,42</i>	<i>131 298,92</i>
<i>03g</i>	<i>11 162,11</i>	<i>2 344,04</i>	<i>13 506,15</i>
<i>03h</i>	<i>511 645,80</i>	<i>107 445,62</i>	<i>619 091,42</i>
<i>Celkem ZL 03a-h</i>	<i>848 240,25</i>	<i>178 130,45</i>	<i>1 026 370,70</i>

<i>Cena díla z SoD</i>	<i>169 967 256,01</i>	<i>35 693 123,76</i>	<i>205 660 379,77</i>
<i>Cena z dodatku č.1</i>	<i>1 435 294,31</i>	<i>301 411,81</i>	<i>1 736 706,12</i>
<i>Cena z dodatku č.2</i>	<i>8 825 301,81</i>	<i>1 853 313,38</i>	<i>10 678 615,19</i>
<i>Cena z dodatku č.3</i>	<i>848 240,25</i>	<i>178 130,45</i>	<i>1 026 370,70</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>181 076 092,38</i>	<i>38 025 979,40</i>	<i>219 102 071,78</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Článek V. Termín plnění, v odst. 2 se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 83 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

5. Příloha č. 29 tohoto dodatku č. 3 Aktualizace harmonogramu realizace díla nahrazuje přílohu č.2 Smlouvy o dílo.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05250/RM1822/77 ze dne 10.11.2020. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1106/2020/OI/VZ s nabytím účinnosti dne 23. 03. 2020, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1106/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 23.03.2020
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 4 smlouvy – Změnový list č. 01a vč. rozpočtu
Příloha č. 2 - Příloha č. 5 smlouvy – Změnový list č. 01b vč. rozpočtu
Příloha č. 3 - Příloha č. 6 smlouvy – Změnový list č. 01c vč. rozpočtu
Příloha č. 4 - Příloha č. 7 smlouvy – Změnový list č. 01d vč. rozpočtu
Příloha č. 5 - Příloha č. 8 smlouvy – Změnový list č. 01e vč. rozpočtu

Příloha č. 6 - Příloha č. 9 smlouvy – Změnový list č. 01f vč. rozpočtu
Příloha č. 7 - Příloha č. 10 smlouvy – Změnový list č. 01g vč. rozpočtu
Příloha č. 8 - Příloha č. 11 smlouvy – Změnový list č. 01h vč. rozpočtu
Příloha č. 9 - Příloha č. 12 smlouvy – Změnový list č. 01i vč. rozpočtu
Příloha č. 10 - Příloha č. 13 smlouvy – Změnový list č. 02a vč. rozpočtu
Příloha č. 11 - Příloha č. 14 smlouvy – Změnový list č. 02c vč. rozpočtu
Příloha č. 12 - Příloha č. 15 smlouvy – Změnový list č. 02d vč. rozpočtu
Příloha č. 13 - Příloha č. 16 smlouvy – Změnový list č. 02e vč. rozpočtu
Příloha č. 14 - Příloha č. 17 smlouvy – Změnový list č. 02f vč. rozpočtu
Příloha č. 15 - Příloha č. 18 smlouvy – Změnový list č. 02g vč. rozpočtu
Příloha č. 16 - Příloha č. 19 smlouvy – Změnový list č. 02h vč. rozpočtu
Příloha č. 17 - Příloha č. 20 smlouvy – Změnový list č. 02i vč. rozpočtu
Příloha č. 18 - Příloha č. 21 smlouvy – Změnový list č. 02j vč. rozpočtu
Příloha č. 19 - Příloha č. 22 smlouvy - Změnový list č. 02k vč. rozpočtu
Příloha č. 20 - Příloha č. 23 smlouvy – Změnový list č. 02m vč. rozpočtu
Příloha č. 21 - Příloha č. 24 smlouvy – Změnový list č. 03a vč. rozpočtu
Příloha č. 22 - Příloha č. 25 smlouvy – Změnový list č. 03b vč. rozpočtu
Příloha č. 23 - Příloha č. 26 smlouvy – Změnový list č. 03c vč. rozpočtu
Příloha č. 24 - Příloha č. 27 smlouvy – Změnový list č. 03d vč. rozpočtu
Příloha č. 25 - Příloha č. 28 smlouvy – Změnový list č. 03e vč. rozpočtu
Příloha č. 26 - Příloha č. 29 smlouvy – Změnový list č. 03f vč. rozpočtu
Příloha č. 27 - Příloha č. 30 smlouvy – Změnový list č. 03g vč. rozpočtu
Příloha č. 28 - Příloha č. 31 smlouvy – Změnový list č. 03h vč. rozpočtu
Příloha č. 29 - Příloha č. 2 smlouvy – Aktualizovaný harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: 19.11.2020

Místo: Ostrava

Datum: 13.11.2020

Místo: Ostrava

FINANČNÍ PLÁN STAVBY - REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY BÝVALÝCH JATEK PRO ÚČELY GALERIE PLATO OSTRAVA

Zadávatel:
Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava
IČ: 00845451

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ: 28315669

Datum: 05.11.2020

Termín realizace: 6.4.2020 - 8.11.2021


Cena díla SOD: 169 967 256,01 Kč bez DPH

Cena vč. dodatku č. 1: 171 402 550,32 Kč bez DPH

Cena vč. dodatku č. 2: 180 227 852,13 Kč bez DPH

Cena vč. dodatku č. 3: 181.076.092,38 Kč bez DPH

Prováděné práce	Celkový součet	2020			2021												
		dosud vyfakturováno			leden	únor	březen	duben	květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	celkem 2021	
FINANČNÍ PLÁN K SOD vč. dod. č. 1 a 2 a 3 v ČÁSTCE 181 076 092,38 Kč	181 076 092,38 Kč	35 609 027,00 Kč	2 566 000,00 Kč	4 609 431,00 Kč	42 784 458,00 Kč	4 459 090,00 Kč	4 286 611,00 Kč	8 077 206,00 Kč	10 452 447,00 Kč	12 353 608,00 Kč	17 915 624,00 Kč	17 529 614,00 Kč	19 470 536,00 Kč	21 208 543,00 Kč	22 087 317,00 Kč	451 038,00 Kč	138 291 634,00 Kč

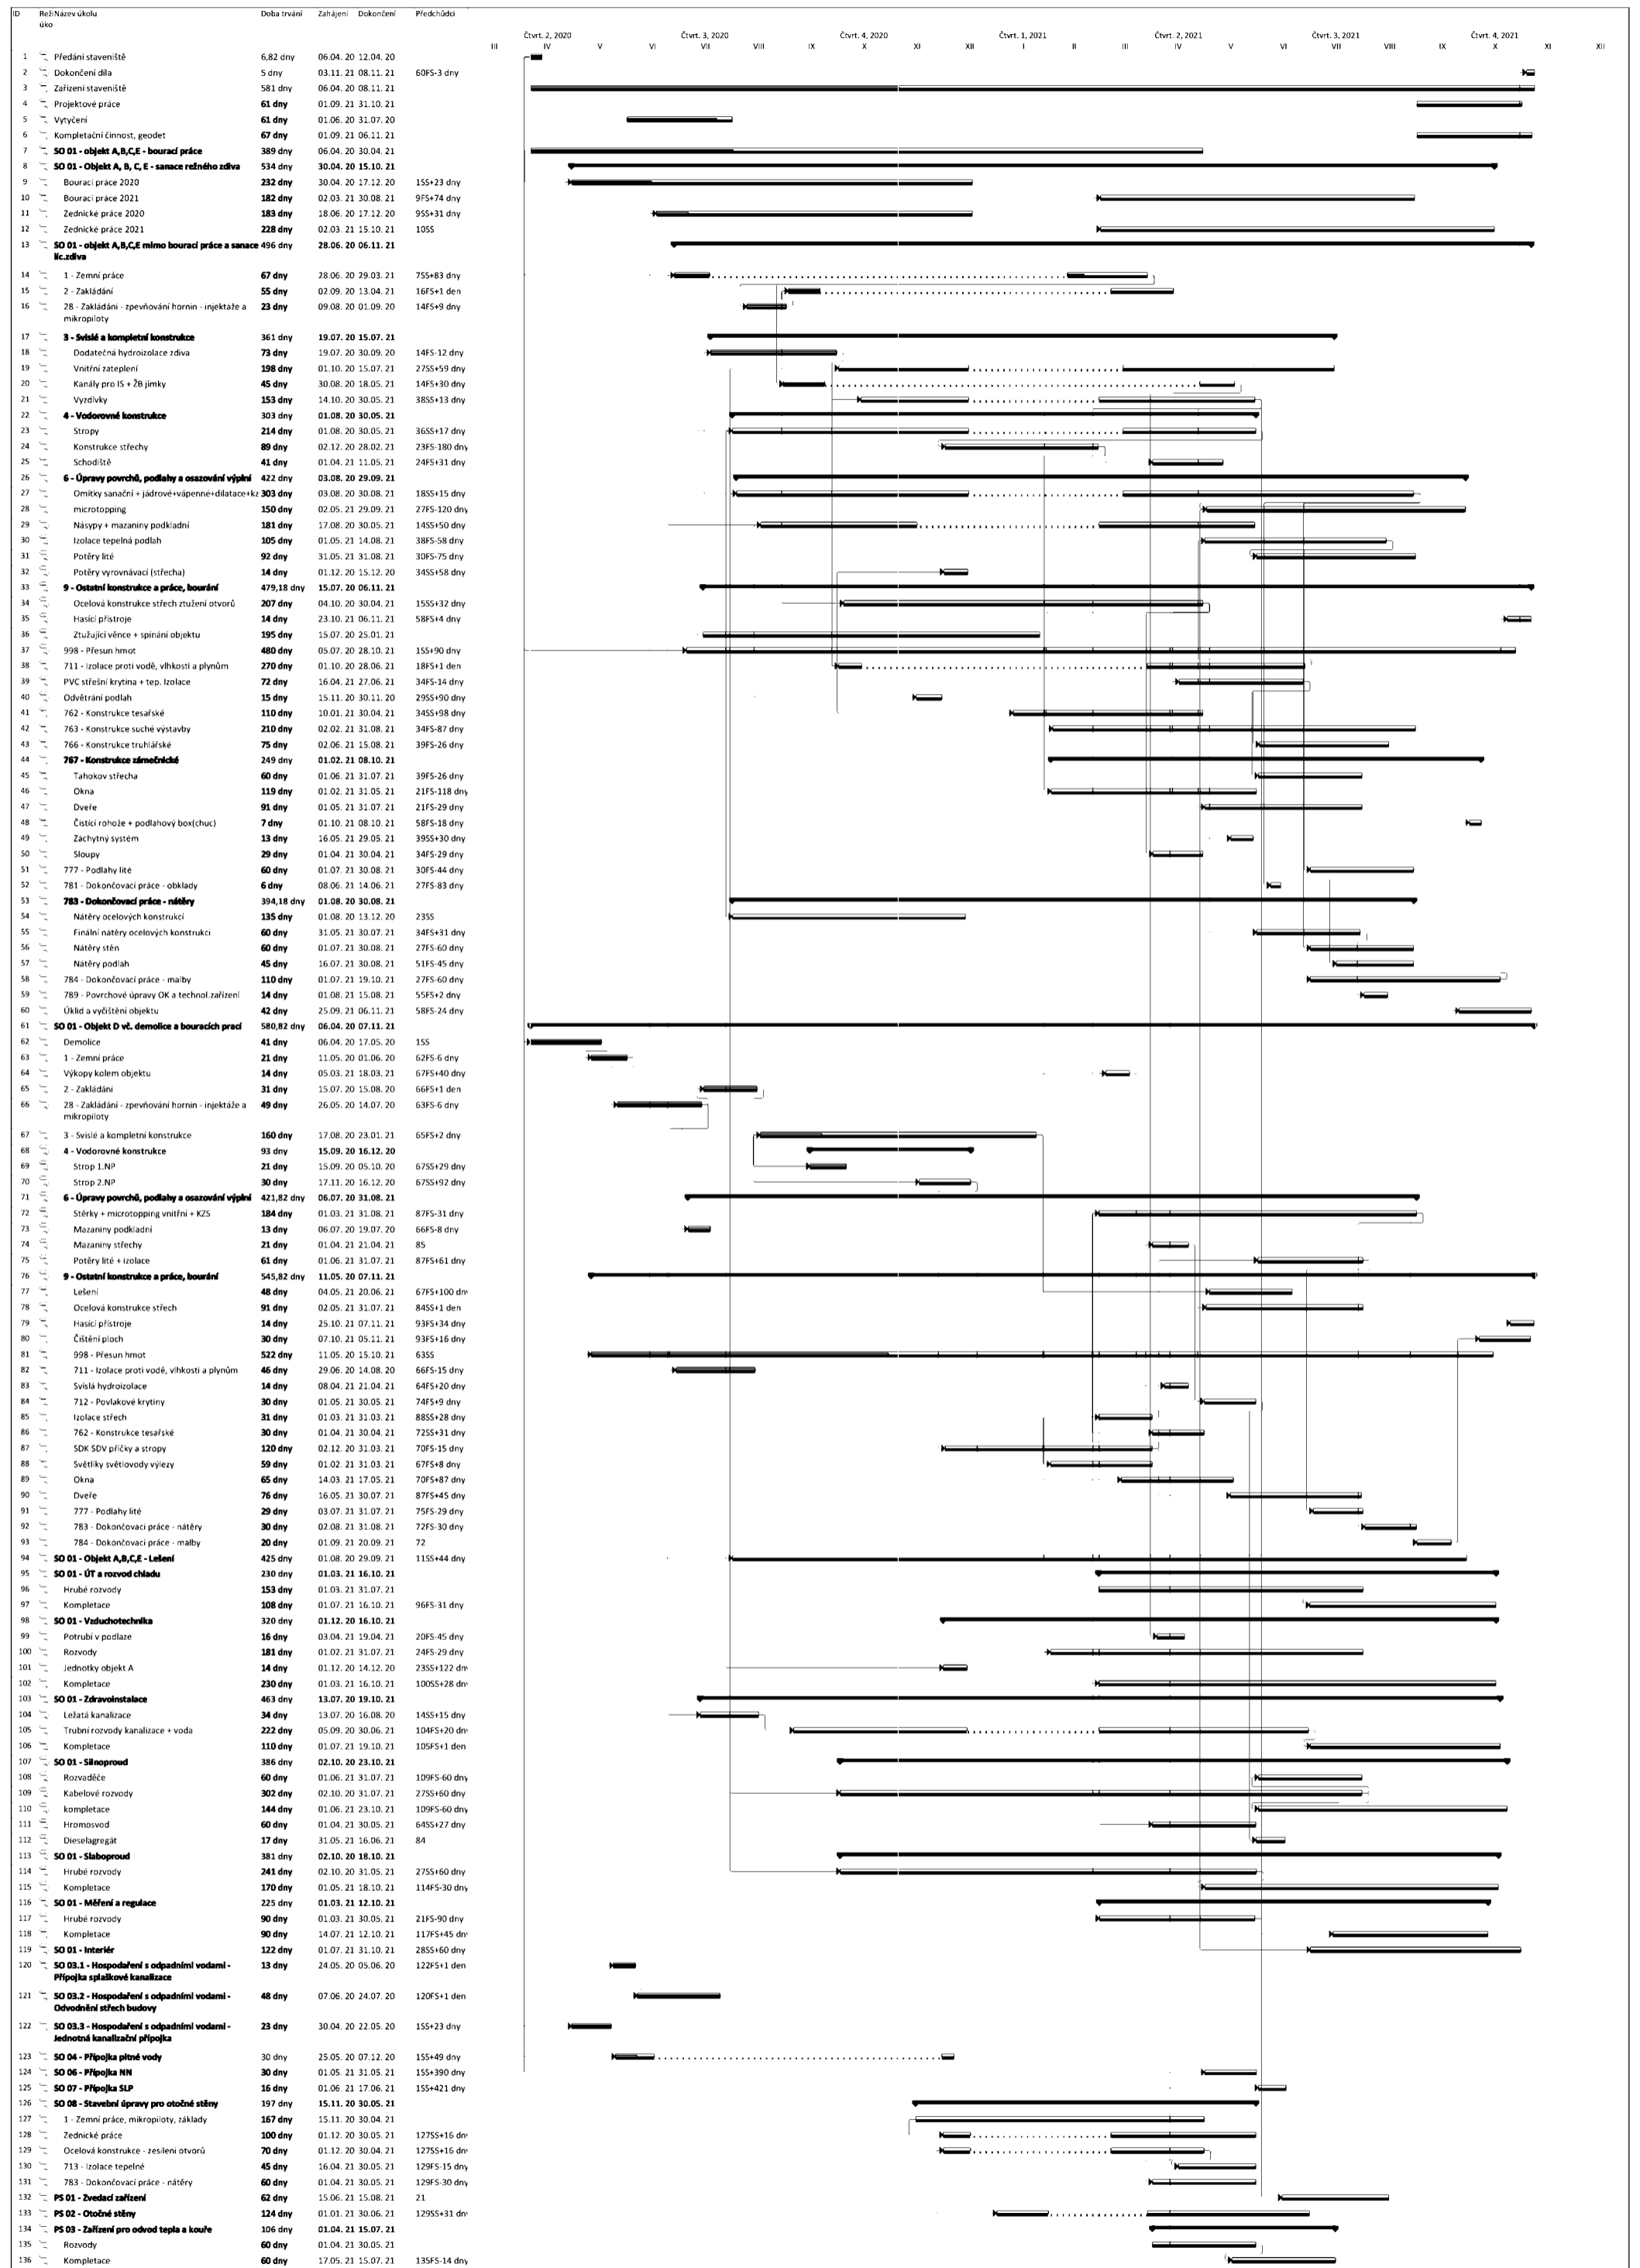

Projekt: Galerie Plato HMAG 04.11. Datum: 05.11.20	Úkol Rozdělení Mílník	Souhrnný Souhrn projektu Vnější úkoly	Vnější mílník Neaktivní úkol Neaktivní mílník	Neaktivní souhrn Ruční úkol Pauze s dobou trvání	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení	Pauze s datem dokončení Konečný termín Průběh
---	-----------------------------	---	---	--	--	---

ID	Rež	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdka																						
137		PS 04 - Stabilní hasicí zařízení	47 dny	15.04.21	31.05.21	34F5-16 dny	III	Čtvrt. 2, 2020 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2020 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2020 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2021 I	II	III	Čtvrt. 2, 2021 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2021 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2021 X	XI	XII

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 01a

Dotčená část díla: SO 03.3, SO 06

Předmět změny: Změna dimenze řízeného protlaku, doplnění cílové a startovací jámy

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [REDACTED] Datum : 17.04.2020

Popis změny:

Změna dimenze řízeného protlaku, zvětšení startovací jámy kanalizace a doplnění startovací a cílové jámy NN protlaku.

Zdůvodnění:

Řízený protlak musí být proveden s chráničkou většího průřezu s ohledem na profil a uložení kanalizačního potrubí. Větší dimenze ocelové chráničky vyžaduje odlišnou mechanizaci provádění protlaku a s touto je přímo spojená větší startovací jáma. Pro protlak NN musí být provedena startovací a cílová jáma, která není předmětem PD. Projektant uvažoval s prováděním protlaků v jednom místě, které není možno takto technicky realizovat.

Řešení:

Zvětšení startovací jámy protlaku pro kanalizaci, provedení protlaku ocelovou chráničkou DN 530, zhotovení startovací a cílové jámy pro protlak NN.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla .

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH

76 101,35 Kč
92 082,63 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. Výkres
3. Fotodokumentace

Za Zhotovitele :	[REDACTED]	Za objednatele:	[REDACTED]
zamítnuto		zamítnuto	
Datum :	Zlín	Datum :	
Podpis, razítko :	[REDACTED]	Podpis, razítko :	[REDACTED]
Za Autorský Dozor:	[REDACTED]	Za objednatele:	[REDACTED]
zamítnuto		zamítnuto	
Datum :		Datum :	
Podpis, razítko :	[REDACTED]	Podpis, razítko :	[REDACTED]
Za Autorský Dozor:	[REDACTED]	Za objednatele:	[REDACTED]
zamítnuto		zamítnuto	
Datum :	[REDACTED]	Datum :	
Podpis, razítko :	[REDACTED]	Podpis, razítko :	[REDACTED]



SOUPIS VÍCEPRACÍ



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13a	K	141721224	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačení potrubí vnějšího průměru vrtu do 560 mm v hornině tř 1 až 4	m	7,000	9 250,00	64 750,00	CS ÚRS 2020 01
						5 160,00		
5	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	17,920	408,90	7 327,49	SOD
			Starbovací jama					
			3,00*3,00*2,72		-24,480			
			Starbovací jama (ROVÁ) kanalizace, starbovací a odlovová jama RH					
			7,00*2,00*2,72		38,080			
			2*2,00*2,00*1,5		12,000			
			"Zcela 30% v zemi této třídy těžitelnosti"					
			(slávací různé zpevněné plochy apod.)		17,92			
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	17,920	37,20	666,62	SOD
7	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	7,680	538,90	4 138,75	SOD
			Starbovací jama					
			3,00*3,00*2,72		-24,480			
			Starbovací jama (ROVÁ) kanalizace, starbovací a odlovová jama RH					
			7,00*2,00*2,72		38,080			
			2*2,00*2,00*1,5		12,000			
			"Zcela 30% v zemi této třídy těžitelnosti"					
			(slávací různé zpevněné plochy apod.)		7,68			
8	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	7,680	51,70	397,06	SOD
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	59,520	72,20	4 297,34	SOD
			Starbovací jama					
			3,00*4*2,72		-32,640			
			Starbovací jama (ROVÁ) kanalizace, starbovací a odlovová jama RH					
			7,00*4*2,72		76,160			
			4*2,00*2,00		16,000			
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	59,520	23,70	1 410,62	SOD
19	K	151101301	Zřízení rozpeření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	8,533	41,70	355,84	SOD
			24,48/3		-8,160			
			50,08/3		16,693			
20	K	151101311	Odstranění rozpeření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	8,533	9,50	81,07	SOD
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,000	77,80	933,60	SOD
22	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	13,600	127,50	1 734,00	SOD
23	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,200	33,20	1 699,84	SOD
			"na meziskládku - potřebná kubatura"					
			25,6		25,600			
			"zpětně" 25,6		25,600			
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	25,600	52,70	1 349,12	SOD
			"zpětně z meziskládky" 25,6		25,600			
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	25,600	125,00	3 200,00	SOD
			dle výkopu					
Celkem VÍCEPRÁCE							128 461,35	

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

13	K	141721118	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 350 mm v hornině tř 1 až 4	m	-7,000	3 230,00	-22 610,00	SOD
14	M	140111112	Průběh územní bouřeš a malá jáma 11, 10 x 3,65 x 6 v 6 území	m	-7,000	4 250,00	-29 750,00	SOD
Celkem MĚNĚPRÁCE							-52 360,00	

Celkem VÍCE A MĚNĚPRÁCE
76 101,35
Celkem ZL 01a
76 101,35

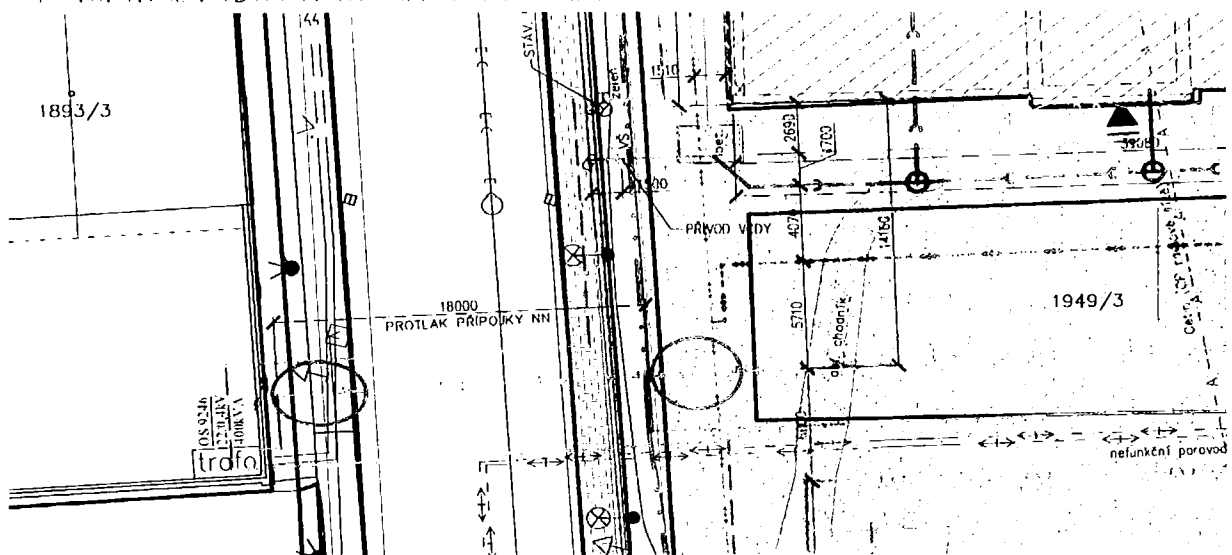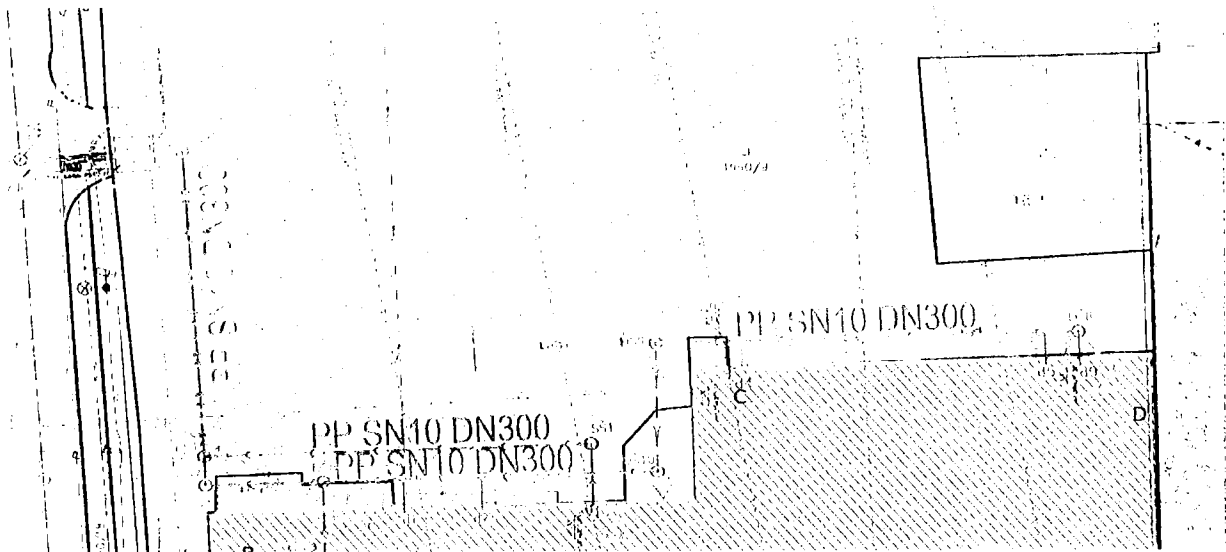

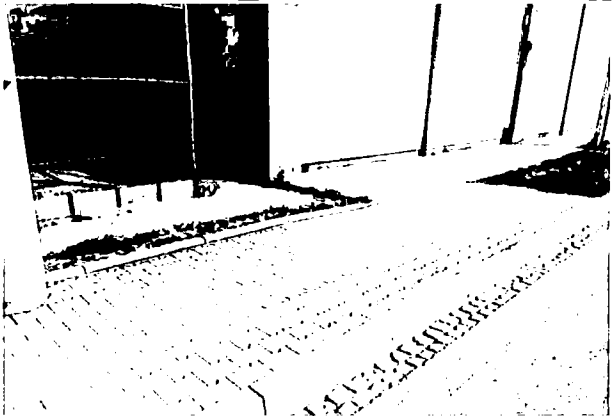


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133483586-12009-201111102919**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

V Ostravě dne 11.11.2020



133483586-12009-201111102919

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST**ZL - 01b**

Dotčená část díla: SO-03 HOSPODAŘENÍ S ODPADNÍMI VODAMI

Předmět změny: Úprava dešťové kanalizace

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 OstravaZhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 04.05.2020

Popis změny:

Změna řešení úpravy návrhu dvou kanalizačních šachet.

Zdůvodnění:

Změna řešení dotčené části projektu spočívá v úpravě návrhu dvou kanalizačních šachet. Jedná se o šachty DŠ5 a DŠ6. Tyto šachty budou prohloubeny oproti původnímu návrhu o 800mm, ato z důvodu přípravy pro budoucí řešení akumulace dešťových vod. Tato akumulace bude řešena v rámci projektu zpevněných ploch. Došlo i ke změně návrhu provedení šachtového dna.

Řešení:

Osazení den do nižších výškových úrovní, šachtová dna DŠ 5 a DŠ6 budou provedena jako koncová.

§222, odst. (4) 15% absolutní hodnota bez zdůvodňování

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla .

Předpoklad dopadu do ceny :zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH28 068,96 Kč
33 963,44 Kč**Seznam příloh:**

1. Rozpočet
2. PD - Úprava dešťové kanalizace

Za Zhotovitele :

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :
