

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133485629-48005-201111105215**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

V Ostravě dne 11.11.2020



133485629-48005-201111105215

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Pláto“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL. - 02g

Dotčená část díla: SO 03, SO 04

Předmět změny: Zásyp kanalizace a vodovodní přípojky kamenivem

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :  Datum : 30.06.2020

Popis změny:

Zásyp výkopu kanalizace a vodovodní přípojky kamenivem.

Zdůvodnění:

Z důvodu nálezu kontaminované zeminy na stavbě, bude zpětný zásyp výkopu kanalizace proveden kamenivem a kontaminovaná zemina odvezena na skládku.

Řešení:

Zpětný zásyp kanalizace a vodovodní přípojky kamenivem frakce 0/63.









§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 136 673,64 Kč
vč. 21% DPH 165 375,10 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. Výkres
3. Fotodokumentace
4. Stanovisko AD

Za Zhotovitele :		Za objednatele:	
zamítnuto		zamítnuto	
Datum :		Datum :	
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor:		Za objednatele:	
zamítnuto		zamítnuto	
Datum :		Datum :	
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor:		Za objednatele:	
zamítnuto		zamítnuto	
Datum :		Datum :	
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						376,34		CS ÚRS 2020 01
					166,00			
					63,17			
890	K	167R	Překládání zeminy bagrem na mezideponii	hod	5,000	1 600,00	8 000,00	vlastní
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	163,640	149,20	24 415,09	SOD
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	163,640	135,00	22 091,40	SOD
					163,64			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	818,200	3,60	2 945,52	SOD
					818,20			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	163,640	13,10	2 143,68	SOD
Celkem VÍCEPRÁCE							136 673,64	

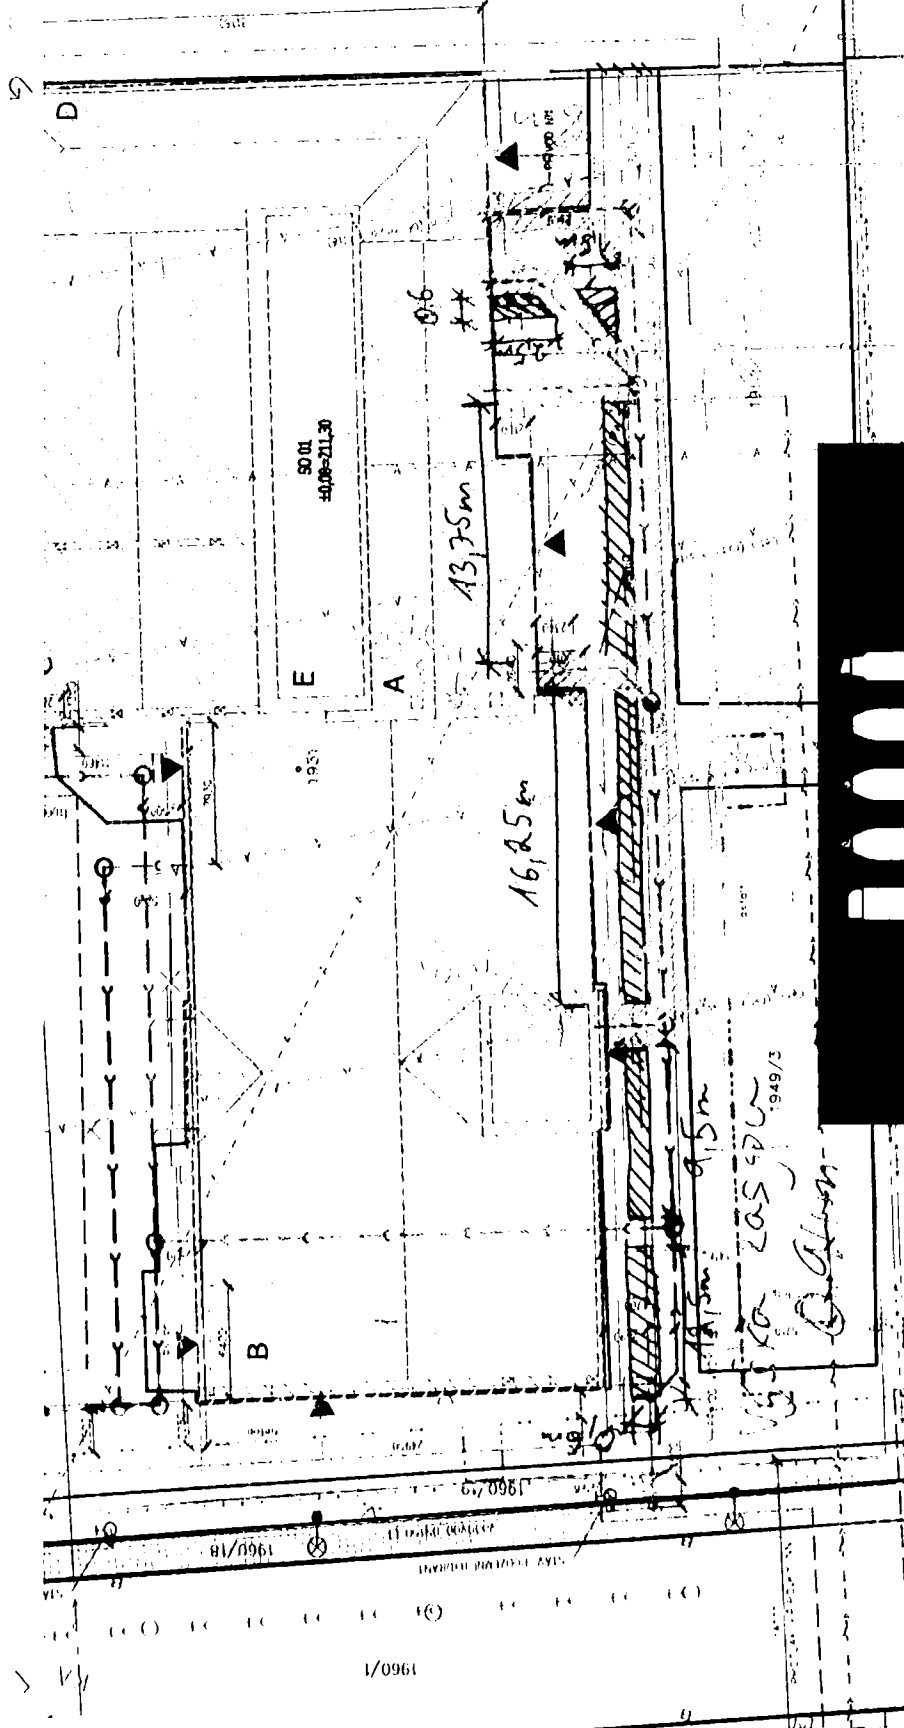
Celkem ZL 02g
136 673,64

1960/1

1960/18

0-10 10000000 0112000 21205 4000 - 0002000

1942



1/0961

()
