

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-287/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] L.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí útvaru realizace staveb
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

II. SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice

Zastoupená: Zdeňkem Havlem,
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

[redacted]
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)

[redacted]
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Kontaktní adresou: Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou C 8032/KSCB.

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted], stavbyvedoucí
[redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted]avbyvedoucí
[redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted], stavbyvedoucí
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-287/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

28.030.251,58 Kč (Slovy: **Dvacet osm milionů třicet tisíc dvě stě padesát jedna** korun českých a 58/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21 % 5.886.352,83 Kč (Slovy: **Tři miliony osm set devadesát sedm tisíc pět set dvacet dva** korun českých a 83/100).

Cena včetně DPH činí **33.916.604,41 Kč** (Slovy: **Třicet tři milionů devět set šestnáct tisíc šest set čtyři** korun českých a 41/100).


Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.


III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1, 2 a 3.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 13.11.2020
Za Objednatele:

Chrudim dne: 13.11.2020
Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Ing. Martin Lukeš
ředitel
Oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.


Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
Oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis objektů s DPH**Stavba: MS2019 - Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky****Varianta: ZŘ -**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		28 030 251,58
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
SO 101	1 část	4 177 443,82	877 263,20	5 054 707,02
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV 1	Změna dle zaměřené skutečnosti	326 968,65	68 663,42	395 632,07
SO 102	2 část	12 429 019,68	2 610 094,13	15 039 113,81
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV 2	Změna dle zaměřené skutečnosti	1 035 187,02	217 389,27	1 252 576,29
SO 103	3. část	11 281 499,58	2 369 114,91	13 650 614,49
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV 3	Změna dle zaměřené skutečnosti	782 160,30	164 253,66	946 413,96
SO 181	1 část - DIO	68 464,90	14 377,63	82 842,53
SO 182	2. část - DIO	5 358,70	1 125,33	6 484,03
SO 183	3 část - DIO	68 464,90	14 377,63	82 842,53

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky - SMLO-287/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1. část	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.09.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 Dopravní stavby VÝCHOD

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po provedení sanace zemní pláně dle předpokladu PDPS v tl. 300 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm, byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa dle PDPS (viz protokol č. 298/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 332/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Na základě výsledku provedené zkoušky únosnosti zemní pláně byl stanoven AD a TDS další postup. Sanace pláně byla provedena v tl. 600 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm. Po provedené sanaci zemní pláně byly provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou, které dosáhly požadavku únosnosti zemní pláně dle PDPS (viz protokol č. 299/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 333/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	326 968,65 Kč	326 968,65 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: 12. 11. 2020	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: 12. 11. 2020	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 12. 11. 2020	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. [redacted]	datum: 12. 11. 2020	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 12. 11. 2020	podpis: [redacted]
			Číslo paré: [redacted]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: SML0-287/2020 - Oprava silnice III/3587 Trh Bubny - Restokry

Číslo a název SO/PS: SO 101 - 1. část

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - 1. část

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 762,75	2 451,25	688,50	83,00 Kč	146 308,25 Kč	0,00 Kč	57 145,50 Kč	203 453,75 Kč	57 145,50 Kč	39,10%
2	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZAVISLOU ZKŮŠEBNOU POMOČ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	41 880,50 Kč	41 880,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 880,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	02730	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	3,00	3,00	0,00	823,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	02852	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	15,50	15,50	0,00	2 325,60 Kč	36 046,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 046,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	02946	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	7 790,70 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	03100	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 032,75	1 032,75	0,00	73,10 Kč	75 494,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75 494,03 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	11332	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	3 670,00	3 670,00	0,00	4,80 Kč	17 616,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 616,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	11360	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	15,60	15,60	0,00	1 603,40 Kč	25 013,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 013,04 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	11372E	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	20,00	20,00	0,00	83,70 Kč	1 674,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 674,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	113765	ČIŠTĚNÍ PŘIKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	1 460,00	1 460,00	0,00	111,90 Kč	163 374,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	163 374,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	12932	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	688,50	1 377,00	688,50	132,40 Kč	91 157,40 Kč	0,00 Kč	91 157,40 Kč	182 314,80 Kč	91 157,40 Kč	100,00%
16	21450	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	2 295,00	2 295,00	0,00	2,70 Kč	6 196,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 196,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	18110	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	730,00	730,00	0,00	35,50 Kč	25 915,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 915,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	18243	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	2 295,00	2 295,00	0,00	7,90 Kč	18 130,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 130,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	21461C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	352,90	352,90	0,00	680,60 Kč	240 183,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	240 183,74 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	68,00	66,00	0,00	89,50 Kč	6 086,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 086,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	56363	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	4 129,00	4 129,00	0,00	215,10 Kč	888 147,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	888 147,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	567534	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	730,00	730,00	0,00	89,50 Kč	65 335,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 335,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	56963	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 129,00	4 129,00	0,00	14,00 Kč	57 806,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 806,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	572123	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	3 792,00	3 792,00	0,00	9,30 Kč	35 265,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 265,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	572211	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	3 670,00	3 670,00	0,00	179,40 Kč	658 398,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	658 398,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	574A34.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	342,00	342,00	0,00	224,50 Kč	76 779,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	76 779,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	574A44.B	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	3 963,00	3 963,00	0,00	248,90 Kč	986 390,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	986 390,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	574C56	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁŠKU	KUS	36,00	36,00	0,00	377,90 Kč	13 604,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 604,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	91228	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,00	18,00	0,00	1 278,10 Kč	23 005,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 005,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	914161	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	8,00	8,00	0,00	2 031,40 Kč	16 251,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 251,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	914931	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	188,13	188,13	0,00	122,10 Kč	22 970,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 970,06 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	188,13	188,13	0,00	337,20 Kč	63 435,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 435,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	915211	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	20,00	20,00	0,00	145,40 Kč	2 908,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 908,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	931325	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	80,00	80,00	0,00	28,80 Kč	2 304,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 304,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
43	11120	Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						3 850 475,17 Kč	0,00 Kč	148 302,90 Kč	3 998 778,07 Kč	148 302,90 Kč	4,00%
Nové položky													
44	12373	ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1	M3	0,00	688,50	688,50	259,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	178 665,75 Kč	178 665,75 Kč	178 665,75 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	178 665,75 Kč	178 665,75 Kč	178 665,75 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						3 850 475,17 Kč	0,00 Kč	326 968,65 Kč	4 177 443,82 Kč	326 968,65 Kč	8,00%

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:


Datum:

Přehled nových položek


Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky, SMLO-287/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	1. část
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	688,500	259,50 Kč	178 665,75 Kč	Jednotková cena je převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě.

Za zhotovitele:
Podpis:



Za objednatele:
Podpis:





SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby VÝCHOD oblastní
závod Pardubice
Továrni 209
537 01 Chrudim
Mob: +420 601090551

E-mail: m.lukas@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

V Chrudimi, dne 5.10.2020

Vyjádření ke změně předmětu díla

**Stavba: Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky
SMLO-287/1073/200/20/2020**

Po provedení sanace zemní pláně dle PD v tl. 300 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm, byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa dle PD, protokol číslo 298/20/ZL ze dne 5.10.2020 a protokol číslo 332/20/ZL ze dne 26.10.2020

Na základě výsledku provedené zkoušky únosnosti zemní pláně byl stanoven AD a TDI další postup. Sanace pláně bude provedena v tl. 600 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm. Po provedené sanaci zemní pláně budou provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou.

Souhlasíme s výše uvedenou změnou.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

SWIETELSKY stavební s.r.o. zodpovědný projektant správce stavby

Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky

Vyjádření TDS k ZBV č. 01 (SO 101)

V rámci provádění stavebních prací na Stavbě byly zastiženy nepředvídané okolnosti, které spočívaly v nevyhovujících výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek (dále jen „SZZ“) po provedení sanace zemní pláně v tl. 300 mm dle předpokladu PDPS. Na základě této skutečnosti byla provedena rozšířená sanace zemní pláně v tl. 600 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm a provedeny opakované SZZ, jejichž výsledky potvrdily dostatečnou únosnost zemní pláně dle požadavku PDPS (45 MPa).

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 10.10.2020

[Redacted signature block]
bice (19)
3031

[Redacted line]

TDS

[Redacted signature]

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3587 Tři Buby - Řestoky - SMLO-287/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2. část	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 02
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.09.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 Dopravní stavby VÝCHOD

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po provedení sanace zemní pláně dle předpokladu PDPS v tl. 300 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm, byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa dle PDPS (viz protokol č. 298/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 332/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Na základě výsledku provedené zkoušky únosnosti zemní pláně byl stanoven AD a TDS další postup. Sanace pláně byla provedena v tl. 600 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm. Po provedené sanaci zemní pláně byly provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou, které dosáhly požadavku únosnosti zemní pláně dle PDPS (viz protokol č. 299/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 333/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	1 035 187,02 Kč	1 035 187,02 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno:	datum: 12. 11. 2020	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno:	datum: 12. 11. 2020	podpis:
Projektant	jméno:	datum: 12. 11. 2020	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s sou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno:	datum: 12. 11. 2020	podpis:
Zhotovitel	jméno:	datum: 12. 11. 2020	podpis:
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: SMLO-287/2020 - Oprava silnice III/3587 Tř Bubby - Řestoky								ZMĚNA SOUPISU PRÁČÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - 2. část								č.01					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - 2. část													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	5 622,93	7 802,73	2 179,80	83,00 Kč	466 702,78 Kč	0,00 Kč	180 923,40 Kč	647 626,18 Kč	180 923,40 Kč	38,80%
2	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRÁČÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,00	1,00	0,00	38 372,10 Kč	38 372,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 372,10 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	02730	POMOC PRÁČE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍŤÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	11 627,90 Kč	11 627,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 627,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	02852	PRŮZKUMNÉ PRÁČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	3,00	3,00	0,00	823,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	48,44	48,44	0,00	2 325,60 Kč	112 652,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	112 652,05 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODU V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	7 790,70 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	50,00	50,00	0,00	28,80 Kč	1 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	11241	UPRAVA STROMŮ D. DO 0,5M REZEM VĚTVÍ	KUS	30,00	30,00	0,00	6 101,80 Kč	183 054,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	183 054,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENĚHO	M3	3 274,43	3 274,43	0,00	73,10 Kč	239 360,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	239 360,47 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	10 913,00	10 913,00	0,00	4,80 Kč	52 382,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	52 382,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	18,15	18,15	0,00	1 545,80 Kč	28 056,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 056,27 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	30,00	30,00	0,00	83,70 Kč	2 511,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 511,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	4 697,00	4 697,00	0,00	111,90 Kč	525 594,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	525 594,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	21450	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	2 182,95	4 362,75	2 179,80	132,40 Kč	289 022,58 Kč	0,00 Kč	288 605,52 Kč	577 628,10 Kč	288 605,52 Kč	99,90%
19	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	7 276,50	7 276,50	0,00	2,70 Kč	19 646,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 646,55 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	2 348,50	2 348,50	0,00	35,50 Kč	83 371,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	83 371,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	21481C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	7 276,50	7 276,50	0,00	7,90 Kč	57 484,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 484,35 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 115,98	1 115,98	0,00	680,60 Kč	759 535,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	759 535,99 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	99,00	99,00	0,00	89,50 Kč	8 860,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 860,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUJ. ČEM A ASF. EM TL DO 150MM	M2	12 368,00	12 368,00	0,00	215,10 Kč	2 660 356,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 660 356,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	2 348,50	2 348,50	0,00	89,50 Kč	210 190,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	210 190,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12 368,00	12 368,00	0,00	14,00 Kč	173 152,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	173 152,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	11 301,00	11 301,00	0,00	9,30 Kč	105 099,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 099,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	10 913,00	10 913,00	0,00	179,40 Kč	1 957 792,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 957 792,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	403,00	403,00	0,00	224,50 Kč	90 473,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	90 473,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	11 503,00	11 503,00	0,00	248,90 Kč	2 863 096,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 863 096,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	120,00	120,00	0,00	377,90 Kč	45 348,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	45 348,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,00	2,00	0,00	8 683,70 Kč	17 367,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 367,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVĚ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	21,00	21,00	0,00	1 284,70 Kč	26 978,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	26 978,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	914261	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINIKOVĚ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,00	5,00	0,00	3 273,30 Kč	16 366,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 366,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABĚTON DOD A MONTÁŽ	KUS	15,00	15,00	0,00	2 031,40 Kč	30 471,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 471,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	605,81	605,81	0,00	122,10 Kč	73 969,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	73 969,77 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTĚM HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	605,81	605,81	0,00	337,20 Kč	204 280,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	204 280,14 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	91551	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,00	2,00	0,00	1 831,40 Kč	3 662,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 662,80 Kč	0,00 Kč	0,00%

39	931325	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	30,00	30,00	0,00	145,40 Kč	4 362,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 362,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								11 393 832,66 Kč	0,00 Kč	469 628,92 Kč	11 863 361,58 Kč	469 628,92 Kč	4,00%
Nové položky													
45	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	0,00	2 179,80	2 179,80	259,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	565 658,10 Kč	565 658,10 Kč	565 658,10 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	565 658,10 Kč	565 658,10 Kč	565 658,10 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								11 393 832,66 Kč	0,00 Kč	1 035 187,02 Kč	12 429 019,68 Kč	1 035 187,02 Kč	9,00%

Za Zhotovitele:


Datum:


12.11.2020

Za Objednatele:

Datum:

12.11.2020



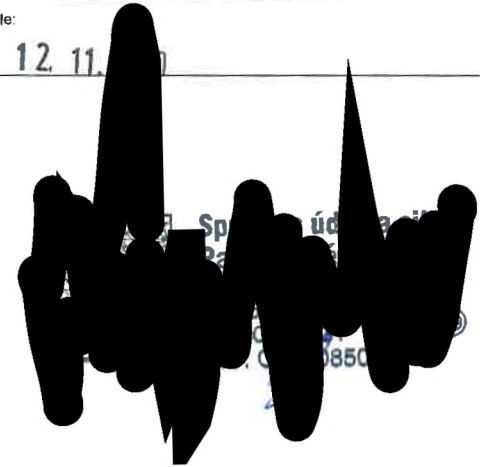


Přehled nových položek


Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava silnice III/3587 Tř. Bubny - Řestoky, SMLO-287/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	2. část
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 102/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	2 179,800	259,50 Kč	565 658,10 Kč	Jednotková cena je převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě.

Za zhotovitele:
Podpis:



Za objednatele:
Podpis:



Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky


Vyjádření TDS k ZBV č. 02 (SO 102)

V rámci provádění stavebních prací na Stavbě byly zastiženy nepředvídané okolnosti, které spočívaly v nevyhovujících výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek (dále jen „SZZ“) po provedení sanace zemní pláně v tl. 300 mm dle předpokladu PDPS. Na základě této skutečnosti byla provedena rozšířená sanace zemní pláně v tl. 600 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm a provedeny opakované SZZ, jejichž výsledky potvrdily dostatečnou únosnost zemní pláně dle požadavku PDPS (45 MPa).

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 10.10.2020


a silnic
TDS


§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky - SMLO-287/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 3. část	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 03
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.09.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 Dopravní stavby VÝCHOD

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po provedení sanace zemní pláně dle předpokladu PDPS v tl. 300 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm, byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa dle PDPS (viz protokol č. 298/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 332/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Na základě výsledku provedené zkoušky únosnosti zemní pláně byl stanoven AD a TDS další postup. Sanace pláně byla provedena v tl. 600 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm. Po provedené sanaci zemní pláně byly provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou, které dosáhly požadavku únosnosti zemní pláně dle PDPS (viz protokol č. 299/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 333/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	782 160,30 Kč	782 160,30 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno:	datum: 12. 11. 2020	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno:	datum: 12. 11. 2020	podpis:
Projektant	jméno: nýš	datum: 12. 11. 2020	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno:	datum: 12. 11. 2020	podpis:
Zhotovitel	jméno: ek	datum: 12. 11. 2020	podpis:
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název stavby: SMLO-287/2020 - Oprava silnice III/3587 Tř. Bubny - Restokly								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 103 - 3. část								E.01					
Číslo a název rozpočtu: SO 103 - 3. část													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD)	M3	4 690,33	5 337,33	1 647,00	83,00 Kč	389 296,98 Kč	0,00 Kč	136 701,00 Kč	525 997,98 Kč	136 701,00 Kč	35,10%
2	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	1,00	0,00	41 860,50 Kč	41 860,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 860,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	11 627,90 Kč	11 627,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 627,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	02852	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	3,00	3,00	0,00	823,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	45,56	45,56	0,00	2 325,60 Kč	105 954,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 954,34 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	02944	ČSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PŘEVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	02946	ČSTAT. POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZŘÍZENÍ, PŘEVOD, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	7 790,70 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO	M3	2 469,83	2 469,83	0,00	73,10 Kč	180 544,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	180 544,21 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	10 306,00	10 306,00	0,00	4,80 Kč	49 468,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	49 468,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	11372C	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PĚŠ. ROZPADŮ PŘES 2000 M2	M3	128,40	128,40	0,00	656,20 Kč	84 256,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	84 256,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	113765	FREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	90,00	90,00	0,00	83,70 Kč	7 533,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 533,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	4 371,00	4 371,00	0,00	111,90 Kč	489 114,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	489 114,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1 946,55	3 293,55	1 647,00	132,40 Kč	218 003,22 Kč	0,00 Kč	218 062,80 Kč	436 066,02 Kč	218 062,80 Kč	100,00%
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 488,50	5 488,50	0,00	2,70 Kč	14 818,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 818,95 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	18243	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	2 185,50	2 185,50	0,00	35,50 Kč	77 585,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	77 585,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	5 488,50	5 488,50	0,00	7,90 Kč	43 359,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 359,15 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	886,72	886,72	0,00	680,60 Kč	603 501,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	603 501,63 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	66,00	66,00	0,00	89,50 Kč	5 907,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 907,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	567534	VRST. PRO OBNOVU A OPR. RECY. ZA STUJ. CEM. A ASF. EM. TL DO 150MM	M2	11 672,00	11 672,00	0,00	215,10 Kč	2 510 647,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 510 647,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	2 185,50	2 185,50	0,00	89,50 Kč	195 602,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	195 602,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	572123	IN-FILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMUL. ZE DO 1,0KG/M2	M2	11 672,00	11 672,00	0,00	14,00 Kč	163 408,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	163 408,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	10 670,00	10 670,00	0,00	9,30 Kč	99 231,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	99 231,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	10 306,00	10 306,00	0,00	179,40 Kč	1 848 896,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 848 896,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	533,00	533,00	0,00	224,50 Kč	119 658,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 658,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM	M2	10 937,00	10 937,00	0,00	248,90 Kč	2 722 219,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 722 219,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,00	6,00	0,00	10 465,10 Kč	62 790,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	62 790,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	6,00	6,00	0,00	523,30 Kč	3 139,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 139,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	9122B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLÁST. HMŮT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	112,00	112,00	0,00	377,90 Kč	42 324,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 324,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,00	2,00	0,00	8 683,70 Kč	17 367,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 367,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,00	16,00	0,00	1 285,20 Kč	20 563,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 563,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	914261	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	1,00	0,00	3 273,30 Kč	3 273,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 273,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK. TRUBEK ZABETON. DOD. A MONTÁŽ	KUS	14,00	14,00	0,00	2 031,40 Kč	28 439,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 439,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	579,75	579,75	0,00	122,10 Kč	70 787,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 787,48 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	567,31	567,31	0,00	337,20 Kč	191 297,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	191 297,94 Kč	0,00 Kč	0,00%

40	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	90,00	90,00	0,00	145,40 Kč	13 086,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 086,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
41	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	60,00	60,00	0,00	334,10 Kč	20 046,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 046,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
42	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR I	M3	35,00	1 682,00	1 647,00	259,50 Kč	9 082,50 Kč	0,00 Kč	427 396,50 Kč	436 479,00 Kč	427 396,50 Kč	4705,70%
43	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	120,00	120,00	0,00	28,80 Kč	3 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								10 499 339,28 Kč	0,00 Kč	782 160,30 Kč	11 281 499,58 Kč	782 160,30 Kč	7,00%

Za Zhotovitele:

Datum:

12. 11. 2020

Za Objednatele:

Datum:

12. 11. 2020





PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:		Úprava sídla BVOŠK Tř. Bábiny - Rostkov - BML0-2872020	
1	Příjma snížení částka bez rezervy a DPH	25 888 835,61 Kč	0=30=34
2=1+10=20	Aktuální stav částka (suma stavby)	28 830 251,58 Kč	7=20(1)=34
3=(21)+100	Procenta změny Příjma snížení částka	708,29%	8=1*(1)=3
4=(747)+100	Skutková výkonnostná sazba daň § 33a ZZZ	0,00%	
5=(387)+100	Skutková výkonnostná sazba daň § 33a ZZZ	0,00%	
15 % z Příjma snížení částka		3 882 900,34 Kč	

Bursa Změn bodných a Změn záporných daň § 222 odst. (1) a (4) ZZZ	2 144 315,87 Kč	0=30=34
Skutková sazba 30 % - sazba daň § 33a ZZZ	8,20%	8=1*(1)=3
Základní sazba 30 % pro Změny daň § 222 odst. (1) a (4) ZZZ	7 700 180,00 Kč	11=1*(1)=0

Skutková sazba 30 % pro Změny neprovozní práce daň § 222 odst. (4) ZZZ (ABS)	0,00%	10=2(20)=100
Skutková sazba 30 % pro Změny neprovozní práce daň § 222 odst. (4) ZZZ (ABS)	8,20%	11=1*(1)=0
Základní sazba 30 % pro Změny daň § 222 odst. (1) a (4) ZZZ	12 042 967,81 Kč	

Skutková sazba 30 % pro Změny daň § 222 odst. (4) ZZZ	0,00%	10=2(20)=100
Skutková sazba 30 % pro Změny neprovozní práce daň § 222 odst. (4) ZZZ (ABS)	0,00%	11=1*(1)=0
Základní sazba 30 % pro Změny daň § 222 odst. (1) a (4) ZZZ	0,00%	12=1*(1)=0

BO	ZPV L	Měry BOFS /přehled Zpomy	Změny stavby (stavby se zrušením stavby)	Stavby Stavby	Náklady ZPV	Výsledná sazba daň § 33a ZZZ (BVOŠK)			Změny daň § 222 odst. (4) ZZZ			Skutková sazba daň § 222 odst. (4) ZZZ			Změny neprovozní práce daň § 222 odst. (4) ZZZ			Změny výkonnostní sazba daň § 33a ZZZ		
						Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	Sazba	
BO 101	1	1. část / Stavba plán	0,00 Kč	0,00 Kč	2 144 315,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
BO 102	2	2. část / Stavba plán	0,00 Kč	0,00 Kč	2 144 315,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
BO 103	3	3. část / Stavba plán	0,00 Kč	0,00 Kč	2 144 315,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zodpovídá otázce k datu předložení. Evidenční číslo stavby vyžaduje změny. Evidenční číslo stavby kompenzačních nároků či Změnového listu se schválnosti.

Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky


Vyjádření TDS k ZBV č. 03 (SO 103)

V rámci provádění stavebních prací na Stavbě byly zastiženy nepředvídané okolnosti, které spočívaly v nevyhovujících výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek (dále jen „SZZ“) po provedení sanace zemní pláně v tl. 300 mm dle předpokladu PDPS. Na základě této skutečnosti byla provedena rozšířená sanace zemní pláně v tl. 600 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm a provedeny opakované SZZ, jejichž výsledky potvrdily dostatečnou únosnost zemní pláně dle požadavku PDPS (45 MPa).

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 10.10.2020

A large black rectangular redaction box covering a signature and possibly a stamp.A smaller black rectangular redaction box covering a signature.

.....

