

## **Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4526/2019

ISPROFIN: 5613520022

a

#### **SEŽEV facility s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 68071

bank. spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019-140-570-19035

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč“, která nabyla účinnosti dne 16.12.2019

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě probíhajících změnových řízení dle čl. 17 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“) a to na základě změnového listu stavby č. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 dohodly na ukončení změnových řízení v termínu do 30.4.2021, vzhledem k jejich administrativní náročnosti. Následně po provedení řádných změnových řízení bude uzavřen dodatek č. 4, kterým bude změněn předmět plnění Díla, a to v souladu se shora uvedenými změnovými listy.
- 1.2 Současně s výše uvedeným smluvní strany odůvodňují délku prodloužení termínu plnění i důsledkem vyšší moci, a to pandemie virové choroby COVID – 19, kdy došlo k prodloužení dodávek materiálu zhotovitele, omezení činnosti poddodavatelů a omezení pracovních kapacit na dané stavbě. Tyto skutečnosti zapříčinily taktéž prodloužení termínu plnění Díla.
- 1.3 S ohledem na probíhající změnová řízení a dopady pandemie virové choroby COVID – 19 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 30. 4. 2021.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.6 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

*Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací:** dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

**Stavební práce budou dokončeny do 30. 4. 2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 18 měsíců ode dne zahájení stavebních prací.*

*Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.*

### b. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku ukončení změnového řízení ve shora uvedeném termínu, stejně tak jako v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.5 Součástí dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Olomouci dne 23.11.2020

V Brně dne

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic,  
státní organizace


.....  
**Mgr. Milan Janoušek**  
jednatel společnosti  
SEŽEV facility s.r.o.

**Příloha č. 1**

**Harmonogram postupu prací**

změna dle dodatku č. 3

Harmonogram: Třebíč rekonstrukce výpravní budovy

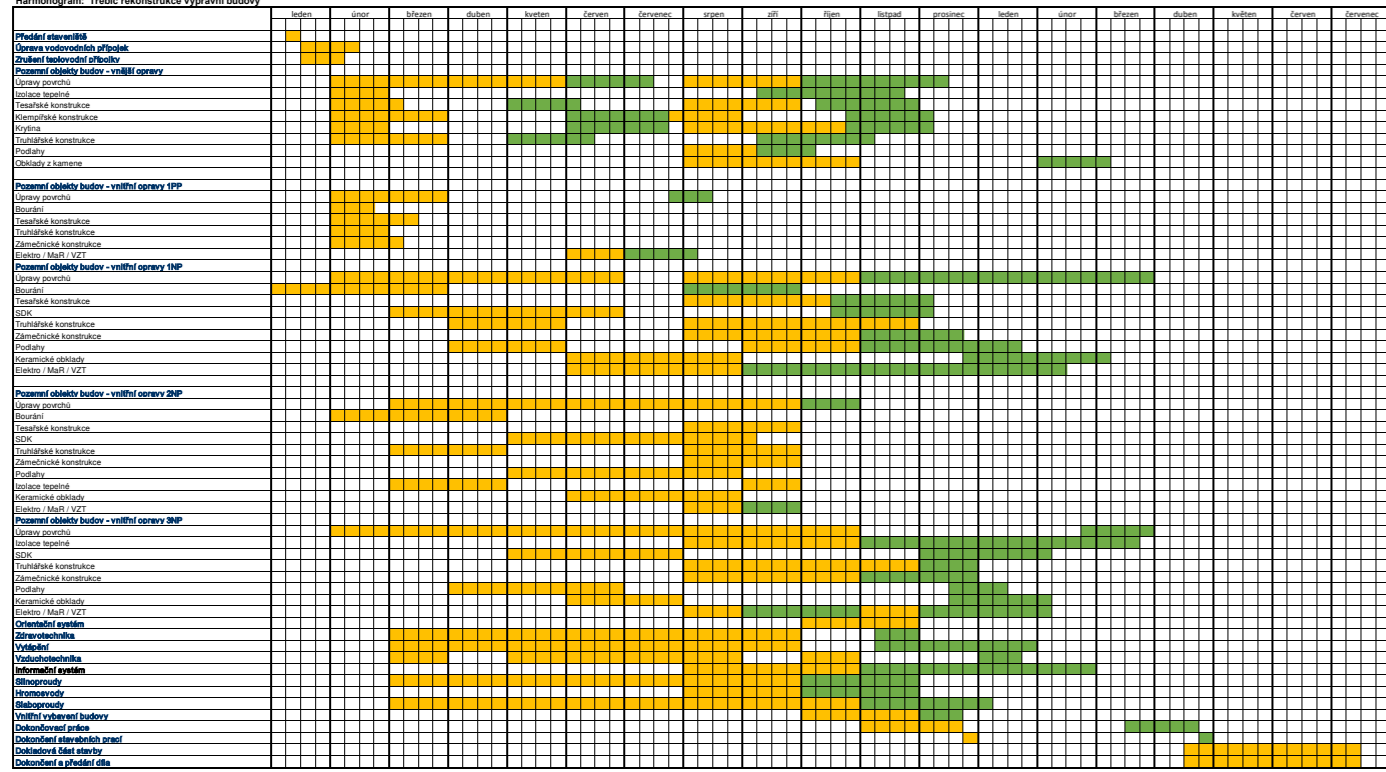

■ Průběh stavebních prací dle původního harmonogramu  
■ Prodloužení stavebních prací

zří  
 listopad  
 listopad  
 prosinec  
 leden  
 únor  
 únor  
 březen  
 duben  
 duben

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1247424

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7a20605d-0767-4947-891e-f38864305af1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.12.2020 15:29:01



32e2929d-cc4f-4dda-aca-45f62d55009c
