



DODATEK č. 13

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: E618-S-5975/2017/Pal

a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

Společník 1 nebo Správce:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: ██████████

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník 2:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. 1/20132
zastoupena: Ing. Pavlem Brůzkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
Korespondenční adresa: **Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice**
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: **N17-023-0173**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 13 je úprava HMĚ postupu prací a dokončení Díla. Termín dokončení stavebních prací se nemění, prodlužuje se pouze celková lhůta pro provedení díla, a to o 4 měsíce.

Termín pro provedení díla se prodlužuje z důvodu vypořádání změnových listů stavby. Zhotovitel uvádí, že u části předaných objektů byly na základě pokynu objednatele provedeny a předány práce, které doposud nebyly administrovány v rámci změnových řízení. Jelikož administrace změnových listů není stavební činností, řízení se provádí až po ukončení a předání prací, nad rámec Smlouvy, požadovaných objednatelem. Celková lhůta pro provedení prací se dále prodlužuje u SO 98-98 -02 – Publicita, a to z důvodu toho, že za současné situace v době nouzového stavu není možné uspořádat slavnostní ukončení stavby, Tiskovou konferenci a jiné náležitosti, vyžadované Smlouvou.

V souvislosti s výše uvedeným se nemění termín dokončení stavebních prací. Termín pro dokončení Díla se posouvá se u SO 98-98-02 a dále u SO dotčených změnovým řízením z 30.11.2020 do 31.03.2021, u ostatních SO se termín nemění, zůstává v platnosti termín 30.11.2020.

Po ukončení změnových řízení dojde k navýšení Ceny Díla a budou administrovány příslušné dodatky. Fakturace prací Zhotovitelem bude provedena po ukončení příslušného změnového řízení a podpisu příslušného dodatku.

Zhotovitel dále prohlašuje, že z výše uvedených důvodů prodloužení termínu pro dokončení Díla nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy. Příloha č. 4 obsahuje harmonogram postupu prací platný ke dni podpisu dodatku č. 13.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 12, takto:

Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

1) 16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 12*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 13*
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby



2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 8 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 13, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhoř.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 13, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 13 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 13 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 13 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 13 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4) Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 13

V Praze dne 30 - 11 - 2020

V Praze dne 30 - 11 - 2020

Objednatel č. 1:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti

V Plzni dne 30 - 11 - 2020


Objednatel č. 2:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

.....
Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu:
Dopravní stavby ZÁPAD

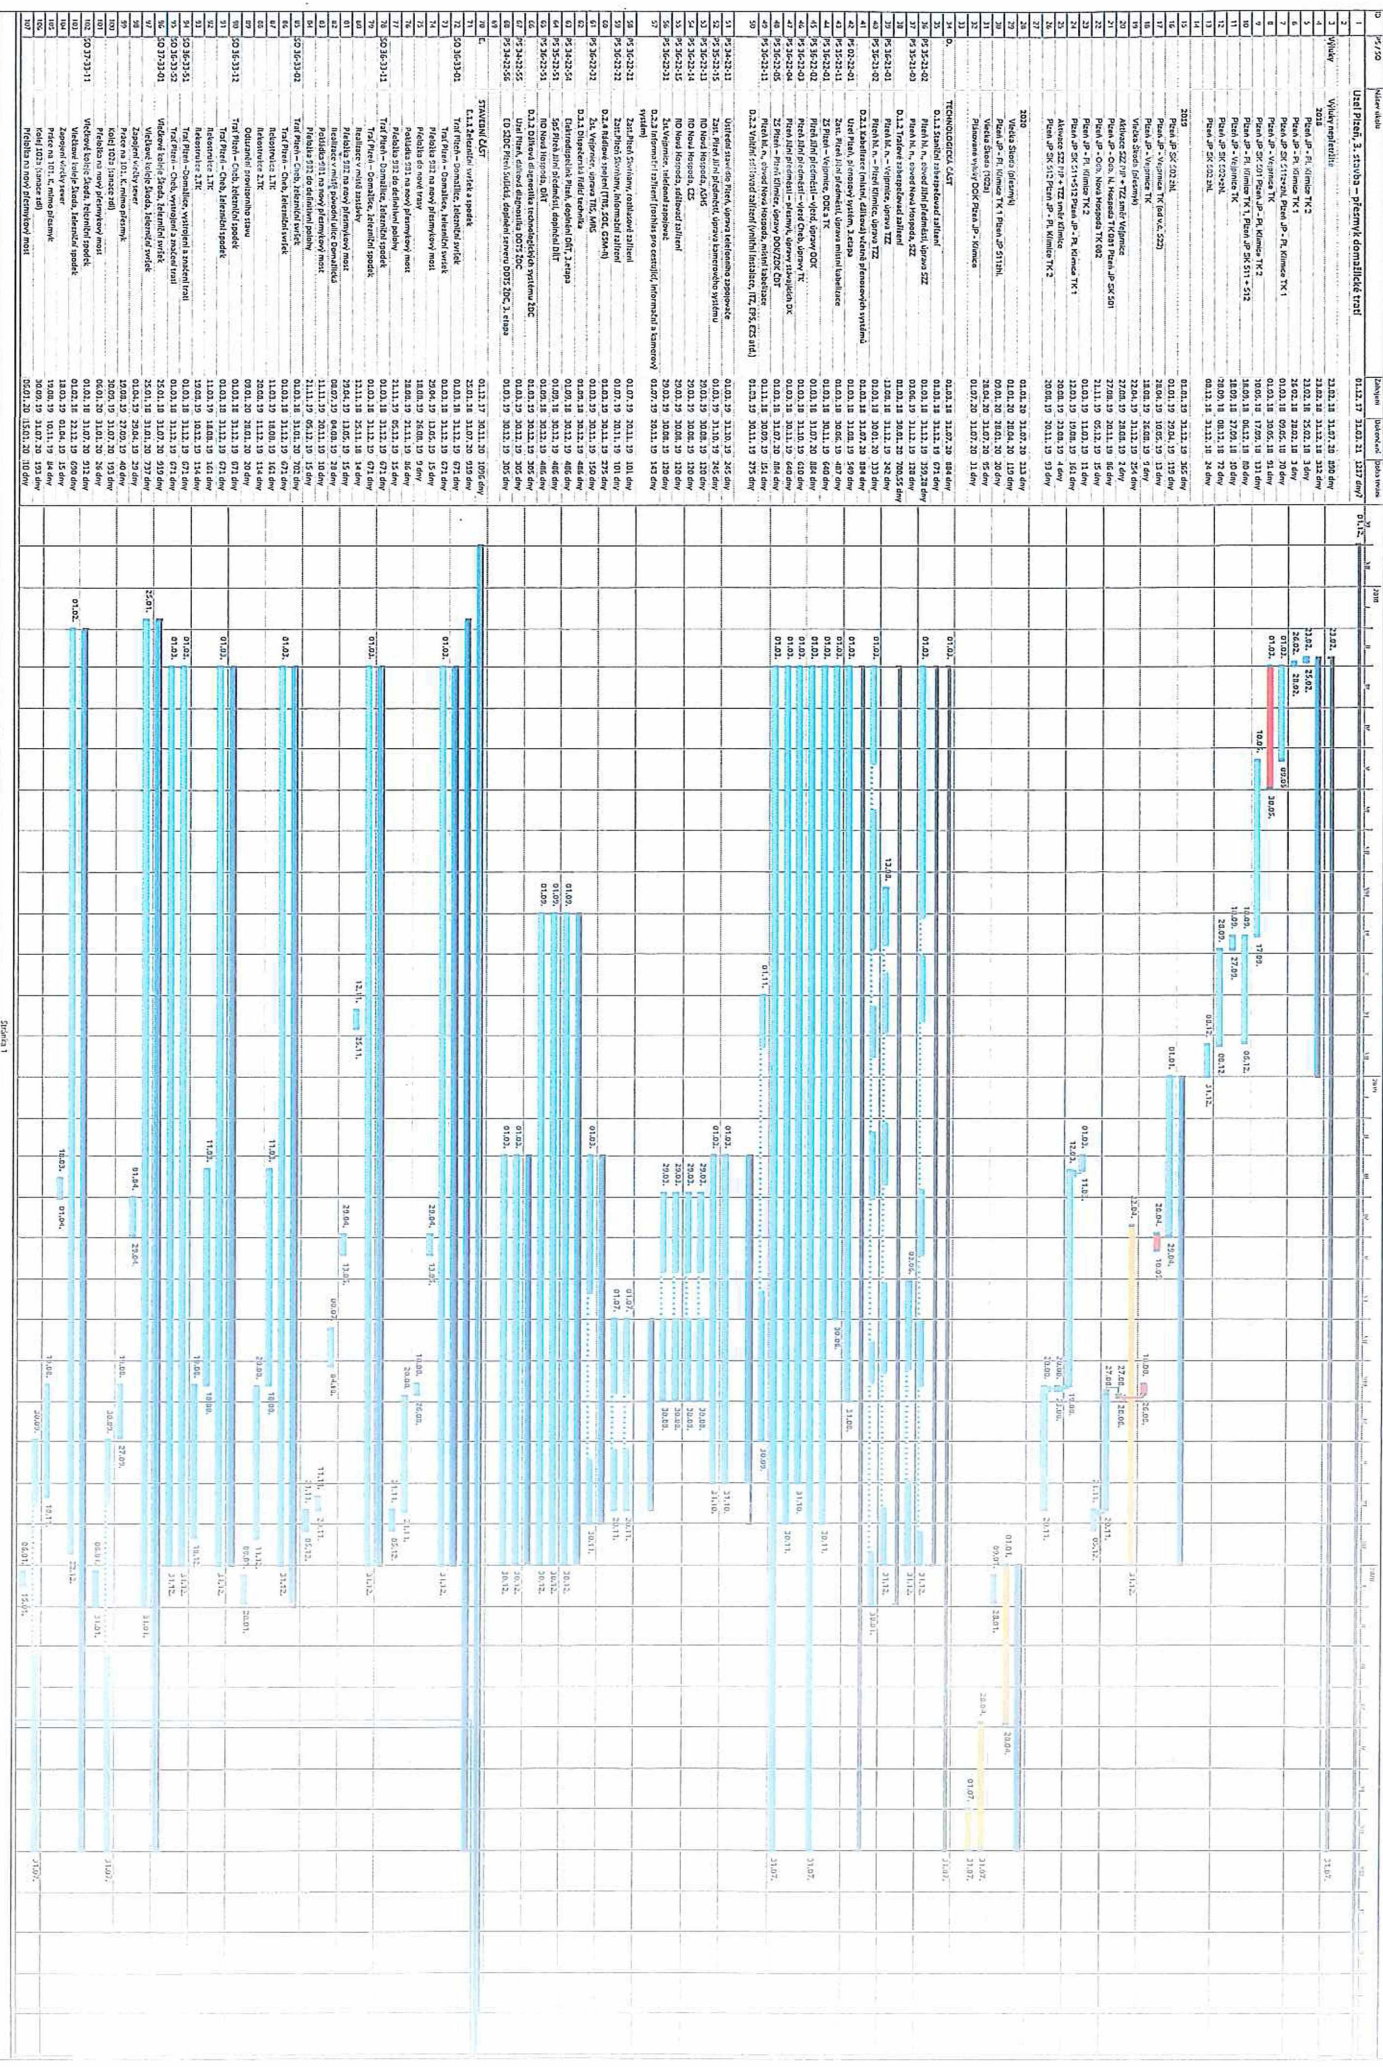

Stručná 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1259607

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9004a5da-cb51-44b1-b522-0bec5a4e4aa2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 15:31:03



b3b32a57-b0a1-4c10-b15e-2b7622bbd8b7
