

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0217A20

## 1 SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice  
Sídlo: náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
IČ: 00289931  
DIČ: CZ00289931  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města  
Tel.: [REDAKCE]  
E-m [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí OSRI  
Tel.: [REDAKCE]  
E-m [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** PORR a. s.  
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006,  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE] ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci a [REDAKCE] vedoucí provozu Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozu, stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr v oboru DS, tel. [REDAKCE] a [REDAKCE] asistent stavbyvedoucího, tel.: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

## 2 PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavci 7.4, 7.5, 7.6 a 24.1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0217A20 ze dne 17. 4. 2020 na stavbu „Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova“ (dále jen SoD) na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se SoD mění dle článku 3 tohoto Dodatku č. 1.

## 3 ZMĚNY SMLOUVY

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba

vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán změnovými listy č. 1 až 7 s technickým popisem předmětu změn a s rozpočty a tyto jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

*Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 7.1 článku 7 SoD Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny ruší a nahrazuje se textem novým:*

#### 7.1 Výše sjednané ceny

7.1.1 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena díla dle SoD bez DPH	9 923 066,22 Kč
<b>Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1</b>	<b>832 365,61 Kč</b>
<b>Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 1</b>	<b>- 222 005,51 Kč</b>
<b>Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>10 533 426,32 Kč</b>
Výše DPH 21%	2 212 019,53 Kč
<b>Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>12 745 445,85 Kč</b>

Cena včetně DPH slovy dvanáctmilionůsedmsetčtyřicetpěttisícčtyřistačtyřicetpět a 85/100 korun českých.

7.1.2 Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4, zákona č.. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## **4 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1 a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek č. 1 do 3 (tří) měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

---

Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0217A20 ze dne 17. 4. 2020 nedotčené  
Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz  
svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni  
ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-61/2020/17 dne  
23. 11. 2020.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 7 vč. rozpočtů

V Moravských Budějovicích dne

V Brně dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



Ing. Vlastimil Bařinka  
starosta

ředitel úseku

vedoucí provozu Brno

## Změnový list č. 1

### **Stavba: Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova**

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č. 1	Cena celkem SoD + ZL č. 1
SO 201 Most	9 923 066,22	328 611,22	- 32 935,11	10 218 742,33
<b>Celkem</b>	<b>9 923 066,22</b>	<b>328 611,22</b>	<b>- 32 935,11</b>	<b>10 218 742,33</b>

#### **Technický popis předmětu změny:**

Předmětem změny je jiná konstrukce římsy na SO 201 Most. Bude dodržena konstrukce žulových mostních obrubníků položených do drenážního plábetonu. Toto řešení je v projektové dokumentaci PDPS, položky v rozpočtu však počítaly s klasickým řešením monolitické římsy. Bylo tedy nutné nově vzniklé položky docenit.

Za technický dozor:


Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

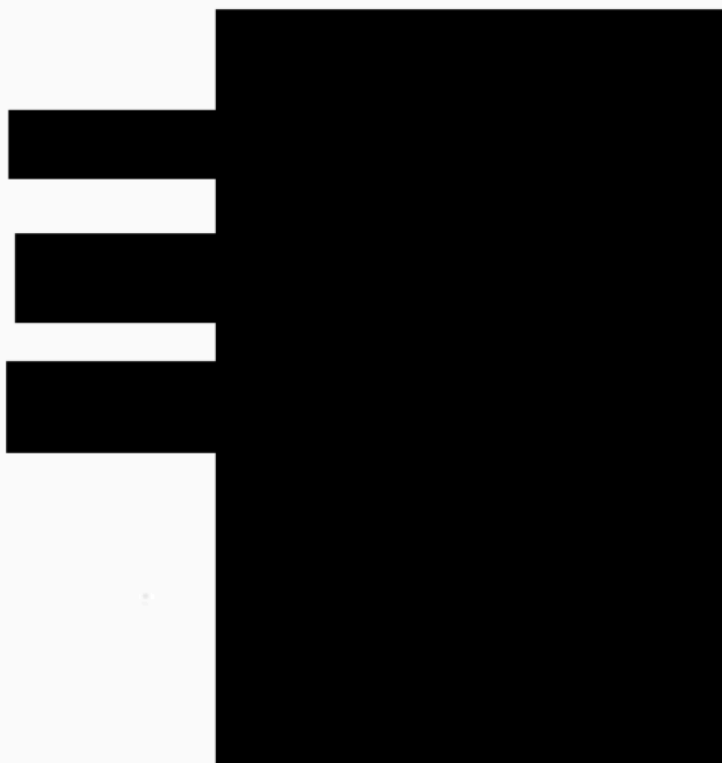

### Změnový rozpočet 1 - kamenné obruby

S:	2211201705	REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVA		
	SO 201	MOST	méněpráce	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	----------	--------	----------	--------

Díl:	STÁVAJÍCÍ POLOŽKY	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
13	21341 OA0 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	m3	0,60000	103 750,00	62 250,00		0,00	0,70500	73 143,75
18	285393OA0 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	204,00000	584,00	119 136,00		0,00	140,00000	81 760,00
20	317325 OA0 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	43,73852	15 562,00	680 658,85	2,11638	32 935,11		
	0,15*0,20*(35,319+35,227) - objem žulových obrub								
53	93131 OA0 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU	m3	0,05961	155 624,00	9 276,75		0,00	0,10600	16 496,14
Díl:	NOVÉ POLOŽKY	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
	622300172.RT2 Těsnění napojovacích spár tmelem, včetně dodávky tmelu Ceresit FT 101	m		88,70	0,00		0,00	70,54600	6 257,43
	spára římsa x obrubník								
	917411111.R00 Osaz. stoj. obrub kam. bez opěry, lože kam. těžené	m		144,50	0,00		0,00	70,54600	10 193,90
	R1 Obrubník 15/20 cm přímý se zkosením, vč. dopravy	m		1 955,00	0,00		0,00	72,00000	140 760,00


RTS 20/1

RTS 20/1


individuální

<b>Celkem</b>	<b>871 321,60</b>	<b>32 935,11</b>	<b>328 611,22</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------------

Zhotovitel:



Objednatel:

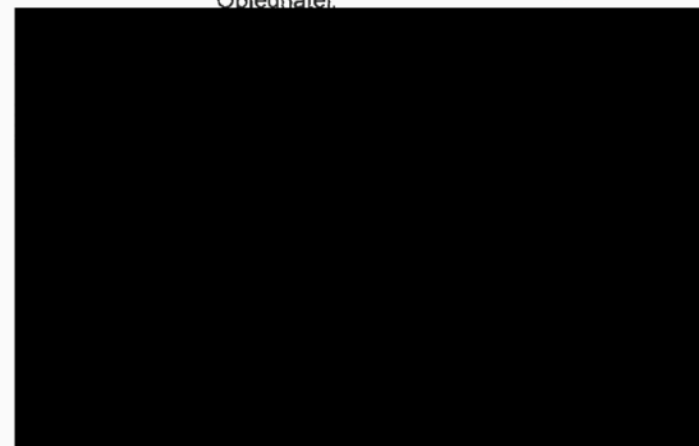

## Změnový list č. 2

### **Stavba: Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova**

Objekt	Cena dle SoD a ZL č. 1	Vícepráce dle ZL č. 2	Méněpráce dle ZL č. 2	Cena celkem SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2
SO 201 Most	10 218 742,33	177 590,08	0,00	10 396 332,41
<b>Celkem</b>	<b>10 218 742,33</b>	<b>177 590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10 396 332,41</b>

### **Technický popis předmětu změny:**

Předmětem změny je jiný typ a kubatura betonu spádové vrstvy. Kubatura odpovídá geodetickému zaměření, jež je přílohou tohoto změnového listu.

Za technický dozor:


Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:


Datum:




### Změnový rozpočet 2 - spádová vrstva

S:	2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVA									
	SO 201 MOST					méněpráce		vícepráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
27	457324	OA0		29,11103	6 484,00	188 755,92			27,39	177 590,08
		(B25)	m3							
<b>Celkem</b>						<b>188 755,92</b>		<b>0,00</b>		<b>177 590,08</b>

Zhotovitel:



Objednatel:

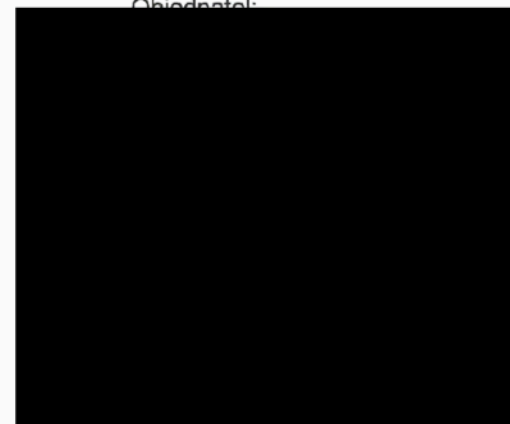

### Změnový list č. 3

**Stavba:****Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova**

Objekt	Cena dle SoD a ZL č. 1 a ZL č. 2	Vícepráce dle ZL č. 3	Méněpráce dle ZL č. 3	Cena celkem SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2 + ZL č. 3
SO 201 Most	10 396 332,41	80 000,00	0,00	10 476 332,41
Celkem	10 396 332,41	80 000,00	0,00	10 476 332,41

**Technický popis předmětu změny:**

Předmětem změny je odfrézování a nové položení ohrubné vrstvy stávající vozovky v místě napojení na opravovaný úsek z důvodu zvlněné stávající komunikace.

Za technický dozor:


Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:







### Změnový rozpočet 3 - napojení komunikace

S:	2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVA									
	SO 201 MOST						méněpráce		vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>STÁVAJÍCÍ POLOŽKY</b>									
4	11372	OA0		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	m3	47,00875	1 556,00	73 145,62		
								0,00	5,00000	7 780,00
36	572213	OA0		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	432,05100	14,00	6 048,71		
								0,00	100,00000	1 400,00
38	574A44	OA0		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM	m2	432,05100	324,00	139 984,52		
								0,00	100,00000	32 400,00
42	58910	OA0		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	350,00000	156,00	54 600,00		
								0,00	50,00000	7 800,00
66	014111	OA0		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	m3	263,27643	280,00	73 717,40		
								0,00	1,67600	469,28
<b>Díl:</b>	<b>NOVÉ POLOŽKY</b>									
	113203111			Vytrhání obrub z dlažebních kostek 2*9,55=19,1	m		96,00	0,00		
								0,00	19,10000	1 833,60
	917461111			Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m		277,50	0,00		
								0,00	13,00000	3 607,50
	917862111			Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m		292,50	0,00		
								0,00	9,55000	2 793,38
	59217460			Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus		117,00	0,00		
								0,00	10,00000	1 170,00
	917931112			Osazení přídlažby, kostka velká, 2 řady, lože C12/15	m		322,50	0,00		
								0,00	9,55000	3 079,88
	998225111			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t		60,90	0,00		
								0,00	6,23000	379,41
	002			Ostatní technologická doprava - přesun frézy	Kč		17 286,95	0,00		
								0,00	1,00000	17 286,95
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>		<b>80 000,00</b>

Zhotovitel:



Objednatel:

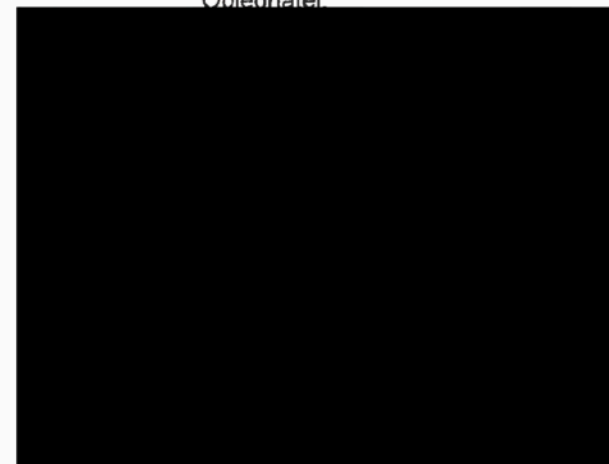

## Změnový list č. 4

### **Stavba: Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova**

Objekt	Cena dle SoD a ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3	Vícepráce dle ZL č. 4	Méněpráce dle ZL č. 4	Cena celkem SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2 + ZL č. 3 + ZL č. 4
SO 201 Most	10 476 332,41	64 250,00	0,00	10 540 582,41
<b>Celkem</b>	<b>10 476 332,41</b>	<b>64 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 540 582,41</b>

### **Technický popis předmětu změny:**

Předmětem změny je provedení většího rozsahu sanací na spodním lici nosné konstrukce. V tomto místě měly být prováděny pouze sjednocující a protikouřové nátěry. Po zjištění skutečného stavu ale bylo po dohodě s objednatelem nutno přistoupit k pasivaci otryskané výztuže a jemné reprofilaci.

Za technický dozor:


Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:




### Změnový rozpočet 4 - sanace spodního líce NK

S:	2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVA										
	SO 201 MOST					méněpráce		vícepráce			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	
<b>Díl: OVN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>									
43	626112	OA0		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	m2	9,60760	2 594,00	24 922,11	0,00	20,00000	51 880,00
		<b>Nové položky</b>									
	632479521			Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP	m2		534,00	0,00	0,00	20,00000	10 680,00
	938907010			Očištění výztuže prům.do 10 mm,ocel.kartáčem,ručně	m		38,60	0,00	0,00	20,00000	772,00
	622474001			Antikorozi ochranný nátěr ocelové výztuže	m		45,90	0,00	0,00	20,00000	918,00
<b>Celkem</b>							<b>24 922,11</b>	<b>0,00</b>	<b>64 250,00</b>		

Zhotovitel:



Objednatel:

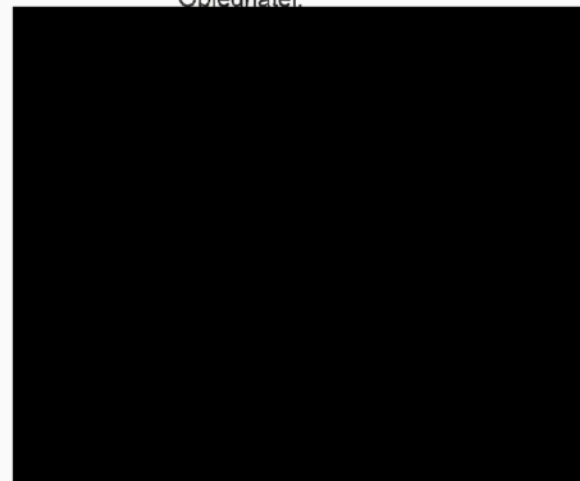

## Změnový list č. 5

### **Stavba: Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova**

Objekt	Cena dle SoD a ZL č. 1,2,3,4	Vícepráce dle ZL č. 5	Méněpráce dle ZL č. 5	Cena celkem SoD + ZL č. 1,2,3,4,5
SO 201 Most	10 540 582,41	123 935,77	0,00	10 664 518,18
Celkem	10 540 582,41	123 935,77	0,00	10 664 518,18

### **Technický popis předmětu změny:**

Předmětem změny je prodloužení mostního závěru. V zadávací dokumentaci je uvažováno s mostním závěrem pouze pod konstrukcí vozovky. Je ale nutné jej provést i pod římsami.

Za technický dozor:


Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:


Datum:




### Změnový rozpočet 5 - mostní závěr

S:	2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVA									
SO 201 MOST						méněpráce	vícepráce			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
<b>Díl: OVN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>								
54.93140	OA0	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	m	20,70000	15 562,00	322 133,40			7,96400	123 935,76800
<b>Celkem</b>						<b>322 133,40</b>	<b>0,00</b>		<b>123 935,77</b>	

Zhotovitel:



Obídnatel:

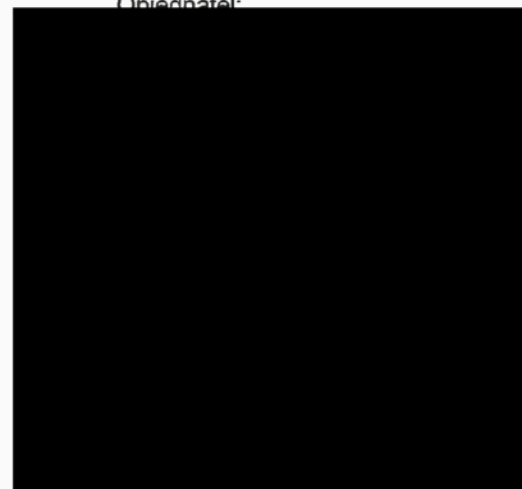

## Změnový list č. 6

**Stavba:**  
**Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova**

Objekt	Cena dle SoD a ZL č. 1,2,3,4,5	Vícepráce dle ZL č. 6	Méněpráce dle ZL č. 6	Cena celkem SoD + ZL č. 1,2,3,4,5,6
SO 201 Most	10 664 518,18	0,00	- 129 688,00	10 534 830,18
<b>Celkem</b>	<b>10 664 518,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 129 688,00</b>	<b>10 534 830,18</b>

### **Technický popis předmětu změny:**

Předmětem změny vypuštění konstrukce monolitických šachet za římsami. Správci sítí šachty nepožadují.

Za technický dozor:


Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:


Datum:




### Změnový rozpočet 6 - manipulační šachty

S: 2211201705		REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVA								
		SO 201 MOST						méněpráce	vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>								
46	893112 OAD	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2	kus	4,00000	32 422,00	129 688,00	4,00000	129 688,00		
<b>Celkem</b>						<b>129 688,00</b>		<b>129 688,00</b>		<b>0,00</b>

Zhotovitel:



Objednatel:



## Změnový list č. 7

### **Stavba: Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova**

Objekt	Cena dle SoD a ZL č. 1,2,3,4,5,6	Vícepráce dle ZL č. 7	Méněpráce dle ZL č. 7	Cena celkem SoD + ZL č. 1,2,3,4,5,6,7
SO 201 Most	10 534 830,18	57 978,54	- 59 382,40	10 533 426,32
Celkem	10 534 830,18	57 978,54	- 59 382,40	10 533 426,32

### **Technický popis předmětu změny:**

Předmětem změny je změna konstrukce příkopových žlabů pod mostem vedle drážního tělesa. V místech, kde byl nalezen stávající kamenný žlab bude tento pročištěn a opraven. Nový betonový žlab bude položen pouze v místech, kde se stávající kamenný nenachází. Uvedená změna byla požadována správou železnic a odsouhlasena projektantem, viz. zázpis ve stavebním deníku.

Za technický dozor:


Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:






**Změnový rozpočet 7 - žlaby pod mostem**

S: 2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVA										
SO 201 MOST						méněpráce		vícepráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>								
55	935222	OA0 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 900MM DO BET TL 100MM	m	90,00000	1 232,00	110 880,00	48,20000	59 382,40		
<b>Díl: OVN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>								
67	014121	OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	m3	225,63300	280,00	63 177,24			17,64000	4 939,20
<b>Díl:</b>		<b>NOVÉ POLOŽKY</b>								
	938902206	Čištění příkopů zpev.š.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m	m		496,50	0,00			41,80000	20 753,70
	161101104	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m	m3		602,00	0,00			17,64000	10 619,28
	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		265,00	0,00			17,64000	4 674,60
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		267,00	0,00			17,64000	4 709,88
	289901211	Vyčištění trhlin skal. stěny do 5 cm hl. do 15 cm	m		104,50	0,00			41,80000	4 368,10
	289471211	Sanace trhlin skal hl.spárováním š.5 cm, hl.15 cm	m		182,00	0,00			41,80000	7 607,60
	998212111	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	t		405,00	0,00			0,75600	306,18
<b>Celkem</b>							<b>59 382,40</b>		<b>57 978,54</b>	

Zhotovitel:



Objednatel:
