



DY90P000CE2R

Č.j. VPŠA-1559/EU-2020/OVZI

Identifikátor VZ: PZ
NEN Rekonstrukce
spodní tělocvičny(stavba)
- 1.část
N006/20/V00008891
Č.j.VPŠA-403/EU-2020/OVZI



Počet stran: 3

Příloha: 1/5

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na provedení rekonstrukce spodní tělocvičny (stavba)

č.j. VPŠA-735/EU-2020/OVZI, ze dne 10.07.2020

uzavřená v souladu s §§ 1721, 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčanZ“)

Článek I. Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“), se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně fakturační a doručovací adresou), zastoupená **plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou**, ředitelem školy, oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu tohoto dodatku;
IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrgbn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku


Bankovní spojení:



Kontaktní osoby a údaje:



a

ROYAL DIAMOND – stavební společnost, s.r.o., se sídlem U Hřiště 577, 267 24 Hostomice (je současně fakturační a doručovací adresou), jejímž jménem jedná **Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti**, oprávněný samostatně dle obchodního rejstříku ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;
IČ:471 22 439, DIČ: CZ471 22 439, ID datové schránky: zysx97h
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

Bankovní spojení:



Kontaktní osoba a údaje:



(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedenými smluvními stranami byl dnešního dne, měsíce a roku,

u z a v ř e n


tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na provedení stavby – rekonstrukci spodní tělocvičny – 1. část v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele (dále jen „dodatek č. 1“).

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce ve smyslu § 27, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatek č. 1 je zpracován v souladu se ZZVZ tak, aby nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy, za dodržení § 6 ZZVZ, přičemž na vlastní provedení tohoto zadávacího řízení se dle § 31 ZZVZ ostatní ustanovení ZZVZ neaplikují.

Článek II.

Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.j. VPŠA-735/EU-2020/OVZI je plnění, které se ukázalo nutné pro řádné dokončení zakázky a o kterém nemohl objednatel ani zhotovitel při stanovení původního rozsahu prací a původní ceny vědět. Jde o provedení dalších nezbytných prací, které nepředpokládal projekt a původní zadání (výkaz výměr). **Rozsah nutných víceprací je přiložen v příloze k tomuto dodatku č. 1 (viz připojená a OPF MV ČR zaslaná Příloha č. 2 k č.j.VPŠA-1473/EU-2020/OVZI).** Objednatel se zavázal, že za tyto vícepráce, které budou provedeny se souhlasem objednatele, po odsouhlasení OPF MV ČR, uhradí níže uvedenou navýšenou cenu a mezi smluvními stranami bude uzavřen tento dodatek č. 1. **Termín dokončení díla podle původní smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.**
- 2.2. Rozsah nutných víceprací je nyní odsouhlasen zástupcem zřizovatele, kterým je OPF MV ČR a požadavek objednatele je schválen tak, že **celkové navýšení akce činí 639.347,62 Kč, včetně DPH.**
- 2.3. Smluvní strany se proto dohodly o celkové změně **Ceny díla** dle čl. V., odst. 5.1., původní smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 1 tak, že za dílo, které bude řádně zhotovené a předané (vč. uvedeného navýšení za provedení víceprací), objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní cenu díla podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

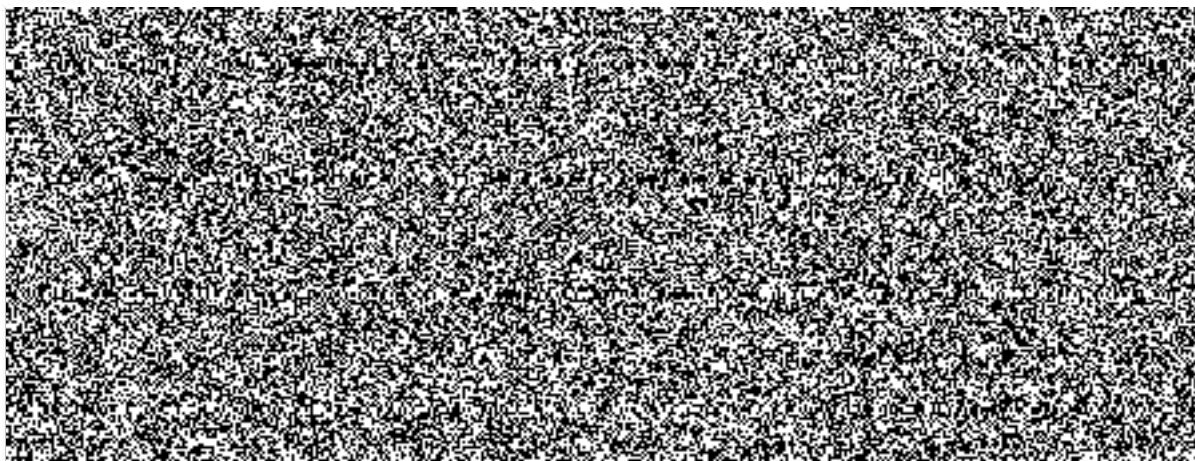

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy č.j. VPŠA-735/EU-2020/OVZI, která nejsou dotčena dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti i po podpisu tohoto dodatku č. 1.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou). Účinnost dodatku č. 1 nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku č. 1 bude provedeno objednatelem na internetu v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:
- v centrálním Registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>;
 - na <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMvPraze>, tj. na internetové adrese národního elektronického nástroje (NEN), který je současně certifikovaným profilem zadavatele (objednatele);
 - příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky ve 2 (dvou) stejnopisech o 3 (třech) stranách textu a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha (rozpočet) o celkem 5 (pěti) stranách. Každý stejnopis dodatku č. 1 je po elektronickém podpisu smluvních stran považován za originál, 1 (jeden) stejnopis dodatku č. 1 obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
- 3.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany zde své podpisy.

V Praze



objednatel (el. podpis)

V Praze



zhotovitel (el. podpis)

Rozpočet k dodatku č. 1

Příloha č. 2 k č.j. VPŠA-1473/EU-2020/OVZI

Kód: VPSaSPS

Stavba: Rekonstrukce Dolní tělocvičny

KSO: Praha 9 - Hrdlořezy

CC-CZ: 18.11.2020
Datum:

Zadavatel: VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9

IČ: 48135453
DIČ: CZ48135453

Zhotovitel: ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o., U Hřiště 577, 267 24 Hostomice

IČ: 47122439
DIČ: CZ47122439

Cena bez DPH			528 386,46
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 528 386,46	Výše daně 110 961,16
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			639 347,62

Datum: 2020.11.27
11:51:32 +01'00'

Date: 2020.11.27
08:54:42 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VPSaSPS

Stavba: Rekonstrukce Dolní tělocvičny

Místo: Praha 9 - Hrdlořezy

Datum: 18.11.2020

Zadavatel: VPS a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 - Ing. ; Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

528 386,46

639 347,62

SO 111 Zateplení fasády

SO 141 Zdravotechnické...



K

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Dolní tělocvičny

Objekt:

SO 141 - Zdravotechnické...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs tví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
619995001			Začištění rýh				

OK

URS

619995001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	OK
41	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	OK
D		766	Konstrukce truhlářské		
62	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	OK
63	M	61140044	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	OK
P			Poznámka k položce:		
65	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	OK
P			Poznámka k položce: Barva viz. PD MODRA		
66	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	OK
VV			"O6 - 4800/2400 - atypicky dělené okna" 4		
VV			Součet		
67			odpočet za barevnost 11%		OK
68		978036121	otlučení omítek	m2	OK
		978059231	odsekání obkladu soklu	m2	OK
		997013501	odvoz sutí	t	OK

