

PCR18ETRpo39881336

Dodatek č.4

č.j.: KRPL-3841-33/ČJ-2019-1800VZ

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-3841-18/ČJ-2019-1800VZ

uzavřená

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku

Tel.: 974 461 551

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted] – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

dále jen "objednatel"

a

Setertix Group s.r.o.

zastoupený: [redacted]

se sídlem: Za Pasáží 1609 Pardubice 530 02

IČ: 28831438

DIČ: CZ 28831438

bankovní spojení: KB - Pardubice

číslo účtu: 0100/107- 4420530217

Tel.: [redacted]

E-mail: setertixgroup@seznam.cz

Fax: [redacted]

Zapsaný: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 31750

dále jen "zhotovitel"

„KRPLbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnových listech č. 2, 3, 7, 12 a 13, které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 4upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 2, 3, 7, 12 a 13(vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č.2, 3, 7, 12 a 13, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 4ke smlouvě o dílo.

IV. V Článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Celková cena bez DPH: | 2.805.731,69 Kč |
| DPH 21%: | 589.203,66 Kč |
| Celková cena včetně DPH 21%: | 3.394.935,35Kč |

slovy: Třimilionytřístadevadesátčtyřitisicedevětsetřicetpětkoruntřicetpěthalérů

textem:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Celková cena bez DPH: | 2.955.919,25 Kč |
| DPH 21%: | 620.743,04 Kč |
| Celková cena včetně DPH 21%: | 3.576.662,29 Kč |

slovy: třimilionpětsetšedesátšesttisícšestsetšedesátdvěkorunyčeské29/100

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 4, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 4 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.


Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 16 -12- 2020


objednatel:

plka
ná



V Pardubicích dne: 15.12.2020

zhotovitel:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

| | |
|-------------|--|
| Název akce: | KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády |
| Objednatel: | ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje |
| Zhotovitel: | Setertix Group s.r.o. |
| Projektant: | Zefraprojekt, s.r.o. |

Předmět změnového listu

Navýšení plochy lešení

Část díla dotčená změnovým listem

Celá stavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala provedení opravy fasády z lešení. V soupisu prací je uvedeno, že plocha fasády je 1718,412 m². Plocha lešení k této fasádě je v soupisu prací uvedena výměrou 1573,296 m².

Nové řešení :

Oprava fasády byla provedena z lešení.

Zdůvodnění změny :

Jedná se o opravu výměry lešení. Oprava fasády vyžadovala postavení lešení v min. výměře jako je fasáda.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Nebyl proveden.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne, zůstala zachována.

Vliv na cenu: Ano

| | |
|--|--------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 22 347,87 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 22 347,87 Kč |

DPH: 4 682,05 Kč

Celkový

datum:

Setertix Group s.r.o.

Za Pasáží 1609 • 530 02 Pardubice

DIČ: CZ28831438

ZMĚNOVÝ LIST č. 2**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Práce a dodávky HSV | 22 347,87 | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 22 347,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|-----------|-------------|
| | | | 22 347,87 | 0,00 |
| CELKEM VRN | | | | 0,00 |

ODPOČTY


Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-----------|----|---|----------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

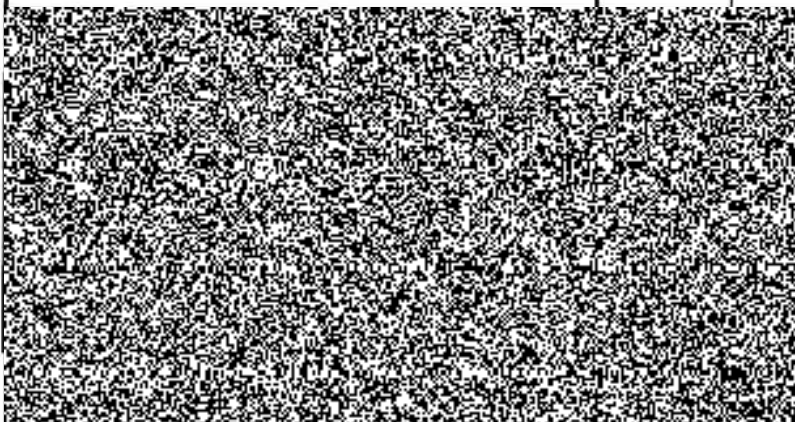


ZMĚNOVÝ LIST č. 2**PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

| Druh položky | P.č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------|------|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 22 347,87 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 22 347,87 |
| SoD | 1 | SoD-01-23 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m | m ² | 145,116 | 45,00 | 6 530,22 |
| SoD | 2 | SoD-01-24 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití | m ² | 145,116 | 65,00 | 9 432,54 |
| SoD | 3 | SoD-01-25 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m | m ² | 145,116 | 35,00 | 5 079,06 |
| SoD | 4 | SoD-01-26 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m ² | 145,116 | 3,00 | 435,35 |
| SoD | 5 | SoD-01-27 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m ² | 145,116 | 3,00 | 435,35 |
| SoD | 6 | SoD-01-28 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m ² | 145,116 | 3,00 | 435,35 |
| Celkem změnový list | | | | | | | 22 347,87 |

Za zhotovitele:

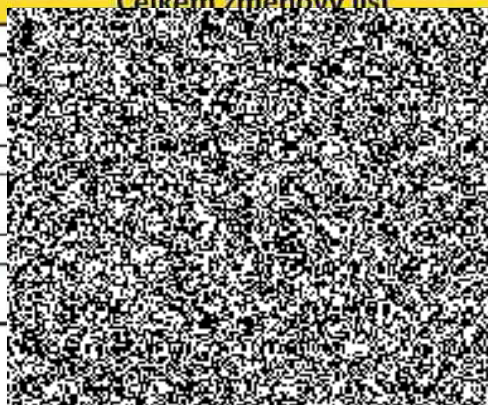

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

| | |
|-------------|--|
| Název akce: | KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády |
| Objednatel: | ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje |
| Zhotovitel: | Setertix Group s.r.o. |
| Projektant: | Zefraprojekt, s.r.o. |

Předmět změnového listu

Hloubková penetrace, složitost nátěrů fasády

Část díla dotčená změnovým listem

Celá stavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace vyžaduje provést penetraci podkladu před nátěrem fasády.

Nové řešení :

Dle technologických postupů zhotovitel aplikoval základní hloubkovou penetraci.

Zdůvodnění změny :

Hloubkovou penetraci podkladu vyžaduje technologický předpis materiálů k nátěru fasády, která nebyla obsažena v rozpočtu.

Výkaz výměr neřeší složitost nátěru fasády, po konzultaci s odborným rozpočtářem (zpracovatelem výkazu výměr na tuto akci), bylo konstatováno, že složitost fasády na objektu vykazuje úroveň 3 z 5 stupňové škály.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Provedeno bez zápisu ve stavebním deníku, zdůvodnění postupu provedeno el. zprávou ze dne 28.05.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, 10 dní

Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zvýšení kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

| | |
|---|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 76 469,69 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 76 469,69 Kč |
| DPH: | 16 058,63 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: | 92 528,32 Kč |

datum:

ZMĚNOVÝ LIST č. 3**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 76 469,69 | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 76 469,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|-----------|-------------|
| | | | 76 469,69 | 0,00 |
| CELKEM VRN | | | | 0,00 |

ODPOČTY


Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-----------|----|---|----------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

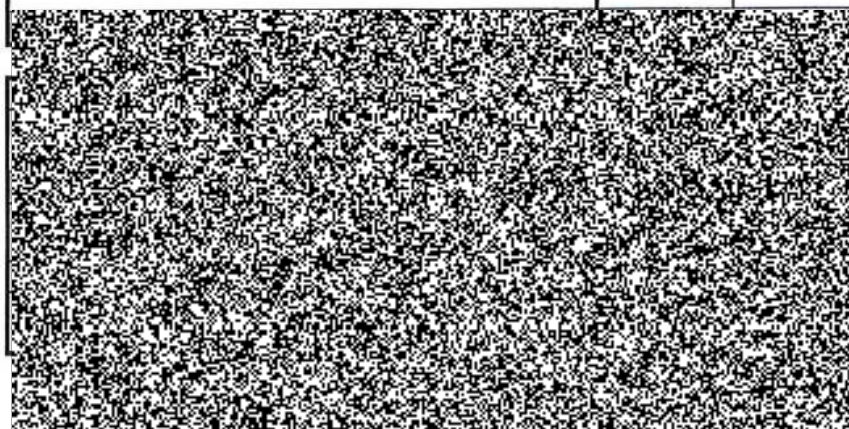


Setertix Group s.r.o.
 Za Pasáží 1609 • 530 02 Pardubice
 DIČ: CZ28831438

ZMĚNOVÝ LIST č. 3**PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

| Druh položky | P.č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------|------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 76 469,69 |
| 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 76 469,69 |
| URS | 1 | 783823163 | Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 1 718,420 | 44,50 | 76 469,69 |
| Celkem změnový list | | | | | | | 76 469,69 |

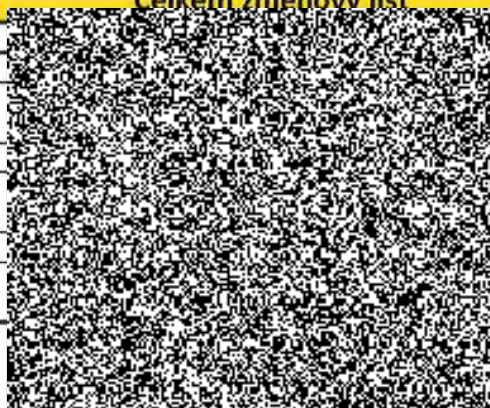

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 7

Identifikace akce

| | |
|-------------|--|
| Název akce: | KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády |
| Objednatel: | ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje |
| Zhotovitel: | Setertix Group s.r.o. |
| Projektant: | Zefraprojekt, s.r.o. |

Předmět změnového listu

Použití mechanizace pro provedení oprav fasády do ul. Klidná a 28. října

Část díla dotčená změnovým listem

Fasáda do ulice Klidná a do ulice 28. října

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala pouze lokální opravy omítky.

Nové řešení :

Místa lokálního poškození, vykazující větší nesoulad s původní fasádou, byla opravena jinou technologií, použitím stěrkové omítky se zrnitostí 1,5 mm. Tímto byl zajištěn větší vizuální soulad s původní omítkou.

Zdůvodnění změny :

Po dokončení opravy fasády a jejího nátěru byl ze strany objednatele připomínkován vizuální nesoulad původních (resp. stávajících) a opravených ploch fasády. Po oboustranné konzultaci byly problematické plochy opraveny stěrkovou omítkou se zrnitostí 1,5 mm, čímž bylo dosaženo vizuální sjednocení stávajících a opravovaných ploch. Uvedené opravy byly provedeny z montážní plošiny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

provedeno bez zápisu ve stavebním deníku, zdůvodnění postupu provedeno el. zprávou ze dne 28.5.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, 10 dní

Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zvýšení zejména estetické kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

| | |
|---|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 20 590,00 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 20 590,00 Kč |
| DPH: | 4 323,90 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: | 24 913,90 Kč |

datum:

Setertix Group s.r.o.

Za Pasáží 1609 • 530 02 Pardubice

DIČ: CZ28831438

ZMĚNOVÝ LIST č. 7**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 20 590,00 | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 20 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|-------------|
| | | | | 0,00 |
| CELKEM VRN | | | | 0,00 |

ODPOČTY


Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-----------|----|---|----------|------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

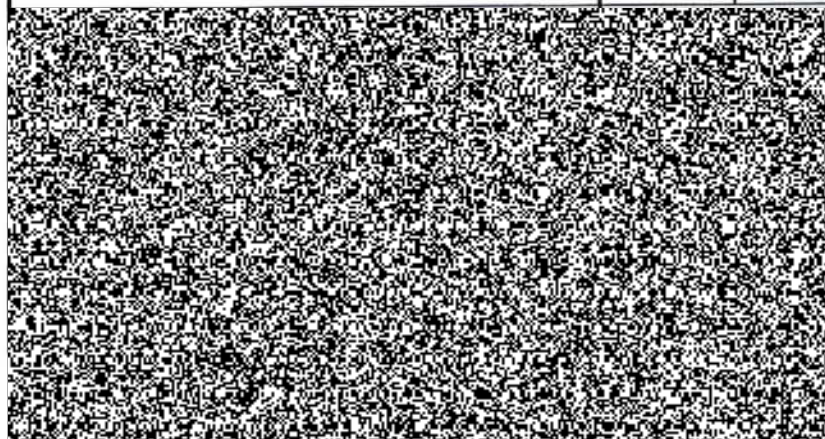


ZMĚNOVÝ LIST č. 7**PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefracprojekt, s.r.o.

| Druh položky | P.č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------|------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 20 590,00 |
| 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 20 590,00 |
| IK | 1 | IK-ZL07-1 | Ochranný nátěr prováděný z montážní plošiny fa 19010143 | hod | 8,00000 | 600,00 | 4 800,00 |
| IK | 2 | IK-ZL07-2 | Ochranný nátěr prováděný z montážní plošiny fa 190100335 | hod | 8,00000 | 830,00 | 6 640,00 |
| IK | 3 | IK-ZL07-3 | Ochranný nátěr prováděný z montážní plošiny fa 19010158 | hod | 8,00000 | 600,00 | 4 800,00 |
| IK | 4 | IK-ZL07-4 | Ochranný nátěr prováděný z montážní plošiny fa 19010186 | hod | 4,00000 | 600,00 | 2 400,00 |
| IK | 5 | IK-ZL07-5 | Doprava dle předložených faktur | km | 78,00000 | 25,00 | 1 950,00 |
| Celkem změnový list | | | | | | | 20 590,00 |

Za zhotovitele:

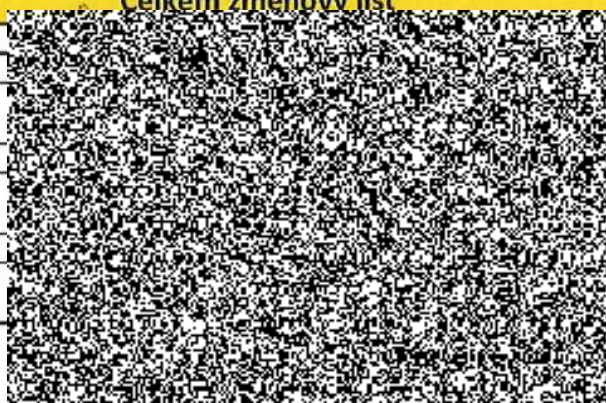

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 12

Identifikace akce

| | |
|-------------|--|
| Název akce: | KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády |
| Objednatel: | ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje |
| Zhotovitel: | Setertix Group s.r.o. |
| Projektant: | Zefraprojekt, s.r.o. |

Předmět změnového listu

nátěr rámců vitrážových oken

Část díla dotčená změnovým listem

fasáda ve dvoře

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace opravu vitrážových oken neřešila.

Nové řešení :

Rámy stávajících vitrážových oken byly opatřeny novým nátěrem.

Zdůvodnění změny :

Po postavení lešení byl zjištěn dožilý stav nátěrů stávajících vitrážových oken, které zdobí hlavní schodiště v interiéru objektu.

Objednatel rozhodl využít postavené lešení a po konzultaci s památkovou péčí provést nový nátěr rámců vitrážových oken.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam nebyl proveden.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zvýšení kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

| | |
|--|--------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 9 540,77 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 9 540,77 Kč |
| DPH: | 2 003,56 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: | 11 544,33 Kč |

dne:

Setertix Group s.r.o.

Za Pasáží 1609 • 530 02 Pardubice

DIČ: CZ28831438

ZMĚNOVÝ LIST č. 12**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 783 Dokončovací práce - nátěry | | 9 540,77 | | | |
| CELKEM OBJEKT | 0,00 | 9 540,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|-------------|
| | | | 9 540,77 | 0,00 |
| CELKEM VRN | | | | 0,00 |

ODPOČTY


Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-----------|----|---|----------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

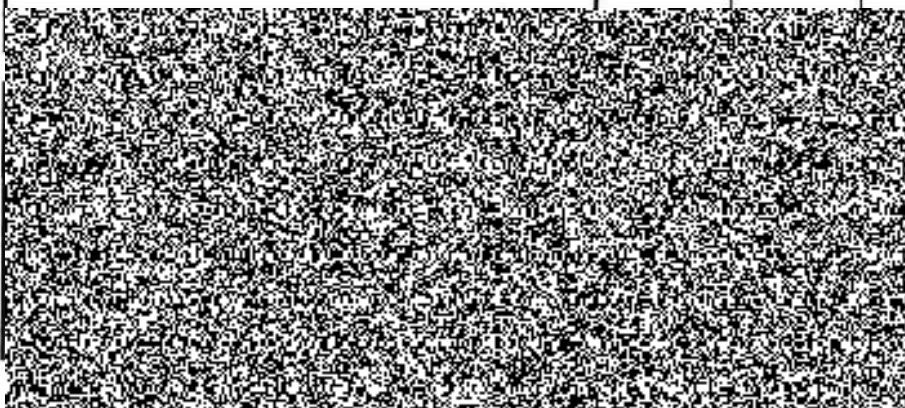


ZMĚNOVÝ LIST č. 12

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

| Druh položky | P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------------|------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 9 540,77 |
| | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 4 740,77 |
| URS | 1 | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 16,740 | 57,00 | 954,18 |
| URS | 2 | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 16,740 | 103,00 | 1 724,22 |
| URS | 3 | 783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 16,740 | 103,00 | 1 724,22 |
| URS | 4 | 783122101 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10% | m2 | 16,740 | 20,20 | 338,15 |
| IK | 5 | ZL12- IK01 | Příplatek za složitost | kpl | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | | | | | | 9 540,77 |

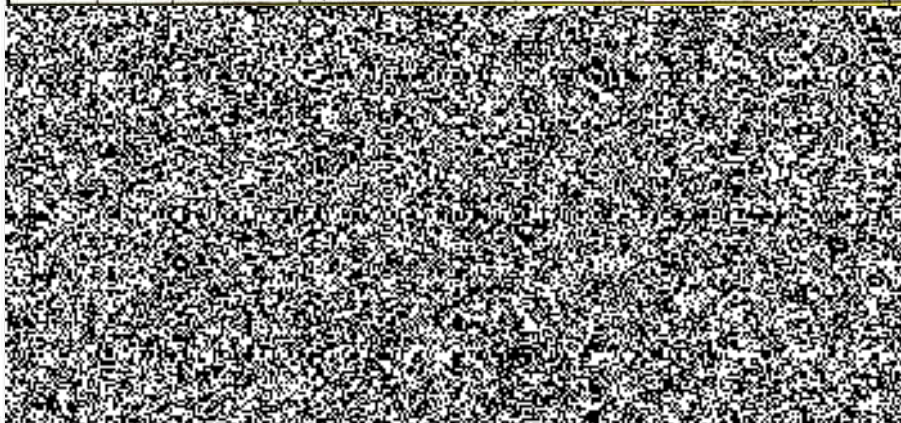

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 13

Identifikace akce

| | |
|-------------|--|
| Název akce: | KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády |
| Objednatel: | ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje |
| Zhotovitel: | Setertix Group s.r.o. |
| Projektant: | Zefraprojekt, s.r.o. |

Předmět změnového listu

Speciální štukatérské práce poškozených zdobných prvků

Část díla dotčená změnovým listem

Fasáda v celém rozsahu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace, resp. soupis prací předpokládaly k opravě poškozených zdobných prvků fasády speciální štukatérské práce v rozsahu 120 hodin. Provedení prací měl předcházet průzkum prvků v rozsahu 50 hodin.

Nové řešení :

Práce na opravě poškozených zdobných prvků fasády byly provedeny v souladu se zadáním. Pro průzkum prvků a provedení opravy prvků (speciální štukatérské práce) však bylo potřeba více hodin než předpokládal soupis prací.

Zdůvodnění změny :

Při zpracování PD byl stav zdobných prvků fasády z větší části pouze odhadnut. Při realizaci prací bylo postupováno dle požadavků PD. Skutečný stav prvků byl horší než předpokládala PD. Speciální štukatérské práce proto byly potřeba ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno v soupisu prací. Více hodin si vyžádal i průzkum prvků.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Nebyl proveden.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zvýšení kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

| | |
|--|--------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 23 240,00 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 23 240,00 Kč |
| DPH: | 4 880,40 Kč |
| Celkový | Kč |

datum:



Za Pasáží 1609 • 530 02 Pardubice

DIČ: CZ28831438

ZMĚNOVÝ LIST č. 13**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 23 240,00 | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 23 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM VRN | | | | 0,00 |

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-----------|----|---|----------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST č. 13**PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertlx Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

| Druh položky | P.č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------|------|------------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 23 240,00 |
| 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 23 240,00 |
| SOD | 1 | SoD - pol. č. 15 | Speciální štukaterské práce složitých poškozených (chybějících) zdobných prvků realizace na pokyn investora a zápisu do SD | hod | 60,00000 | 350,00 | 21 000,00 |
| SOD | 2 | SoD - pol. č. 16 | Podrobné prozkoumání, prohlídka poškozených architektonických plastických prvků z lešení, přesné určení rozsahu a opravy - realizace na pokyn investora a zápisu do SD | hod | 8,00000 | 280,00 | 2 240,00 |
| Celkem změnový list | | | | | | | 23 240,00 |

Za zhotovitele:



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
