

Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 1

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
Zastoupený společností: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Část stavby dotčená změnou:
ORG 2869 Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově se vkládají objekty:
Kolize plynovodu s šachtu Š632399a - provizorní propoj stoky
DN 400 se stokou DN 1000

Vícepráce

99 040,25 Kč (bez DPH)

Datum oznámení změny: květen 2020

Datum předložení změny: 30. 10. 2020

Popis změny: Prodloužení trasy kanalizace DN 400 prodloužit o cca 2 m, provizorní napojení do kanalizace DN 1000.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Změna technického řešení: zvýšení ceny o **99 040,25 Kč** (bez DPH)


Termín ukončení stavby: Dle SOD lhůta provádění prací na díle činí 257 kalendářních dní.

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, technický nákres

V Brně dne:
Za objednatele



V Brně dne:
Za zhotovitele



Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 2

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
Zastoupený společností:	Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Zhotovitel:	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Část stavby dotčená změnou: ORG 2869 Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	
Nově se vkládají objekty: Přeložka Cetin	
Vícepráce	49 626,73 Kč (bez DPH)
Datum oznámení změny: květen 2020	Datum předložení změny: 30. 10. 2020
Popis změny: Do termínu zahájení stavebních prací nezajistila společnost CETIN přeložku svých kabelů. Prověření trasy kabelu CETIN kopanými sondami. Po úplném ověření trasy kabelu CETIN bylo jeho správcem rozhodnuto o vymístění stávajícího kabelu SDK v celém 50 m dlouhém úseku. Po provedení stavebních prací na kanalizaci uložení nového kabelu do definitivní trasy stanovené správcem. Tyto práce včetně provizorního vyvěšení původního kabelu do doby jeho výměny provedla Skanska jako generální dodavatel.	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:	
Změna technického řešení: zvýšení ceny o 49 626,73 Kč (bez DPH)	
Termín ukončení stavby: Dle SOD lhůta provádění prací na díle činí 257 kalendářních dní.	
Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, technický nákres	
V Brně dne: Za objednatele	V Brně dne: Za zhotovitele – Skanska a.s.

Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
Zastoupený společností: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Část stavby dotčená změnou:
ORG 2869 Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově se vkládají objekty:
Změna trasy kanalizace v úseku Š632409m- Š632409o

Vícepráce **143 291,34 Kč (bez DPH)**

Datum oznámení změny: červenec 2020

Datum předložení změny: 30. 10. 2020

Popis změny: V důsledku přímé kolize rekonstruované kanalizace s trasou stávajícího plynovodu bylo nutné ověřit trasy stávajících sítí sondou navíc, provádět výkopové práce ručně v neustálém souběhu s plynovodem. Následně po konzultaci s pracovníky GridServices navrhl zpracovatel PD upravenou trasu kanalizace v tomto úseku. Vzhledem k prostorovým poměrům bylo nutné vložit mezilehlou šachtu s označením Š632409no.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Změna technického řešení: zvýšení ceny o **143 291,34 Kč (bez DPH)**

Termín ukončení stavby: Dle SOD lhůta provádění prací na díle činí 257 kalendářních dní.



Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, technický nákres

V Brně dne:
Za objednatele

V Brně dne:
Za zhotovitele – Skanska a.s.

Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 4

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno	
Zastoupený společností:	Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	
Část stavby dotčená změnou: ORG 2869 Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu		
Nově se vkládají objekty: SO 05 Přeložky kabelů NN		
Méněpráce	-338 199,01 Kč (bez DPH)	
Datum oznámení změny: květen 2020	Datum předložení změny: 30. 10. 2020	
Popis změny: Spol. E.ON realizovala přeložky kabelů NN v dotčené lokalitě na vlastní náklady před zahájením stavby Kopaniny. Objekt nebude realizován.		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: Změna technického řešení: snížení ceny o -338 199, 01 Kč (bez DPH)		
Termín ukončení stavby: Dle SOD lhůta provádění prací na díle činí 257 kalendářních dní.		
Přílohy změnového listu: položkový rozpočet		
V Brně dne: Za objednatele	V Brně dne: Za zhotovitele – Skanska a.s.	
		

Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 5

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
Zastoupený společností: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Část stavby dotčená změnou:
ORG 2869 Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově se vkládají objekty:
SO 06 Přeložky kabelů SDK

Méněpráce -174 209,08 Kč (bez DPH)

Datum oznámení změny: květen. 2020

Datum předložení změny: 30. 10. 2020

Popis změny:

Přeložka SDK společnosti CETIN byla původně jako samostatný objekt zahrnuta do rozpočtu stavby. Aktuálně jsou přeložky telekomunikačních sítí CETIN realizovány v rámci městských staveb na základě smlouvy o mezi statutárním městem Brnem a společností CETIN. Příslušná smlouva byla uzavřena i v případě stavby Kopaniny.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Změna technického řešení: snížení ceny o -174 209,08 Kč (bez DPH)

Termín ukončení stavby: Dle SOD lhůta provádění prací na díle činí 257 kalendářních dní.

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet

V Brně dne:
Za objednatele

V Brně dne:
Za zhotovitele - Skanska a.s.



Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 6

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno	
Zastoupený společností:	Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	Skanska a.s. Křížkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	
Část stavby dotčená změnou: ORG 2869 Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu		
Nově se vkládají objekty: SO 090 k objektu kanalizace DN 1000		
Vícepráce		500 894,70 Kč (bez DPH)
Datum oznámení změny: září 2020		Datum předložení změny: 30. 10. 2020
Popis změny: Jedná se o nestavební náklady k objektu kanalizace DN 1000.		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: Změna technického řešení: zvýšení ceny o 500 894,70 Kč (bez DPH)		
Termín ukončení stavby: Dle SOD lhůta provádění prací na díle činí 257 kalendářních dní.		
Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, DPS		
V Brně dne: Za objednatele		V Brně dne: Za zhotovitele – Skanska a.s.

Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 7

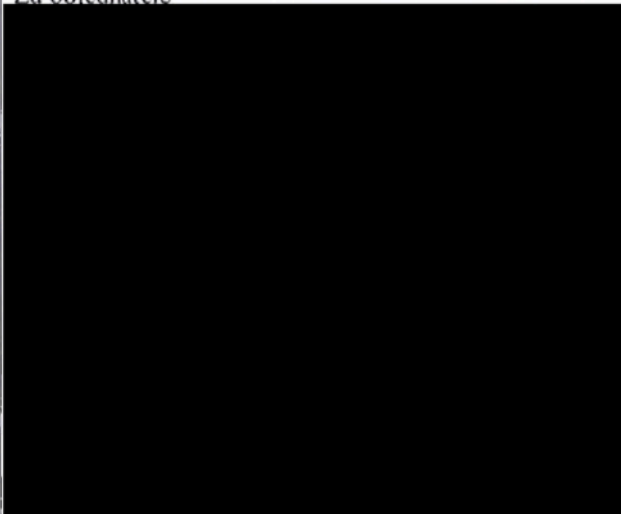Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno		
Zastoupený společností:	Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno		
Zhotovitel:	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8		
Část stavby dotčená změnou: ORG 2869 Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu			
Nově se vkládají objekty: DSO 01.1 Kanalizace DN 1000			
Vícepráce	3 836 533,94 Kč (bez DPH)		
Datum oznámení změny: září 2020	Datum předložení změny: 30. 10. 2020		
Popis změny: V rámci rekonstrukce kanalizace v ulici Kopaniny provedena výměna cca 50 m kanalizace DN 1000 v ulici Potocké v úseku mezi stávajícími šachtami Š632399 a Š632396. Dojde tak k napřimění trasy stávající DN 1000 a umístění soutokové šachty Š632399a dle schválené projektové dokumentace. Navíc se toto řešení obejde bez přeložky NTL, která by při zachování současného stavu byla nutná.			
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:			
Změna technického řešení: zvýšení ceny o 3 836 533,94 Kč (bez DPH)			
Termín ukončení stavby: Dle SOD lhůta provádění prací na díle činí 257 kalendářních dní.			
Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, DPS			
V Brně dne: Za objednatele	V Brně dne: Za zhotovitele – Skanska a.s.		
			

Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 8

Objednatel: Statutární město Brno
Domínkánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
Zastoupený společností: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Část stavby dotčená změnou:
ORG 2485 Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově se vkládají objekty:
Opěrná zeď (obetonování potrubí)

Vícepráce **53 266,35 Kč (bez DPH)**

Datum oznámení změny: červenec 2020

Datum předložení změny: 30. 10. 2020

Popis změny: Původně bylo navrženo odvodnění prostoru mezi dříčkem opěrné zdi a obetonávkou kanalizace pomocí drenáže se zaústěním do kanalizační šachty. Z prostorových důvodů ale nebylo možné se do kanalizační šachty touto drenáží napojit. Z tohoto důvodu bylo navrženo jediné zbývající řešení a to obetonávku kanalizace rozšířit až ke dříčku opěrné zdi a vyspádovat směrem od zdi, aby veškerou vodu svedla drenáž nad koncem základu.


V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Změna technického řešení: zvýšení ceny o **53 266,35 Kč (bez DPH)**


Termín ukončení stavby: Dle SOD lhůta provádění prací na díle činí 257 kalendářních dní.

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, technický náčrtek

V Brně dne:
Za objednatele

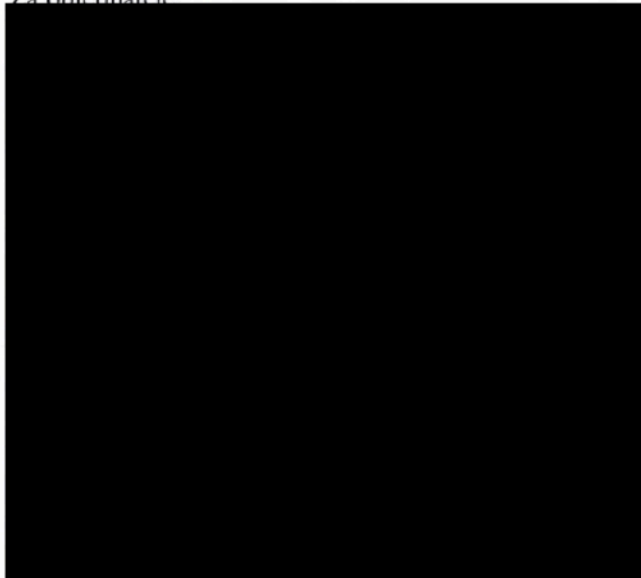

V Brně dne:
Za zhotovitele – Skanska a.s.

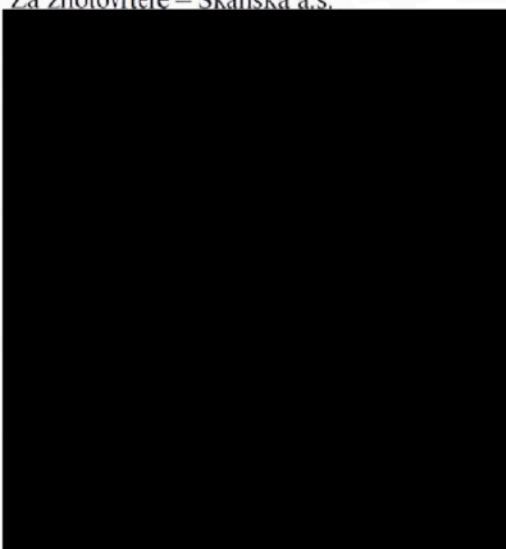

Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 9

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
Zastoupený společností:	Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Zhotovitel:	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Část stavby dotčená změnou:
ORG 2485 Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově se vkládají objekty:
H18063 Opěrná zeď VCP/MNP

Vícepráce

259 833,01 Kč (bez DPH)

Datum oznámení změny: červenec 2020

Datum předložení změny: 30. 10. 2020

Popis změny: Skutečný stav a polohu stavebních konstrukcí dvou garáží bylo možné zjistit až po odkrytí chodníku před garážemi. Bylo zjištěno, že prostor pod garážemi zasahuje až pod vozovku komunikace a je nutné přebudovat zastropení a zajištění svislé stěny mezi soukromým prostorem a podlážím komunikace. Stavební stav původní opěrné zdi je špatný, takže jsme navrhli rozebrání části zdiva, dobetonování a spojení s novou zdí pomocí smykových trnů.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Změna technického řešení: zvýšení ceny o **259 833,01 Kč (bez DPH)**

Termín ukončení stavby: Dle SOD lhůta provádění prací na díle činí 257 kalendářních dní.

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, technický nákres

V Brně dne:
Za objednatele

V Brně dne:
Za zhotovitele – Skanska a.s.

