

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR HAVÍŘOV CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008965	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 00 Vedlejší náklady	

Číslo smlouvy o dílo: **980/OUR/19** ze dne **6. 1. 2020**
 Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří**
 Projektant/ autorský dozor: **DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
 Technický dozor objednatele/investora: **ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava**

Přílohy: PZ-12.1 Změnový rozpočet dle § 222 odst. 4 PZ-12.2 Zaměření přístupových tras PZ-12.3 Tabulka evidence změn	Počet paré: 5 Rozdělovník: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora
--	--

Popis a zdůvodnění změny:

v rámci SO 00 Vedlejší náklady:

Projektovou dokumentaci stavby je navržena přístupová trasa pro pěší na nástupiště železniční stanice Havířov přes schodišťovou věž umístěnou na východní straně budovy nádraží Havířov. V rámci koordinace prací navazujícího projektu "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov" bylo zhotovitelem navrženo jiné uspořádání přístupových tras. Místo schodišťové věže byla provedena oplocená bezbariérová betonová komunikace pro pěší na západní straně budovy nádraží. Tímto uspořádáním došlo k úspoře financí.

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
2 216 560,54	-385 326,32	229 150,62	2 060 384,84

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
2 216 560,54 Kč	-385 326,32 Kč	229 150,62 Kč	-7,05%	2 060 384,84 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				2 493 065,66 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno Ing. Ladislav Čech st.	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Radim Žvak	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janíček	datum	podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18007 Přednádražní prostor Havířov**

Objednatel: Město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov

IČO: 00 29 74 88

DIČ: CZ 00 29 74 88

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Brno, Veverří, Burešova 938/17, PSČ 602 00**

IČO: **46342796**

DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-	156 175,70 CZK
Základní DPH	21 %	-	32 796,90 CZK
Cena celkem s DPH		-	188 972,59 CZK

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 00 Vedlejší náklady	-156 175,70	-156 175,70	-32 796,90	-188 972,59	100,00
Celkem za stavbu		-156 175,70	-156 175,70	-32 796,90	-188 972,59	100,00

Položkový rozpočet


S:	18007	Přednádražní prostor Havířov
O:	01	SO 00 Vedlejší náklady
R:	1	SO 00 Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady						-385 326,32
8	R - P 4	Dodávka a montáž schodišťové věže pro zajištění přístupu na nástupiště z parkovací plochy na východě, překonávaná výška cca 5,5 m. nosnost bude odpovídat max. obsazení	kpl.	-1,00000	385 326,32	-385 326,32
Díl: N						229 150,62
23	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3	m3	16,80000	32,97	553,90
				84*0,2	16,80000	
24	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	16,80000	8,79	147,67
101	131233101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3 při překozech inženýrských sítí	m3	9,40000	1 044,10	9 814,54
				47*0,2	9,40000	
102	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,40000	208,82	1 962,91
25	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	13,10000	3 020,00	39 562,00
				131*0,1	13,10000	
26	272365	Výztuž základů z oceli 10505, B500B	t	1,61654	32 971,45	53 299,67
				(74,04/6*131)/1000	1,61654	
27	564831111U00	Podklad ze štěrku ŠD 0-63 tl 100 mm	m2	131,00000	107,00	14 017,00
28	34135111R00	Zřízení bednění stěn nosných	m2	25,80000	384,67	9 924,49
29	341351112R00	Odstranění bednění stěn nosných	m2	25,80000	98,91	2 551,88
30	34351911	Příplatek k cenám bednění	m2	25,80000	172,55	4 451,79
31	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	13,10000	5 495,24	71 987,64
32	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	32,75000	159,36	5 219,04
33	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	294,75000	14,29	4 211,98
34	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,75000	184,64	6 046,96
35	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,75000	164,86	5 399,17
Celkem						-156 175,70



Přednádražní prostor Havířov Výměry ploch provizorních přístupových cest

Vyhotovil: ing. Roman Piják
Datum: 29.9.2020

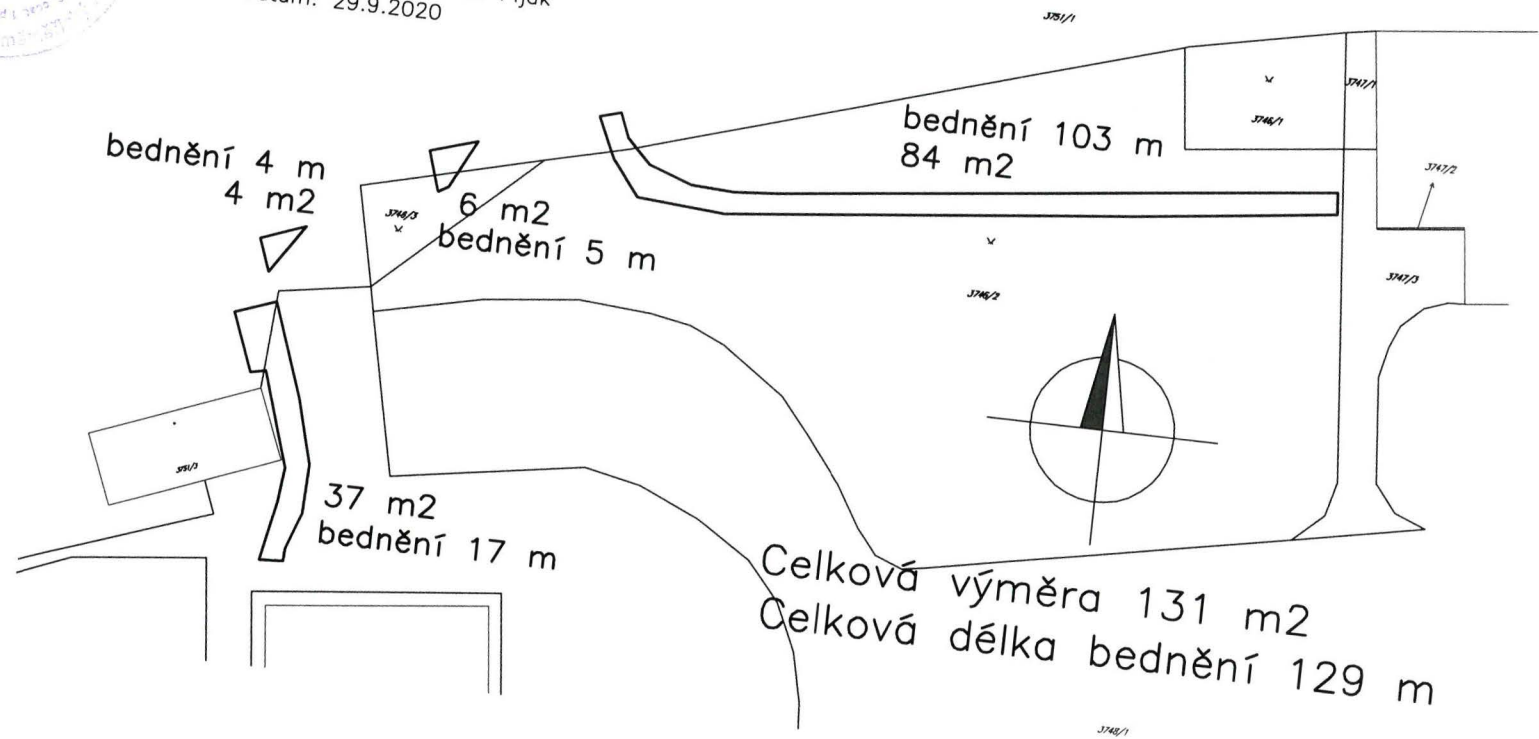

PZ-12.3 TABULKA EVIDENCE ZMĚN

 Stavba: **Přednádražní prostor Havířov**

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)	
			Odpočet	Přípočet	Rozdíl							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SO 01 Příprava území	Změna způsobu sanace zemních plání ve SO komunikací a zpevněných ploch	0,00	1 937 542,50	1 937 542,50	1 937 542,50			1 937 542,50		1 937 542,50	
	SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy		996 060,33	4 566 455,28	3 570 394,95	5 562 515,61			5 562 515,61		3 570 394,95	
	ZL-1 Celkem		996 060,33	6 503 997,78	5 507 937,45	7 500 058,11						
2	SO 11 Přeložka Horkovodu	Vybourání sekundárního ŽB kanálu		835 080,26	835 080,26	835 080,26			835 080,26		835 080,26	
3	SO 04 - Kanalizace dešťová a OLK	Nepotřebnost realizací SO 04 a SO 10.2	109 961,54		-109 961,54	109 961,54			109 961,54		-109 961,54	
	SO 10.2 Kanalizace SŽDC		448 830,64		-448 830,64	448 830,64			448 830,64		-448 830,64	
	ZL-3 Celkem		558 792,18	0,00	-558 792,18	558 792,18						
4	SO 08 - Mobilliář	Technické zpřesnění laviček L1, L2, L4	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
5	SO 17 - Přeložka plynovodu	Zpřesnění trasy a dimenzí plynovodní přípojky	54 927,26	18 474,11	-36 453,15	73 401,37			73 401,37		-36 453,15	
6	SO 16.1 - Přeložka vodovodu, větve V	Úprava napojení vodovodu a pozice armaturní sestavy	6 246,94	177 373,35	171 126,41	183 620,29			183 620,29		171 126,41	
7	SO 07 - Slaboproud	Revize SLP	1 883 469,85	2 595 970,38	712 500,53	4 479 440,23			4 479 440,23		712 500,53	
8	SO 08 - Mobilliář	Nepotřebnost realizace košů, Vitríny pro tištěné jízdni řady	126 397,96	297 839,30	171 441,34	424 237,26			424 237,26		171 441,34	
9	SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy	Záměna dlážděného krytu OK3 za asfalt Nepotřebnost dvojřádku ze žulových kostek	1 038 862,75	1 252 619,69	213 756,94	2 291 482,44			2 291 482,44		213 756,94	
10	SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy	Výšková úprava komunikace pro pěší - provedení palisády a zábradlí	0,00	220 689,18	220 689,18	220 689,18	220 689,18					
11	SO 08 - Mobilliář	Nepotřebnost realizace sklovláknobetonových květníků	132 803,64	0,00	-132 803,64	132 803,64	132 803,64					
	SO 09 - Sadové úpravy	Revize výsadby	336 852,65	218 744,93	-118 107,72	555 597,58	555 597,58					
	ZL-11 Celkem		469 656,29	218 744,93	-250 911,36	688 401,22						
12	SO 00 - Vedlejší náklady	Nepotřebnost realizace schodišťové věže	385 326,32	229 150,62	-156 175,70	614 476,94	614 476,94					
CELKEM změna RN vlivem uznatelných změn			v Kč	5 519 739,88	12 349 939,60	6 830 199,72	17 869 679,48	1 523 567,34	0,00	16 346 112,14	0,00	7 016 597,60
			v % z původní hodnoty závazku	6,00%	13,42%	7,42%						
LIMITY podle § 222 ZVZ						Kč	původní hodnota závazku	91 995 275,52	13 799 291,33	45 997 637,76	45 997 637,76	27 598 582,66
REZERVA (zbývající do vyčerpání LIMITU dle ZVZ)						Kč		12 275 723,99	45 997 637,76	29 651 525,62		20 581 985,06
							% čerpání	11,04%	0,00%	35,54%		25,42%
NOVÁ CENA vč. změn						Kč		98 825 475,24				
