



**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/11253/20**  
na realizaci stavby  
**„Přestupní terminál Citadela v Litvínově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **JMV tech s.r.o.**  
Zastoupený : Milanem Kožnarem, jednatelem  
Sídlo : U Stadionu 1190, 434 01 Most  
IČ : 47286334  
DIČ : CZ47286334  
bankovní spojení : ČSOB a.s.  
č. účtu : 279692074/0300  
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Milan Kožnar  
datová schránka : 9g8vrqf  
kontaktní tel :   
kontaktní e-mail : jmvtech@jmvtech.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11253/20 na realizaci stavby „Přestupní terminál Citadela v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

**Původní znění:**

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

**Lhůta – termín provedení stavby je 14 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

**Nové znění:**

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

**Lhůta – termín provedení stavby je 19 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Konečný termín realizace stavby 07.03.2021.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11215/20	3 537 760,54
Vícepráce - ZL č. 1	927 306,78
Méněpráce - ZL č.2	-222 985,17
Cena díla celkem bez DPH	4 242 082,15

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

### III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 30-12-2020

V Mostě dne 17.12.2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Milan Kožnar  
jednatel



## Změnový list - vícepráce

č.

1

stavba: Přestupní terminál , Citadela Litvínov



- část 18067 - SO.01 - Komu - 18067

Datum 03.12.2020

Vypracoval

Popis změny a její účel :

viz. Příloha č. 1

Popis položky	cena celkem	Poznámka
1) práce prováděné dle položek z SOD - viz. příl. položkový rozpočet	199 593,50 Kč	
2) Práce prováděné dle nových položek - viz. příl. položkový rozpočet (koef. 1,13)	727 713,28 Kč	
cena celkem bez DPH	<b>927 306,78 Kč</b>	
upravená cena bez DPH		
Vypracoval		Datum : 03.12.2020
Kontroloval		Datum : 2.12.2020
		8.12.20

## ROZPOČET

Stavba: Přestupní terminál , Citadela Litvínov

Objekt: 18067 - SO.01 - Komunikac... VCP I

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>139 536,52</b>	<b>0,000</b>
137	11310703R1	Odstranění podkladu plochy z kostek do tl 150 mm při pfekopech inž sílí	m2	65,500	335,00	21 942,50	0,000
142	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého do tl 300 mm	m2	57,000	247,00	14 079,00	0,000
138	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živických tl 100 mm	m2	323,100	54,20	17 512,02	0,000
125	113107185	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živických tl 250 mm	m2	203,000	158,00	32 074,00	0,000
139	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	323,100	79,50	25 686,45	0,000
136	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	31,450	91,10	2 865,10	0,000
166	113201112	Výtrhání obrub silničních ležatých	m	72,000	40,00	2 880,00	0,000
151	131113101	Hloubení jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,000	850,00	8 500,00	0,000
157	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	56,383	150,00	8 457,45	0,000
152	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	10,000	140,00	1 400,00	0,000
153	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	18,000	230,00	4 140,00	0,000
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>23 433,00</b>	<b>19,104</b>
158	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,750	2 470,00	9 262,50	8,461
177	275321411	Základové patky ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,302	2 550,00	10 970,10	10,554
178	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,084	38 100,00	3 200,40	0,089
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 250,00</b>	<b>0,000</b>
155	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	50,000	25,00	1 250,00	0,000
156	3457135R1	Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem	m	50,000	20,00	1 000,00	0,000
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>42 320,00</b>	<b>2,660</b>
163	341126001	Montáž ŽB stěnových panelů u ventilačních věží hmotnosti do 2 t	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	0,089
164	593813000	panel silniční KZD 1-300/100 300x100x15 cm	kus	2,000	3 700,00	7 400,00	2,240
160	388995213	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 140	m	150,000	91,10	13 665,00	0,137
161	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF	m	100,000	70,90	7 090,00	0,069
180	345713551	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	50,000	85,30	4 265,00	0,035
181	388995213R	Chránička kabelů z trub HDPE úprava rozříznutí pro pokládku kabelů bez napojení	m	100,000	45,00	4 500,00	0,091
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>22 447,36</b>	<b>14,612</b>
182	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	3,750	457,00	1 713,75	0,033
183	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	3,750	88,60	332,25	0,000
184	434121416	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	m	15,000	315,00	4 725,00	0,520
185	59373799R1	stupeň schodišťový obkládový z vibrolisovaného betonu tvar L 370x300x170mm	kus	59,000	165,00	9 735,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
154	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,000	799,00	3 995,00	9,454
186	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,436	799,00	1 946,36	4,606

**767 Konstrukce zámečnické 90 256,00 0,000**

145	767995999R11	Zastávka autobusová -repase, obroušení, nátěr, nový střešní polykarbonát s doplňky, oprava světel.reklamy,výměna skla,repase lavičky	kus	2,000	45 128,00	90 256,00	0,000
-----	--------------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 128 669,60 7,596**

174	911339999R3	Dodávka ocelového sloupu pro napínací lana trolejového vedení	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000
175	911339999R4	Pořizovací přírůžka na dodávka ocelového sloupu pro napínací lana trolejového vedení	%	7,000	400,00	2 800,00	0,000
176	911339999R5	Přesun hmot pro na dodávku 9 m ocelového sloupu pro napínací lana trolejového vedení - doprava, jeřábové naložení	soub	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
167	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	225,00	1 125,00	0,000
168	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	15,000	139,00	2 085,00	1,238
143	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	53,000	295,00	15 635,00	0,004
140	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,480	2 420,00	32 621,60	0,000
105	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	225,00	16 200,00	0,000
106	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	77,000	139,00	10 703,00	6,354

**998 Přesun hmot 2 786,82 0,000**

121	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	52,090	53,50	2 786,82	0,000
-----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

**HSV Práce a dodávky HSV 5,255**

**8 Trubní vedení 70 150,00 5,255**

162	899131113R1	Snížení šachtového rámu do štěrkového lože vč.výkopu a štěrkového lože pro osazení panelového záklopu vč.geodetického zaměření	kus	2,000	12 200,00	24 400,00	1,568
179	899131113R3	Zvýšení šachtového rámu do štěrkového lože vč.výkopu a štěrkového lože pro osazení vč. rozebrání zámkové dlažby, nové kunosové krytí, poklop	kus	2,000	19 000,00	38 000,00	1,568
146	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením míže	kus	5,000	1 550,00	7 750,00	2,118

**997 Přesun sutě 405 457,48 0,000**

131	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	705,012	200,00	141 002,40	0,000
132	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 820,048	17,20	48 504,83	0,000
133	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	705,012	110,00	77 551,32	0,000
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	376,533	180,00	67 775,94	0,000
135	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	328,479	215,00	70 622,99	0,000

**Celkem bez DPH**

**927 306,78**



**Příloha ke změnovému listu č.1**

- 1) Asfaltová plocha tl. 6cm pod chodníkem na zastávce BUS (směr Koldům)

$$(4,5*2+3*7+13,5*3,5+24*5,8+24,5*3+6,1*1,5+8*3)*0,06*2,7 = \underline{323,1m^2 (58,481 t)}$$

Je v podkladních vrstvách, vybouráno kvůli zhotovení podkladních vrstev, odtokovým spádům a nástupní výšce autobusového panelu. Dle původního položkového rozpočtu bylo počítáno lože pod zámkovou dlažbou z drčeného kladeniva a zeminy.

**Méněpráce – odpočet původních vrstev z Pd a VV**, Pol. rozp. č. 131,147,148,150





- 2) Betonová plocha tl. do 10cm pod chodníkem na zastávce BUS (směr Koldům), dle původního rozpočtu bylo počítáno lože pod zámkovou dlažbou z drčeného kameniva a ze zeminy .

$$(4,5*2+3*7+13,5*3,5+24*5,8+24,5*3+6,1*1,5+8*3)*0,1*2,2 = \underline{323,1m^2 (71,082t)}$$

Je v podkladních vrstvách, vybouráno kvůli zhotovení podkladních vrstev, odtokovým spádům a nástupní výšce autobusového panelu.

**Méněpráce – odpočet původních vrstev z Pd a VV**, Pol.rozp.č.130, 131,147,148,150

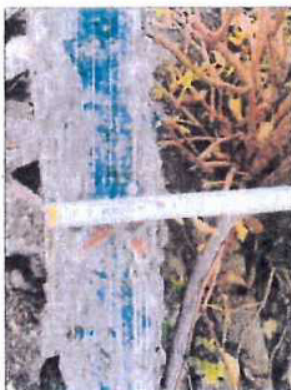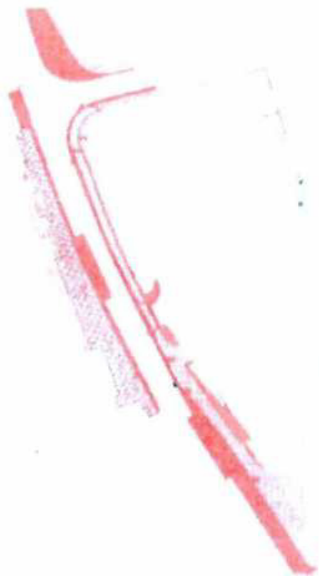

- 3) Obruby silniční u tramvajového pásu (vybourání + pokládka nových)

**72m**

Původní rozpočet tyto práce nezahrnuje.

Pol. rozp. č. 166, 105, 106, 123, 131, 132, 133, 121

Vybourání a pokládka nových silničních obrub z důvodu nesoudržného betonového lože.



- 4) Původní rozpočet s rozsahem těchto prací nepočítá. Pol. rozp. č. 126, 131, 132, 133, 140

Základy železobetonové pod vybetonovaným květináčem v místě budoucích palisád

$(24,5 * 1,1 * 0,5) * 2,2 = 13,475 \text{m}^3$  (26,96)

Vybourání základů v místech, kde budou následně osazovány palisády nového květináče.

Kvůli celkové výšce palisád a dostatečnému usazení se musí vybourat i část základu původního květináče.



*[Handwritten signature]*

- 5) Betonové plochy pod komunikací v místě nové BUS zastávky (směr město)

$$(17*0,75*2)+(17*1,1)*0,15*2,2 = \mathbf{31,45m^2 (10,38t)}$$

Vybourání z důvodu osazování autobusových panelů. Betonové desky jsou v kolizi s panely a s podkladní vrstvou. Betonové desky (stará komunikace) budou odříznuty (17bm), odpikrovány a odtěženy. Následně bude zhotoveno lože dle PD.

**Měněpráce – odpočet původních vrstev z Pd a VV** Pol. rozp. č. 126, 131, 132,133, 136, 143,147,148,150



- 6) Betonové plochy pod komunikací v místě stávající BUS zastávky (směr město). Původní PD pouze odvezení sběru

$$(19*3)*0,25*2,2 = \mathbf{57m^2 (31,35t)}$$

Vybourání z důvodu nesouvislé podkladní vrstvy u nájezdu autobusů na panely – možnost opětovného vytváření kolejí v asfaltu. Betonové desky budou odříznuty (19bm), odpikrovány a odtěženy. Následně se vytvoří lože dle PD.

**Měněpráce – odpočet původních vrstev z Pd a VV** Pol. rozp. č. 126, 131, 132, 133, 142, 143,147,148,150





- 7) Živice v tl. 0,25m původní VV tl. 15cm bude odečtena původní výměra bez přesunů hmot a likvidace jenž VV neobsahuje.

$$((5*2)+(17*3)+(40*3)+(15*1,5))*0,25*2,7 = \underline{203m^2 (137,025t)}$$

**Méněpráce – odpočet původních vrstev z Pd a VV, Pol. rozp. č. 125, 131, 132, 133, 135**




- 8) Ruční vykopávky - obnažení kabelu O2

$$(50*0,5*0,4)*1,8 = \underline{10m^3 (18t)}$$

Z důvodu zhotovení chráničky + rezervy kabel O2 (CETIN), dohodnuto na stavbě s panem Porcalem a Tichým. Proveden zápis do stavebního deníku

Pol. rozp. č. 151,152,153,155,156,154,121,131,132,133,157

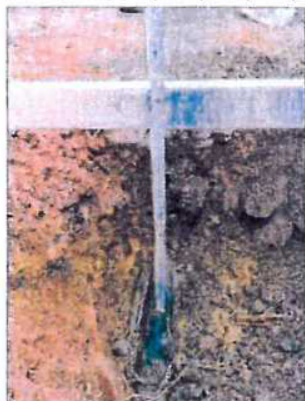

- 9) Chránička kabelu O2 (kopoflex) 4 x stávající kabel + rezerva dle požadavků O2 (CETIN) + obetonování popř. krycí bet. desky



50\*3 = 150m

Pol. rozp. č. 158,121,160,161

10) **Měněpráce** – Repase zastávek namísto objednání nových

Pol. rozp. č. 144, 145

11) Obnažení a zaslepení šachet SČVK + geo. V místě podkladních vrstev pro osazení zastávkových panelů, je výskyt dvou šachet. Bude nutné tyto šachty zakrýt, snížit a zaměřit dle požadavku SČVK. Zaměření (zaslepení panelem). Stávající šachty jsou v kolizi s novými panely a zasahují do stání. Proveden zápis v deníku o provedení a požadavcích SČVK.

Pol. rozp. č.162,163,164,121



12) Výškové upravení kanalizačních vpustí 5ks – položka není v rozpočtu

Pol. rozp. č. 146

13) Skládka beton a asfalt, nejsou položky v rozpočtu, a na to navazující přesuny hmot

Pol. rozp. č. 126, 131, 132, 133,135

14) Ve skladbě vozovky na straně autobusové zastávky ve směru (Koldům) byly nalezeny žulové kostky pod AB krytem cementovém loži. V místě bylo počítáno s podkladem z drčeného kameniva a zeminy. Je nutné vybourat z důvodu nových podkladních vrstev. Pol. rozp. č.

137,157,131,132,133

$17*1,5 + 80*0,5 = \underline{65,5m^2 + tn 38,383}$

**Měněpráce – odpočet původních vrstev z Pd a VV**



- 15) Ukončení chodníku – propoj mezi tramvají a silnicí (směr Koldům) budou vytrhány přechodové obruby, které jsou v dezolátním stavu a budou nahrazeny novými.

**15m**

Položka není v původním rozpočtu. Rozhodnuto až po konzultaci na místě s Panem Porcalem o výměně.

Pol. rozp. č. 167,168



- 16) **Méněpráce** - Nebude proveden vjezd na tramvajový pás. Po dohodě s DP a panem Porcalem, kvůli očekávané výluce tramvají a nadměrném zatížení obrub i nové zámkové dlažby.

Pol. rozp.č. 167,169,170,171,172,173



17) Schody v místě tramvajové zastávky mají být dle PD zachovány, ale jsou v nevyhovujícím stavu.

Pol. rozp.č. 182,183,184,185,186



18) Dodatečné dopravní značení 3x 30km/h

Pol. rozp. č..... 0 ....., NEBUDE ÚČTOVÁNO

19) Nový napínací sloup trolejového vedení + doprava

Pol. rozp. č. 174,175,176



## Změnový list - méněpráce

č.

2

stavba: Přestupní terminál , Citadela Litvínov  
- část 18067 - SO.01 - Komu - 18067

Datum : 03.12.2020

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

viz Příloha č. 1

Popis položky	cena celkem	Poznámka
1) práce prováděné dle položek z SOD - viz příl. položkový rozpočet	-222 985,17 Kč	
2) Práce prováděné dle nových položek - viz příl. položkový rozpočet (koef 1.13)	0,00 Kč	
cena celkem bez DPH	-222 985,17 Kč	
upravená cena bez DPH		

Vypracoval

Datum : 03.12.2020

Kontroloval

Datum : 8.12.2020

751

P.12.20

## ROZPOČET

Stavba: Přestupní terminál , Citadela Litvínov  
 Objekt: 18067 - SO.01 - Komunikac... Méněpráce I

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 25.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**1 Zemní práce -57 103,33 0,000**

147	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm - odečet pouze tl.10cm tj.1/2 plochy bourání asfaltu a betonu	m2	-428,475	35,00	-14 996,63	0,000
124	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	-203,000	75,10	-15 245,30	0,000
148	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	-52,773	239,00	-12 612,75	0,000
150	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-94,991	150,00	-14 248,65	0,000

**5 Komunikace -4 781,84 -0,598**

170	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-5,768	115,00	-663,32	0,000
171	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-5,768	145,00	-836,36	0,000
172	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-5,768	253,00	-1 459,30	-0,598
173	BET.K08C01	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm přírodní	m2	-6,056	301,00	-1 822,86	0,000

**767 Konstrukce zámečnické -160 000,00 0,000**

144	767995999R 1	Zastávka autobusová 3 segmenty 3930x2430x1530, žárové zinkováno	kus	-2,000	80 000,00	-160 000,00	0,000
-----	-----------------	---	-----	--------	-----------	-------------	-------

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -1 100,00 7,596**

169	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-10,000	110,00	-1 100,00	0,000
-----	----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

**Celkem bez DPH**

**-222 985,17**



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/11253/20

Smlouva o dílo: Přestupní terminál Citadela v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	09.12.2020	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	09.12.2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	09.12.2020	Ing. Romana Švarcová	ekonomka OIRR	
Právní oddělení:	09.12.2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	16.12.2020	Číslo usnesení:	R/4262/58	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	gestor	
