



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo

č.j. Objednatele HSJI-1495-153/E-2018

č.j. Zhotovitele 201807201/1165/18/PS, AV.19005.1.110

uzavřené podle ust. § 2486 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „dodatek smlouvy“)

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**

Se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava  
Zastoupená: plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina  
IČO: 70885184  
Bankovní spojení, č.ú. : Česká národní banka; 15032881/0710  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  
Tel.:  
E-mail:  
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel

**Společníci společnosti**

**IMOS + GEOSAN + Zlínstav – výstavba CPS Havlíčkův Brod**

společnost založená na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2019 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a

správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený

e-mail

telefon

fax

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., č. ú.: 17018733/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: ředitel Závodu Brno - PS



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211.

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zastoupený

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459.

a

Třetí společník: Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5743.

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## Článek 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV. (Specifikace díla), odst. 10. Smlouvy o dílo na základě žádosti Zhotovitele o souhlas se změnou osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění v čl. IV., odst. 10 Smlouvy následující:

Osoba hlavního stavbyvedoucího – číslo autorizace se mění a nahrazuje osobou číslo autorizace

Smluvní strany potvrzují, že současně se žádostí o změnu byly předloženy doklady, které prokazují splnění kvalifikace prostřednictvím této autorizované osoby v rozsahu, kterým byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.



4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři obdrží zhotovitel.

V Jihlavě dne 28. 05. 2019

Za Objednatele:

V Brně dne 28. 05. 2019

Za Zhotovitele:

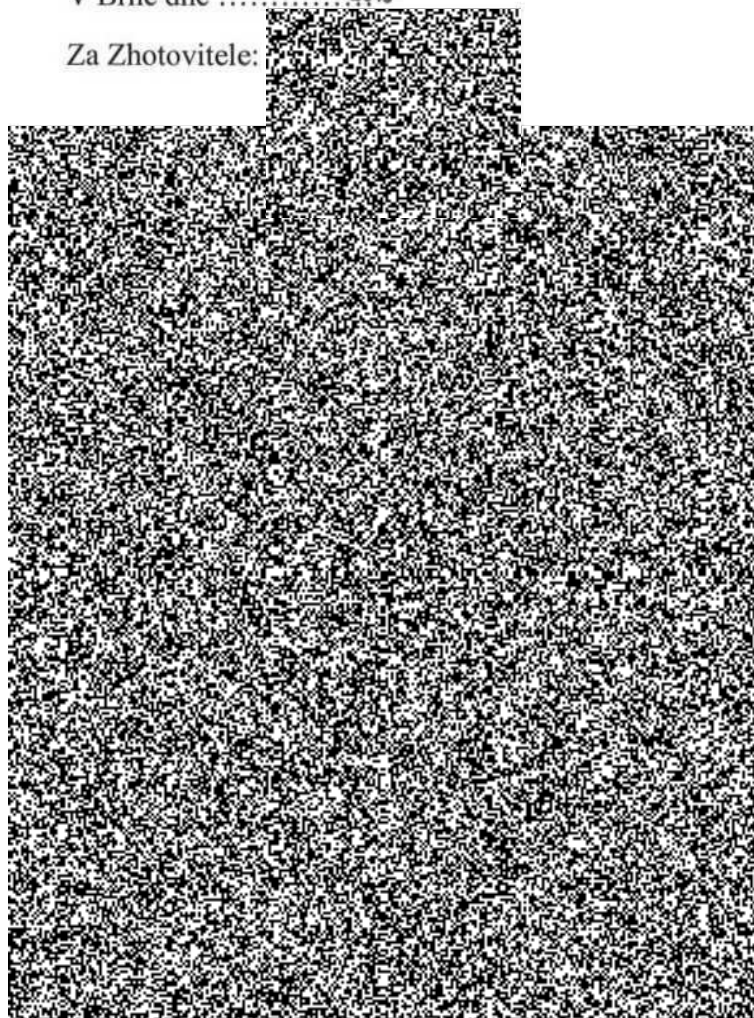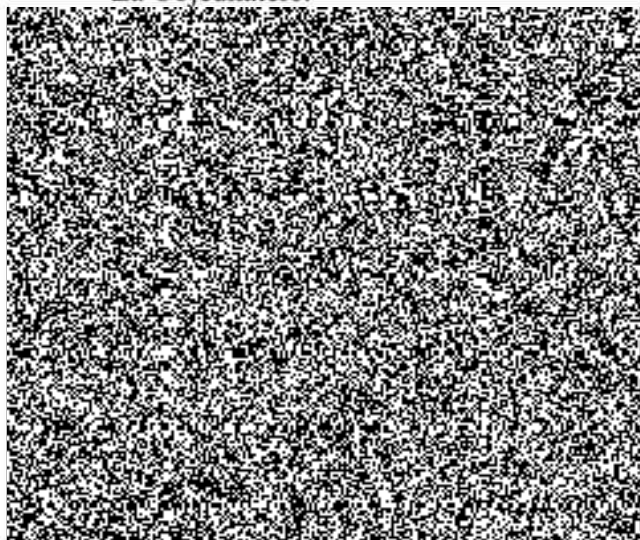



## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

č.j. Objednatele HSJI-1495-153/E-2018

č.j. Zhotovitele 201807201/1165/18/PS, AV.19005.1.110

uzavřené podle ust. § 2486 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**

Se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava  
Zastoupená: plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina  
IČO: 708 85 184  
DIČ: CZ70885184 (není plátce)  
Bankovní spojení, č.ú: Česká národní banka; 15032881/0710  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  
Tel.:  
E-mail:  
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

**Společníci společnosti**

**IMOS + GEOSAN + Zlínstav – výstavba CPS Havlíčkův Brod**

společnost založená na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2019 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

e-mail:

telefon:

fax:

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., č. ú.: 17018733/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211.

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zastoupený:

IČO: 281 69 522



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

DIČ: CZ28169522

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459.

a

Třetí společník: Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený: 

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5743.

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019 je změna sjednaného předmětu díla spočívající v provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce (tzv. vícepráce). Současně se strany dohodly na zúžení předmětu díla o stavební práce, které nebudou provedeny (tzv. méněpráce).

Předmět díla se tak mění v rozsahu stavebních prací, jejichž výčet a rozsah včetně ocenění je uveden v příloze tohoto dodatku označeném jako „Změnový položkový rozpočet“. V důsledku popsané změny sjednaného předmětu díla se současně mění celková cena díla. S ohledem na výše uvedené změny předmětu díla se v souladu s čl. VII. odst. 15. Smlouvy o dílo níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo mění takto:

**Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 1.** se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla se sjednává takto:

**Cena díla bez DPH: 216 924 772,84 Kč**

**DPH 21% : 45 554 202,30 Kč**

**Cena díla celkem s DPH činí: 262 478 975,14 Kč**

Slovy: Dvě stě šedesát dva milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc devět set sedmdesát pět korun českých a čtrnáct haléřů.

### Rekapitulace ceny díla ke dni uzavření smlouvy:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH: 217 851 067,00 Kč

DPH 21%: 45 748 724,00 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 263 599 791,00 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH: 924 879,78 Kč

Cena méněprací bez DPH: 1 851 173,94 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: - 926 294,16 Kč






### Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy - registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.


Příloha: Změnový položkový rozpočet

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

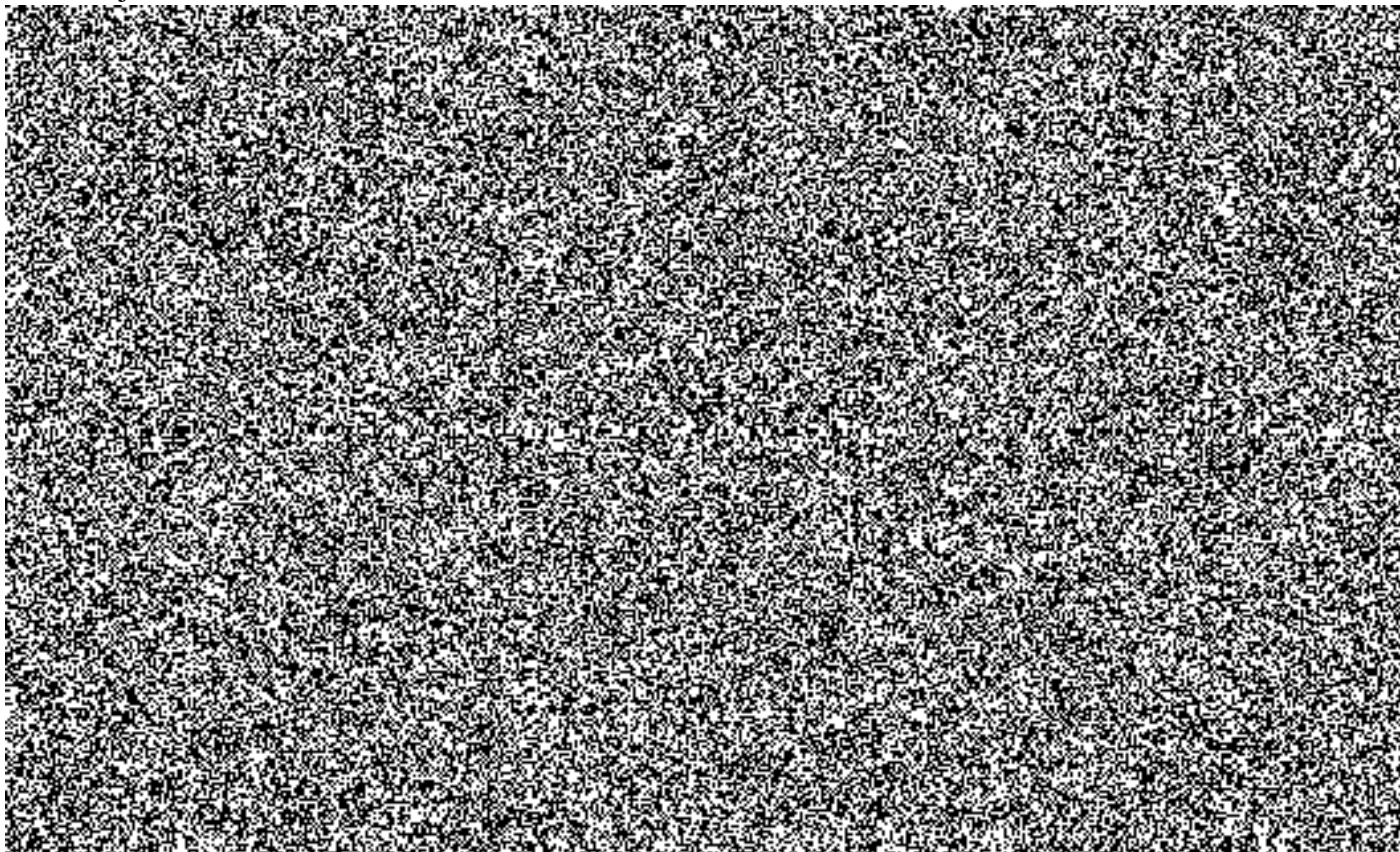


**Položkový soupis prací a dodávek**

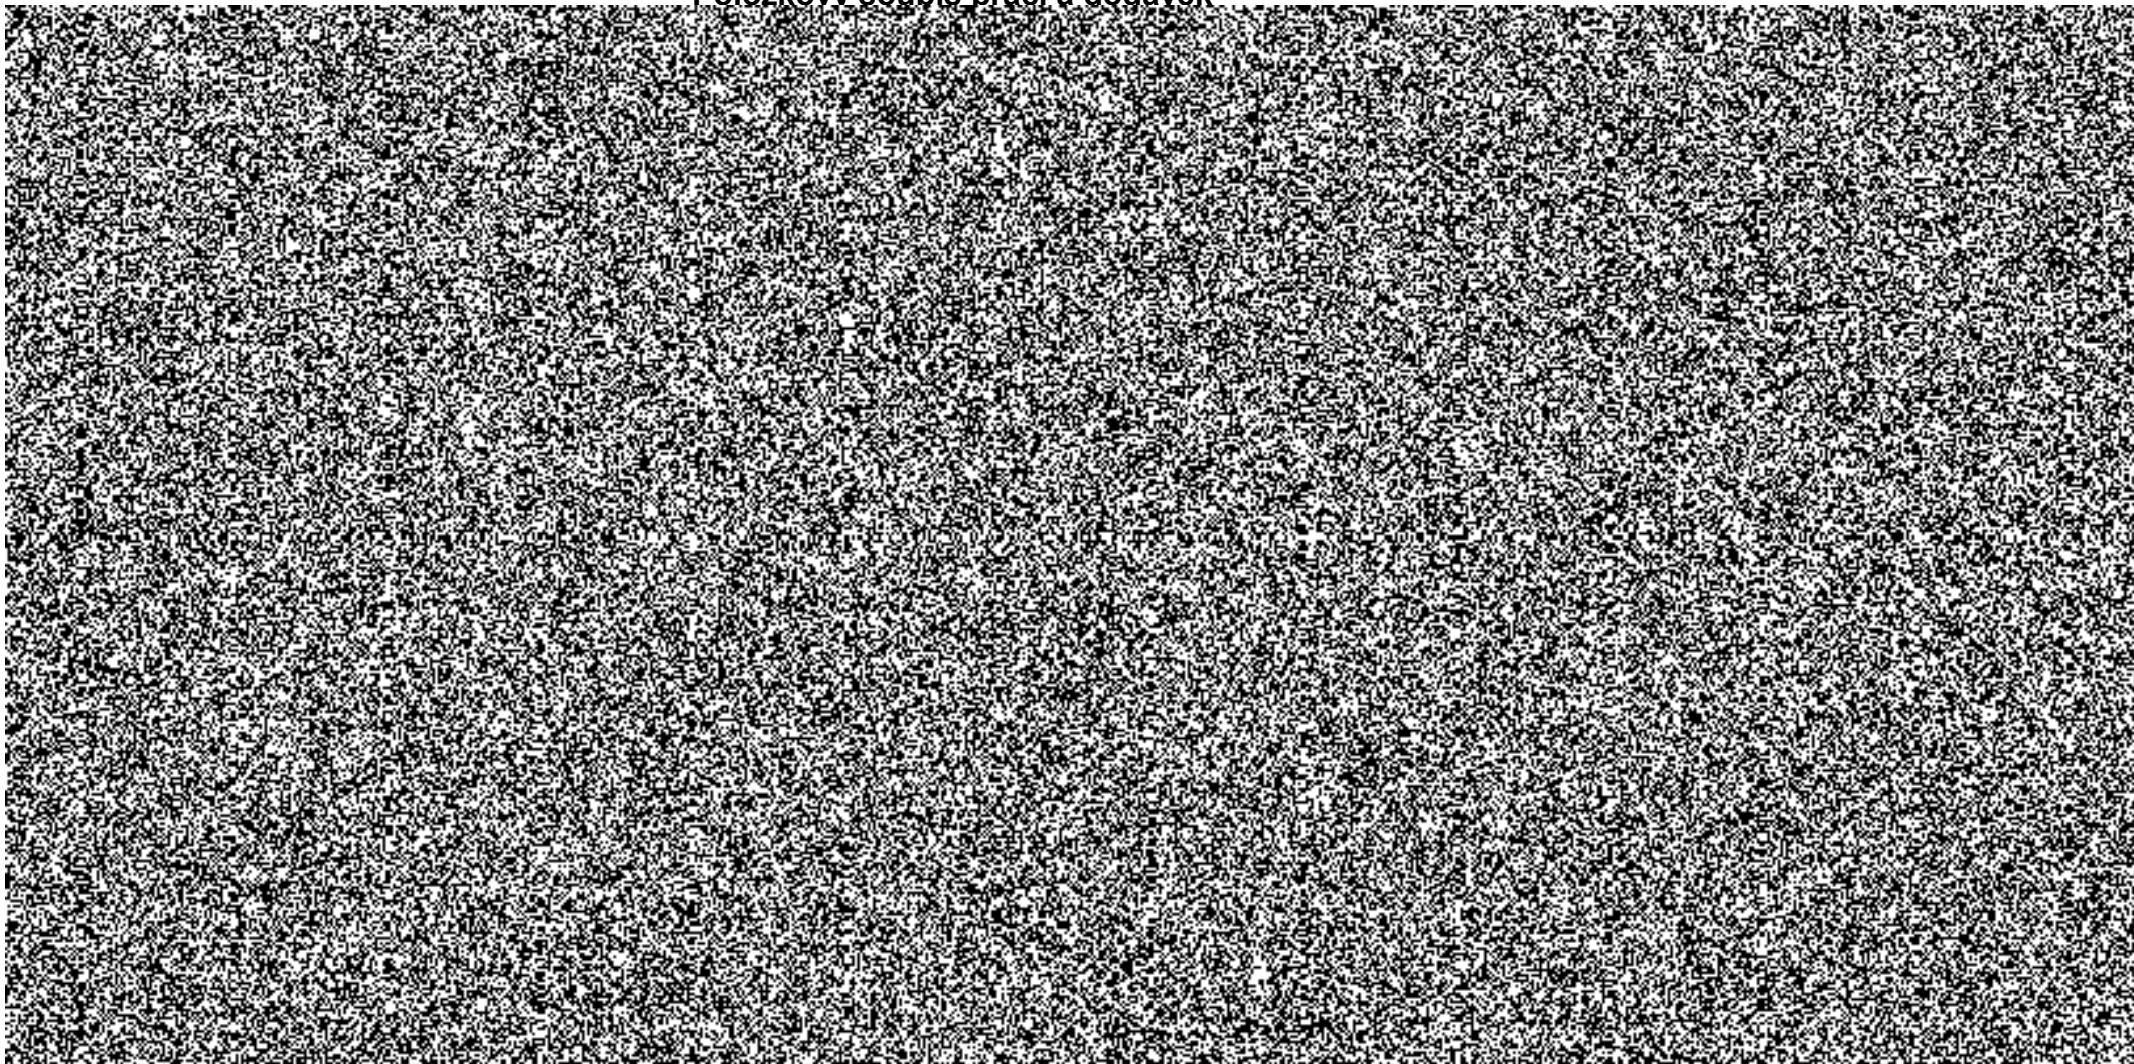




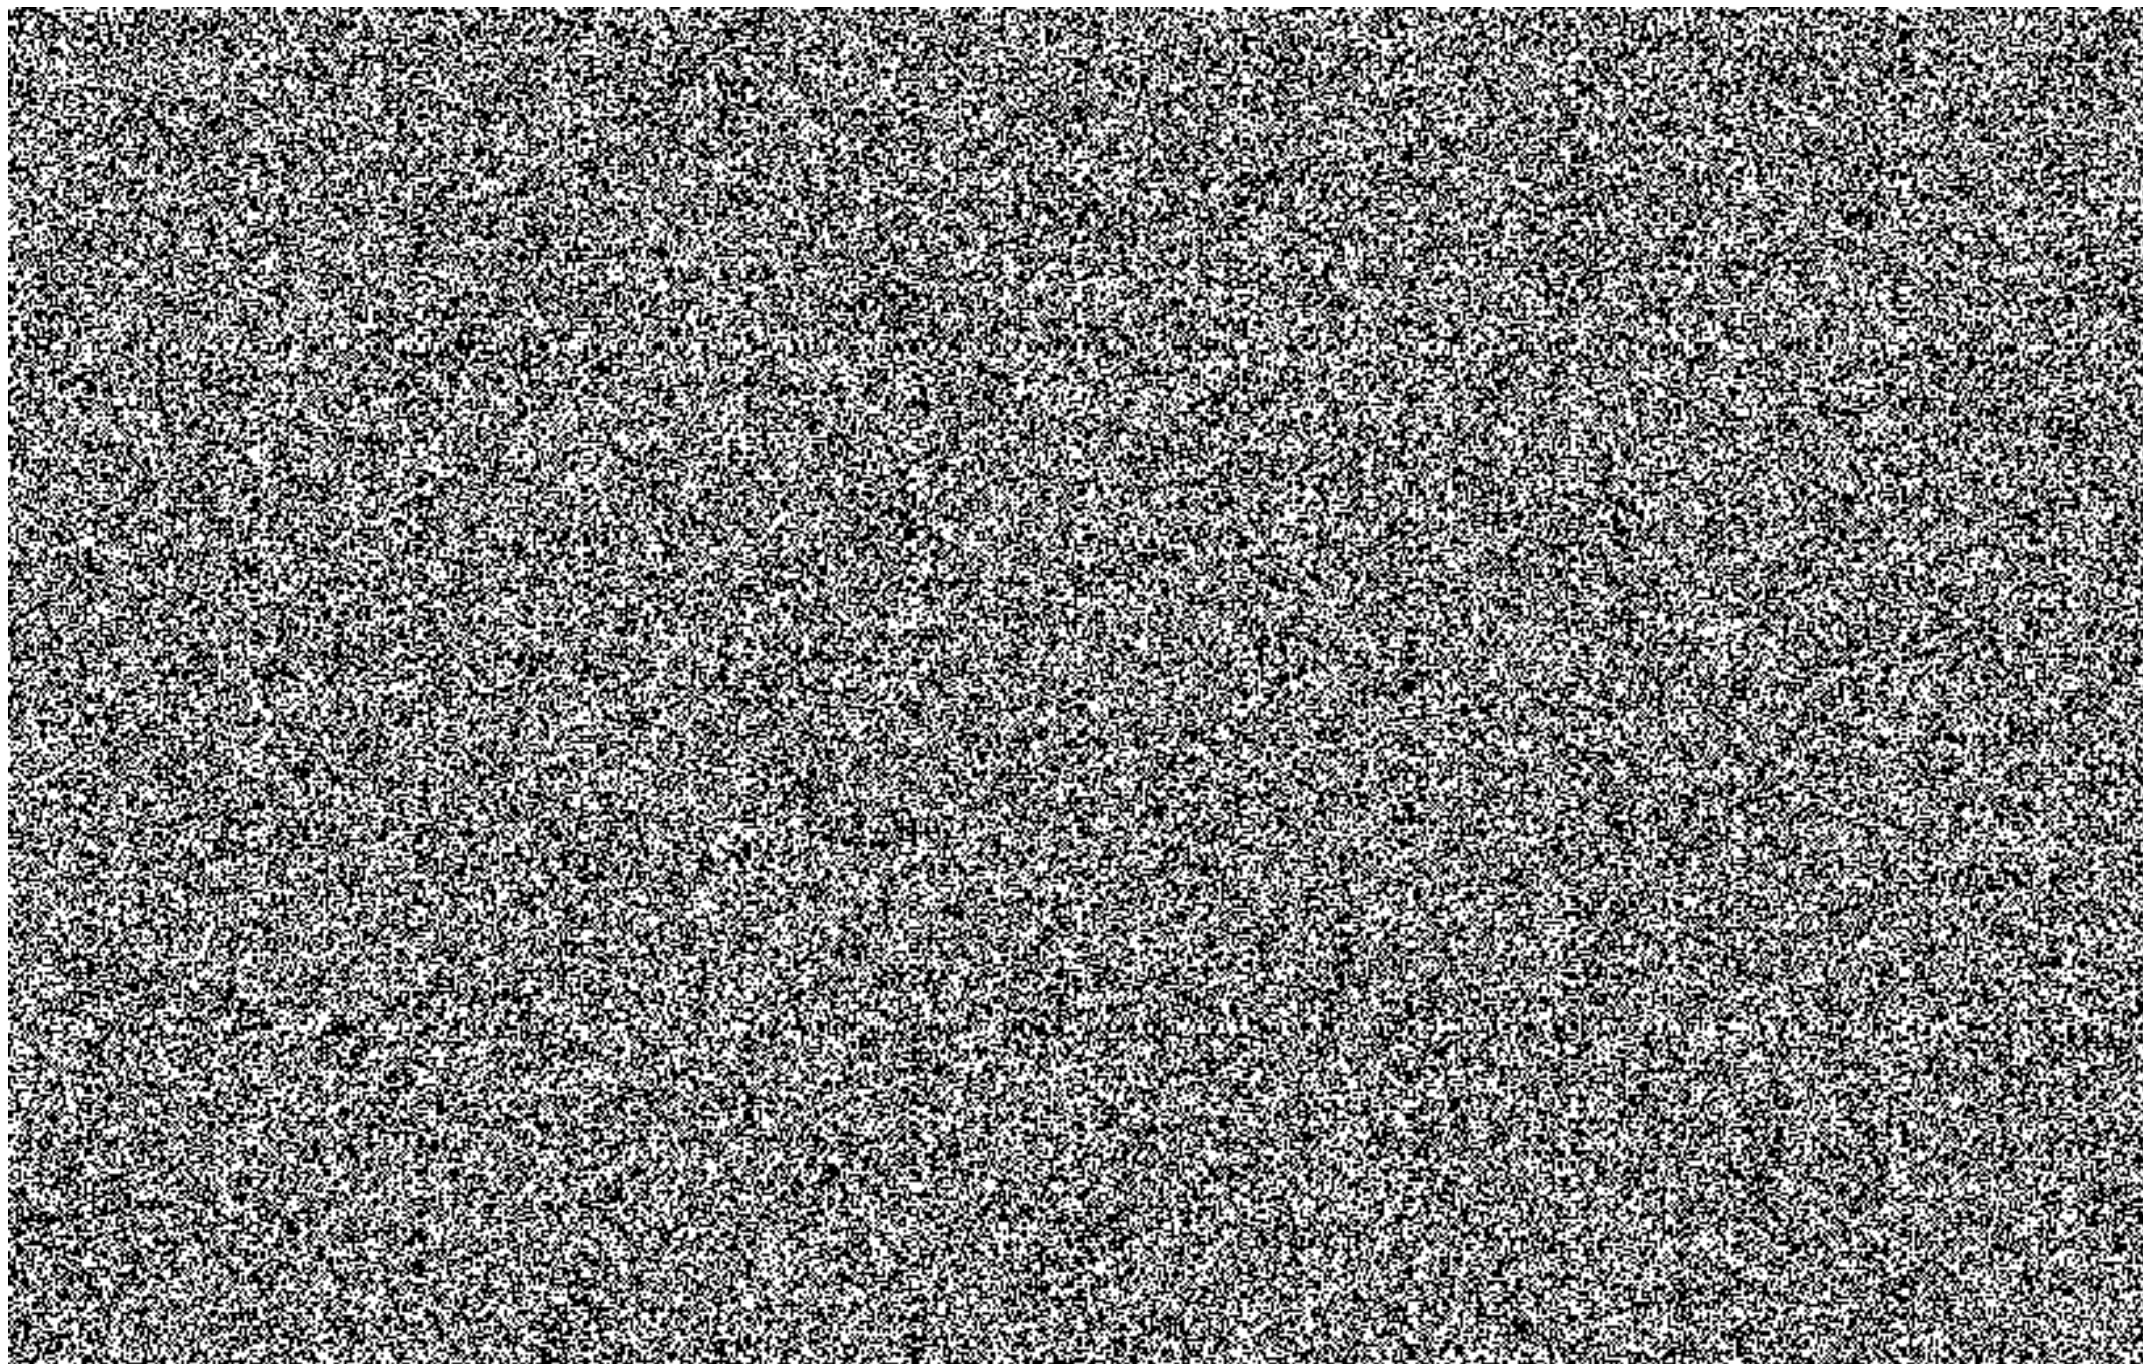





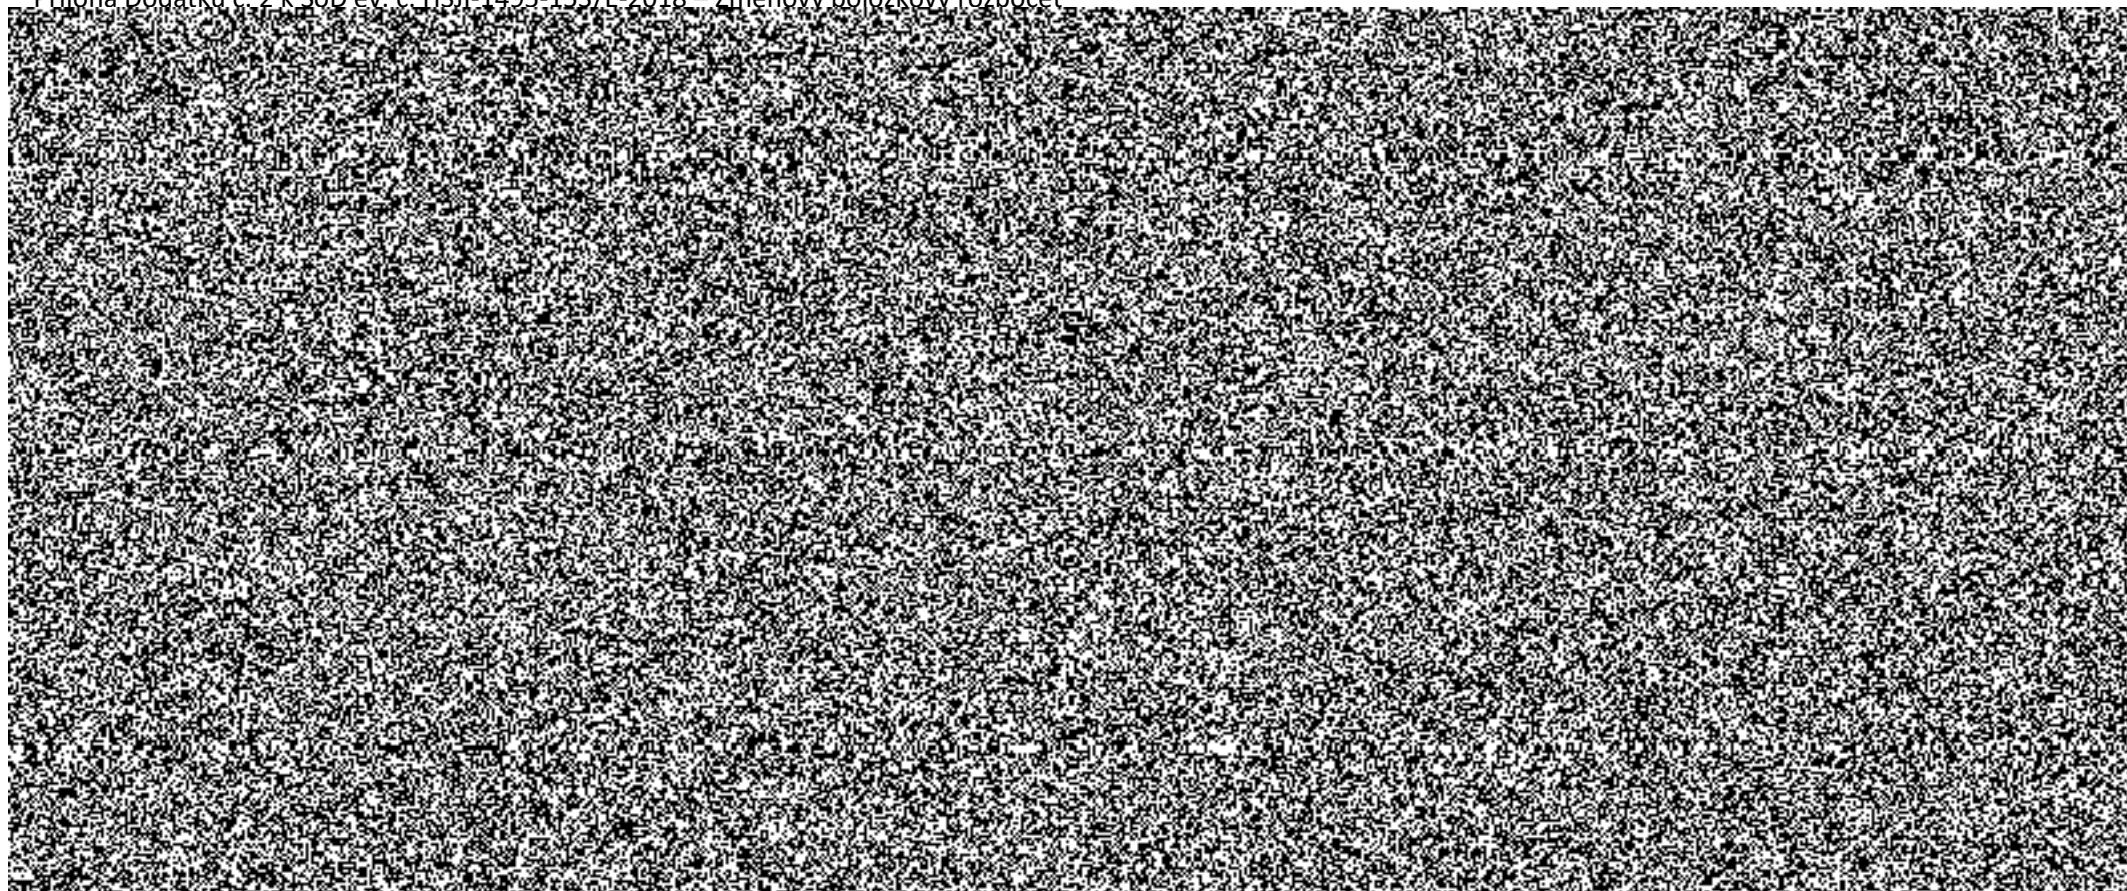

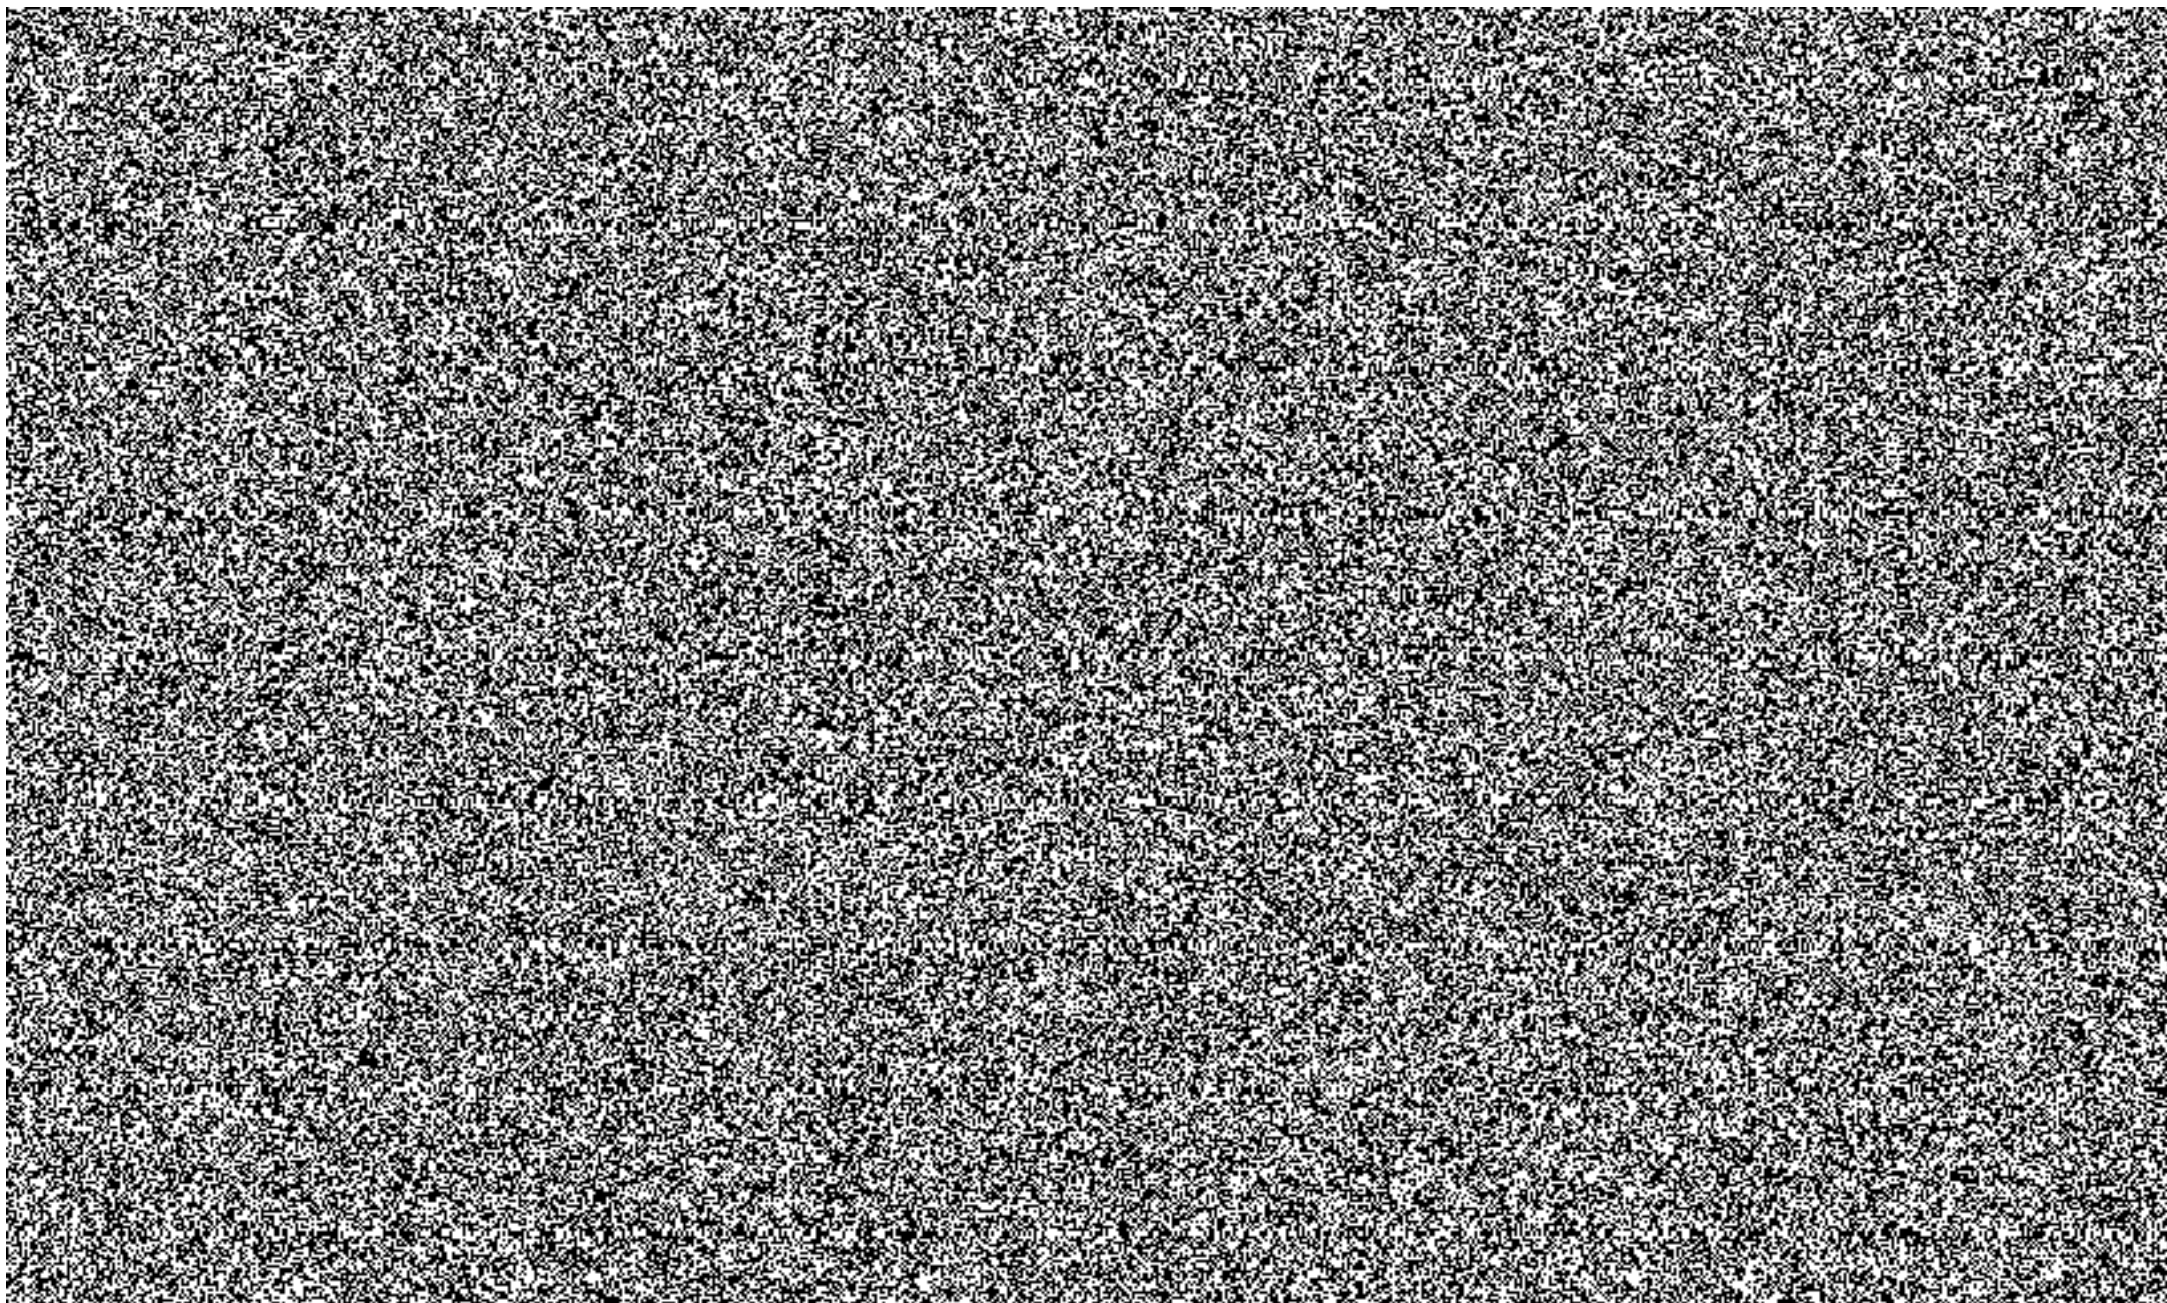





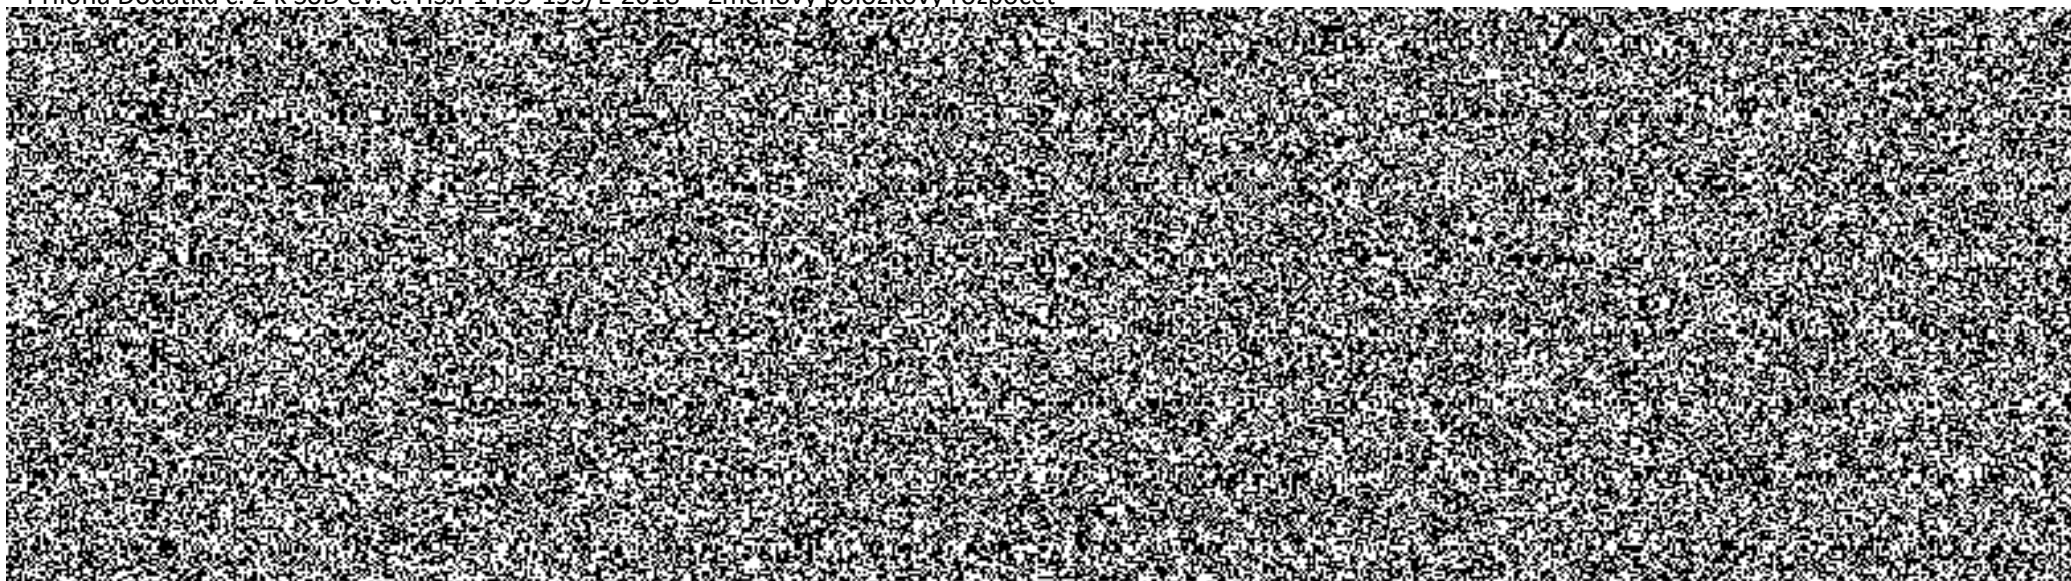

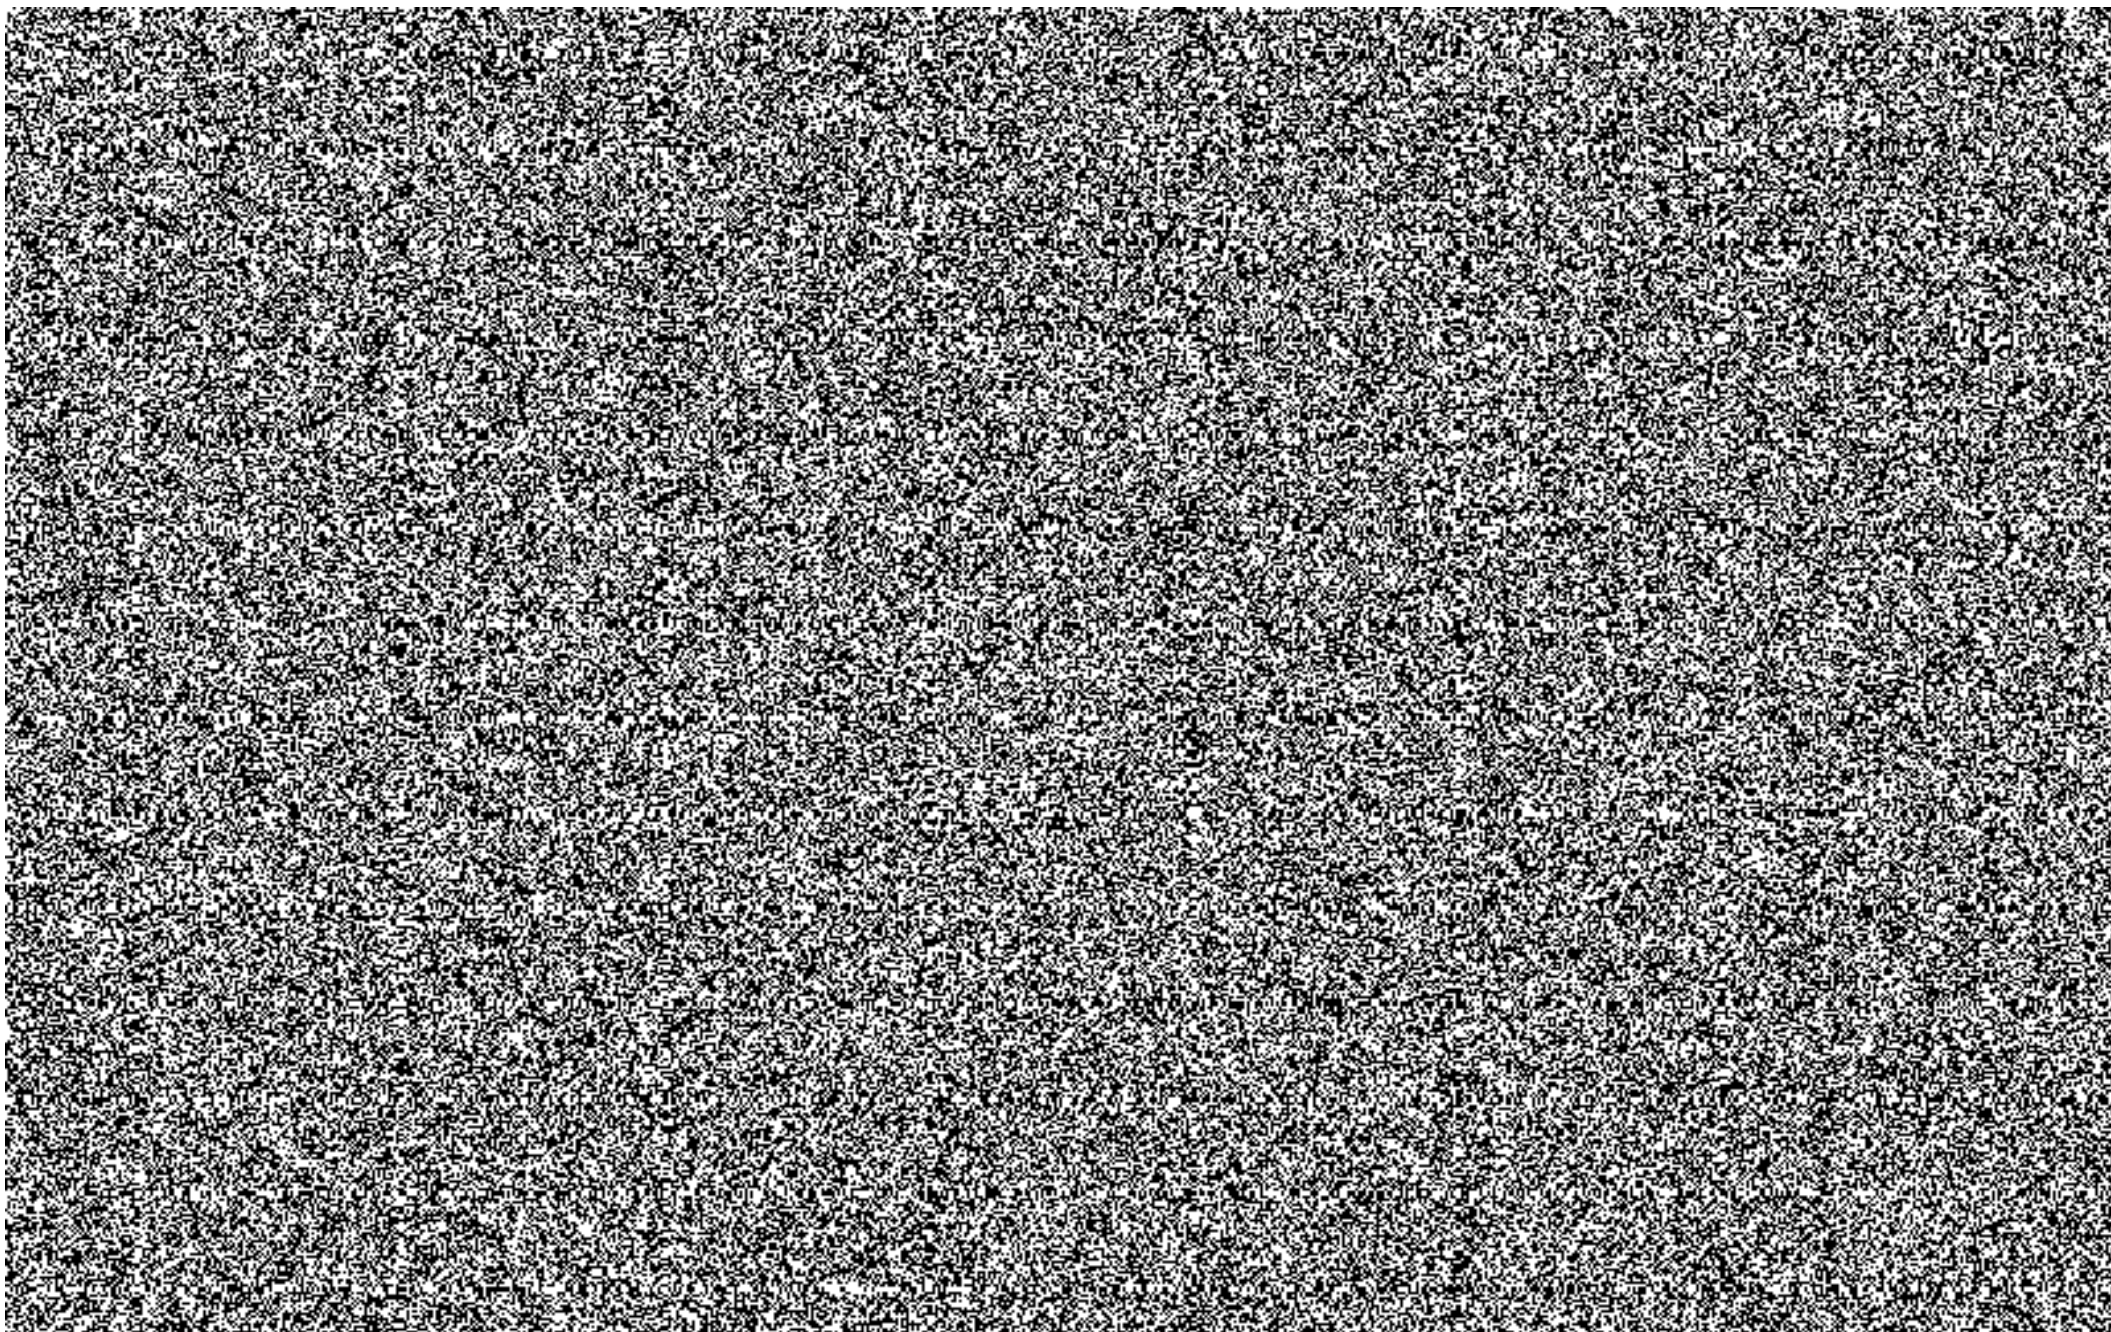



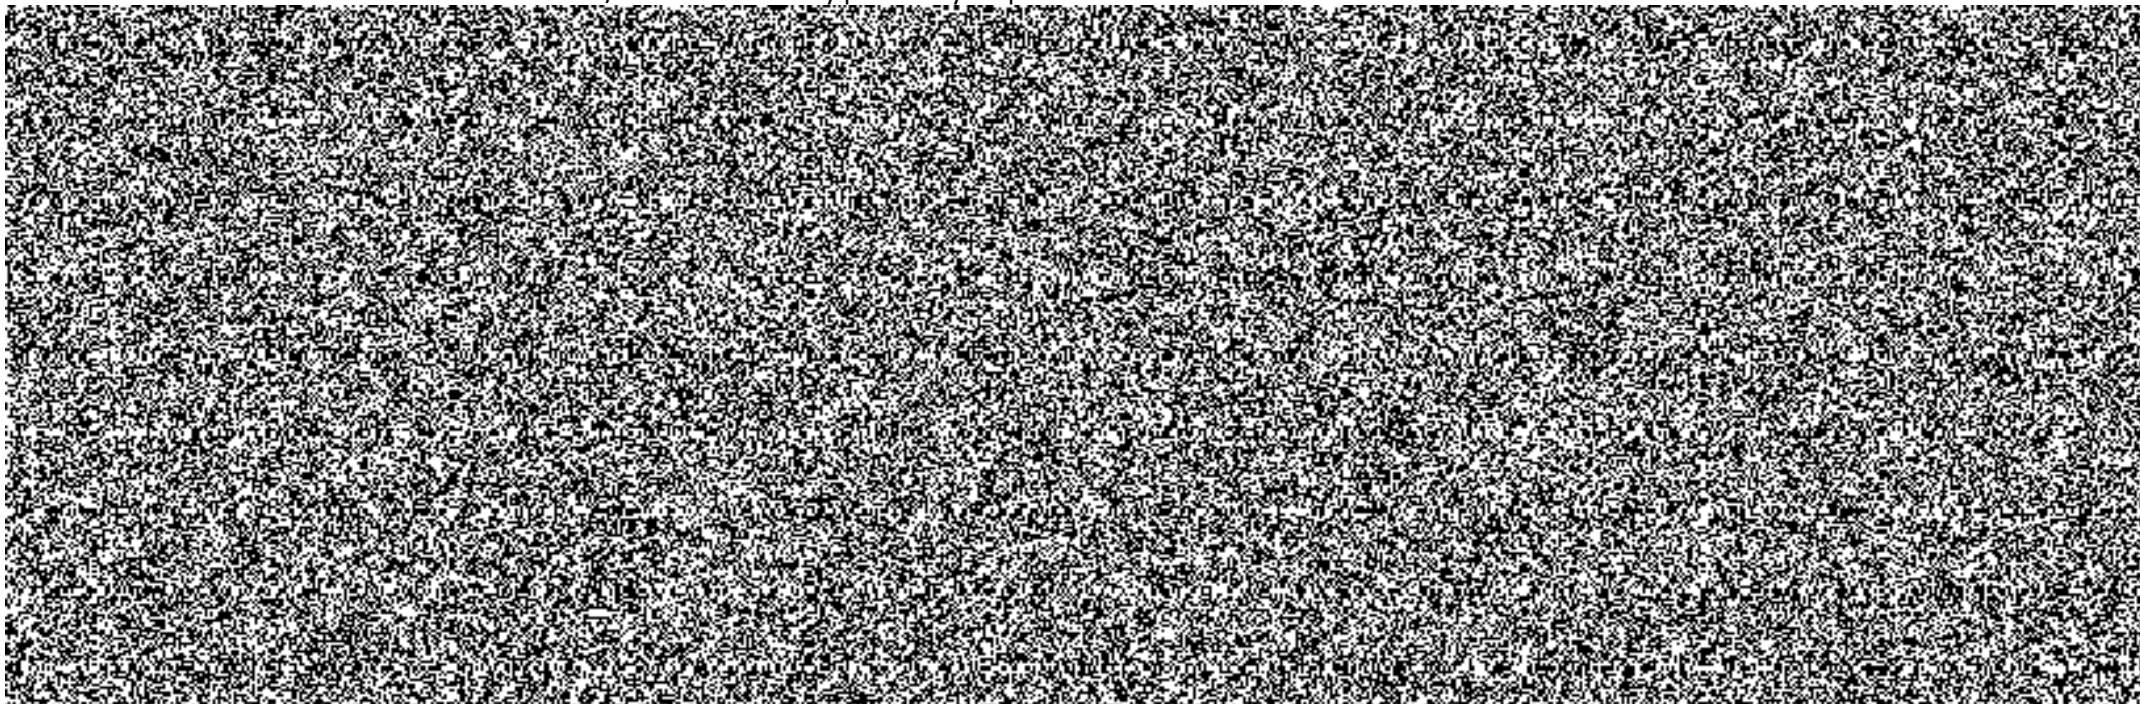

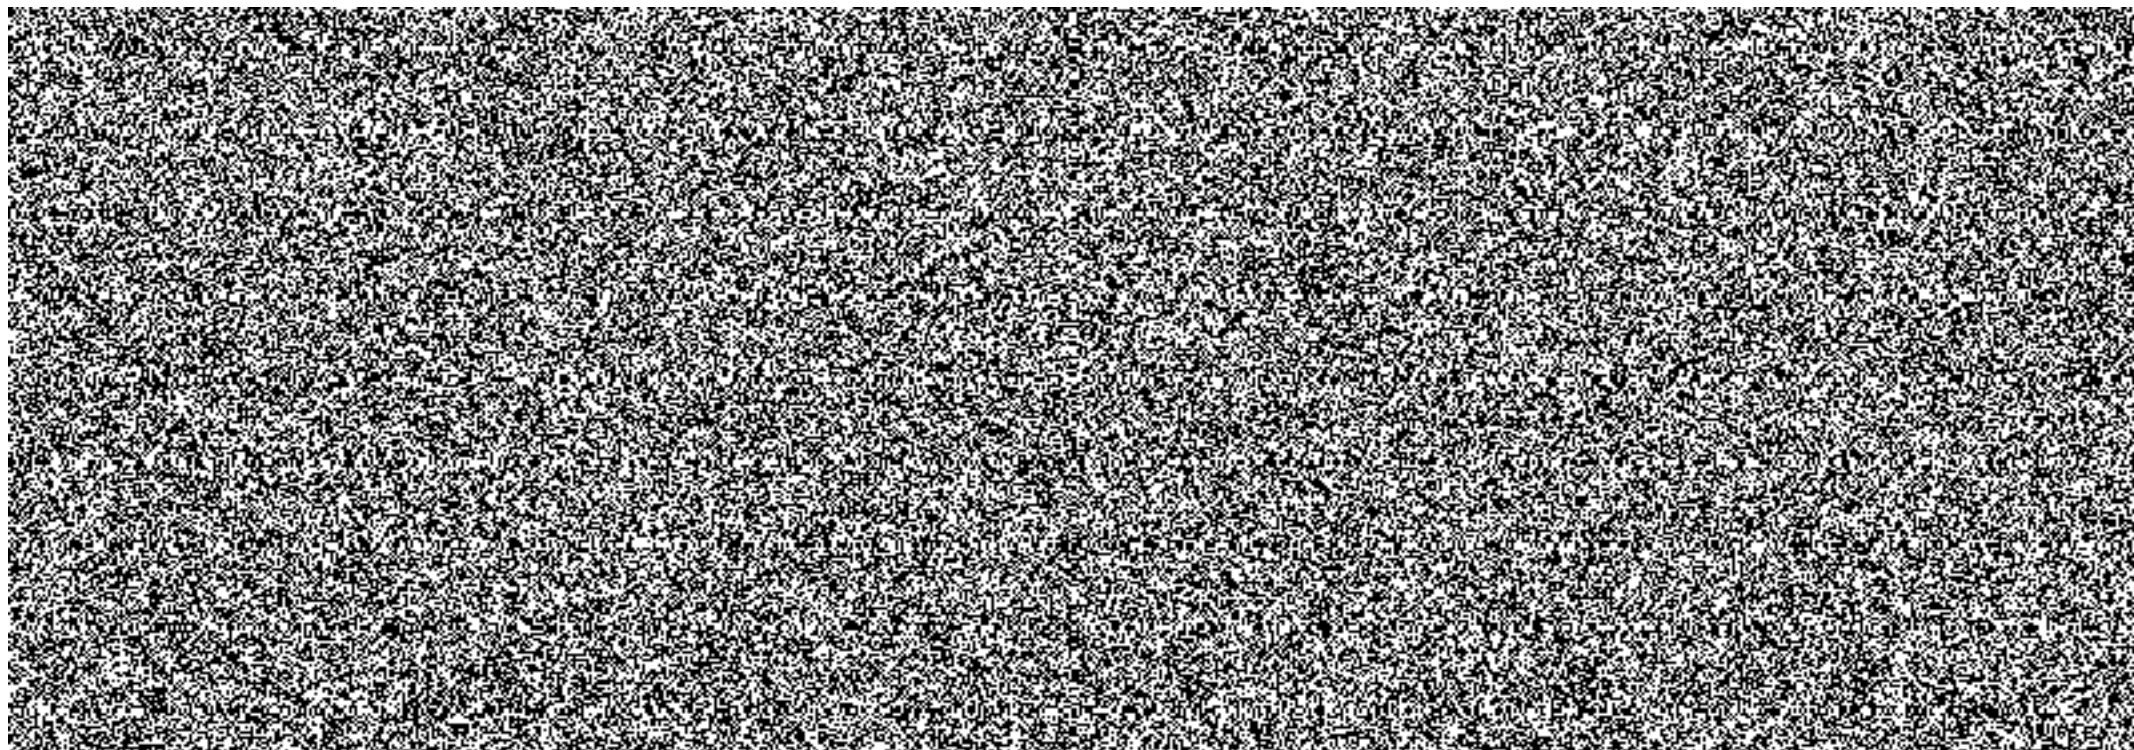





## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

č.j. Objednatele HSJI-1495-153/E-2018

č.j. Zhotovitele 201807201/1165/18/PS, AV.19005.1.110

uzavřené podle ust. § 2486 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**

Se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava  
Zastoupená: plk. Mgr. Jirí Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina  
IČO: 708 85 184  
DIČ: CZ70885184 (není plátce)  
Bankovní spojení, č.ú: Česká národní banka; 15032881/0710  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  
Tel.:  
E-mail:  
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)



#### 2. Zhotovitel:

**Společníci společnosti**

**IMOS + GEOSAN + Zlínstav – výstavba CPS Havlíčkův Brod**

společnost založená na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2019 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

e-mail:

telefon:

fax: +420 548 129 390 2

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., č. ú.: 17018733/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211.

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zastoupený:

IČO: 281 69 522



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

DIČ: CZ28169522

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459.

a

Třetí společník: Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený: 

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5743.

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019 je změna sjednaného předmětu díla spočívající v provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce (tzv. vícepráce). Současně se strany dohodly na zúžení předmětu díla o stavební práce, které nebudou provedeny (tzv. méněpráce).

Předmět díla se tak mění v rozsahu stavebních prací, jejichž výčet a rozsah včetně ocenění je uveden v příloze tohoto dodatku označeném jako „Změnový položkový rozpočet“. V důsledku popsání změny sjednaného předmětu díla se současně mění celková cena díla. S ohledem na výše uvedené změny předmětu díla se v souladu s čl. VII. odst. 15. Smlouvy o dílo níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo mění takto:

**Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 1.** se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla se sjednává takto:

**Cena díla bez DPH: 216 813 556,35 Kč**

**DPH 21% : 45 530 846,84 Kč**

**Cena díla celkem s DPH činí: 262 344 403,19 Kč**

Slovy: Dvě stě šedesát dva milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta tři korun českých a devatenáct haléřů.

### Rekapitulace ceny díla ke dni uzavření smlouvy:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH: 216 924 772,84 Kč

DPH 21%: 45 554 202,30 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 262 478 975,14 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 3:

Cena víceprací bez DPH: 226 045,14 Kč

Cena méněprací bez DPH: 337 261,63 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: - 111 216,49 Kč





### Článek 3 Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy - registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: Změnový položkový rozpočet

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

**Změnový výkaz výměr č. 01 - Dodávka a montáž samozavíračů**

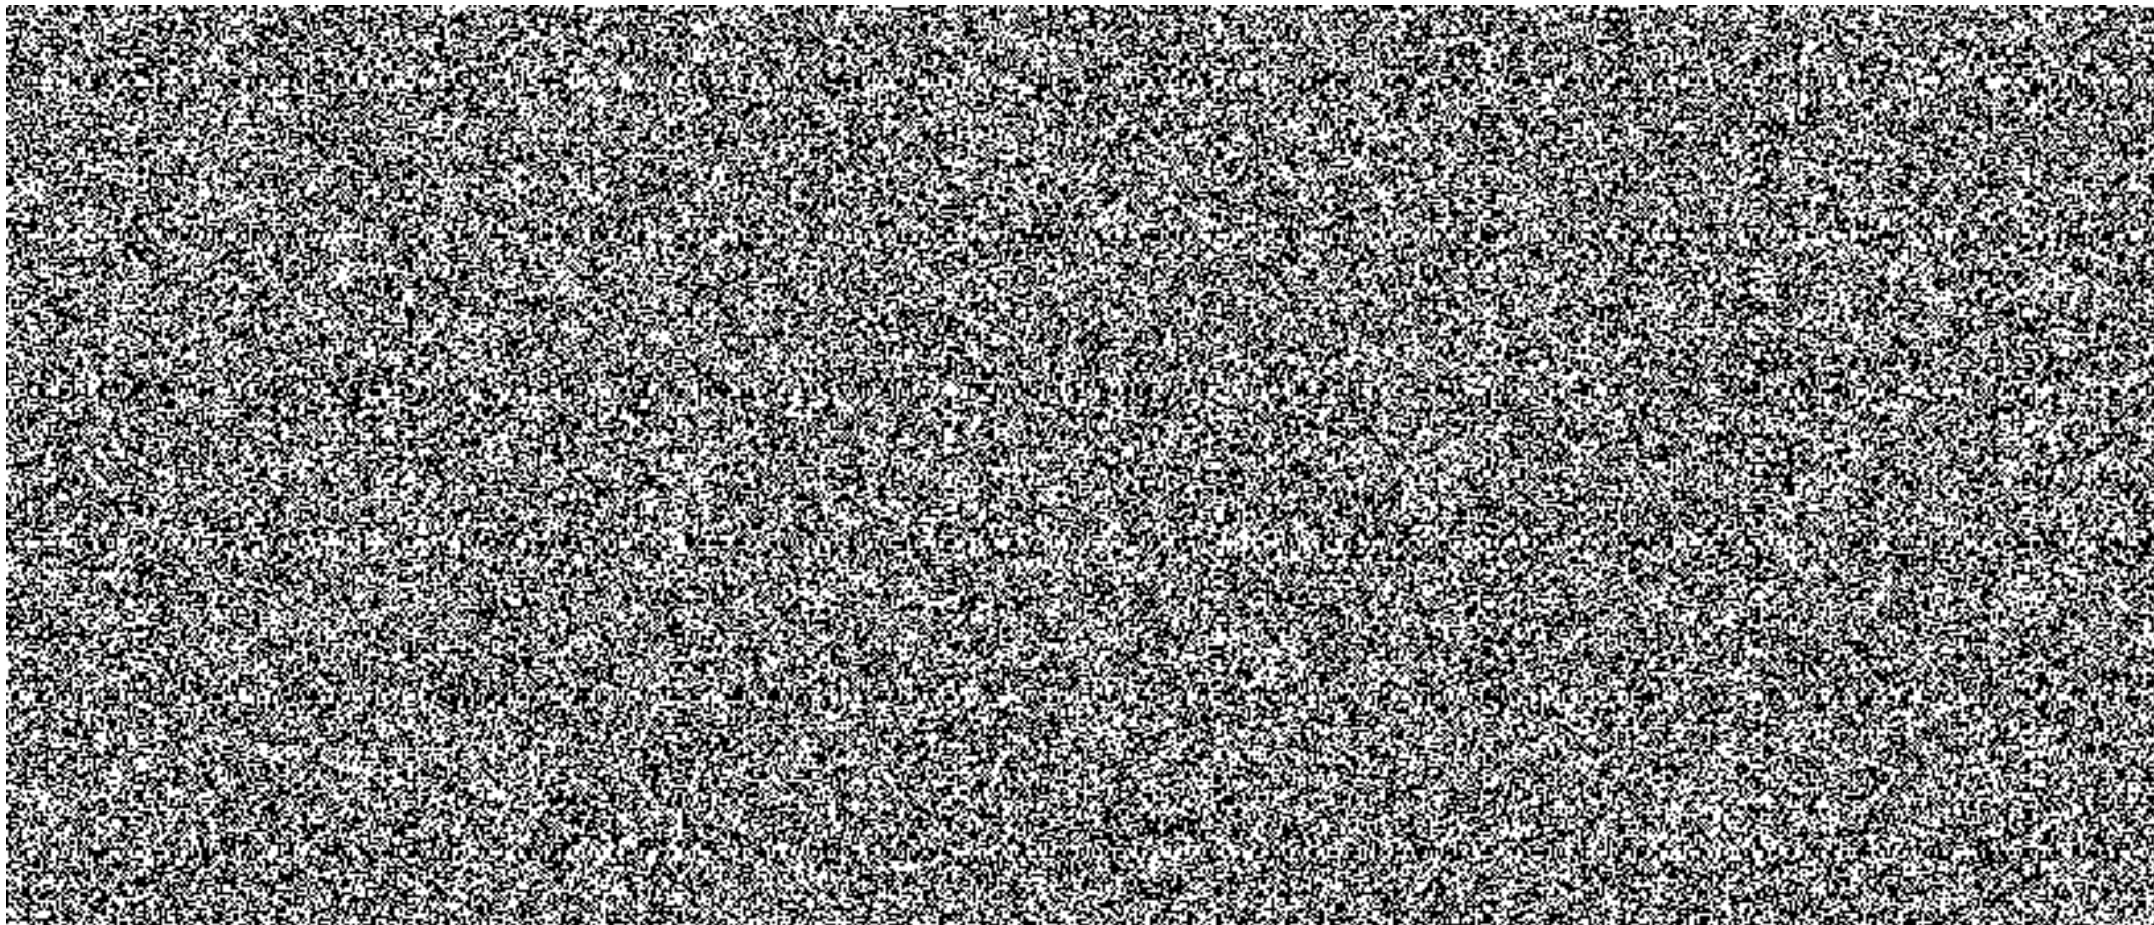




**Změnový výkaz výměr č. 02 - změna regulátorů průtoku vzduchu**

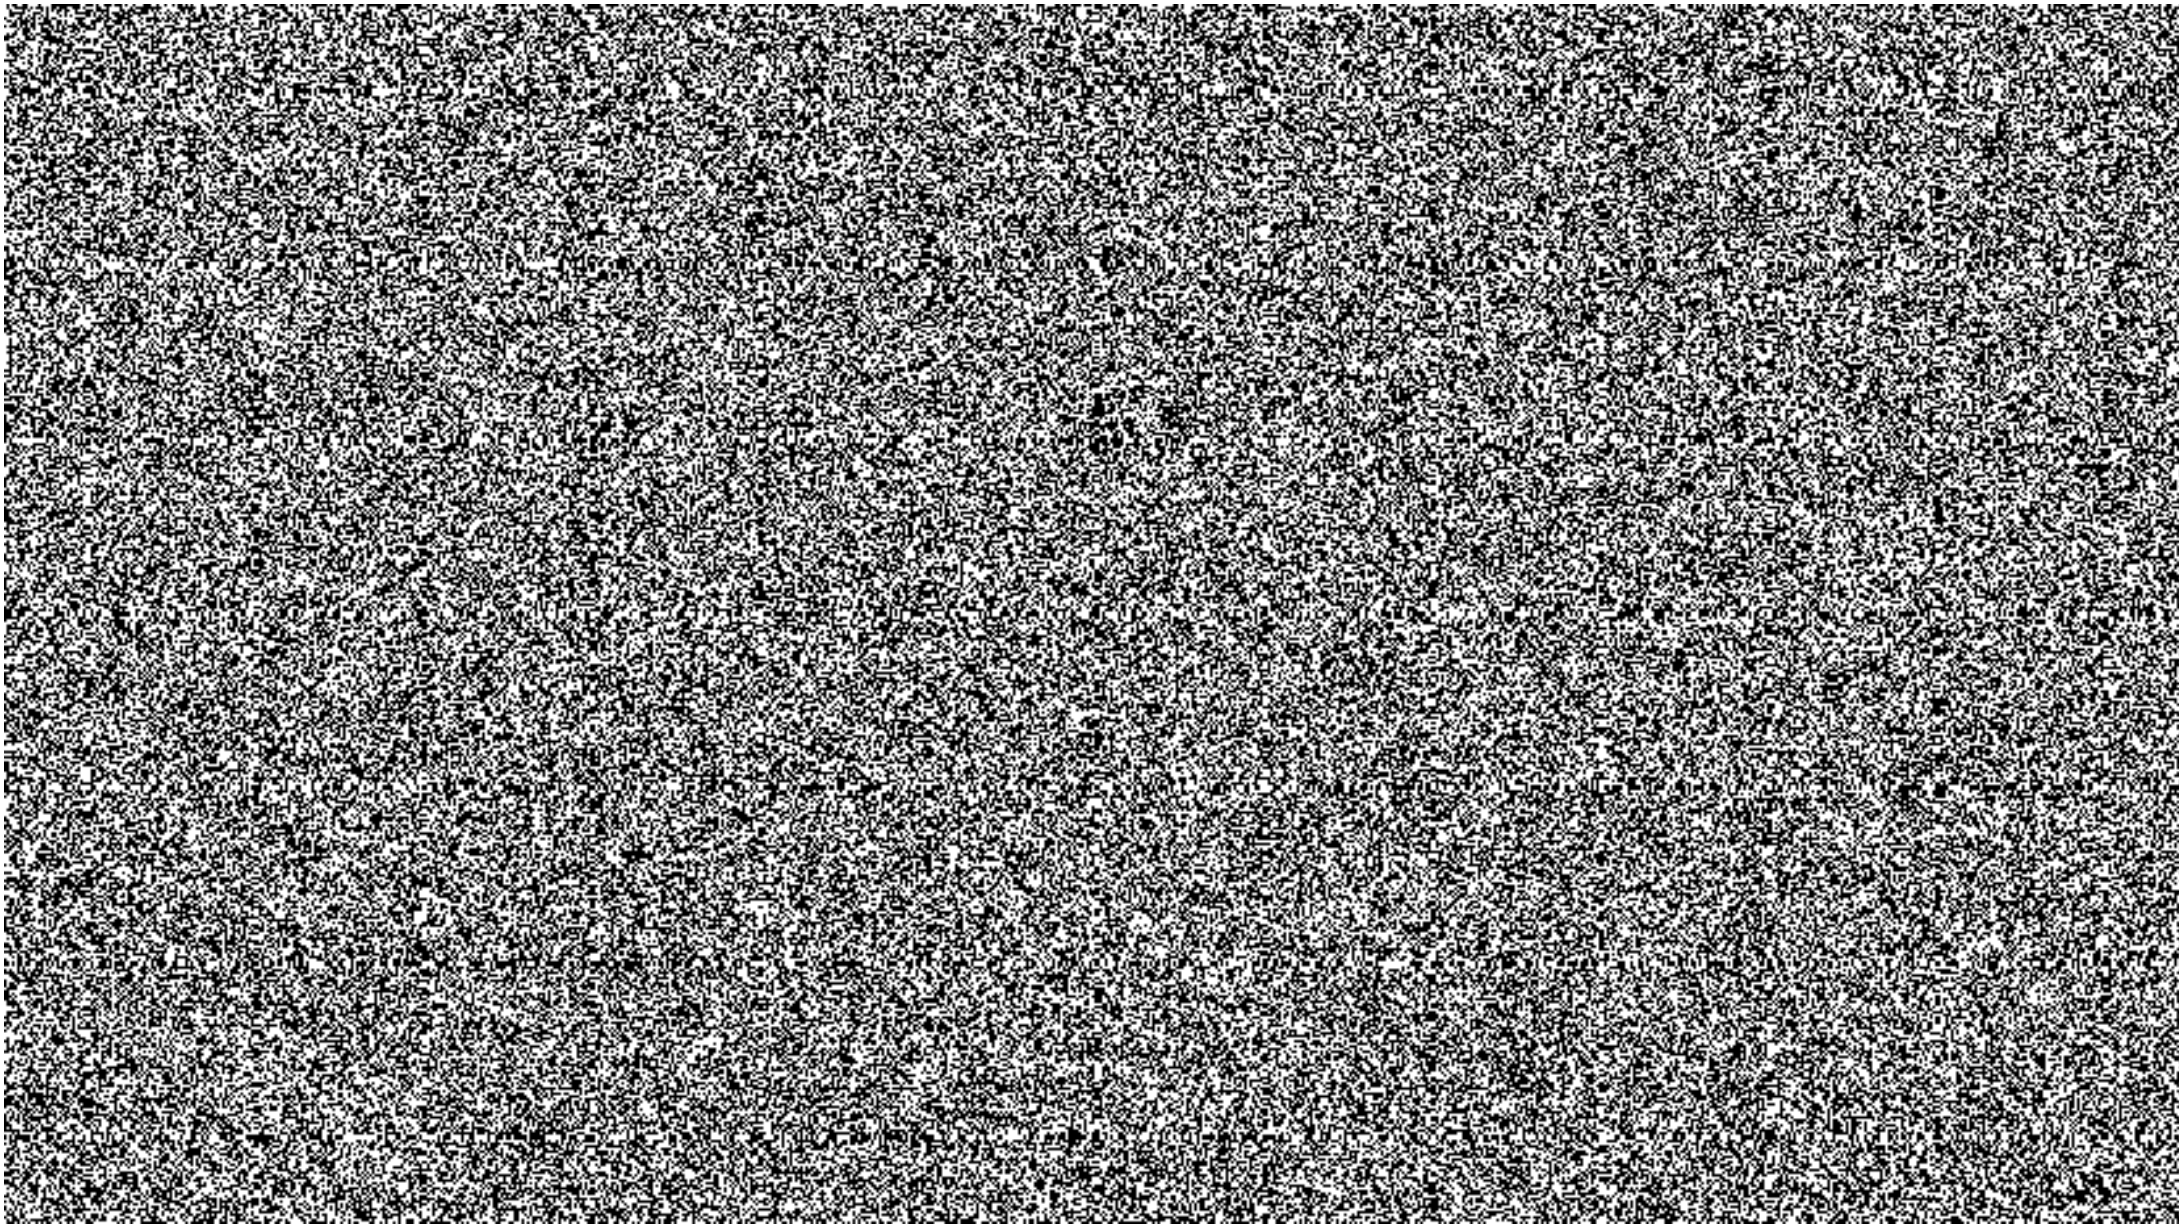




**Změnový výkaz výměr č. 03 - Změna umístění sušičky**

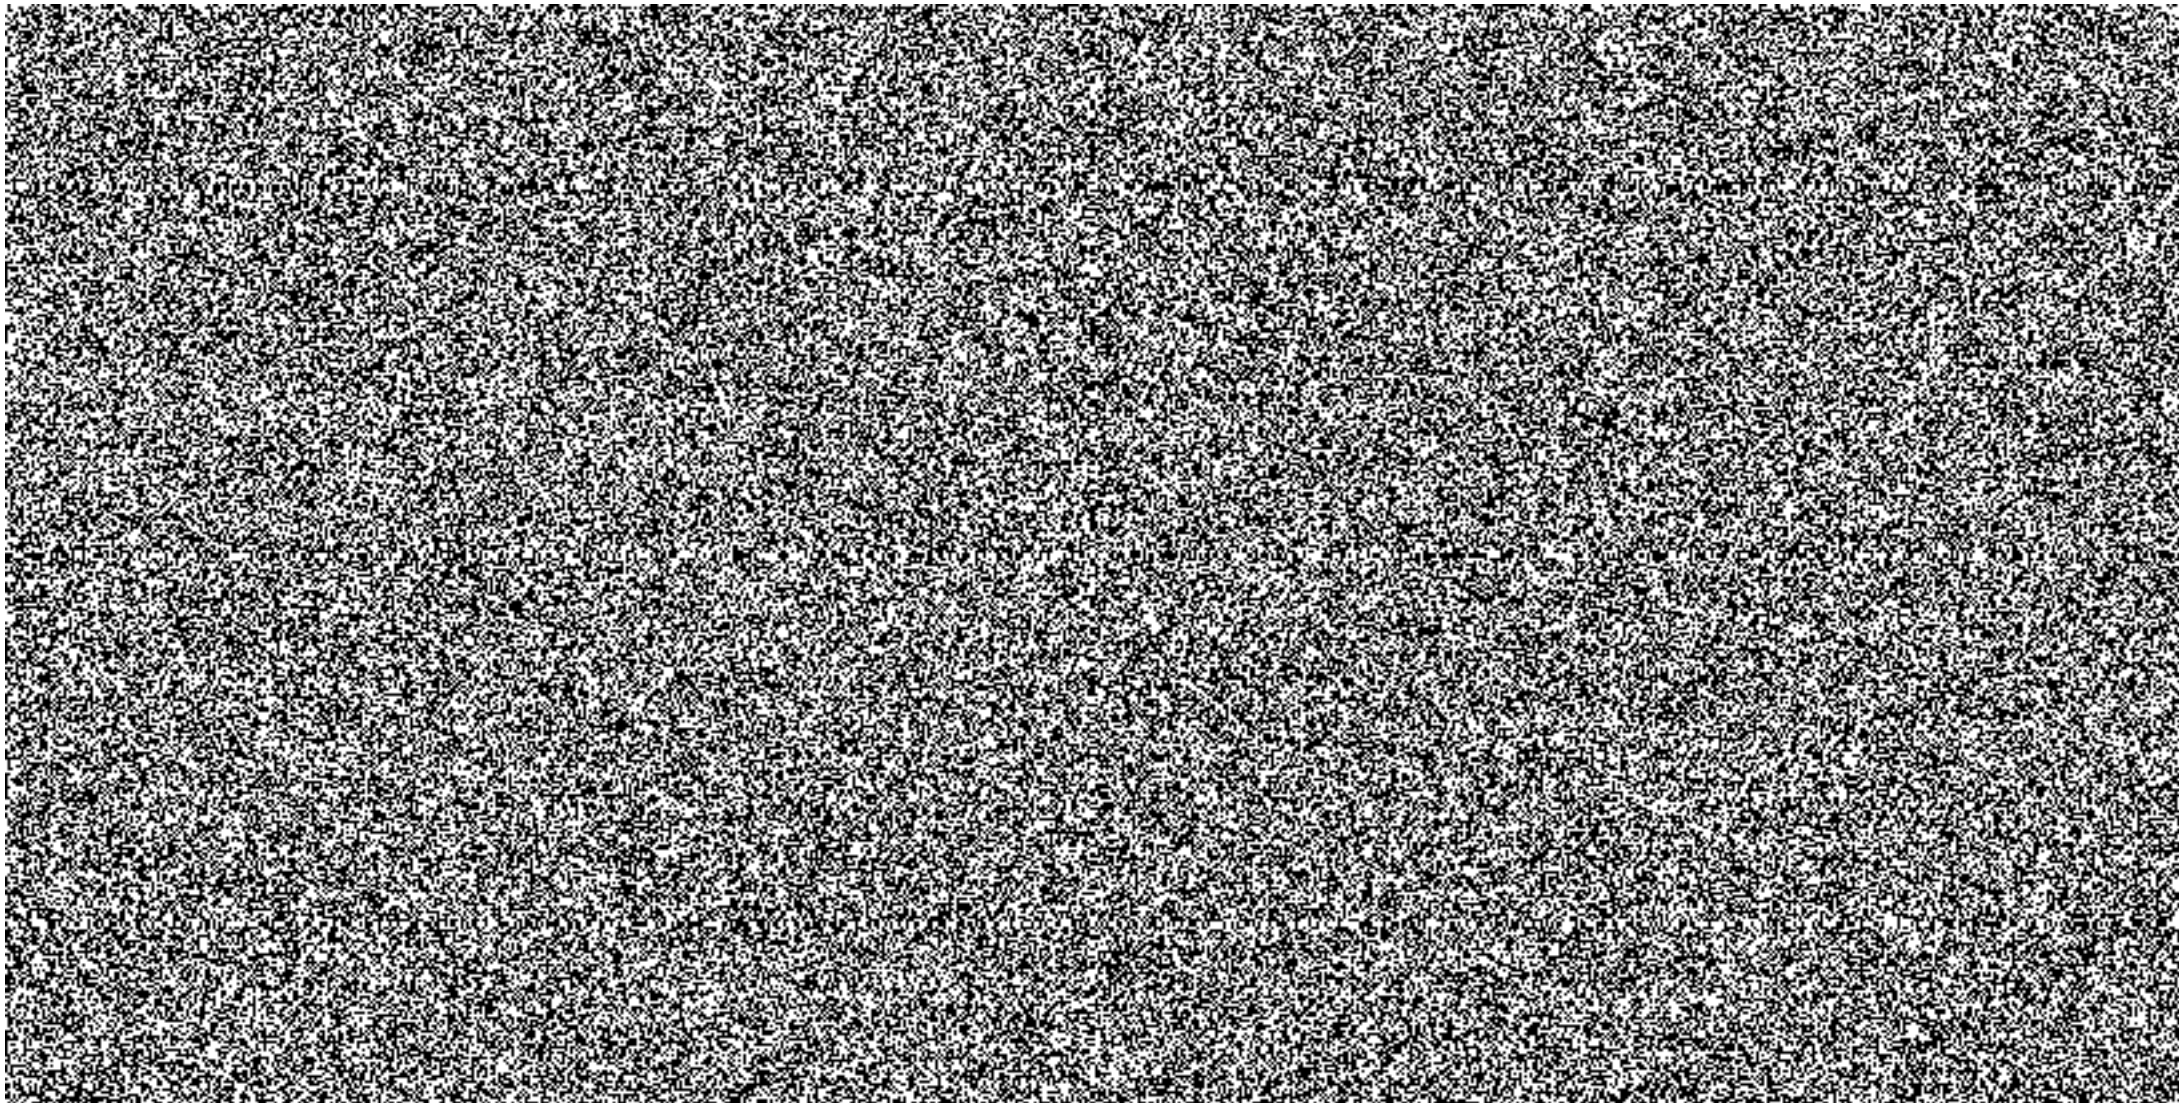




**Změnový výkaz výměr č. 04 - změny ZTI**

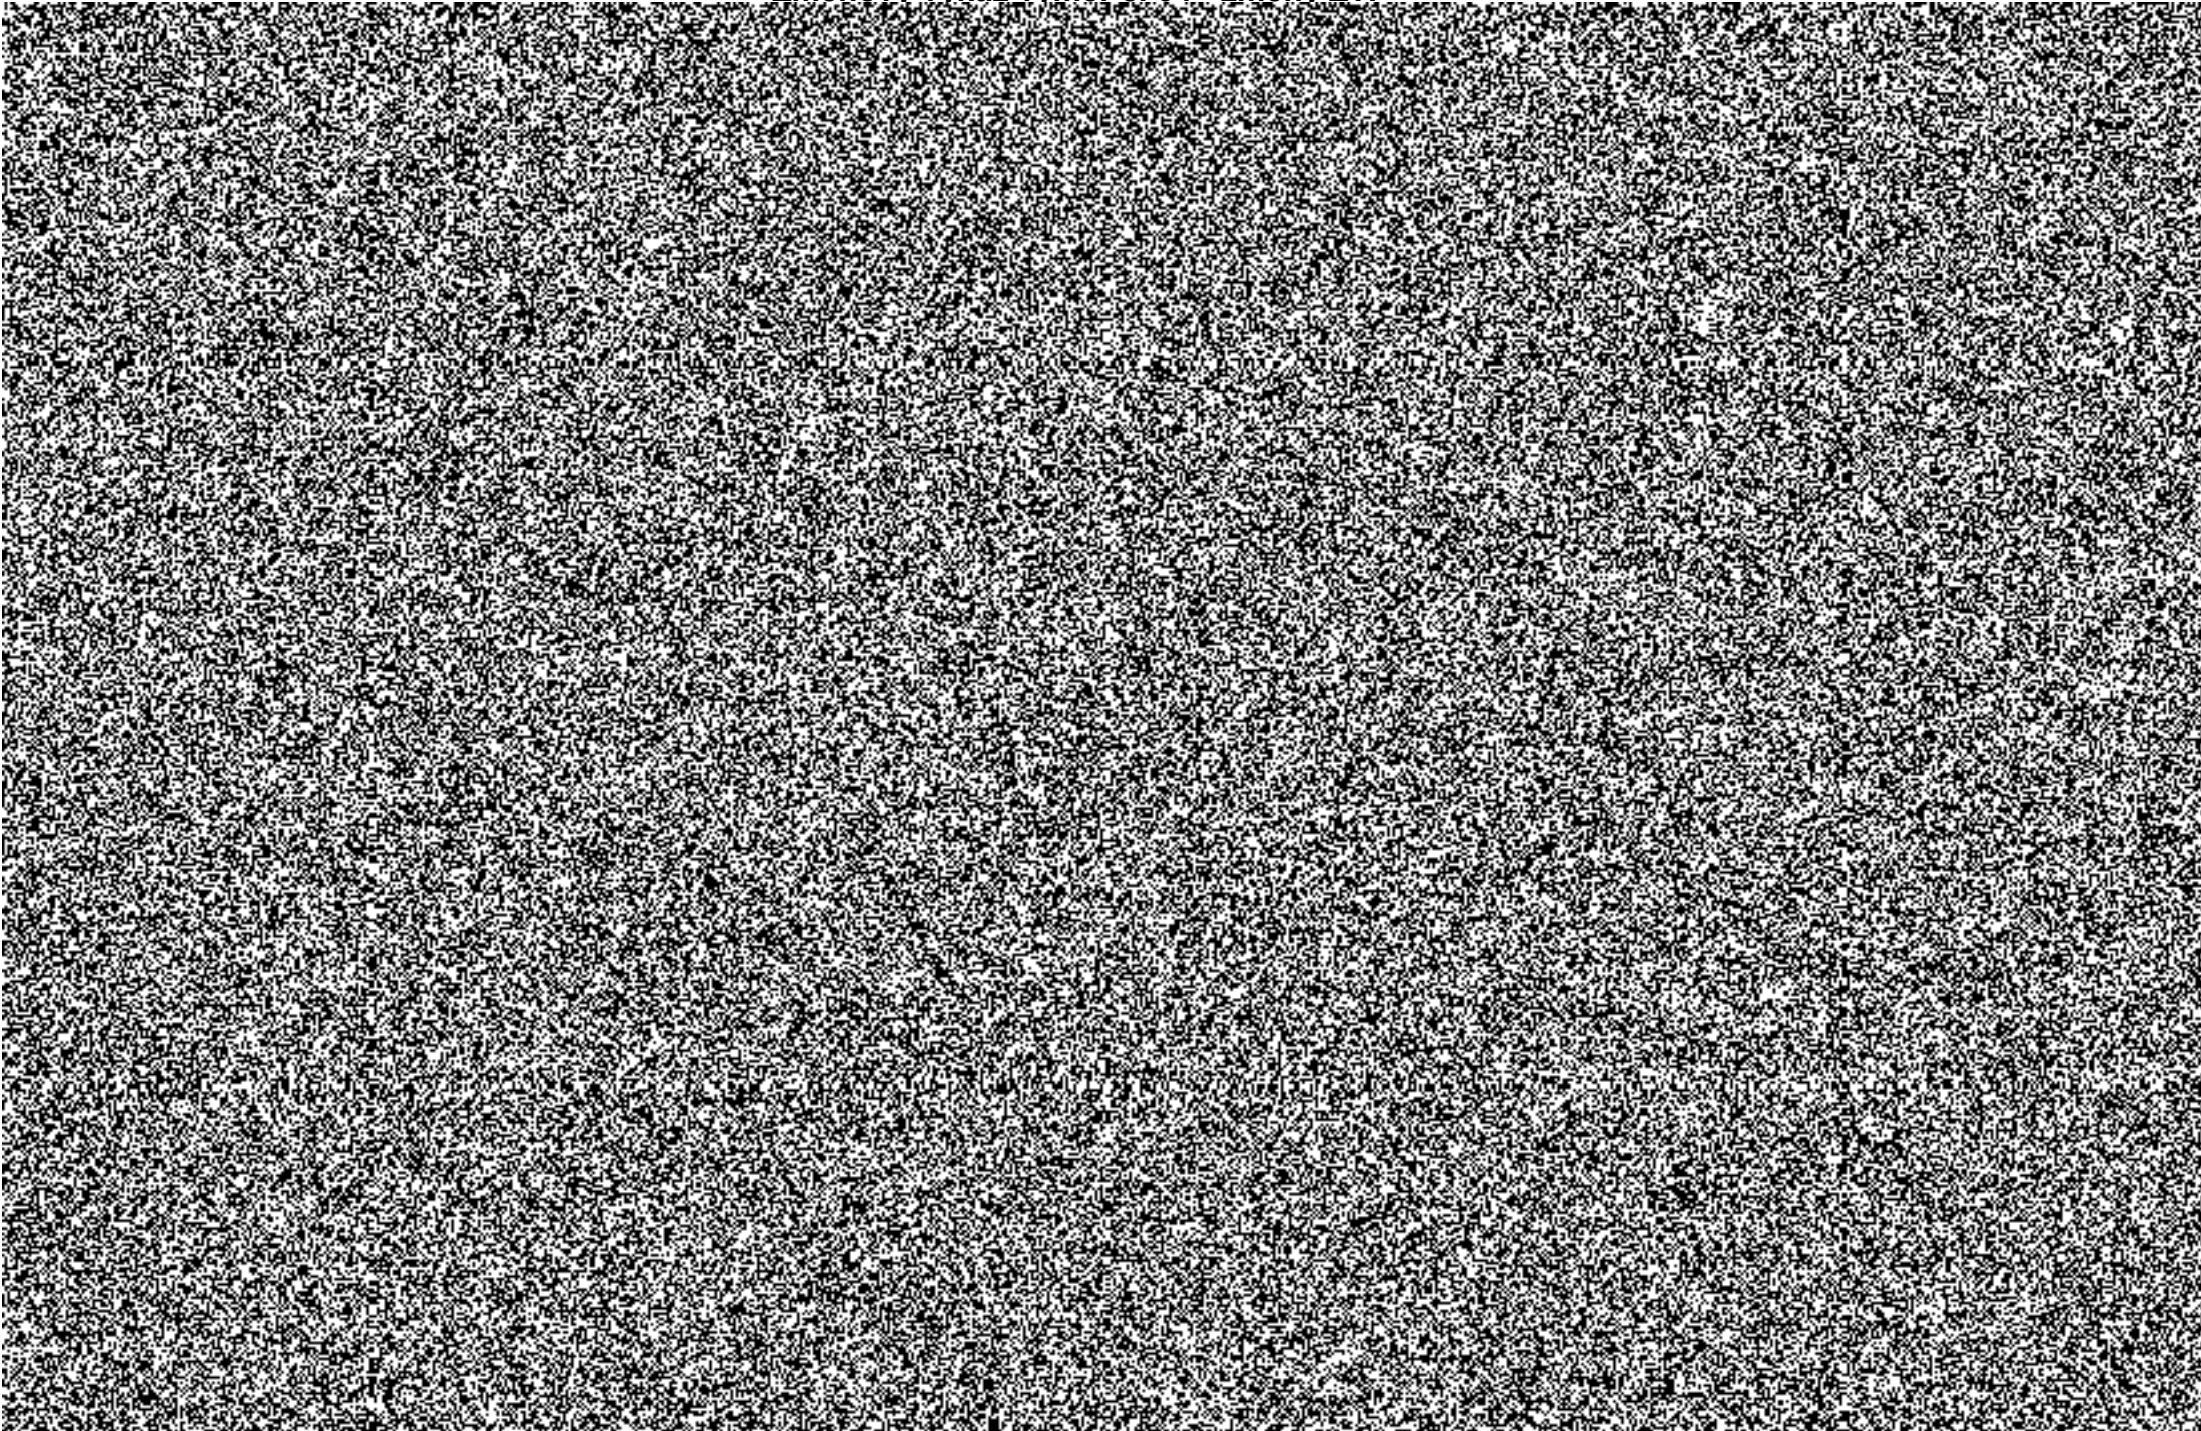

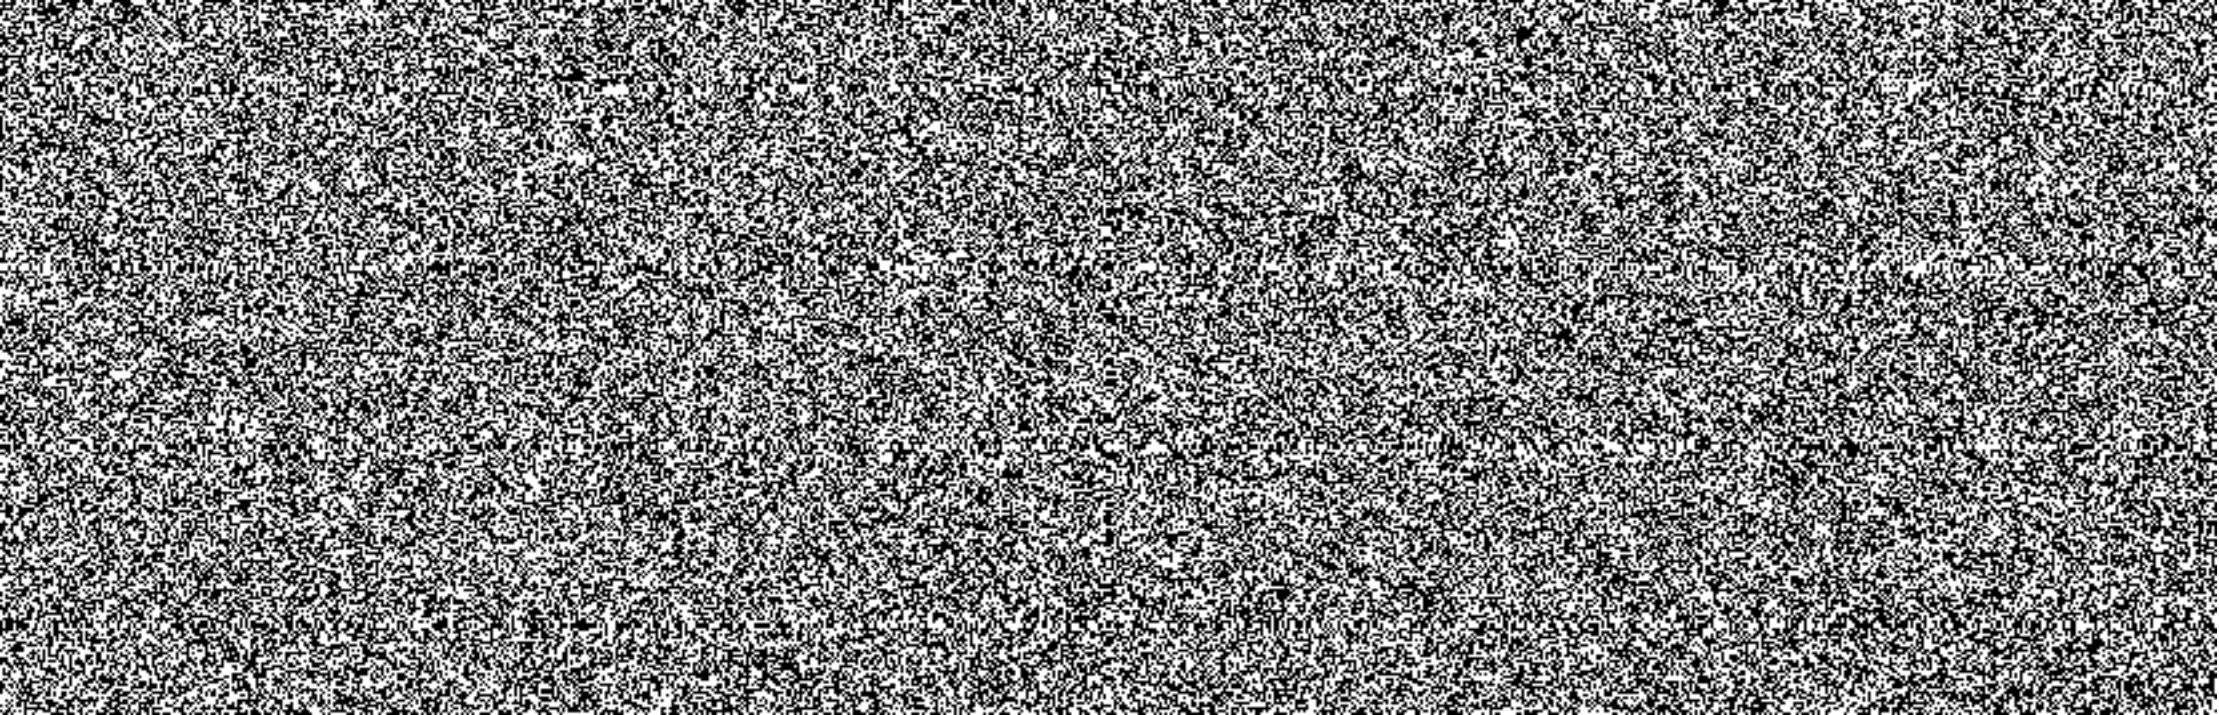





**Změnový výkaz výměr č. 05 - změna potrubí WAP**

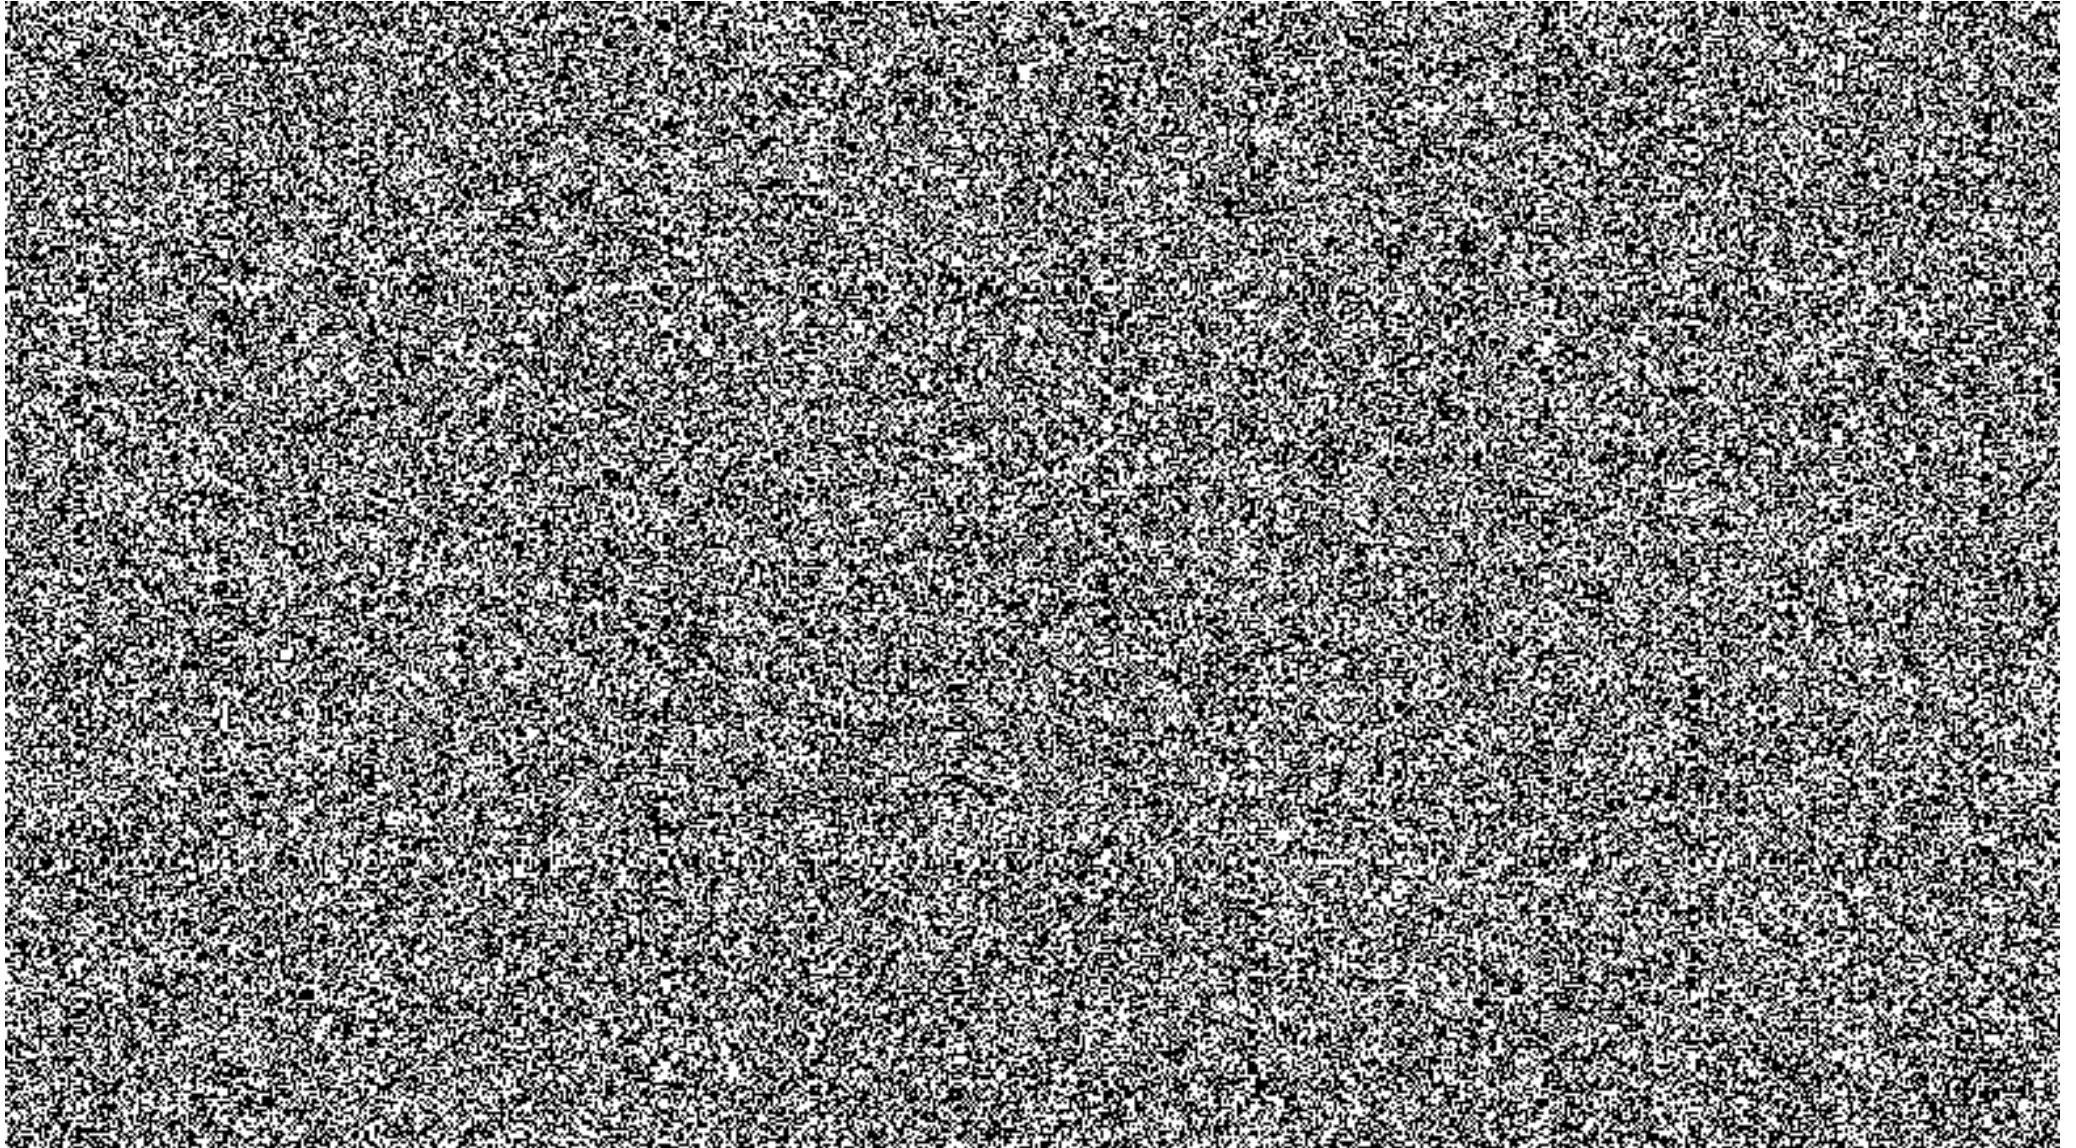


**Změnový výkaz výměr č. 06 - odpočtové položky - sadové úpravy (údržba) + návěstidla**

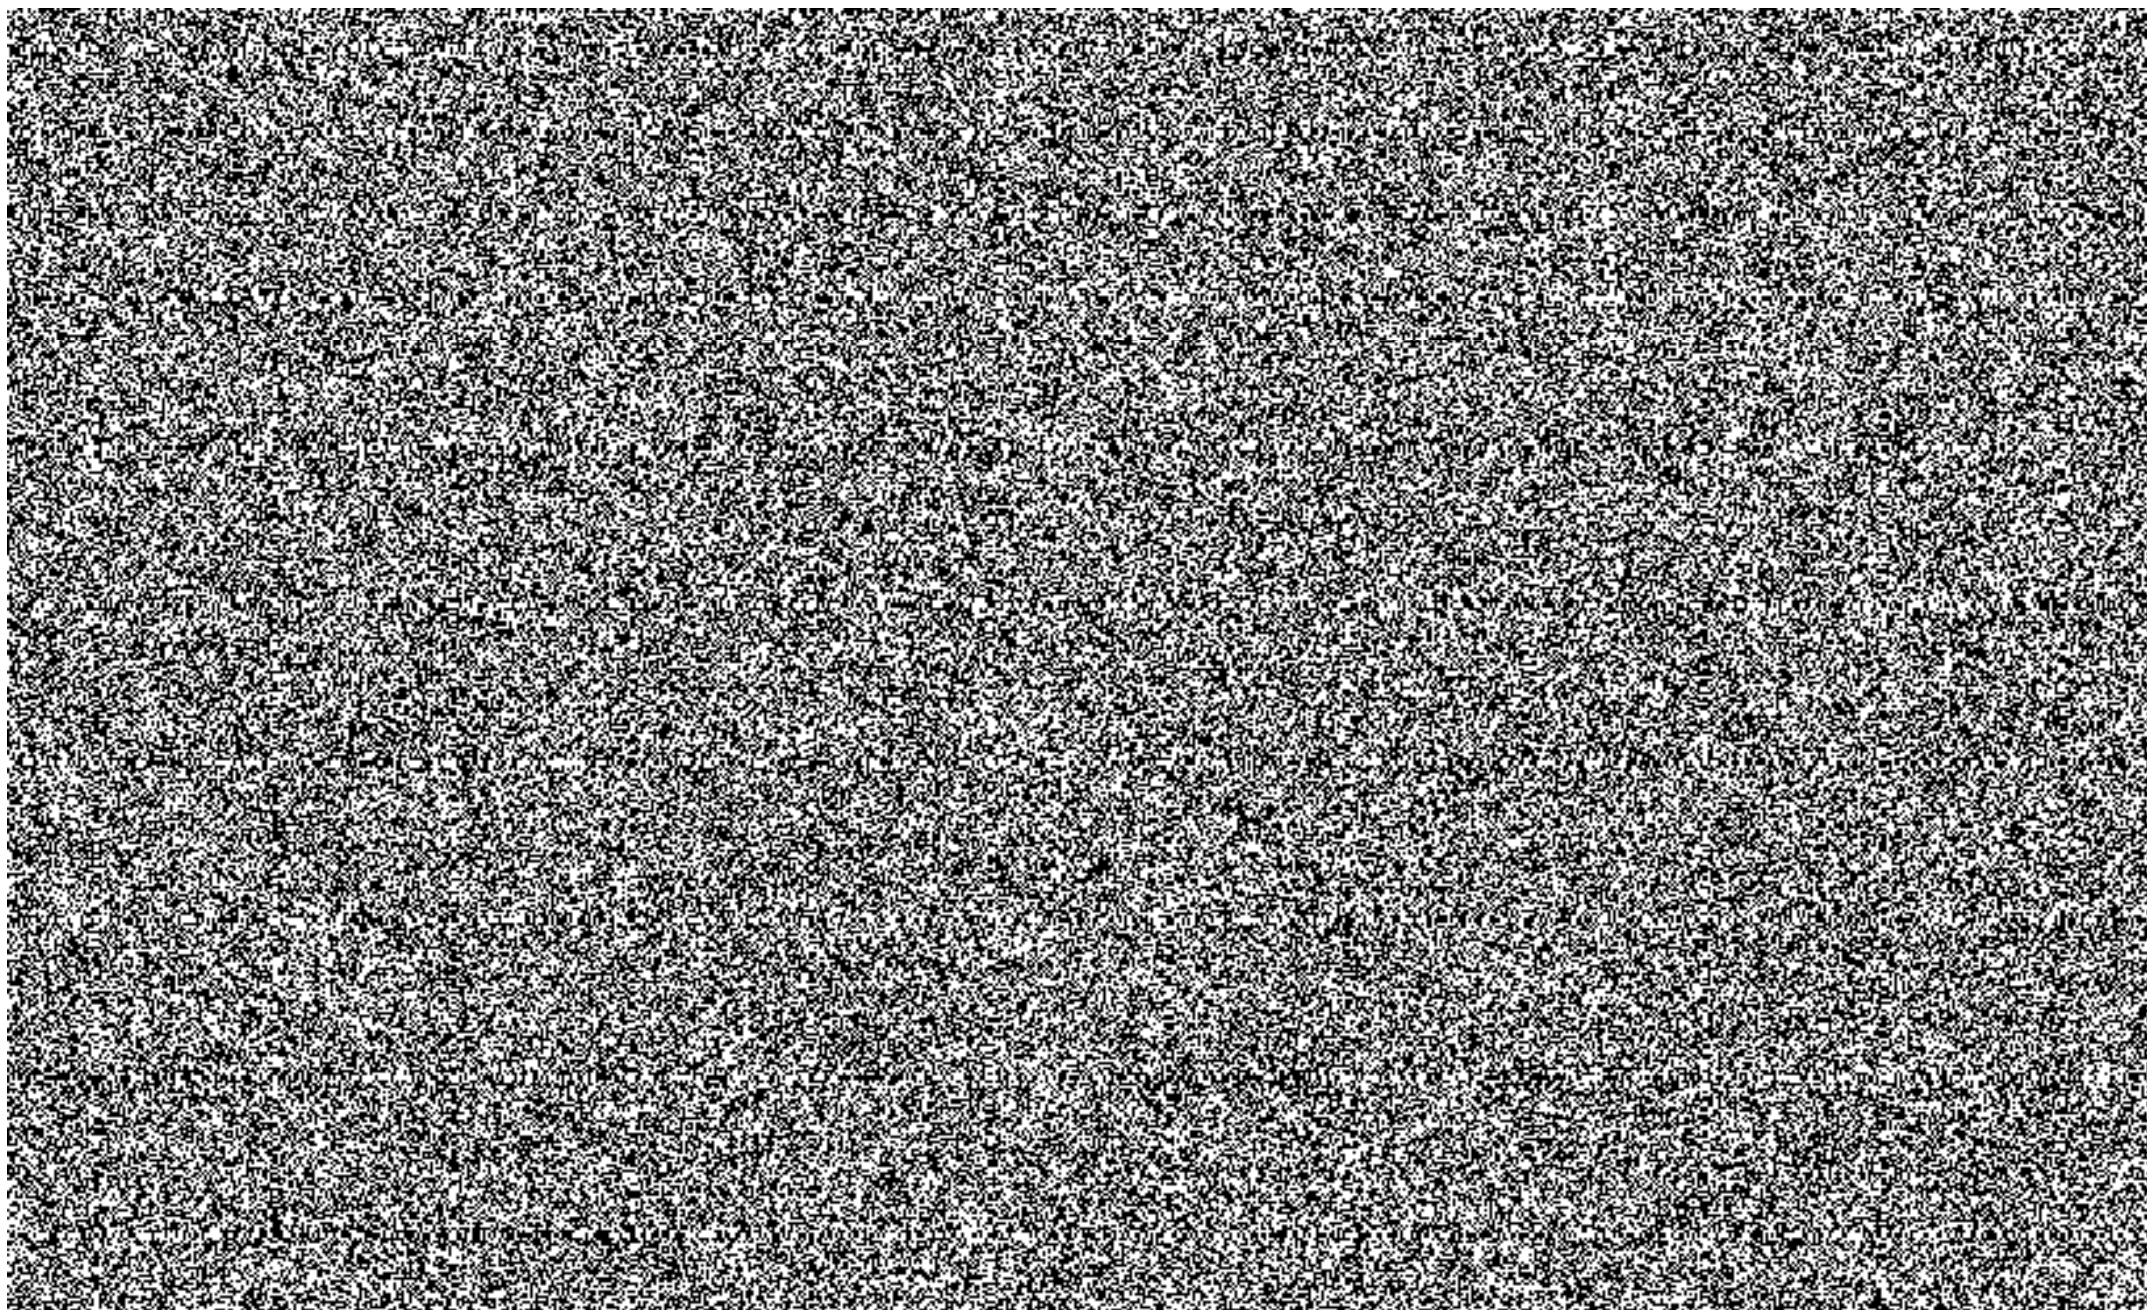



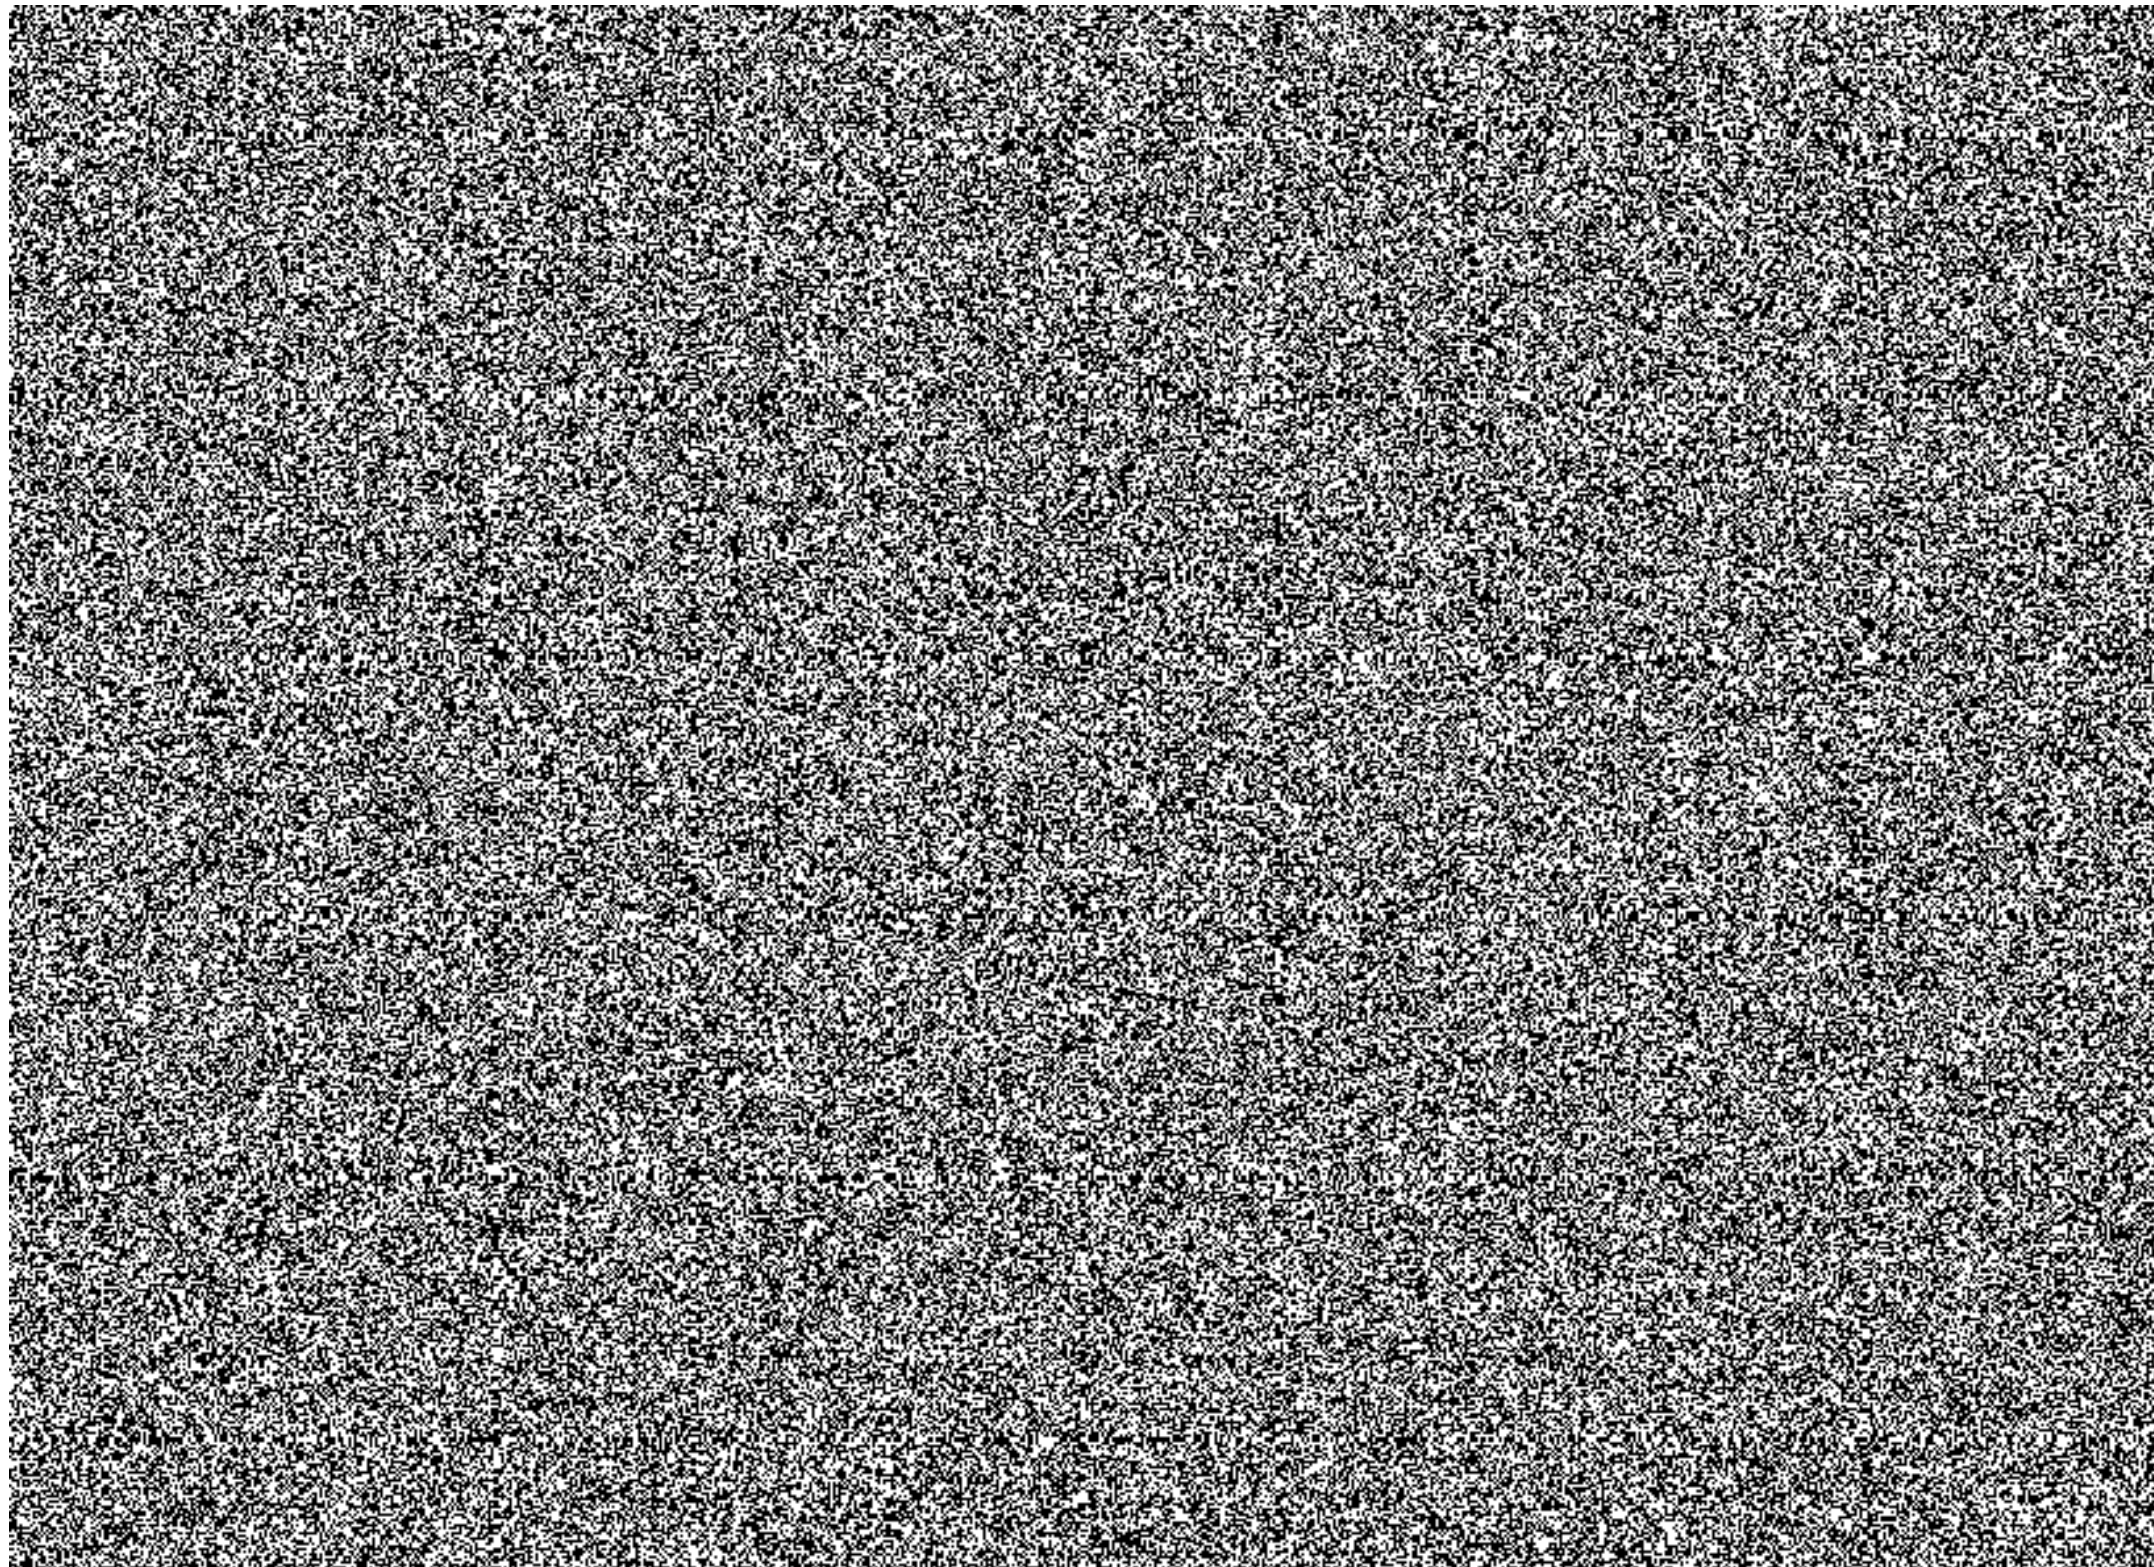

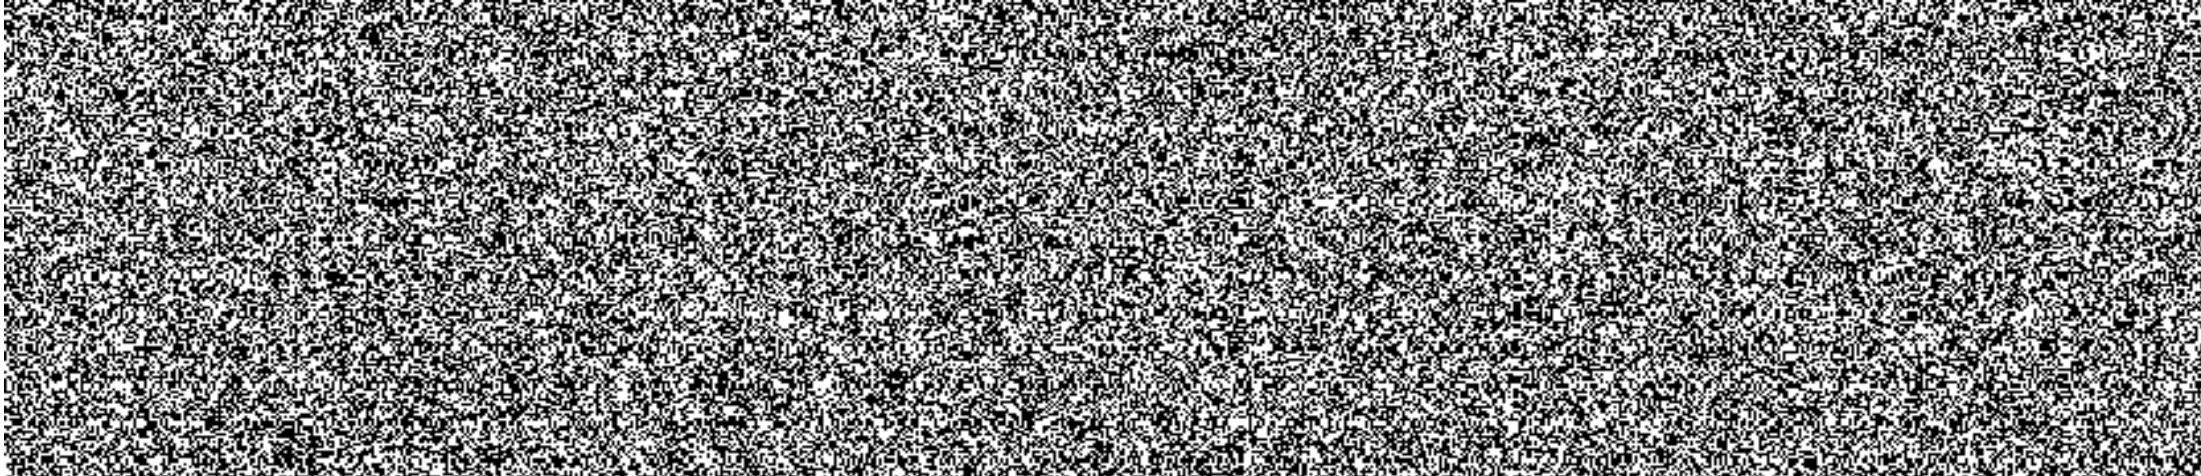



## Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

č.j. Objednatele HSJI-1495-153/E-2018

č.j. Zhotovitele 201807201/1165/18/PS, AV.19005.1.110

uzavřené podle ust. § 2486 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**

Se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava  
Zastoupená: plk. Mgr. Jirí Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina  
IČO: 708 85 184  
DIČ: CZ70885184 (není plátce)  
Bankovní spojení, č.ú: Česká národní banka; 15032881/0710  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  
Tel.:  
E-mail:  
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)



#### 2. Zhotovitel:

**Společníci společnosti**

**IMOS + GEOSAN + Zlínstav – výstavba CPS Havlíčkův Brod**

společnost založená na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2019 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

e-mail:

telefon:

fax: +420 548 129 390

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., č. ú.: 17018733/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211.

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zastoupený:

IČO: 281 69 522





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

DIČ: CZ28169522

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459.

a

Třetí společník: Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený [redacted]

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5743.

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019 je změna sjednaného předmětu díla spočívající v provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce (tzv. vícepráce). Současně se strany dohodly na zúžení předmětu díla o stavební práce, které nebudou provedeny (tzv. méněpráce).

Předmět díla se tak mění v rozsahu stavebních prací, jejichž výčet a rozsah včetně ocenění je uveden v příloze tohoto dodatku označeném jako „Změnový položkový rozpočet“. V důsledku popsané změny sjednaného předmětu díla se současně mění celková cena díla. S ohledem na výše uvedené změny předmětu díla se v souladu s čl. VII. odst. 15. Smlouvy o dílo níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo mění takto:

**Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 1.** se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla se sjednává takto:

**Cena díla bez DPH: 217 261 440,15 Kč**

**DPH 21% : 45 624 902,44 Kč**

**Cena díla celkem s DPH činí: 262 886 342,59 Kč**

Slovy: Dvě stě šedesát dva milionů osm set osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých a padesát devět haléřů.

### Rekapitulace ceny díla ke dni uzavření smlouvy:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4:

Cena díla bez DPH: 216 813 556,35 Kč

DPH 21%: 45 530 846,84 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 262 344 403,19 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 4:

Cena víceprací bez DPH: 2 811 824,42 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 2 363 940,62 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 447 883,80 Kč




### Článek 3 Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy - registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: Změnový položkový rozpočet

Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

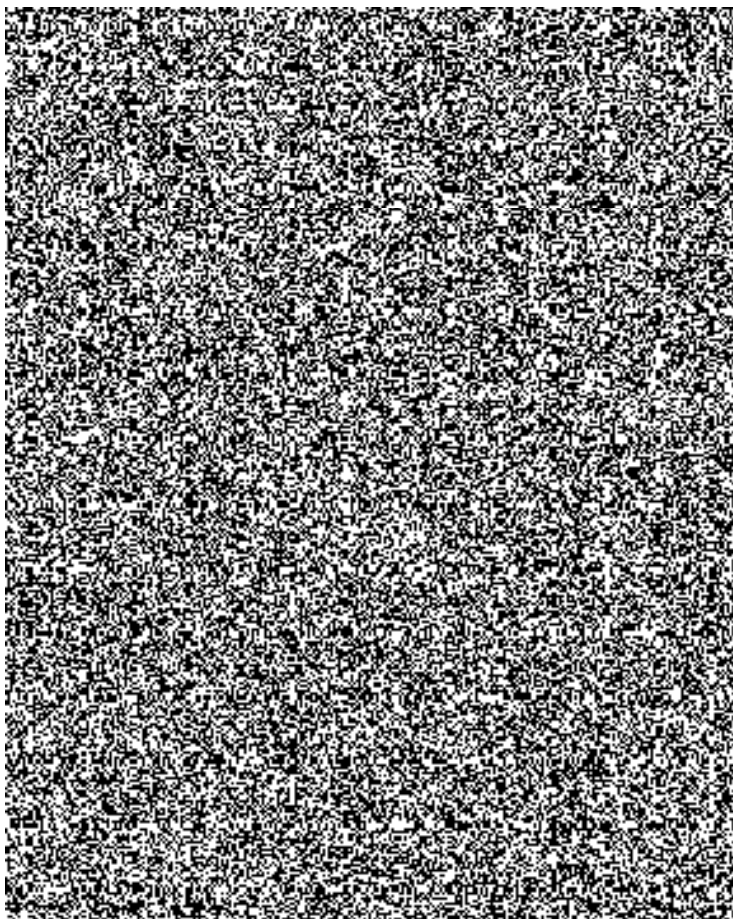





**Příloha Dodatku č. 4 k SoD ev. č. HSJI-1495-153/E-2018 – Změnový položkový rozpočet**

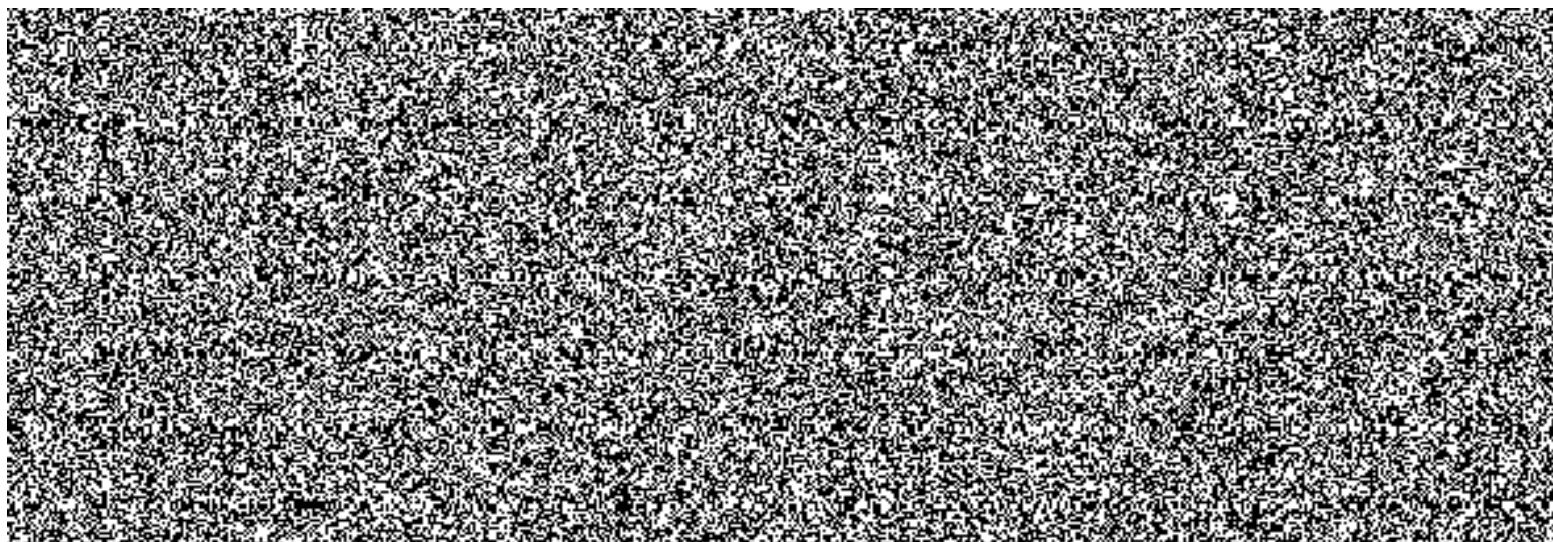

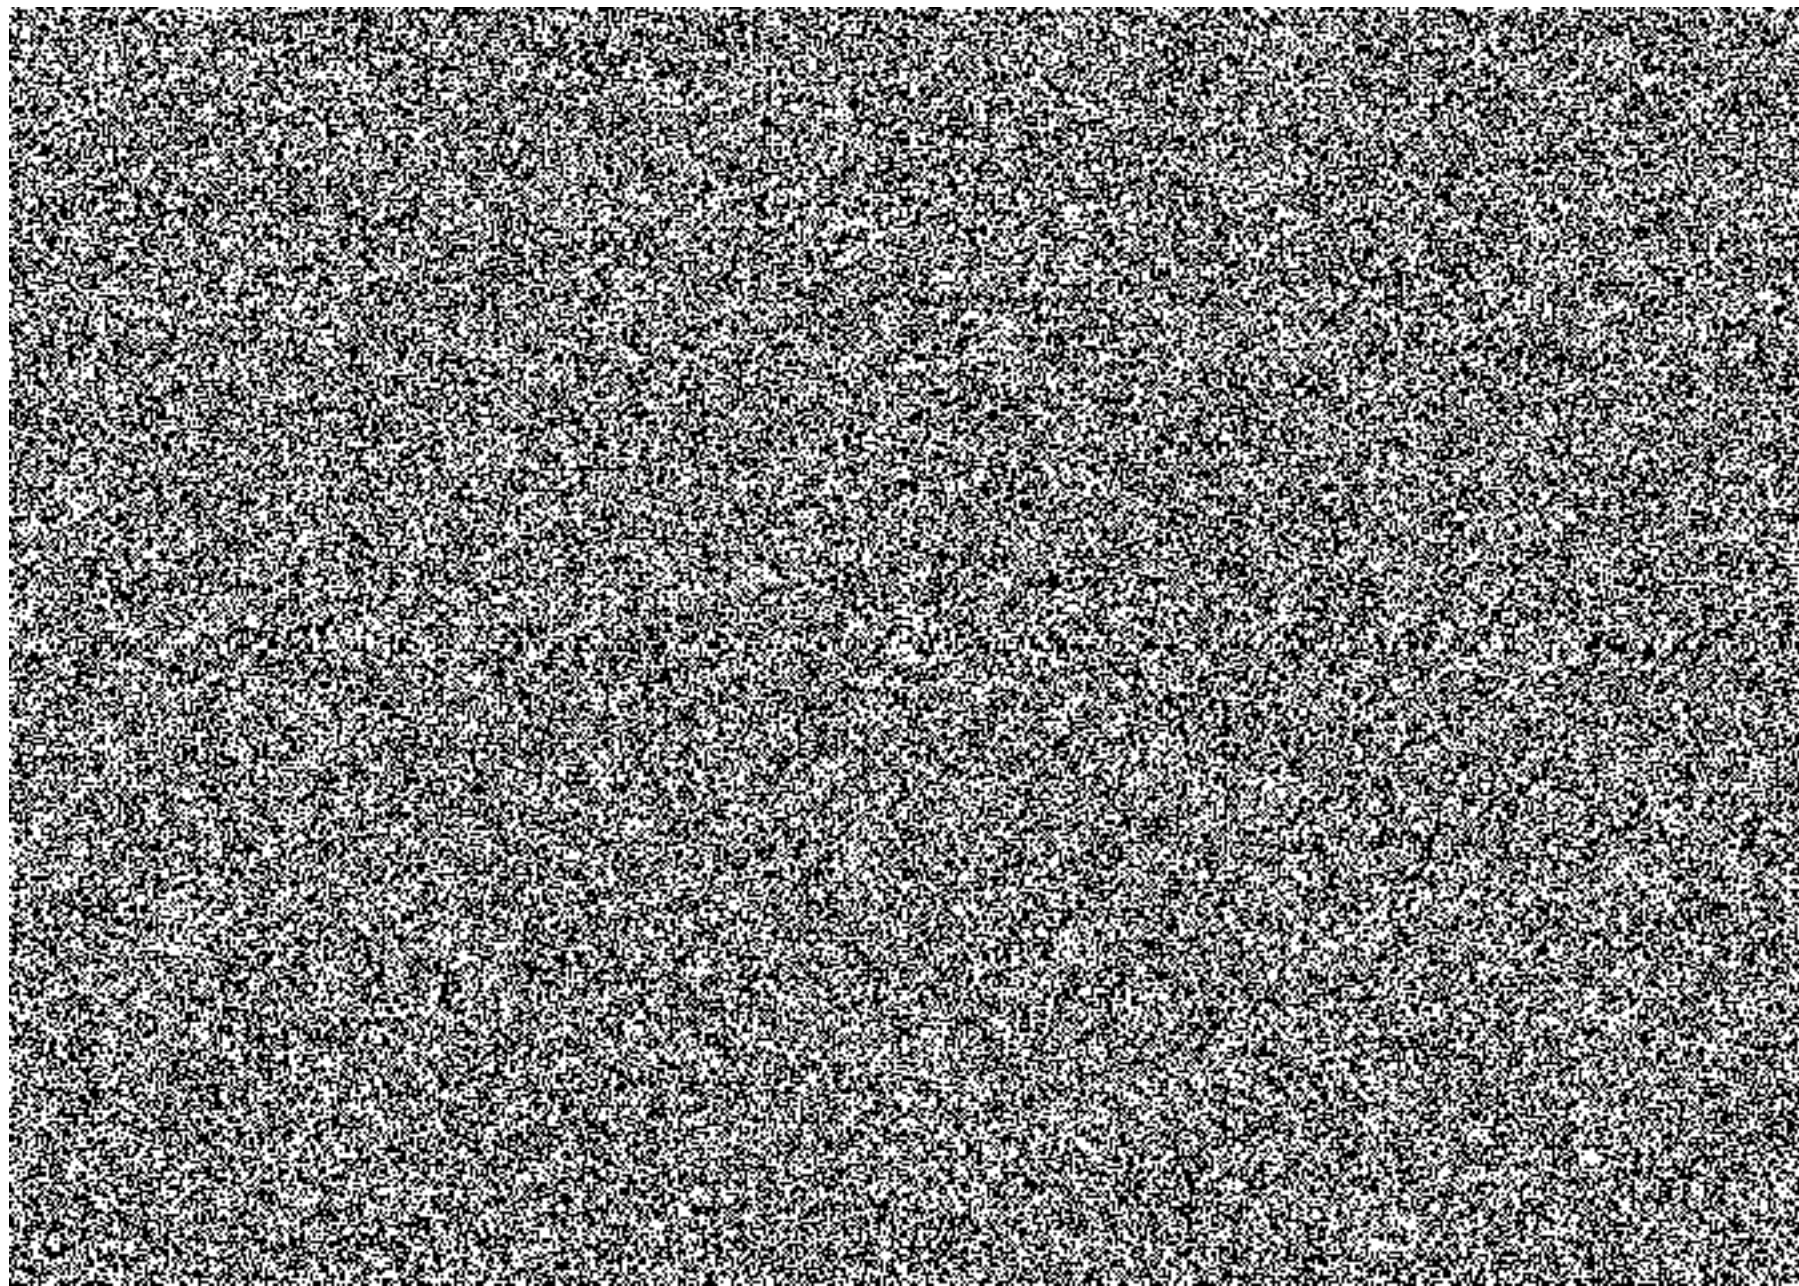





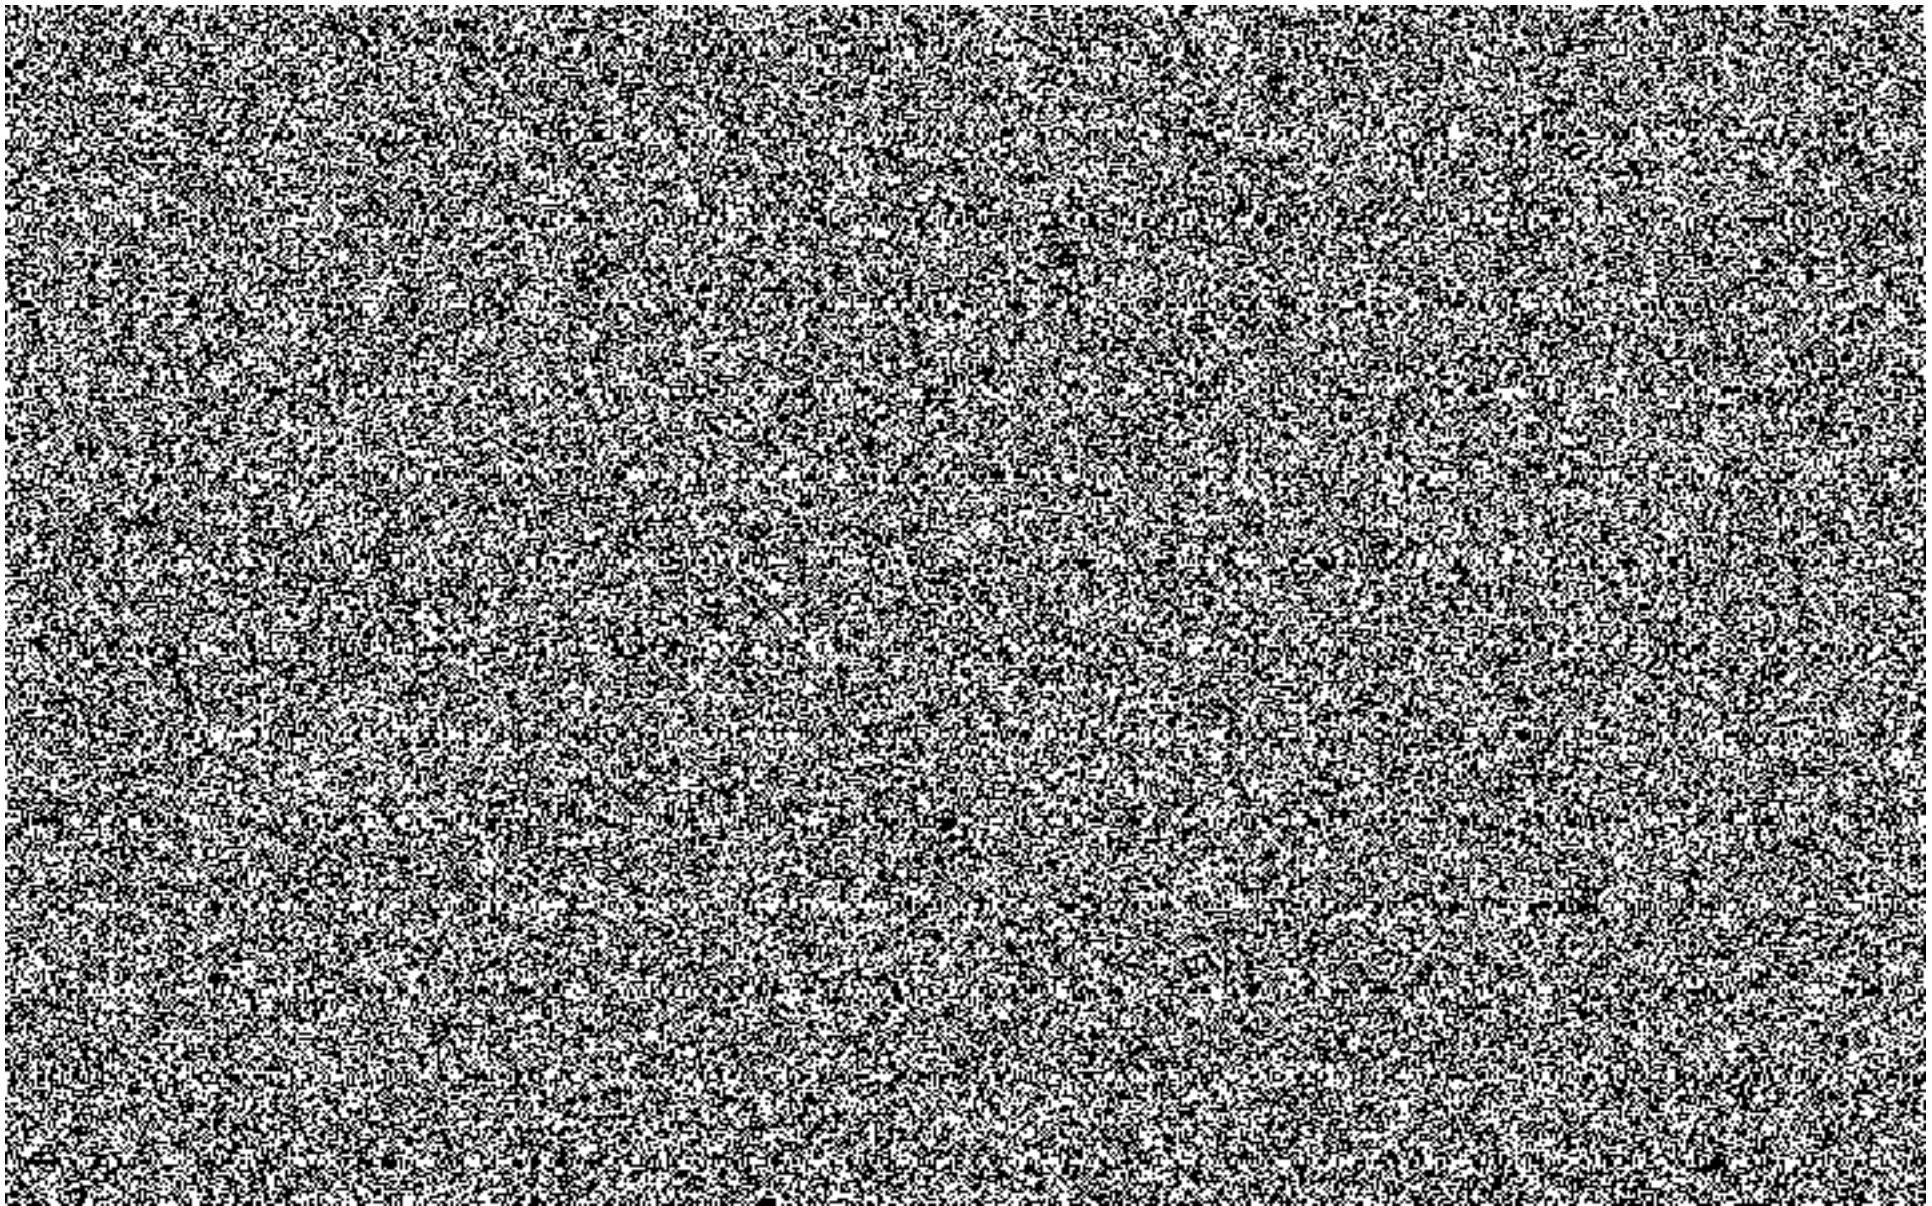

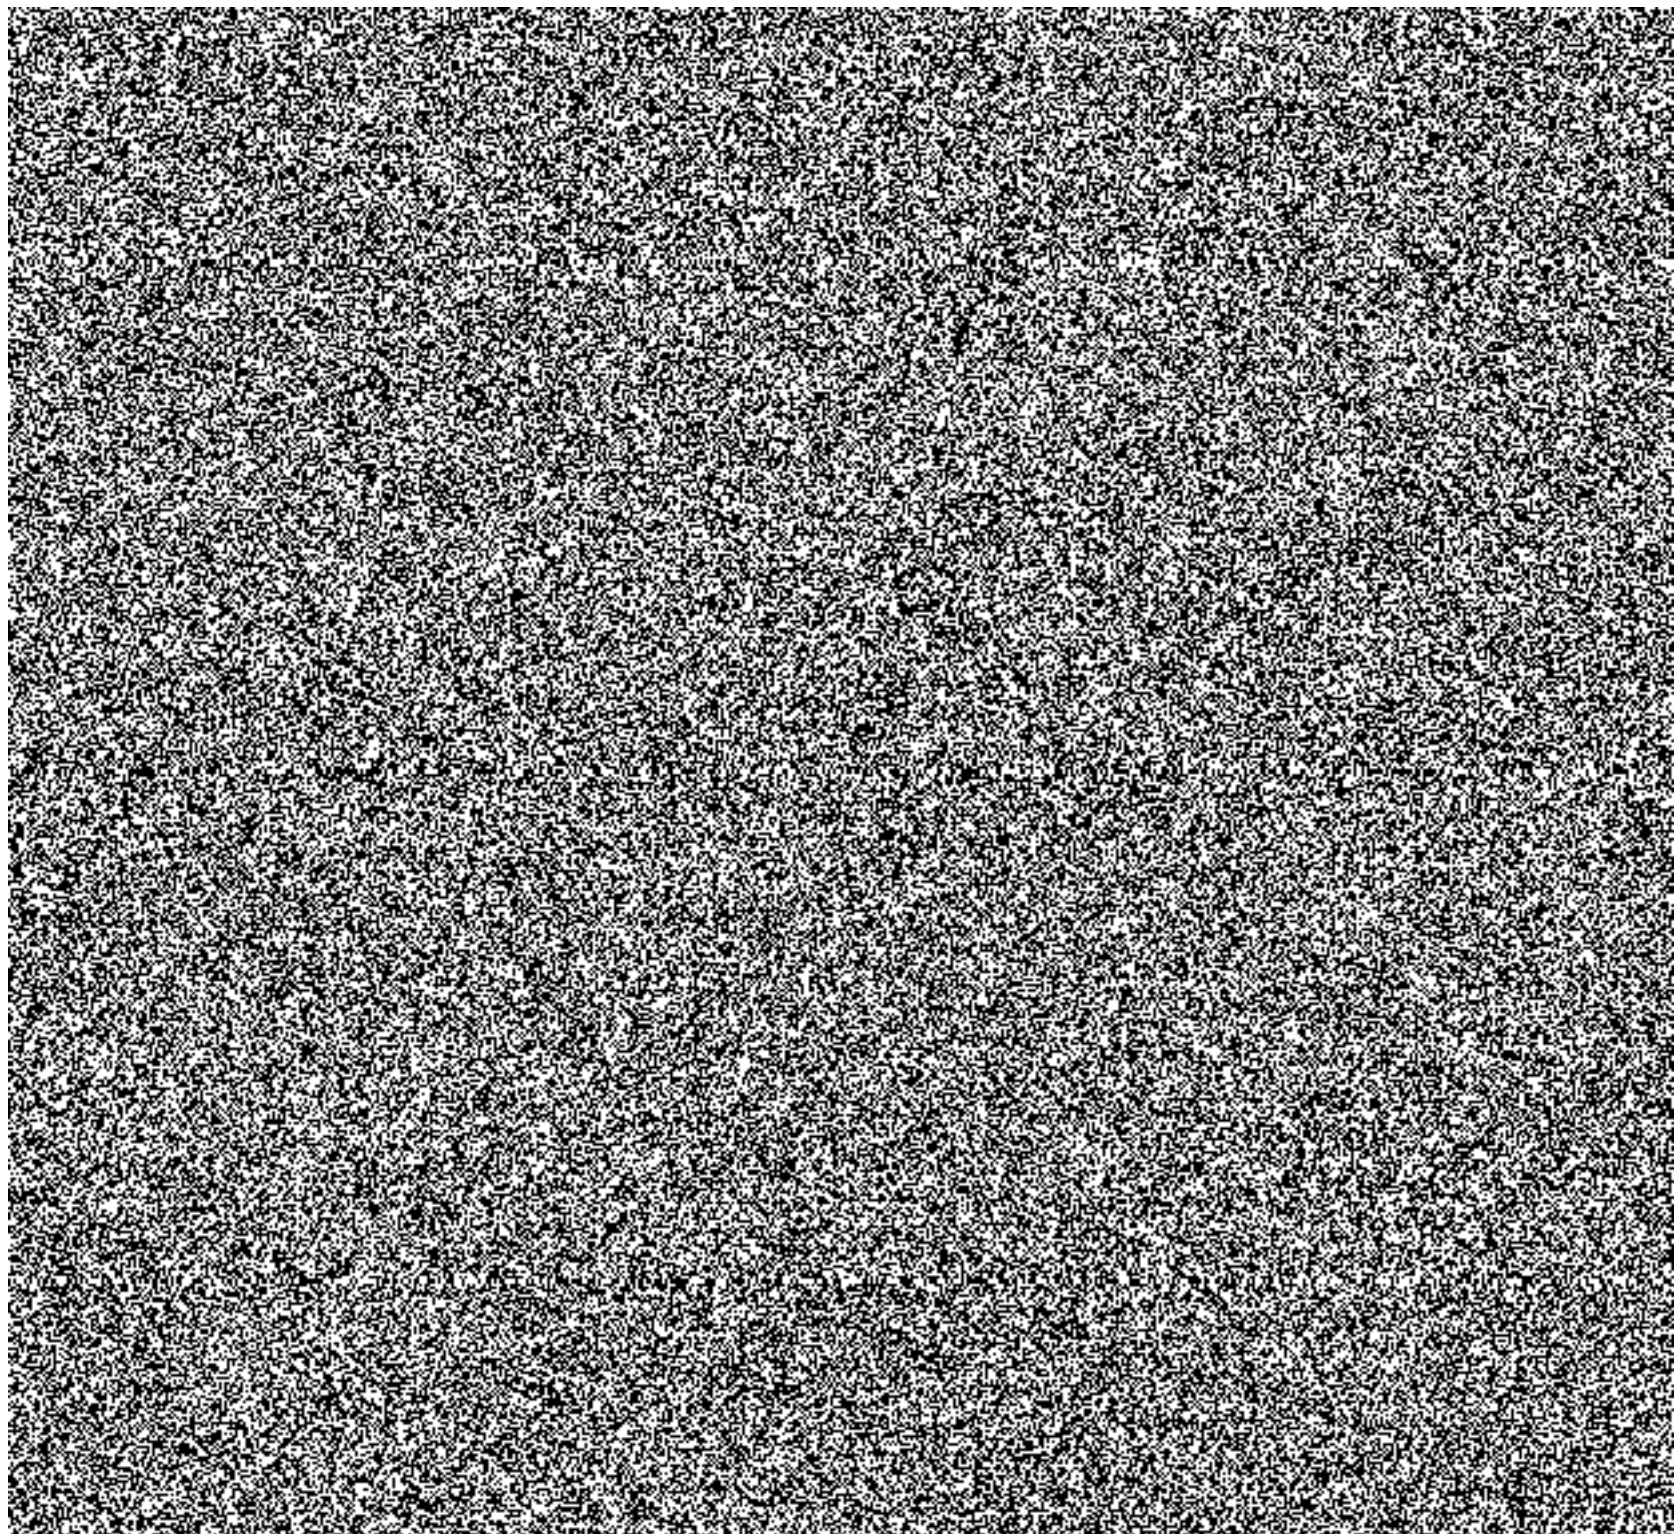





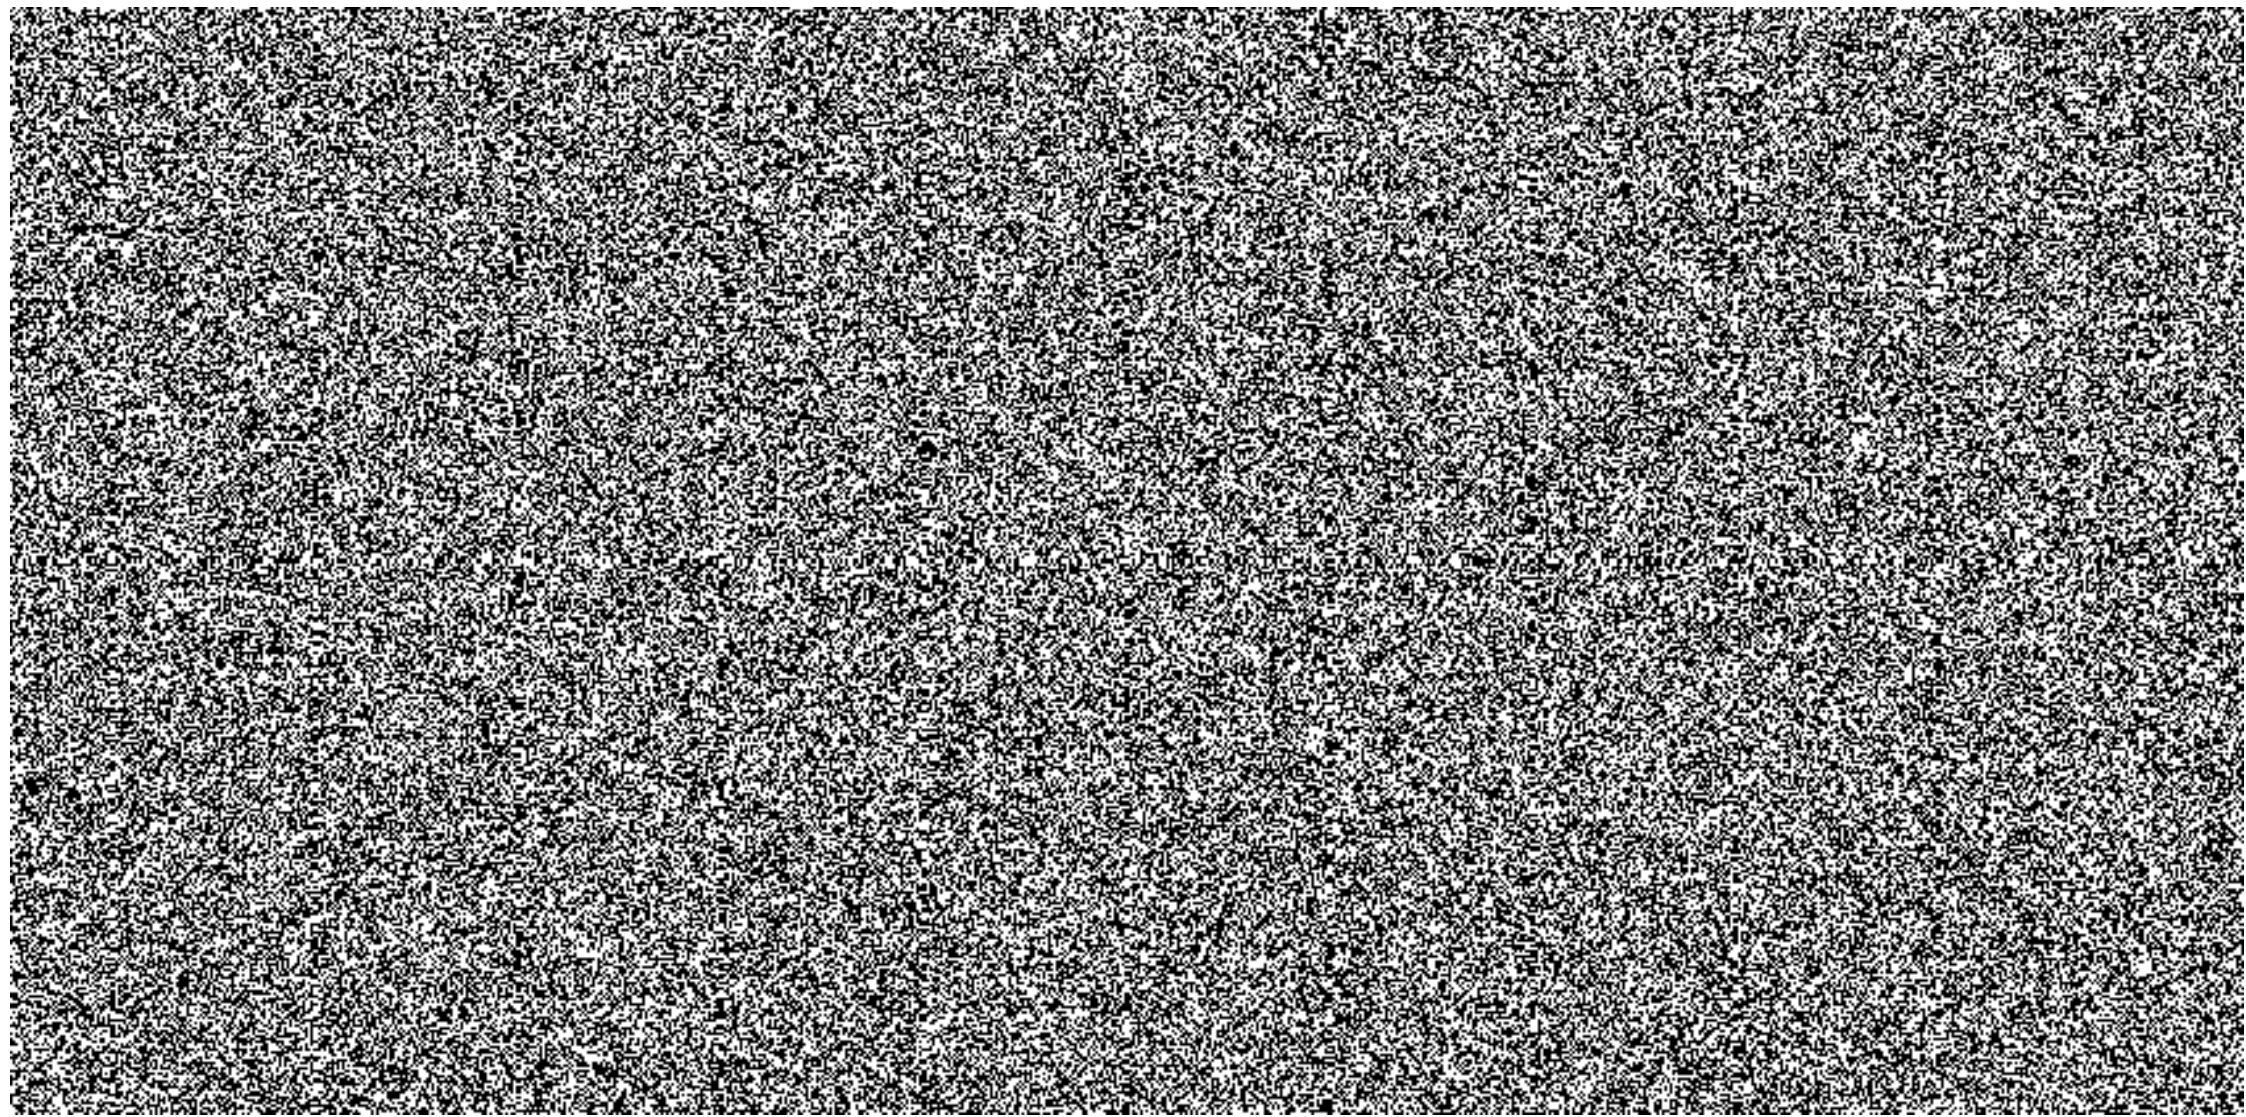

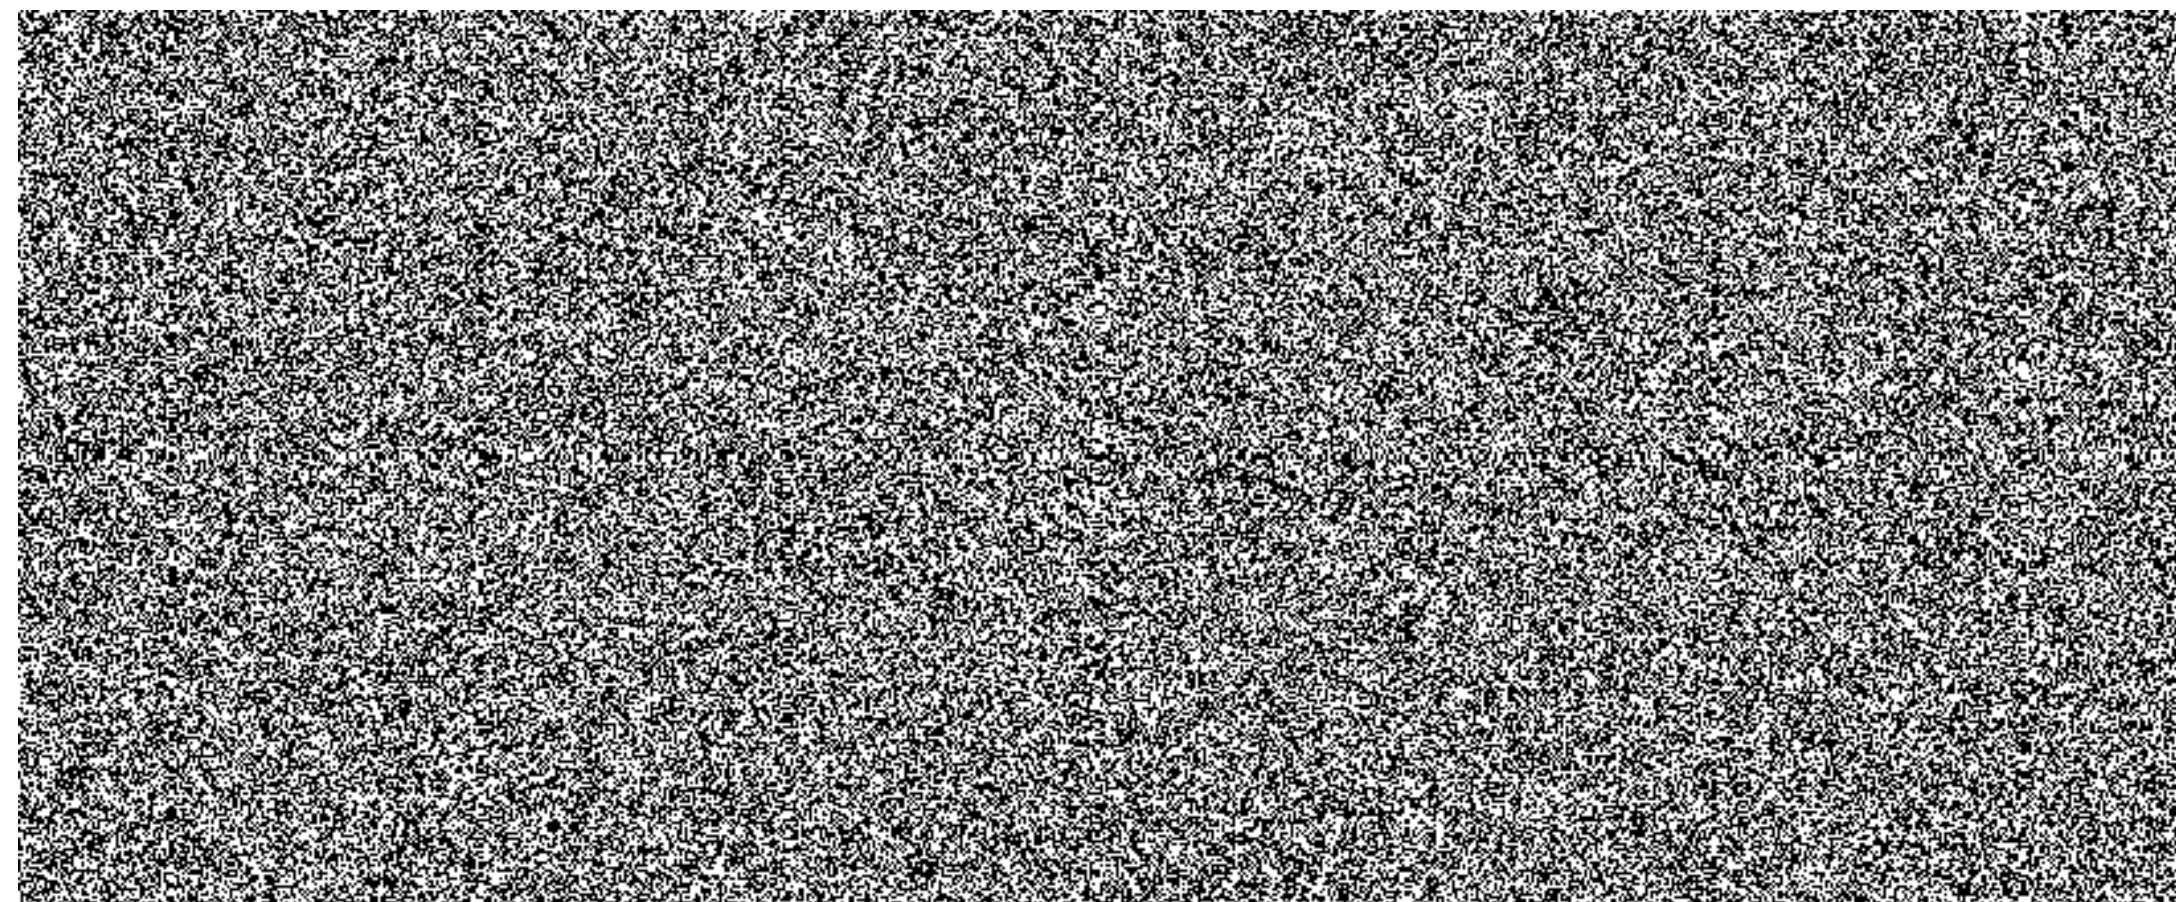





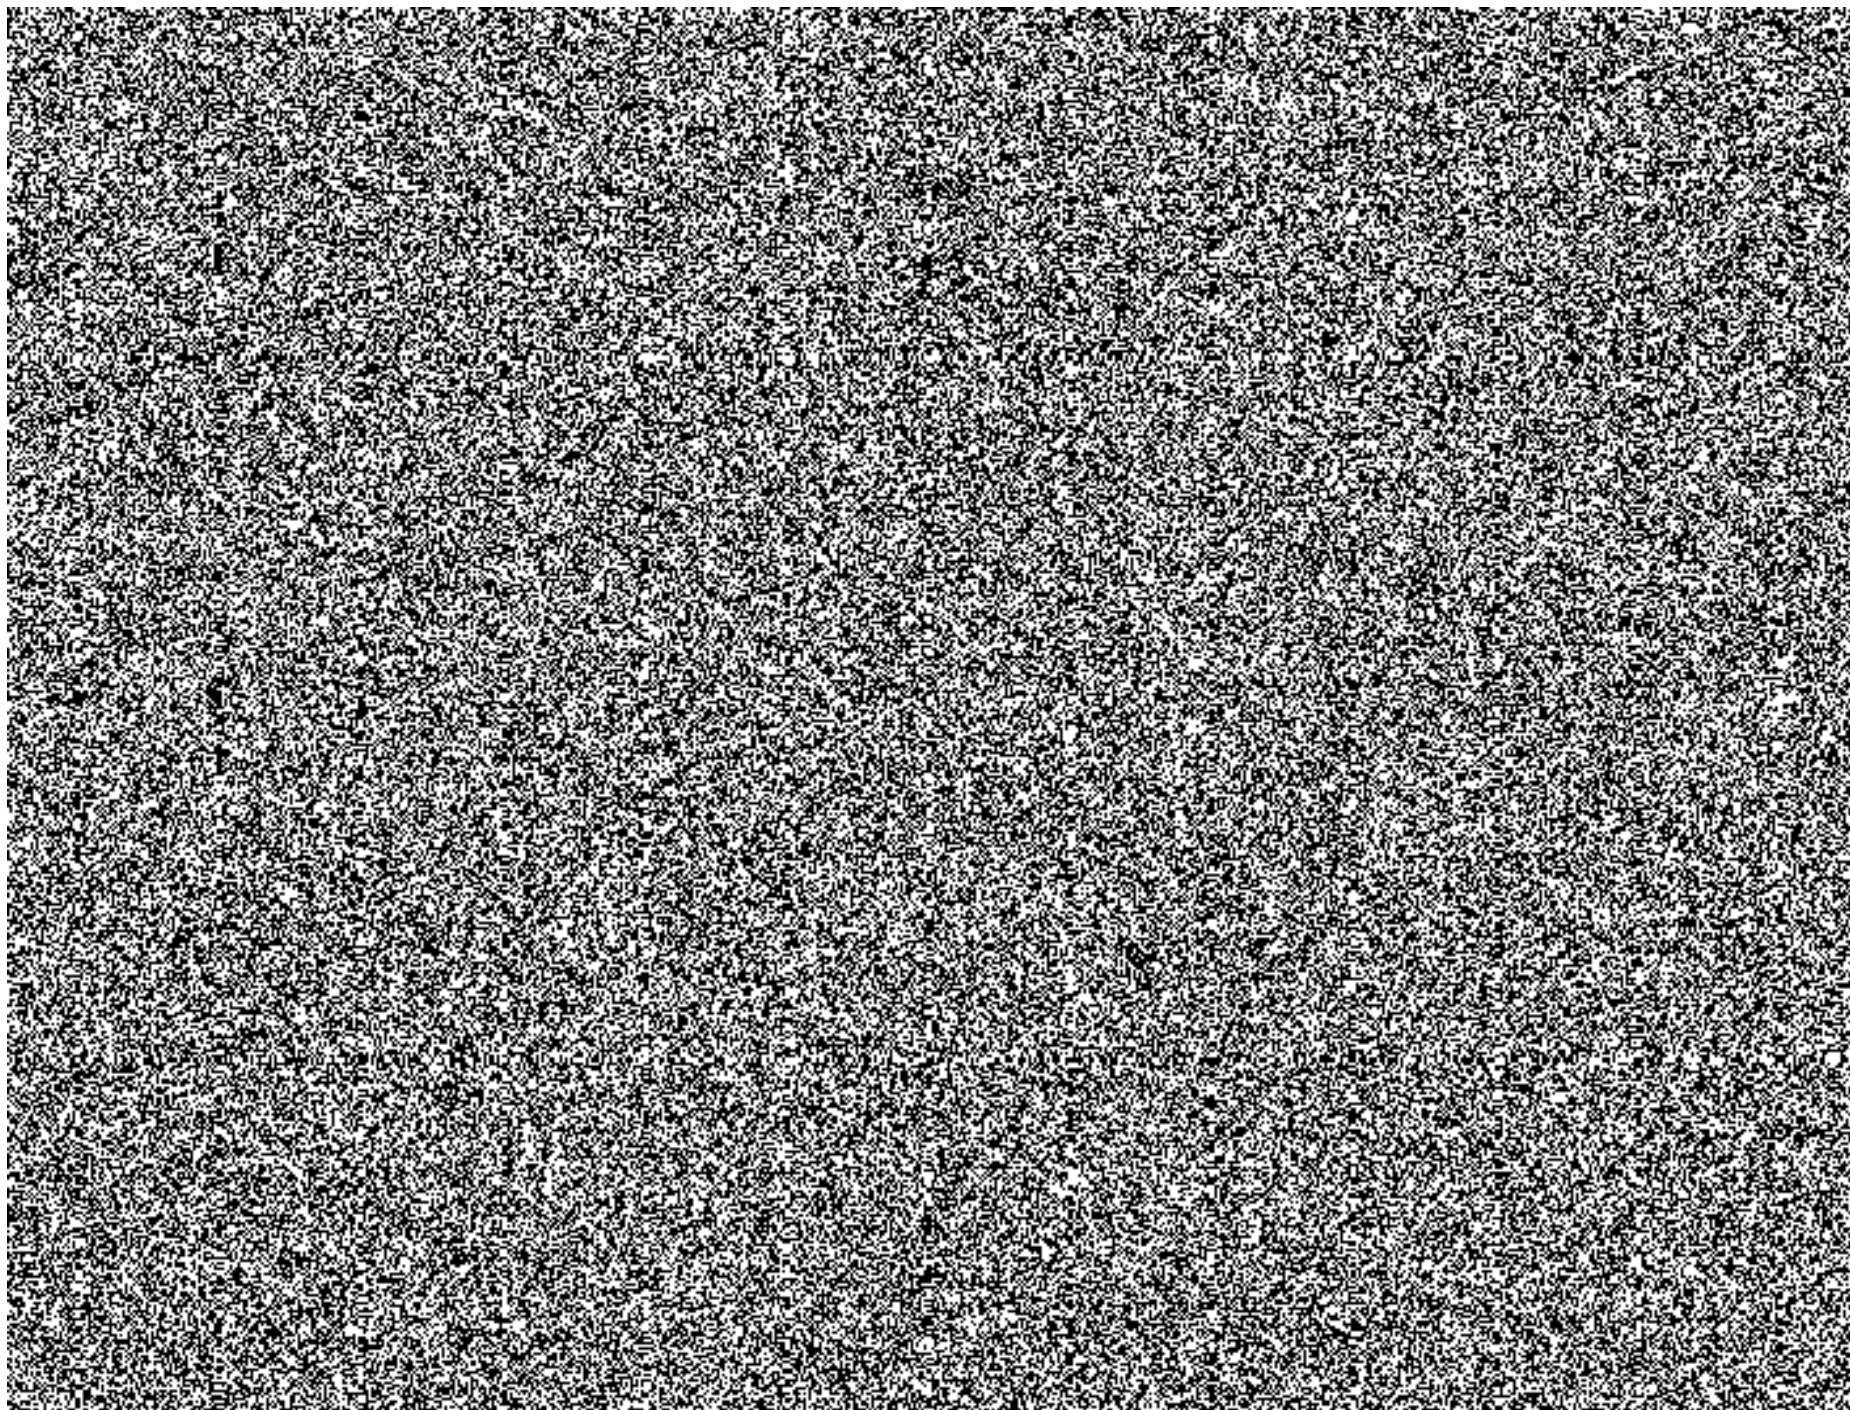

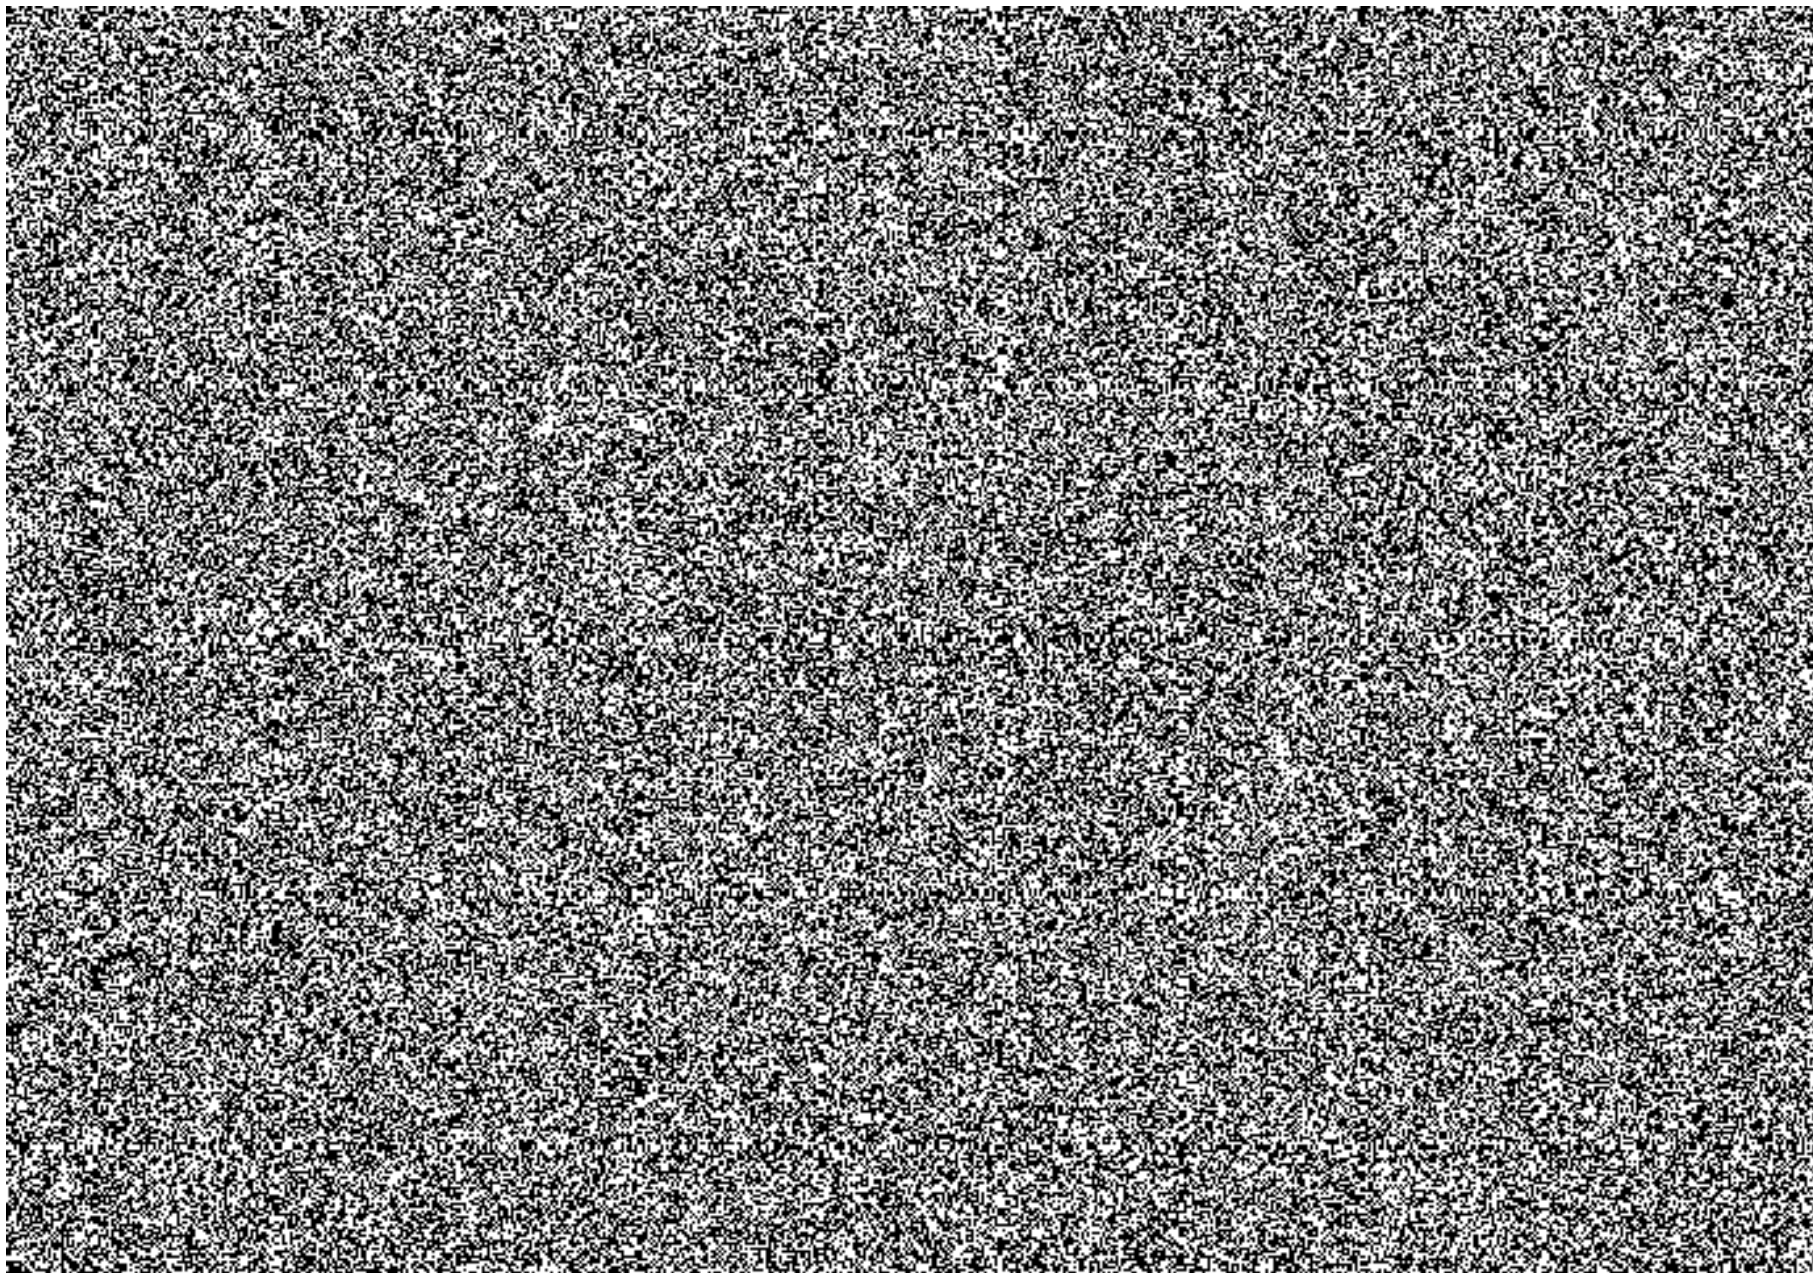





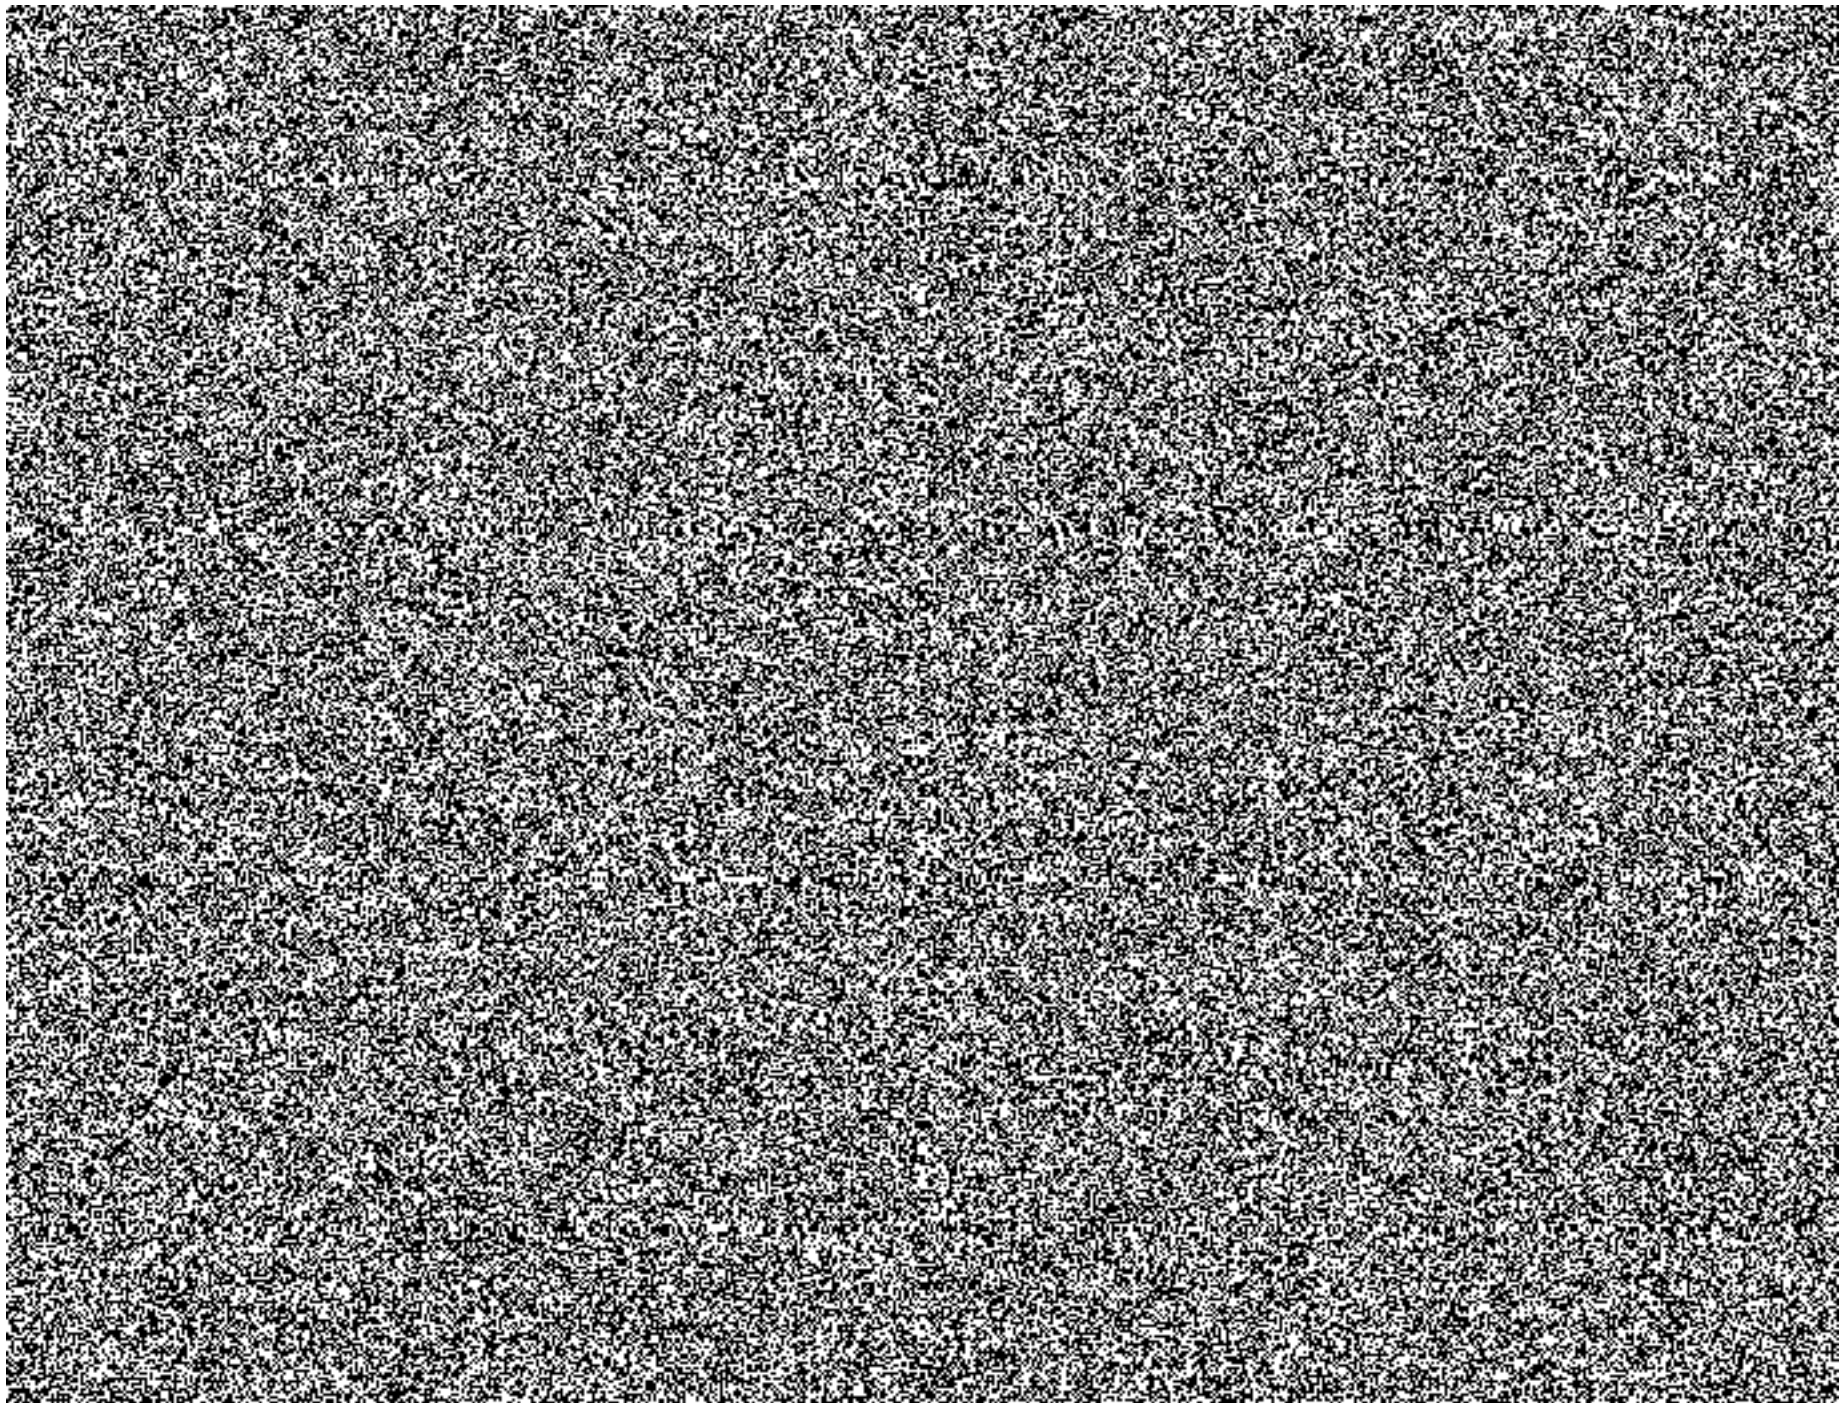

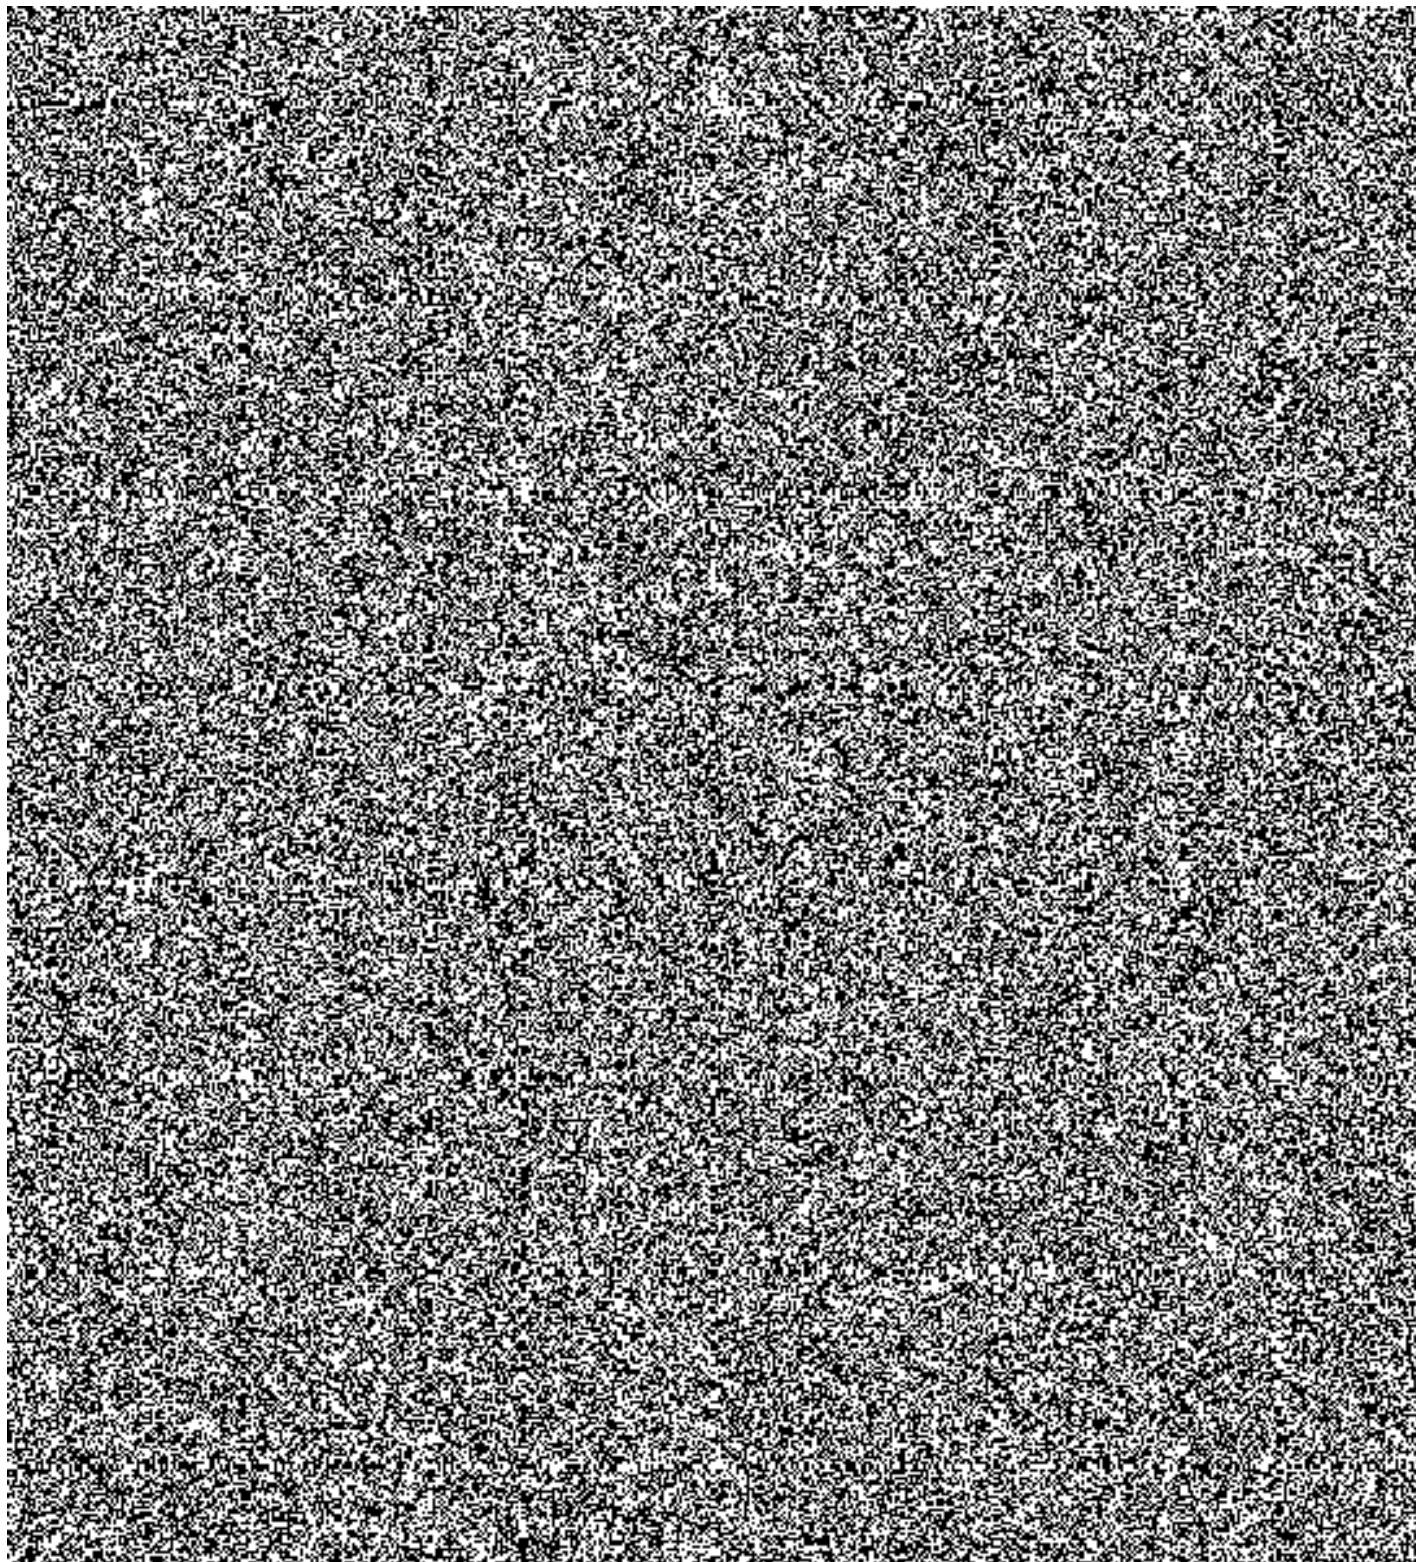





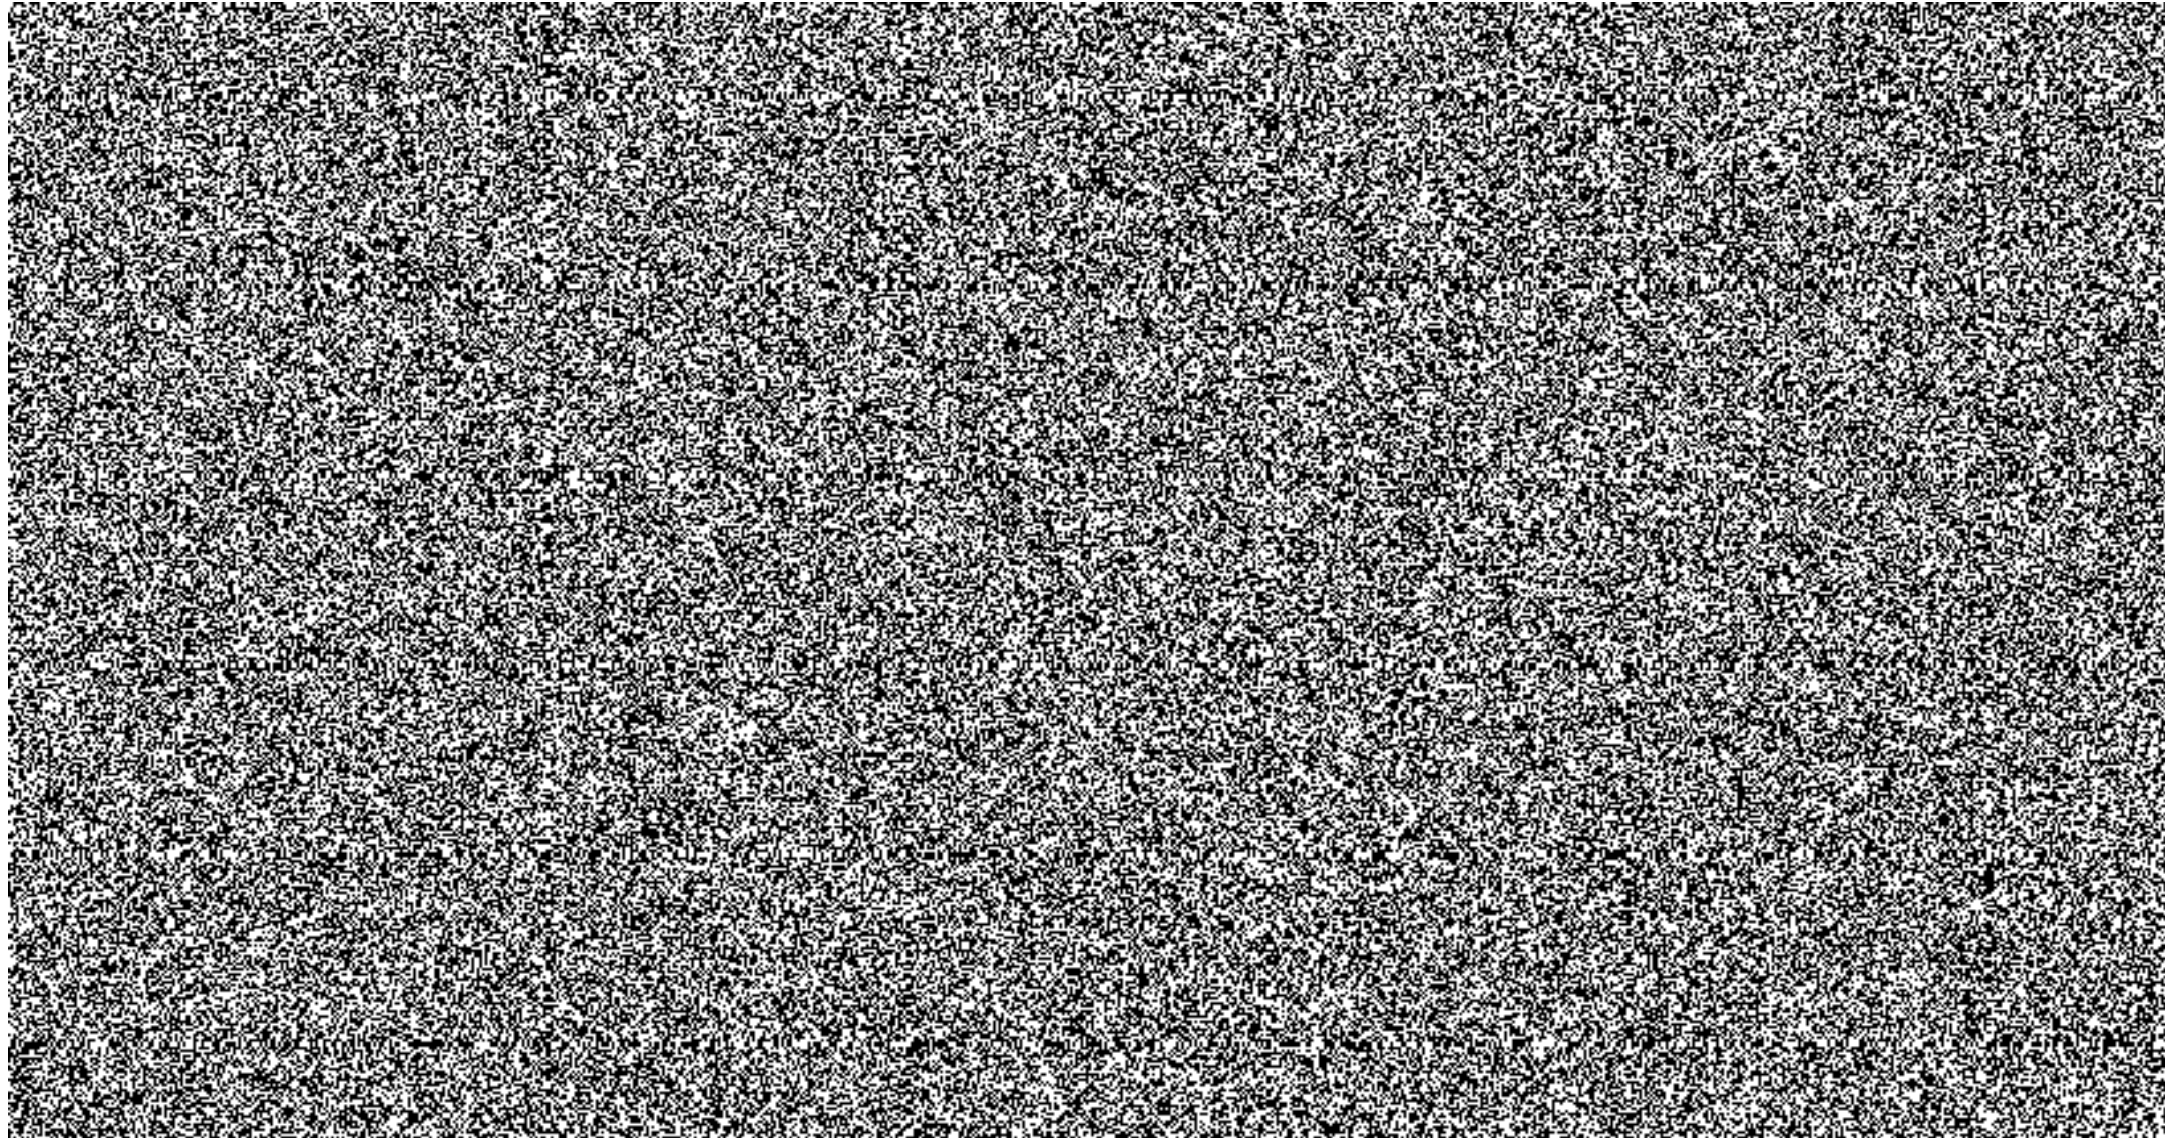

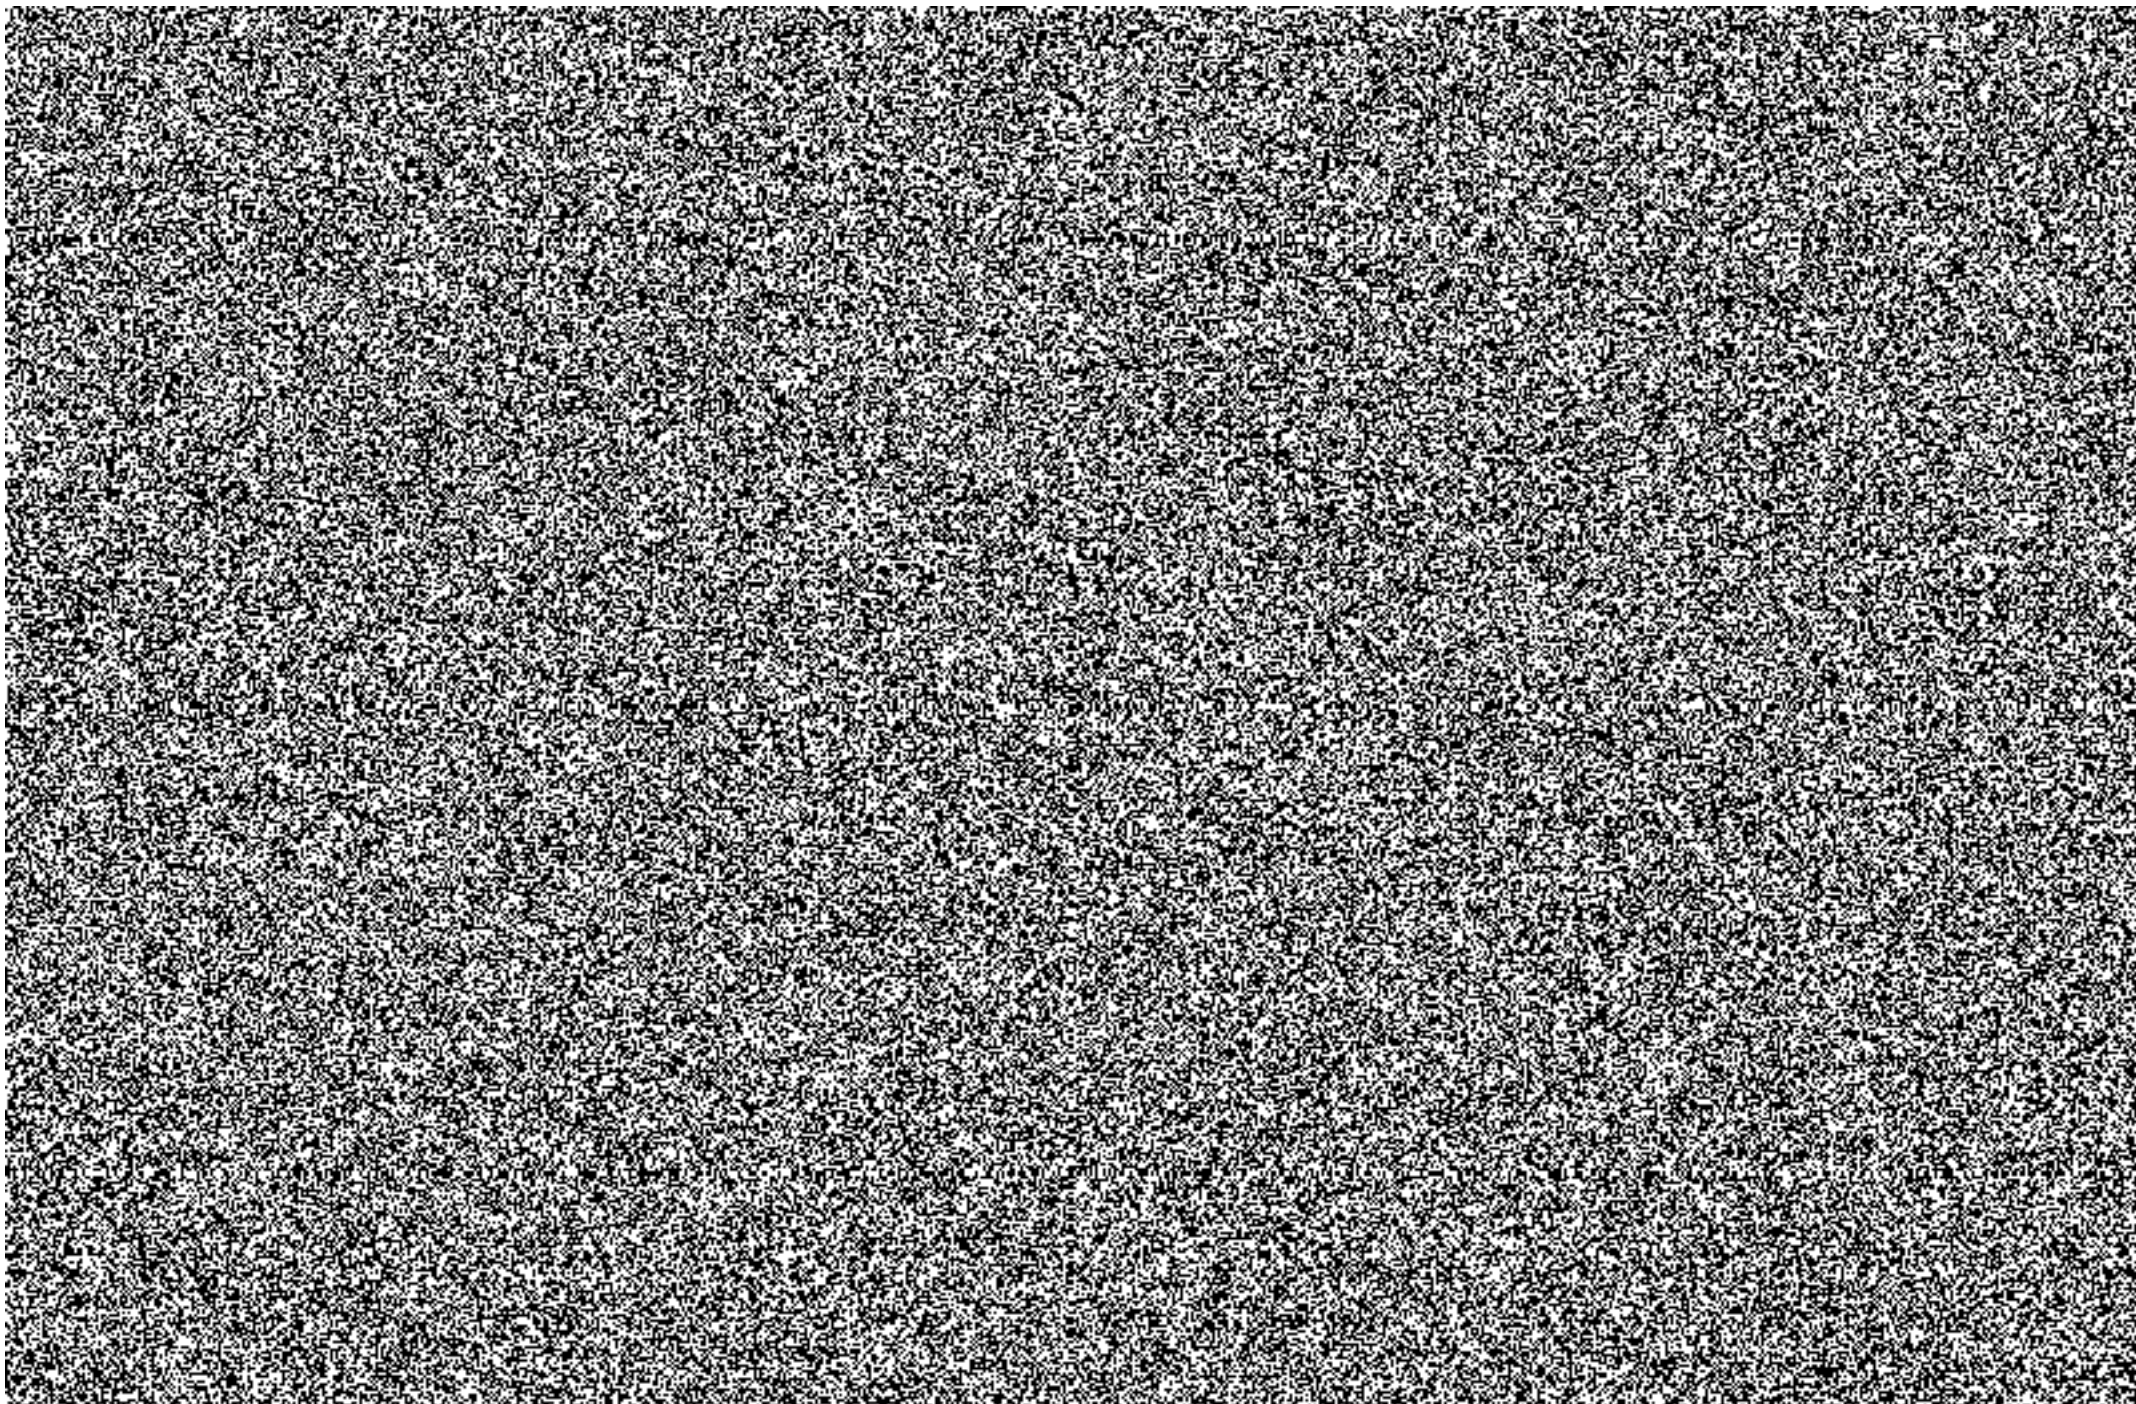





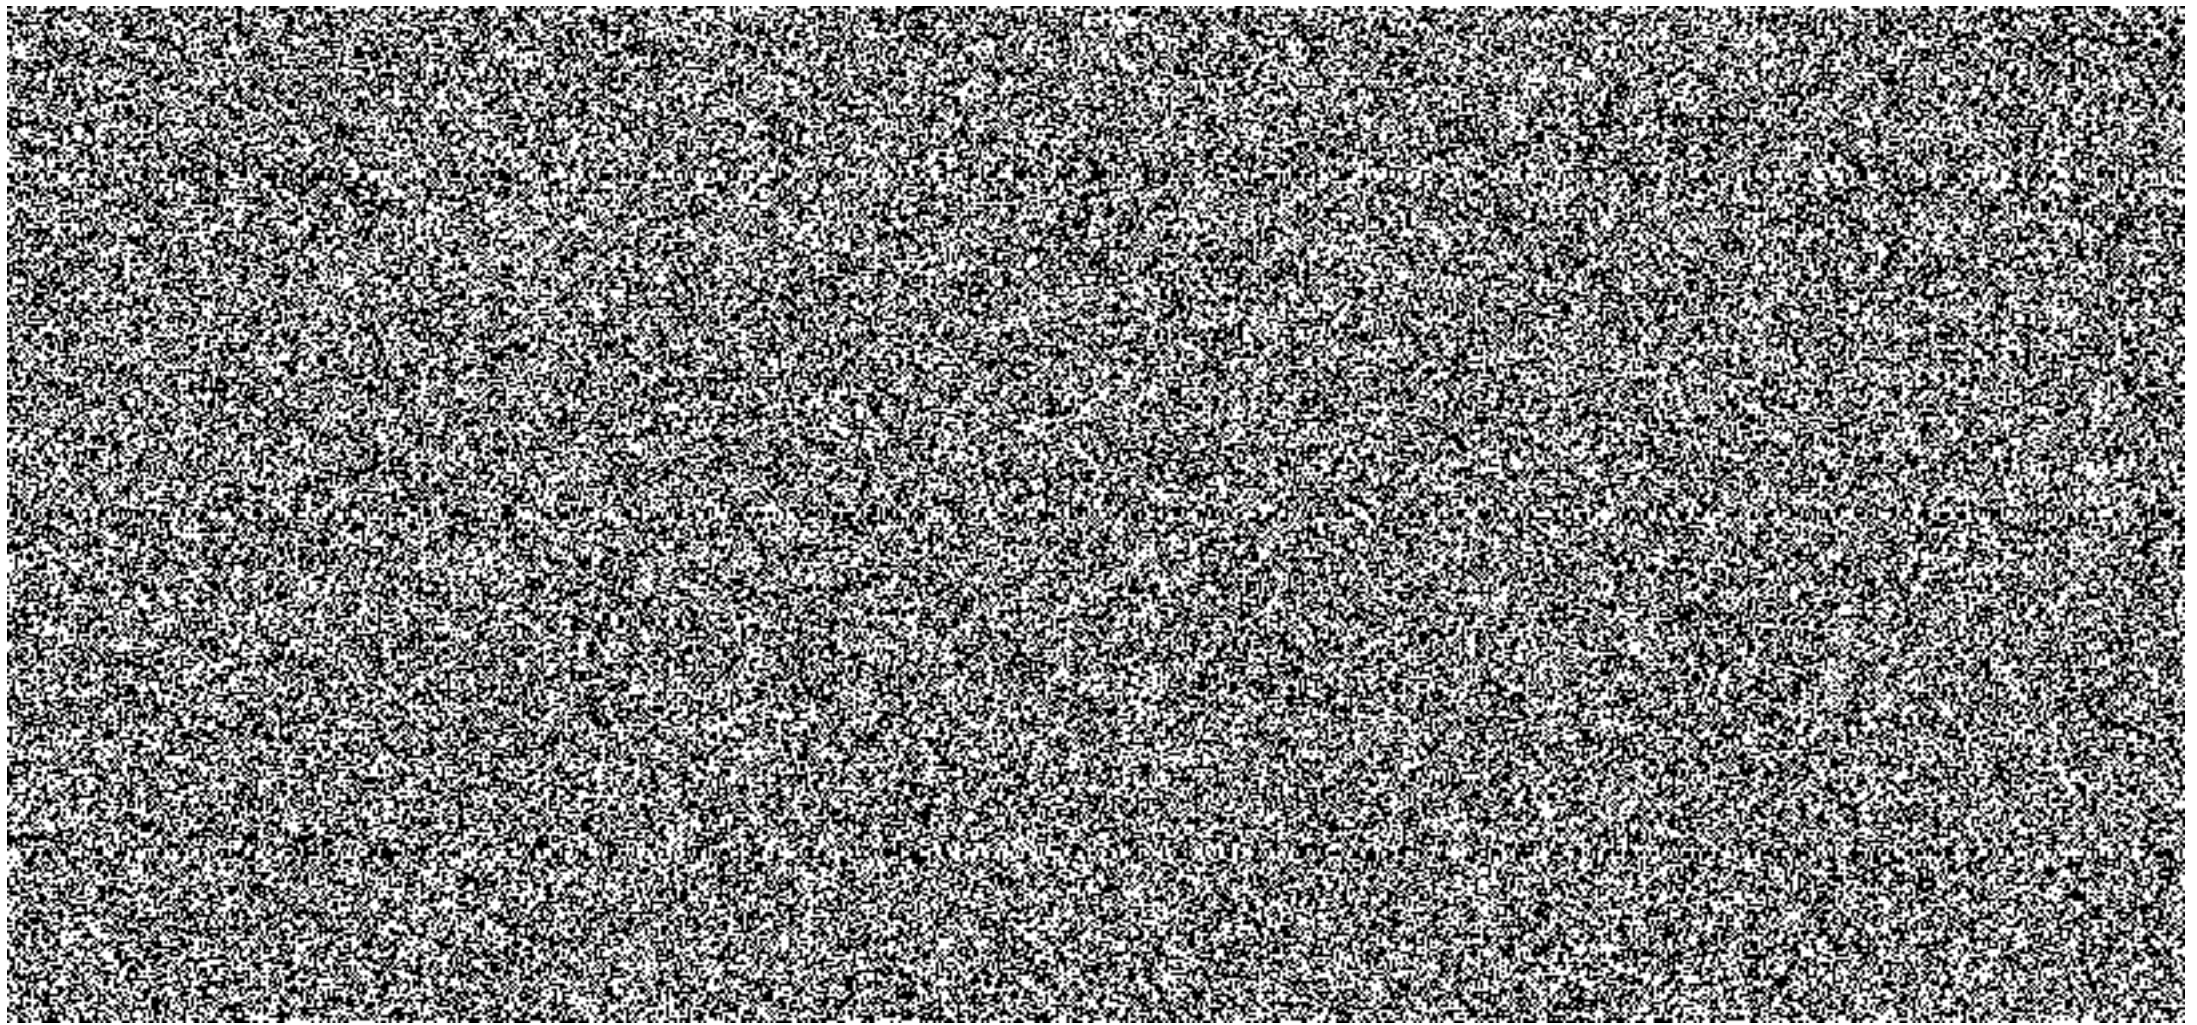

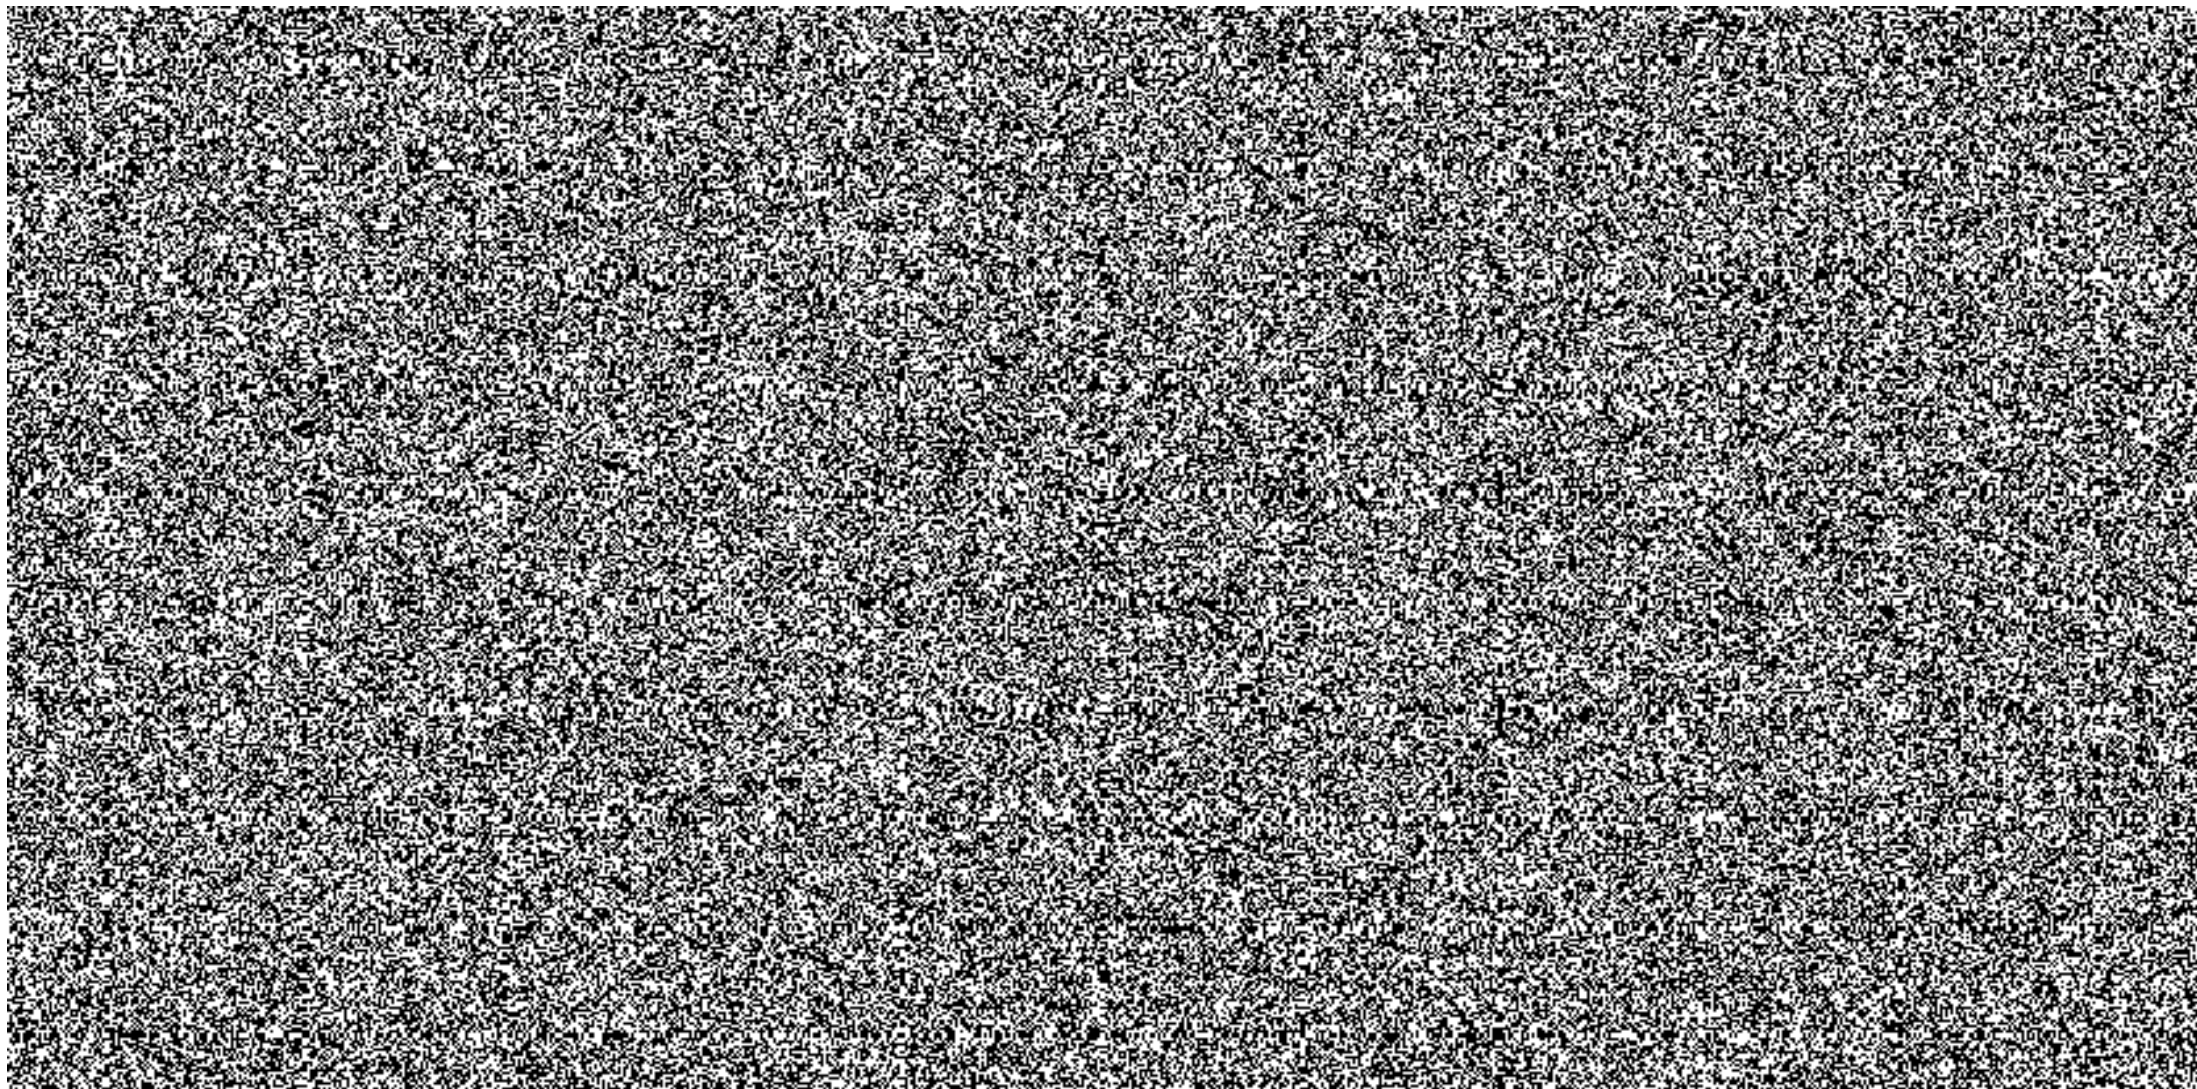





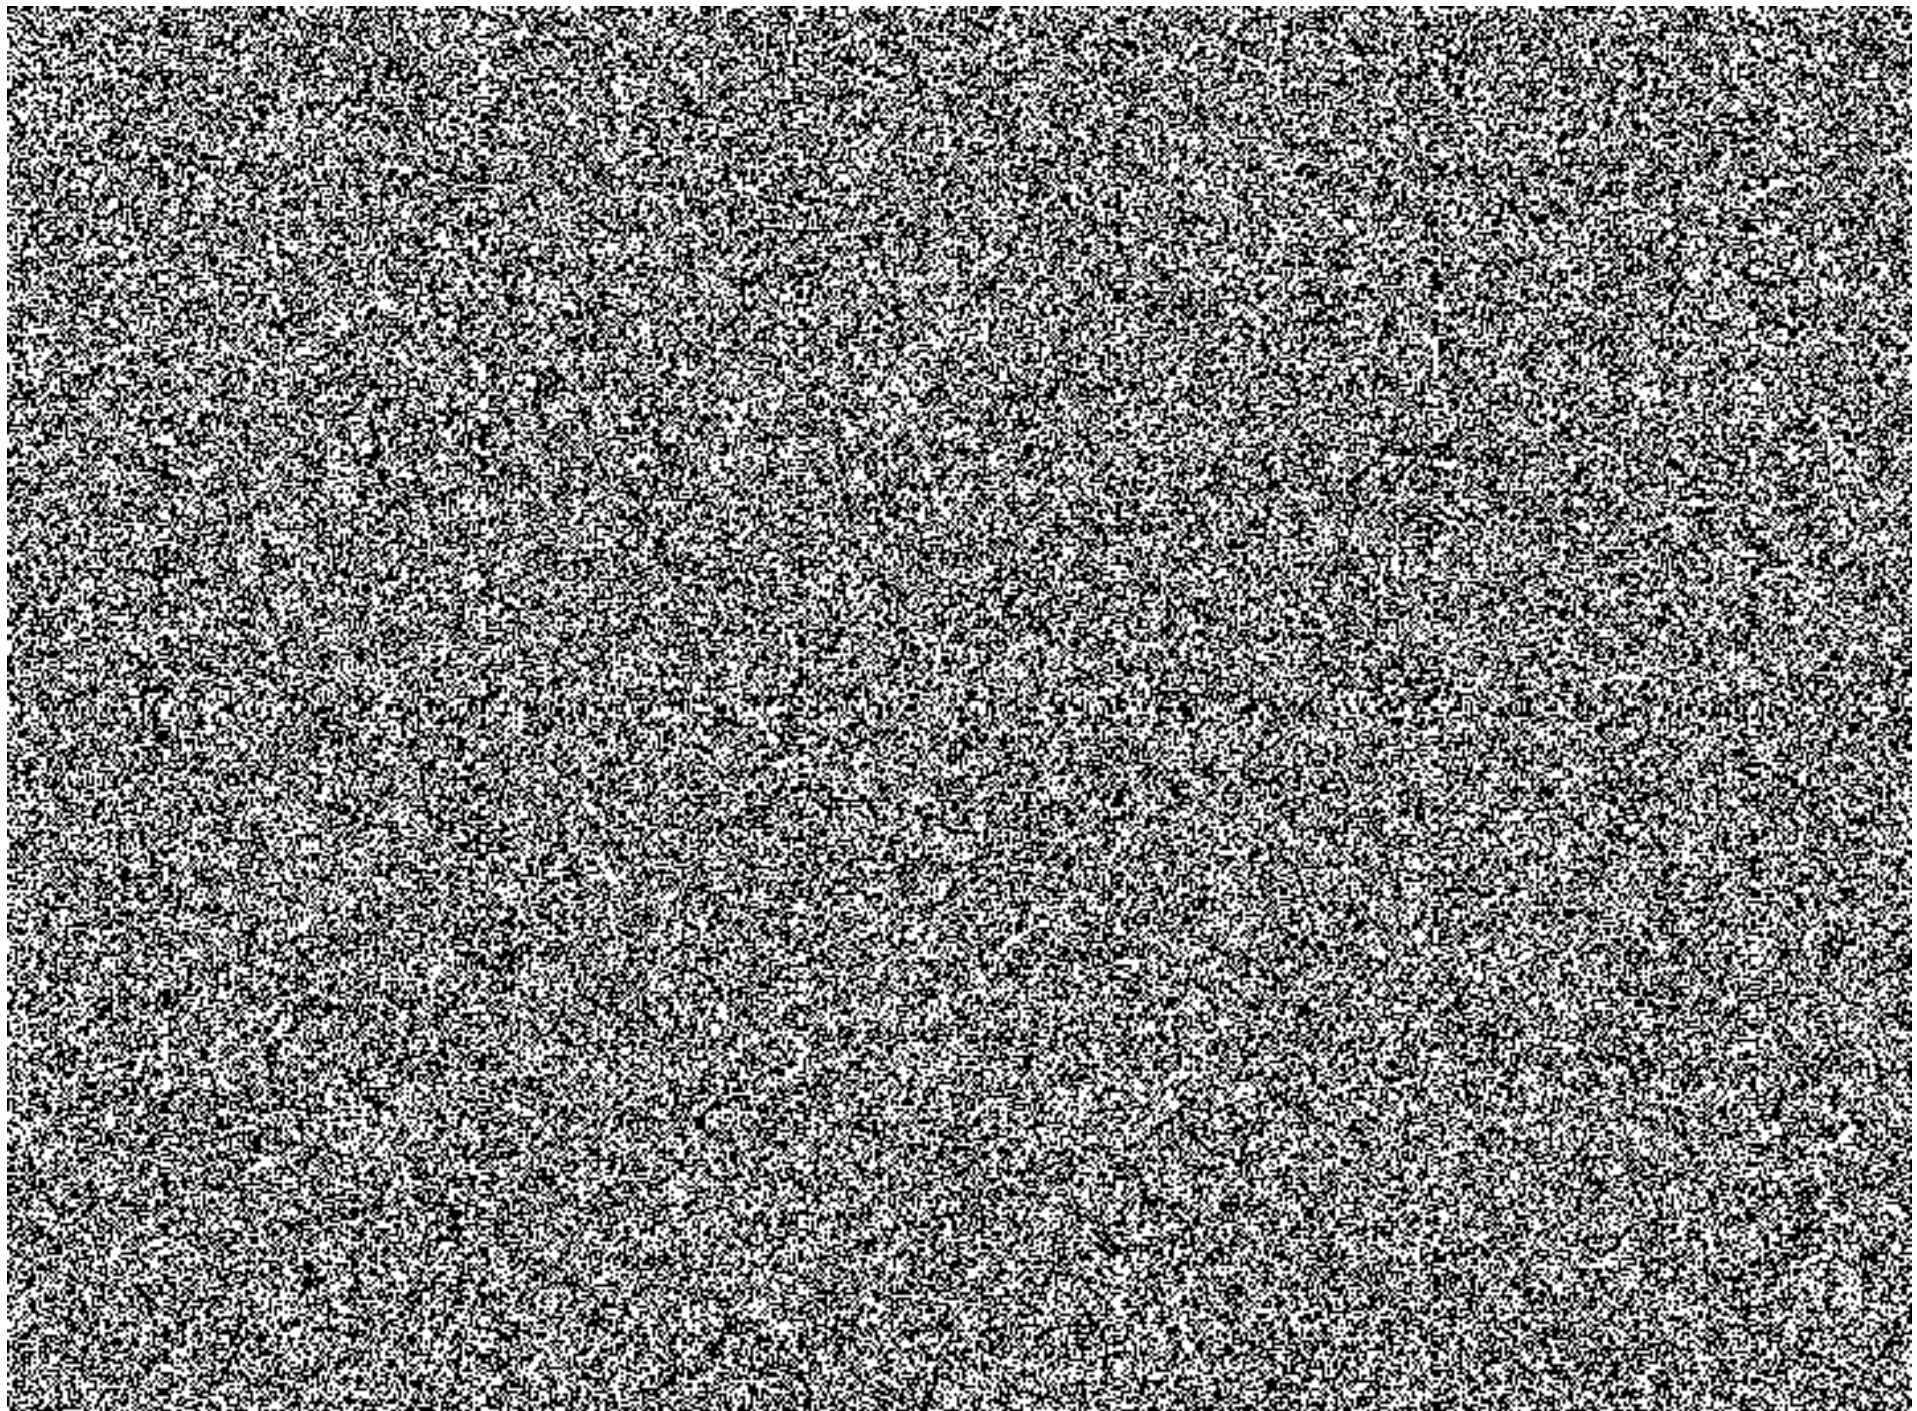

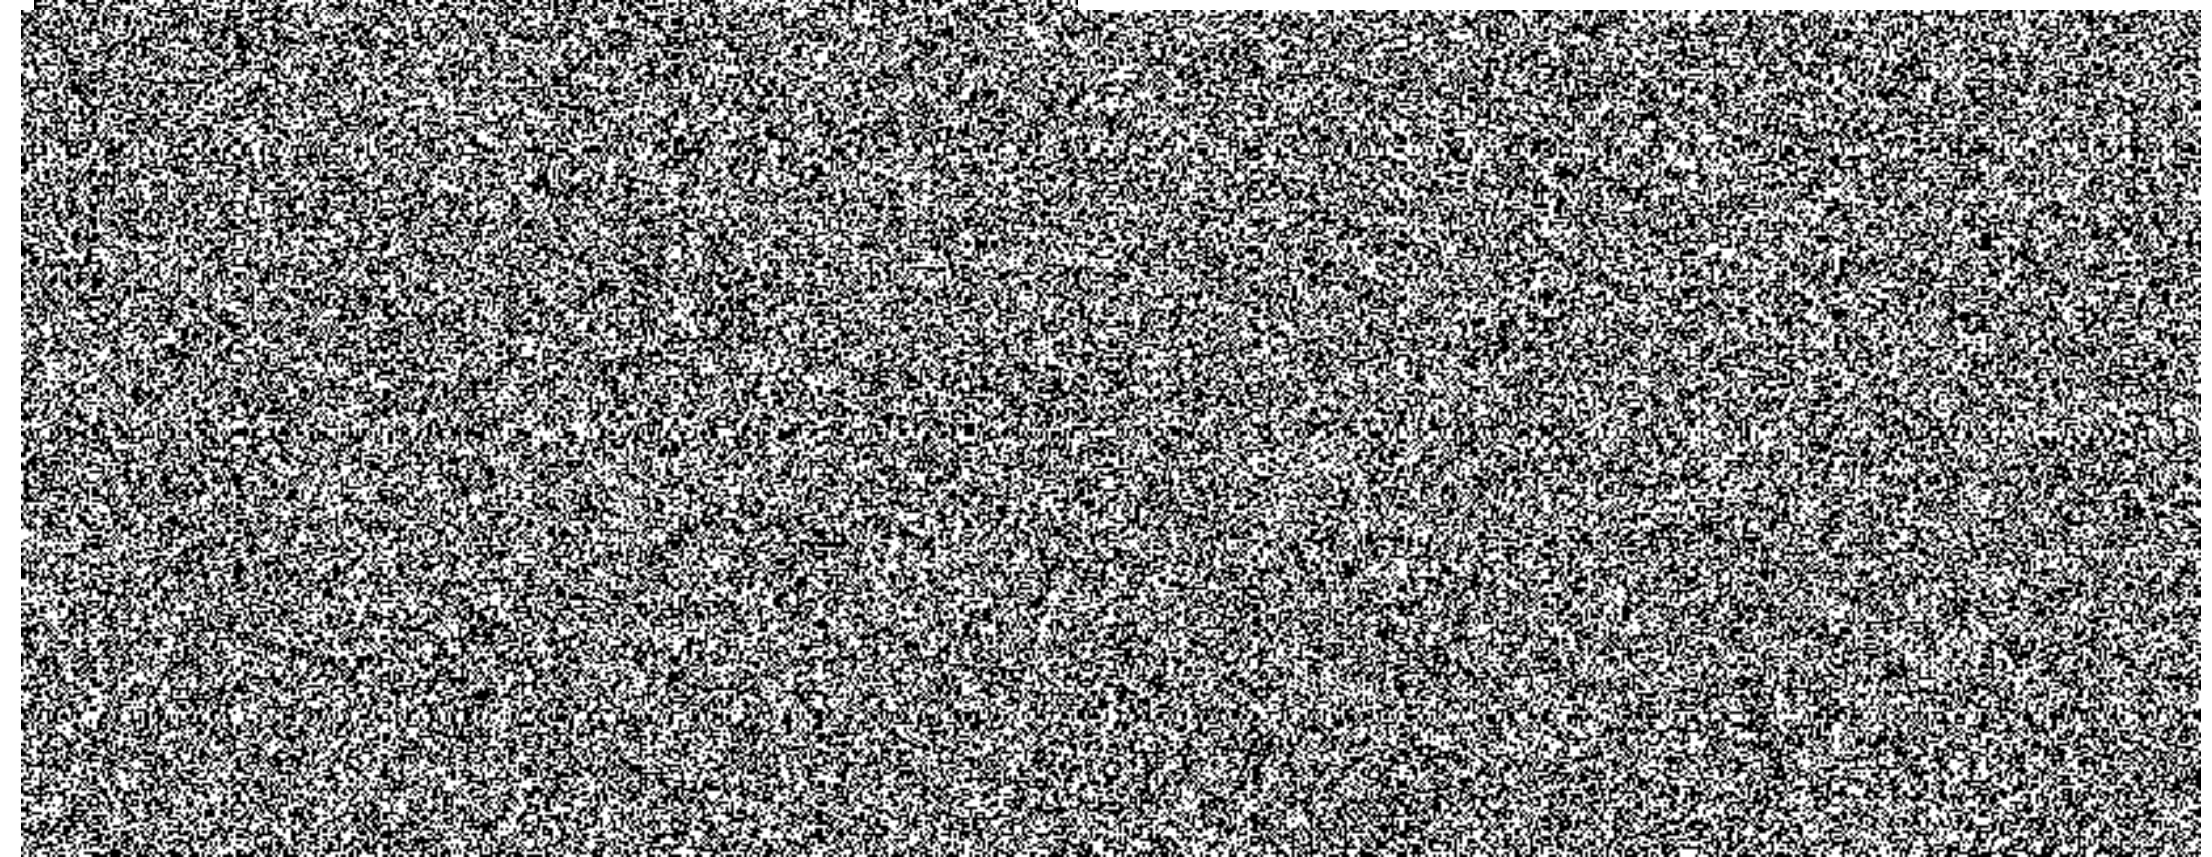




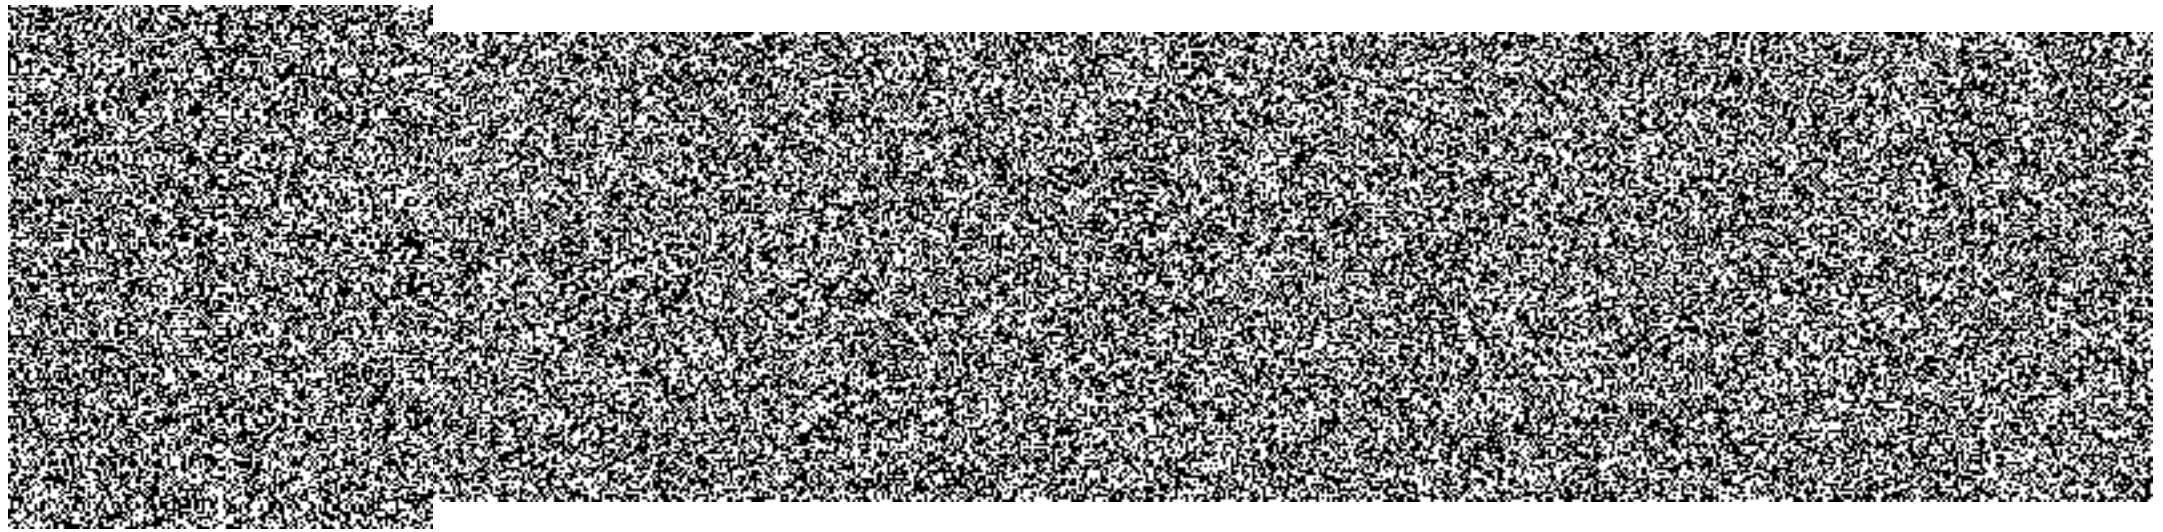


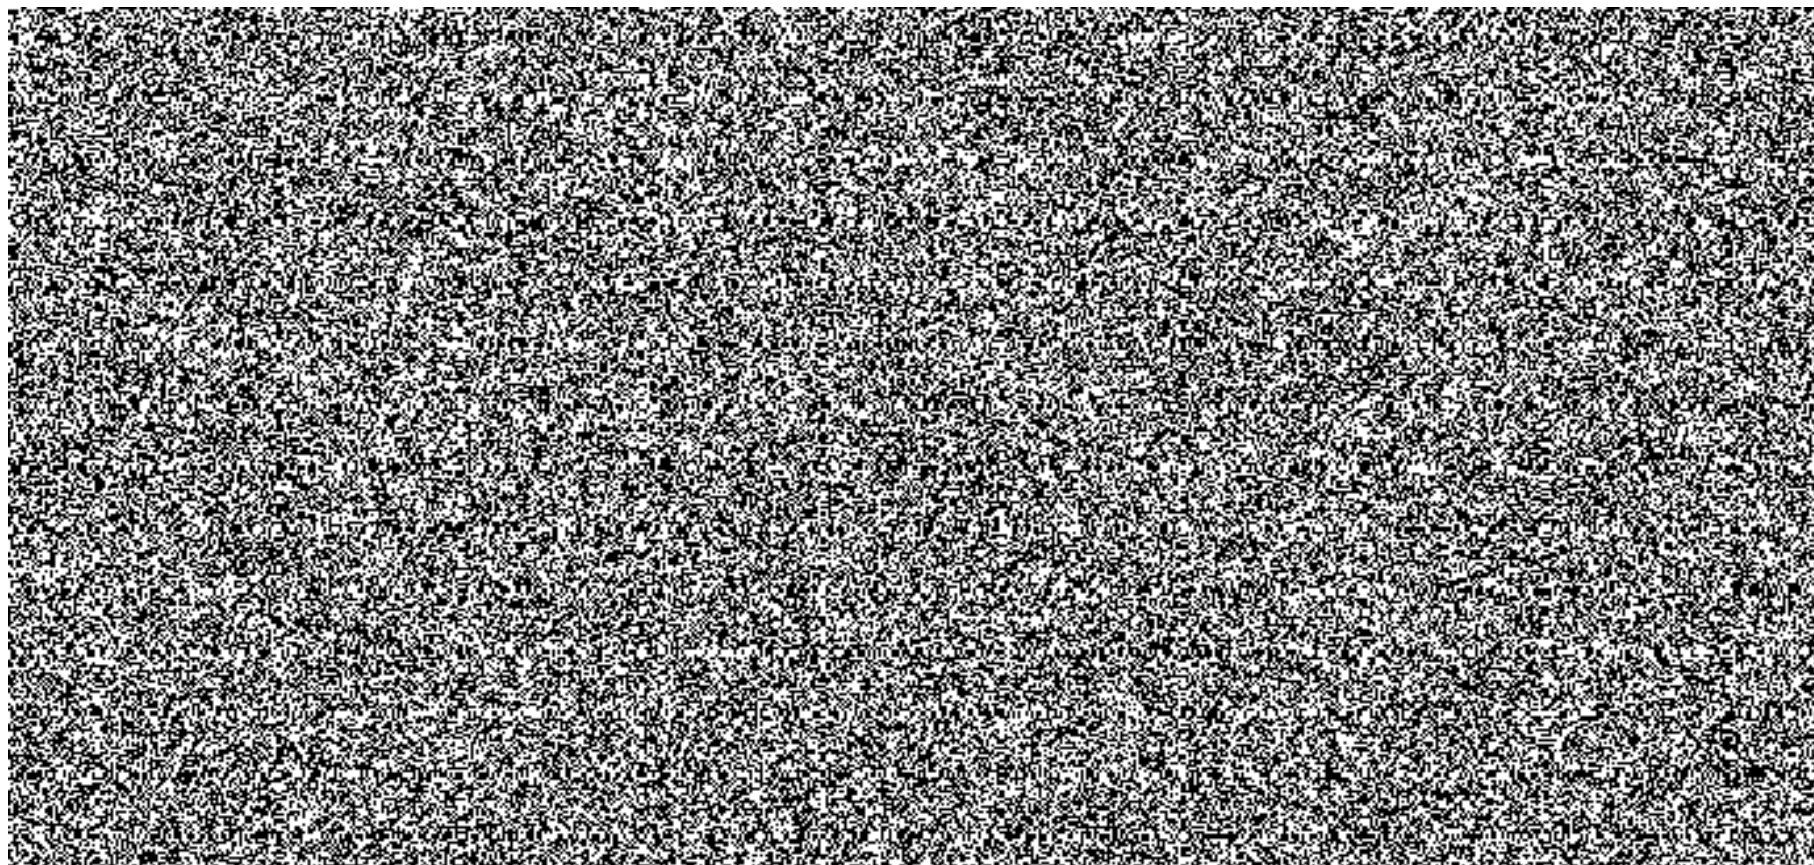




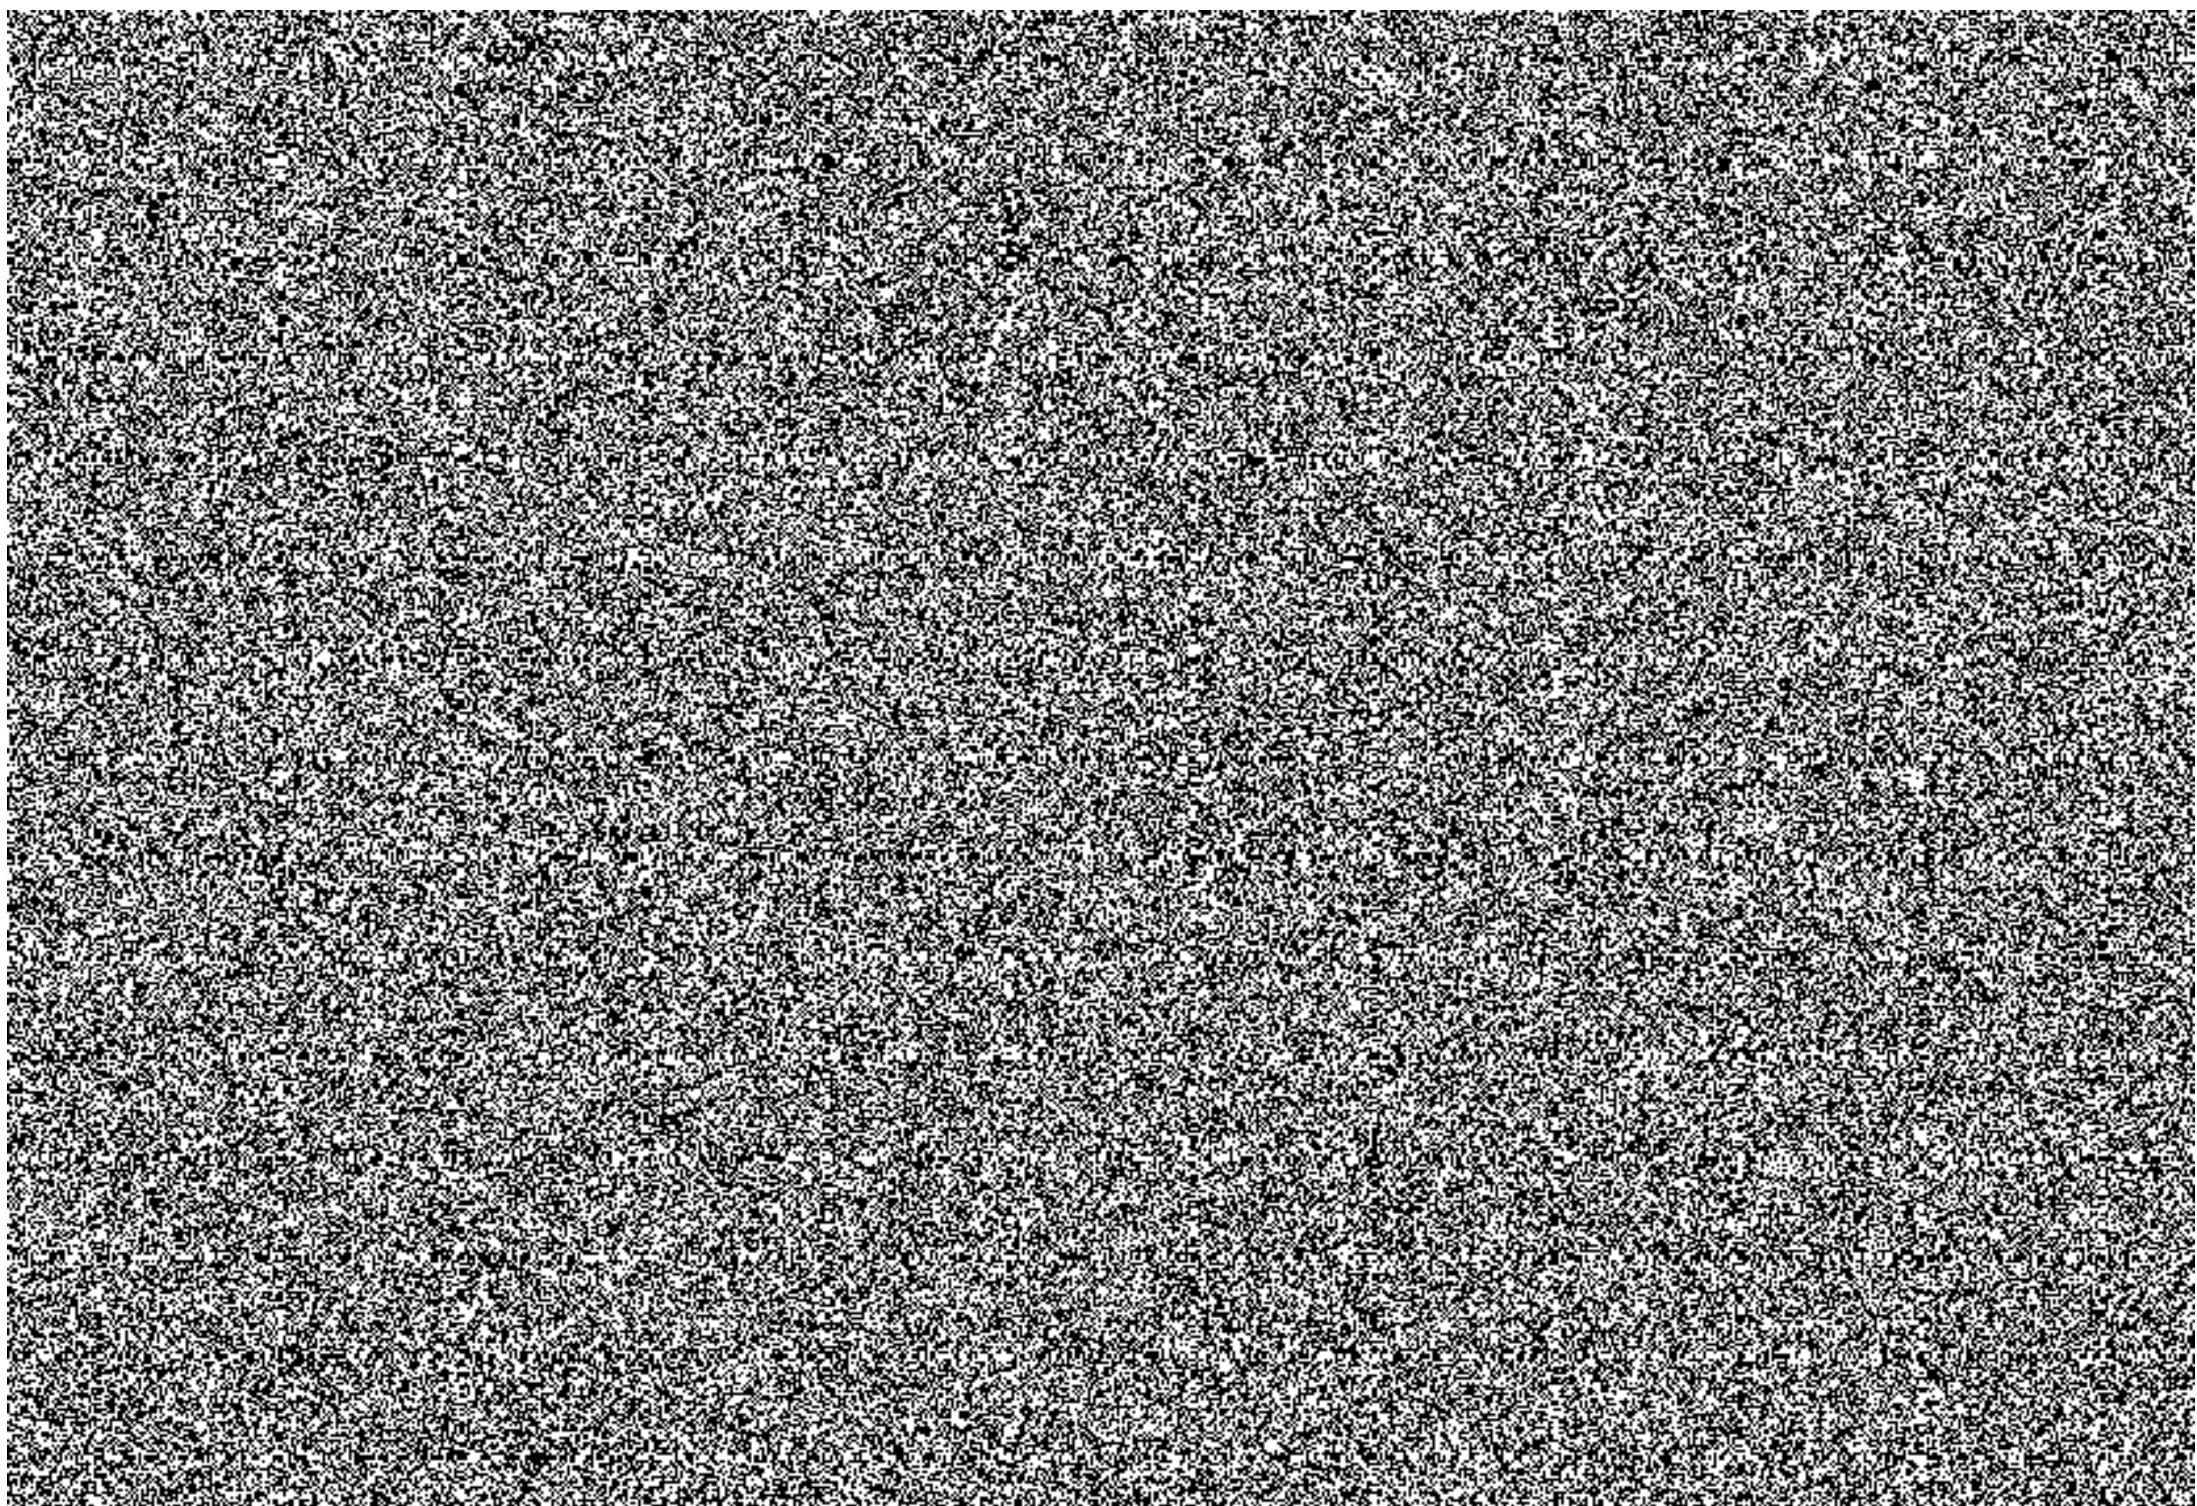




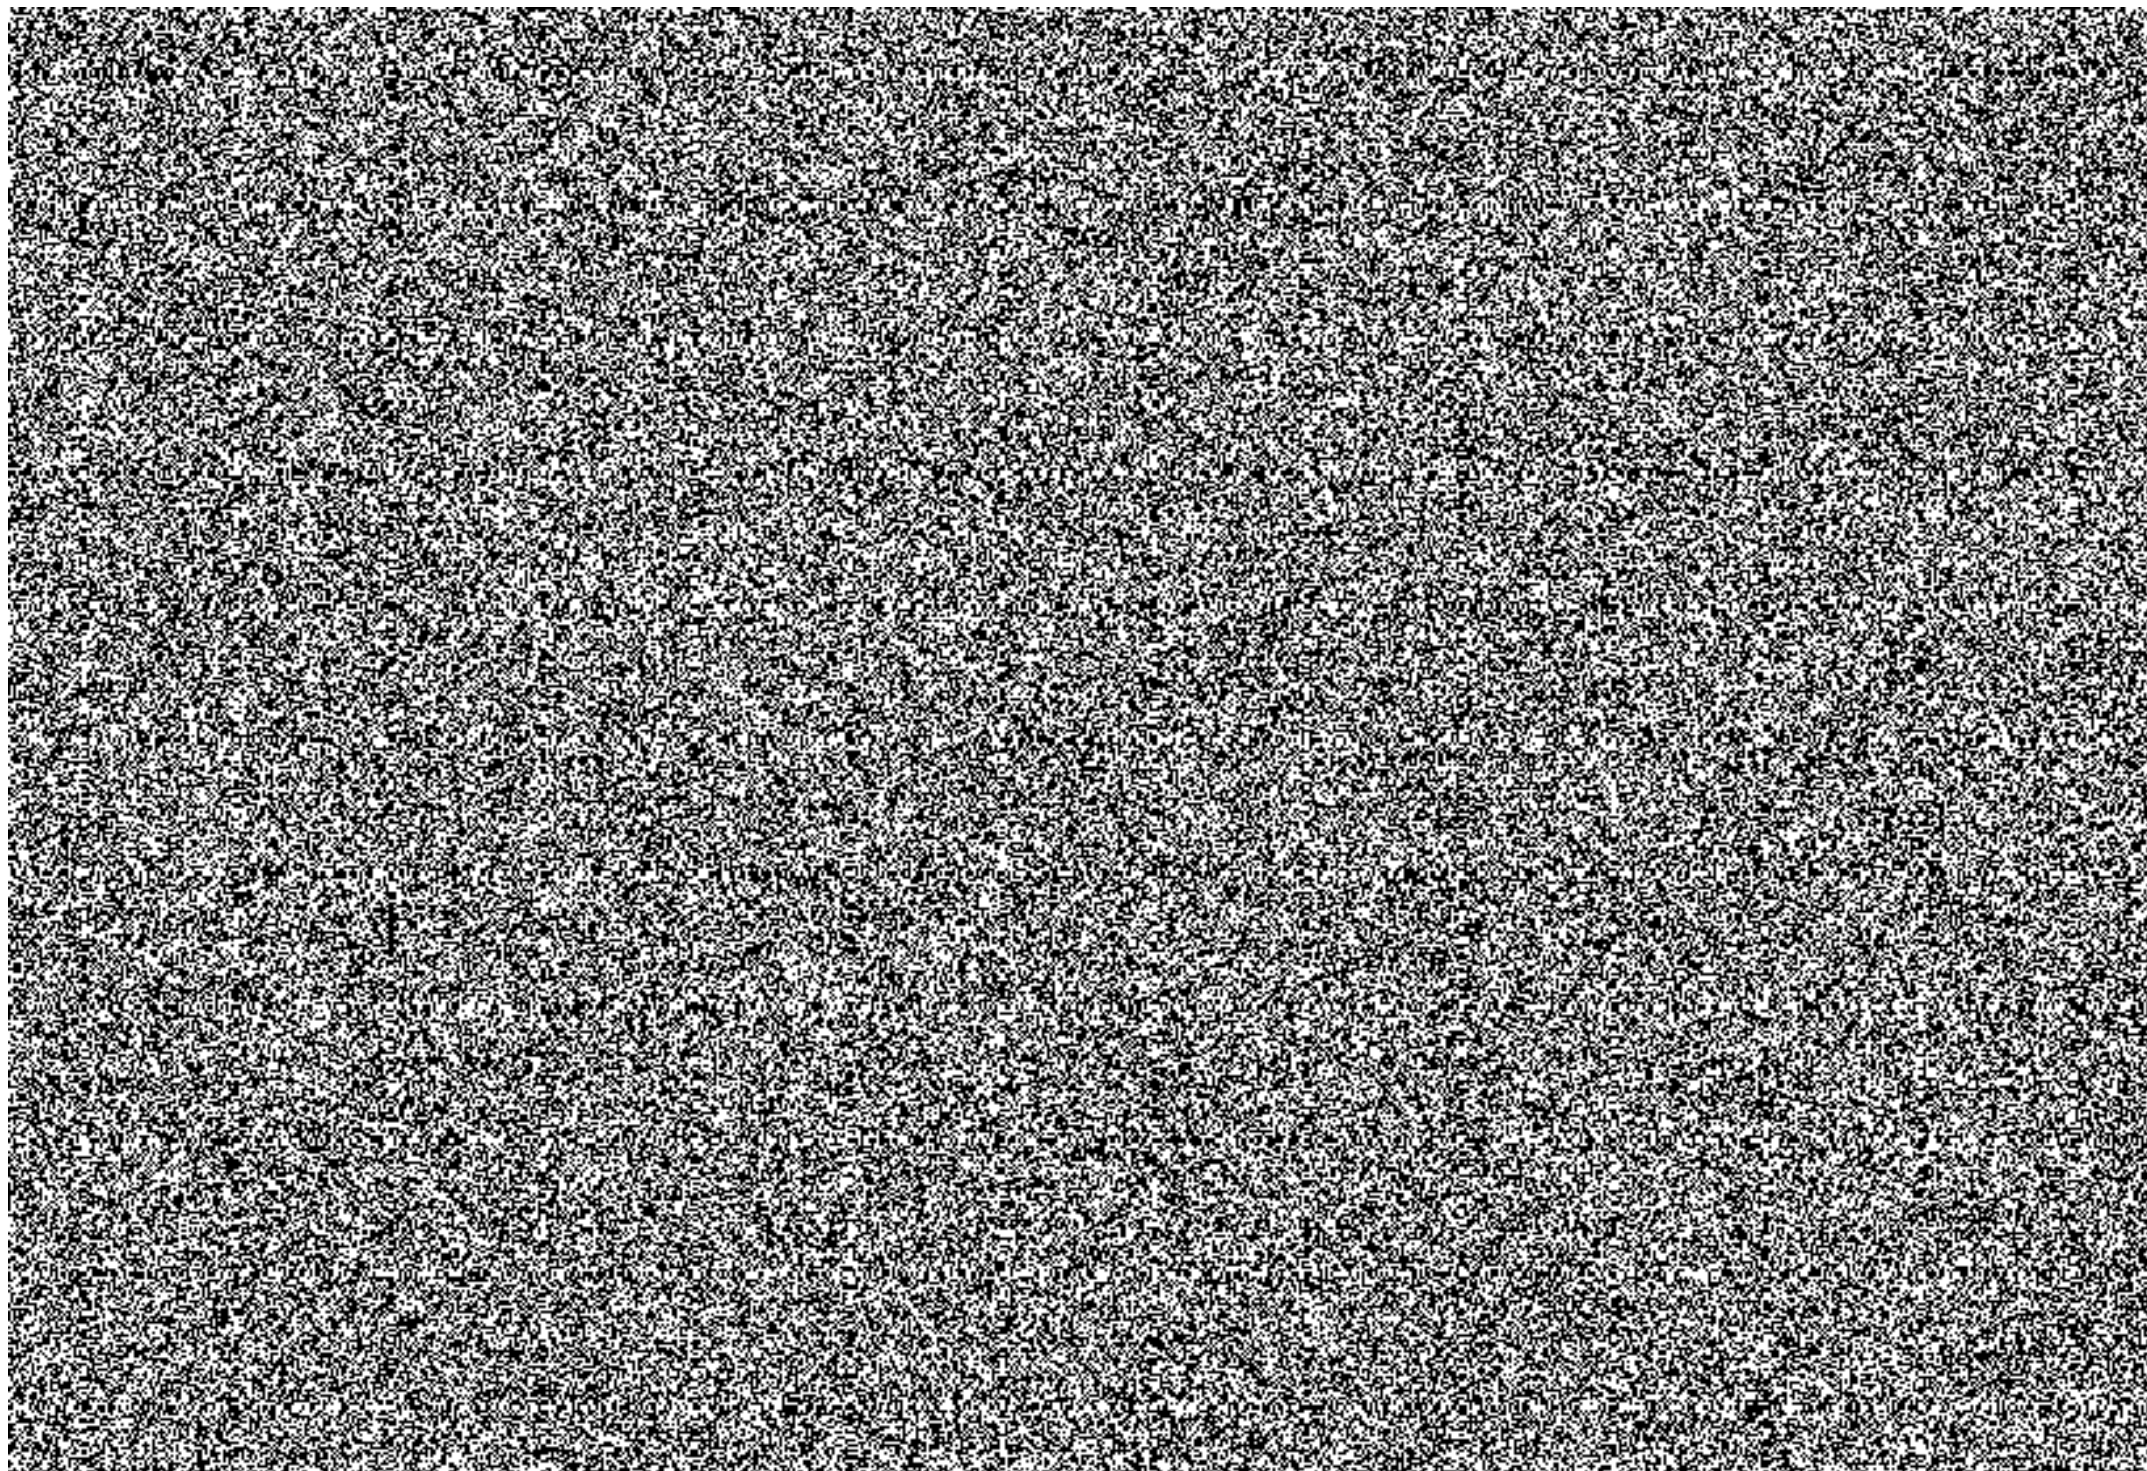





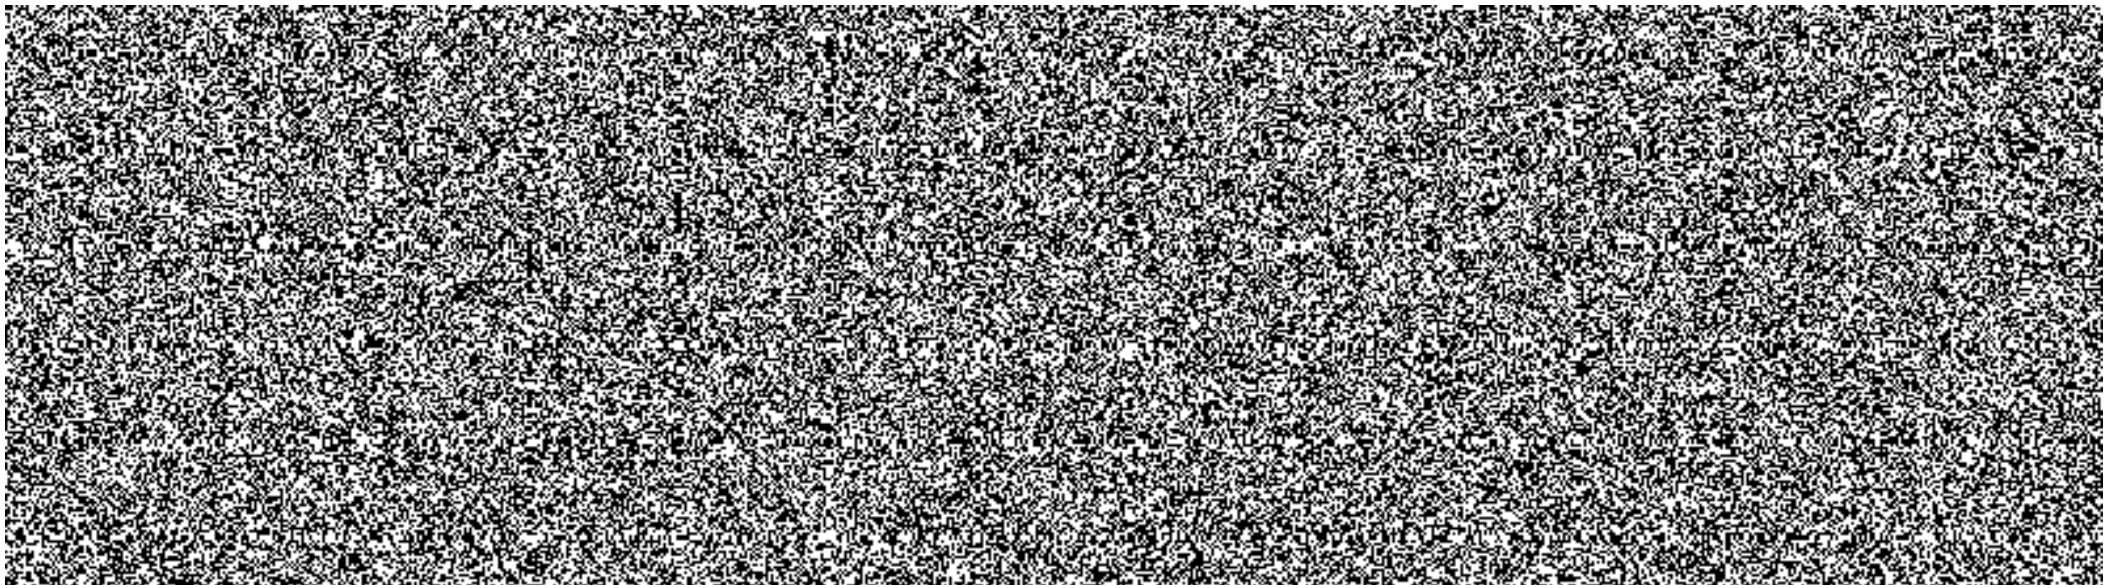

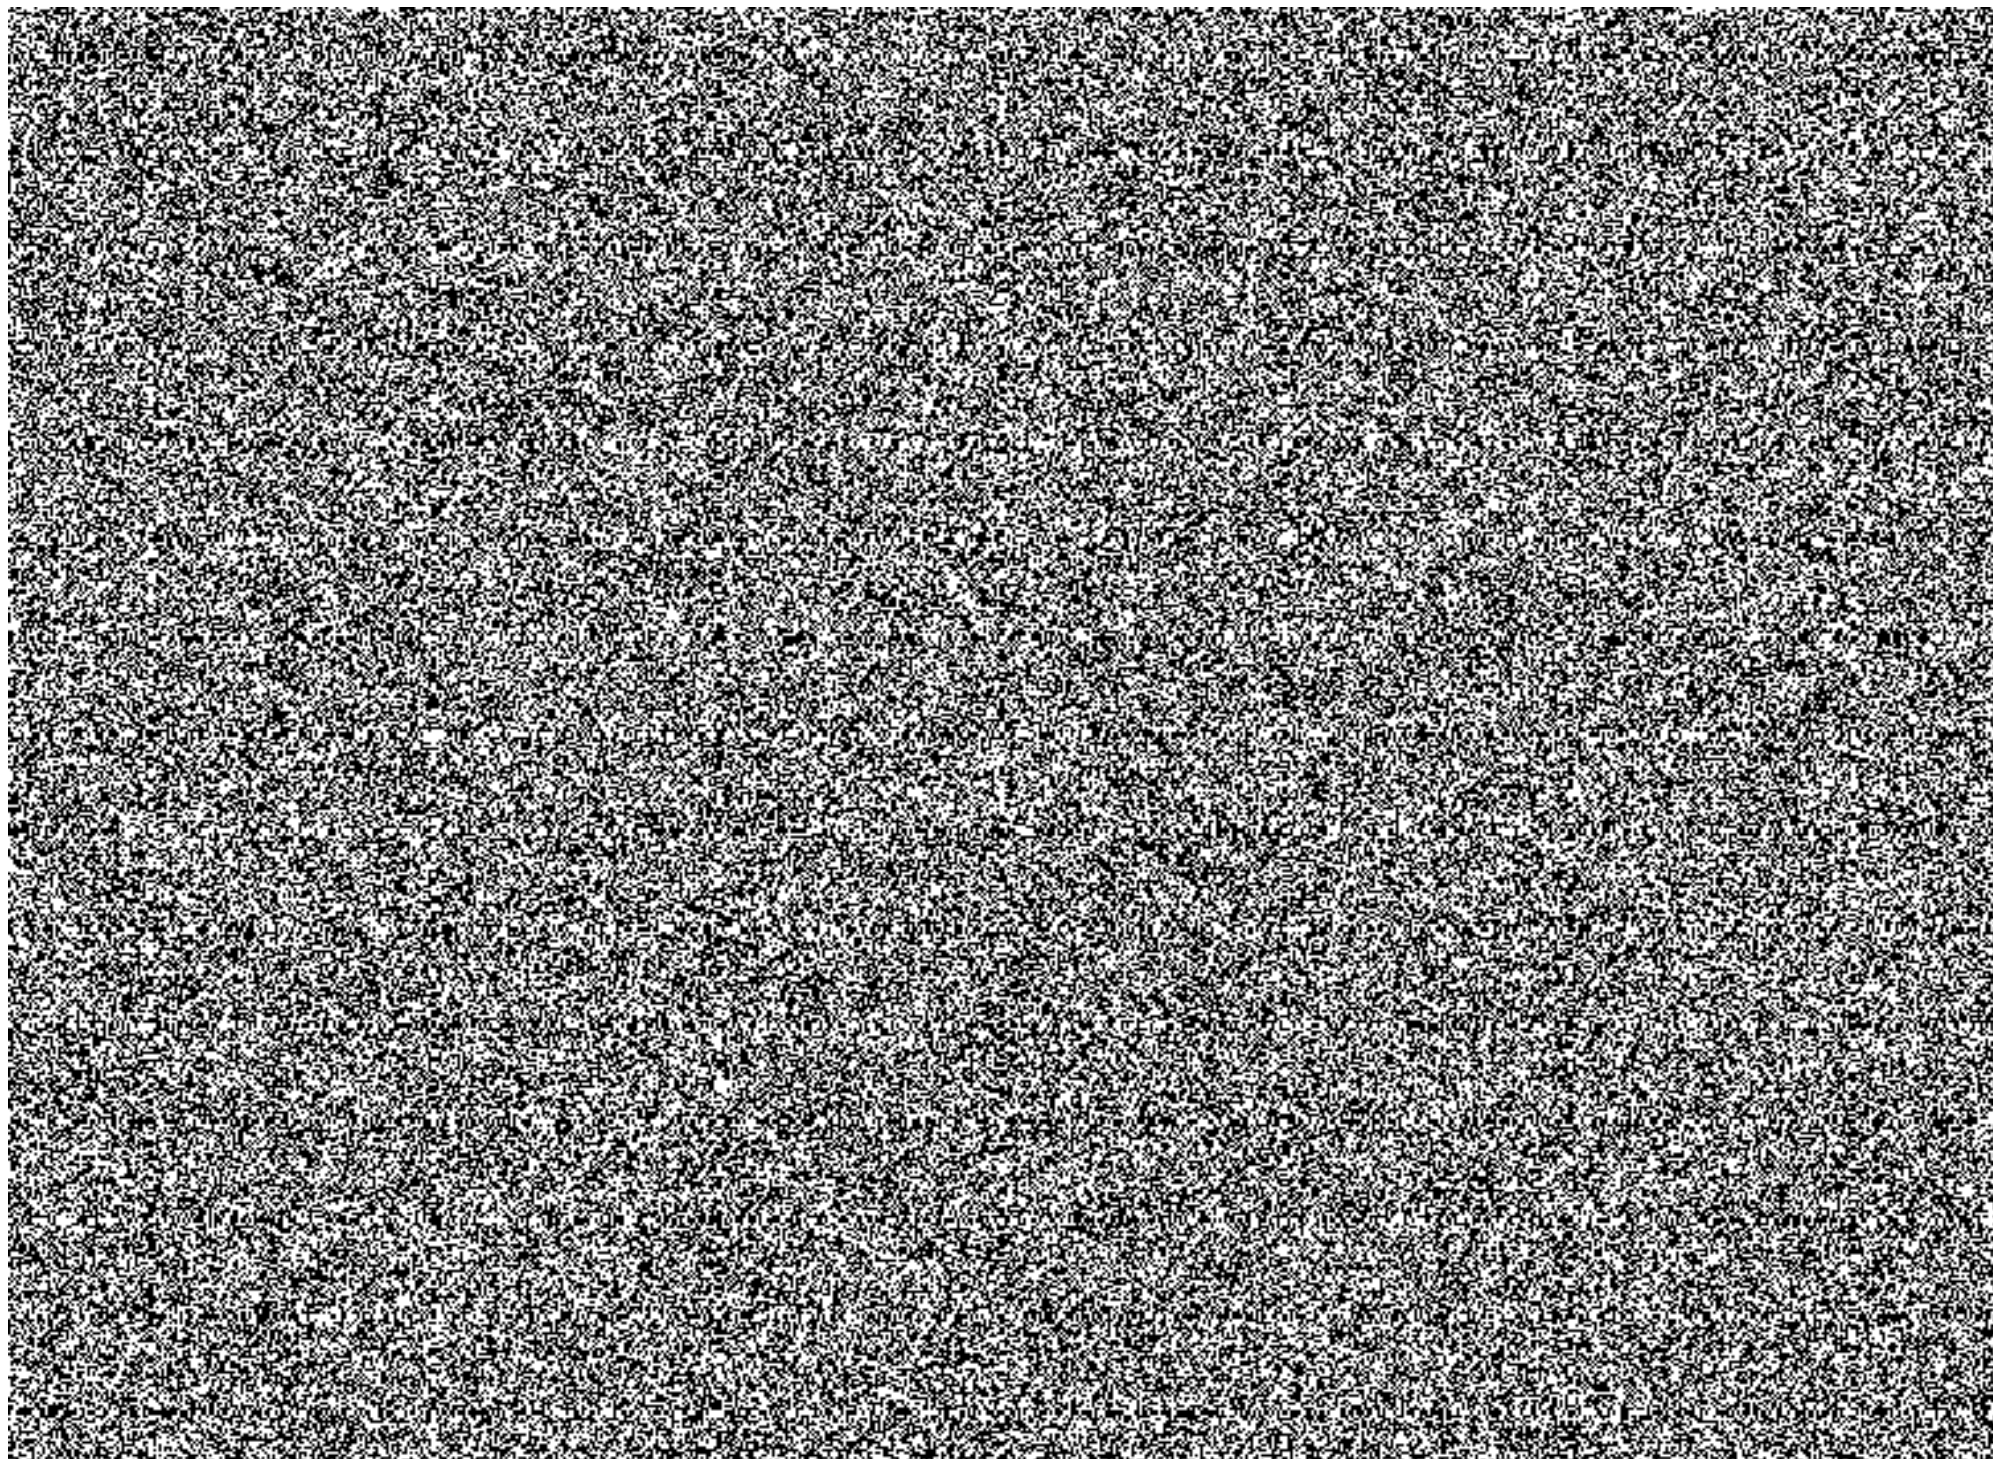





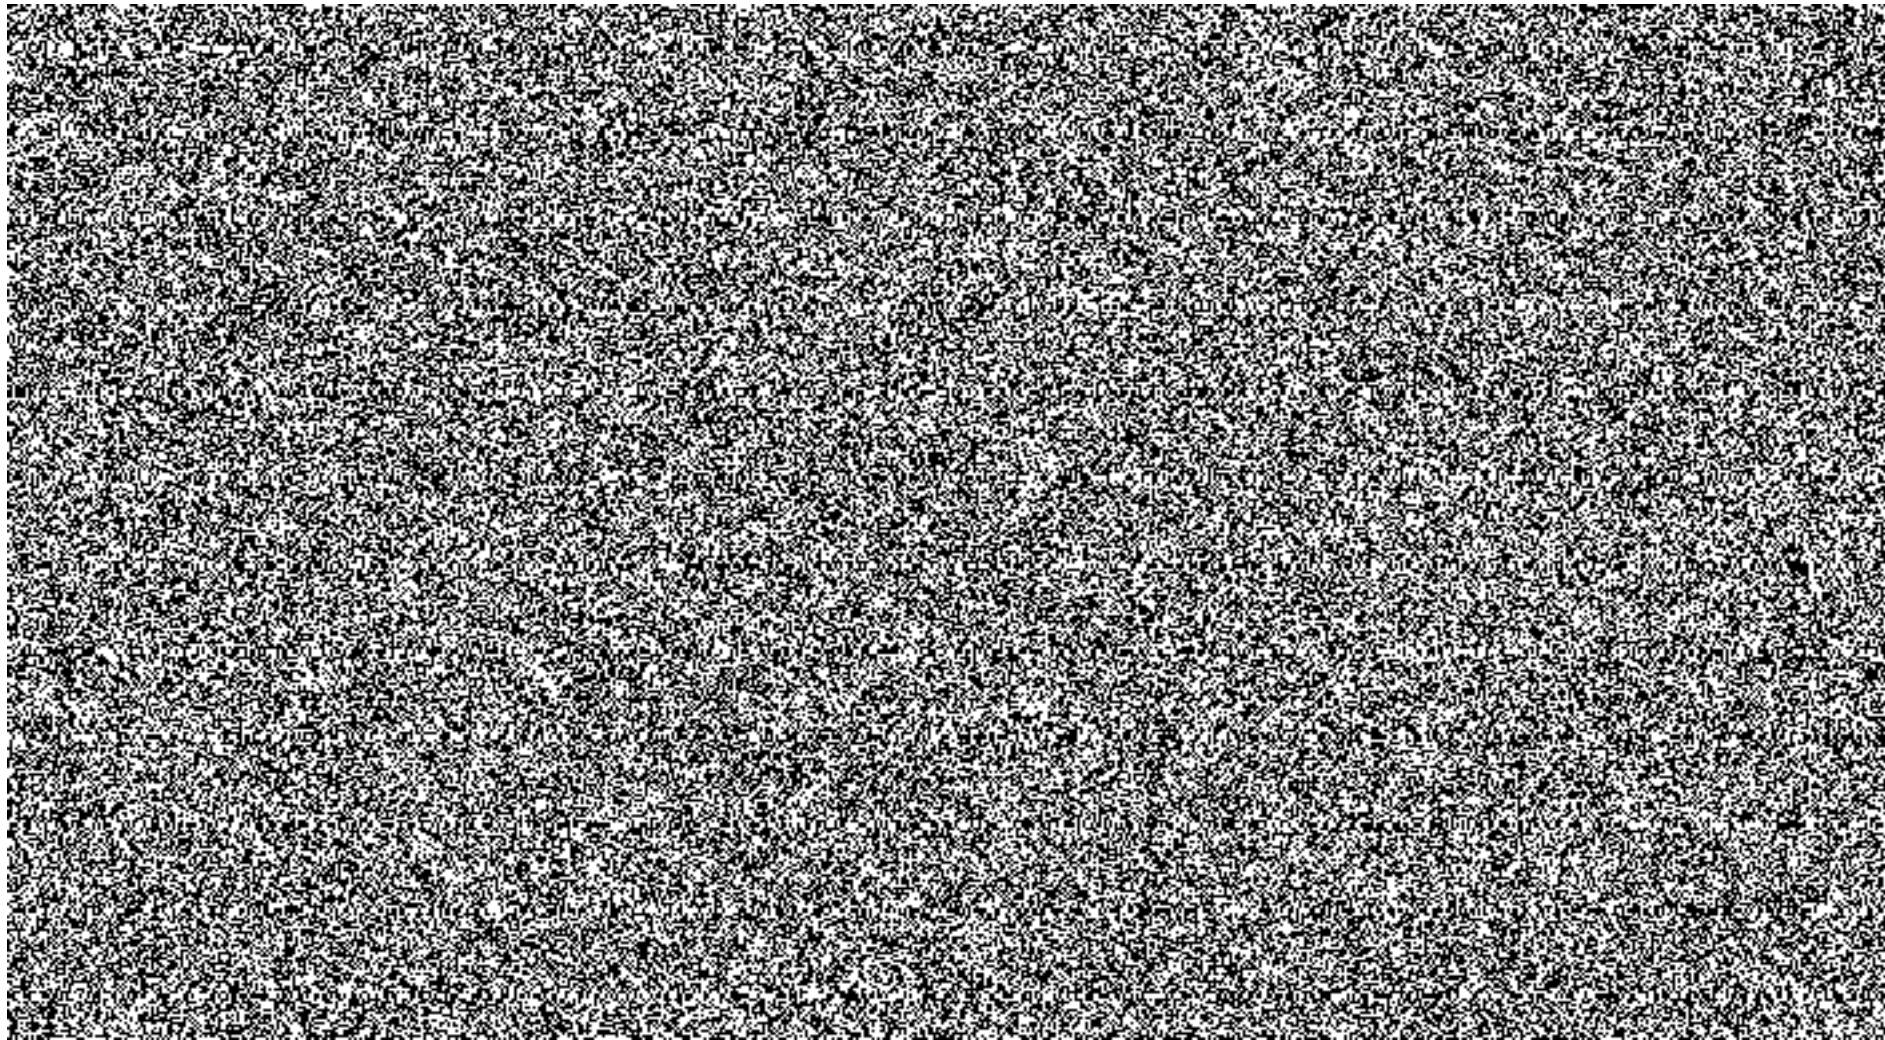

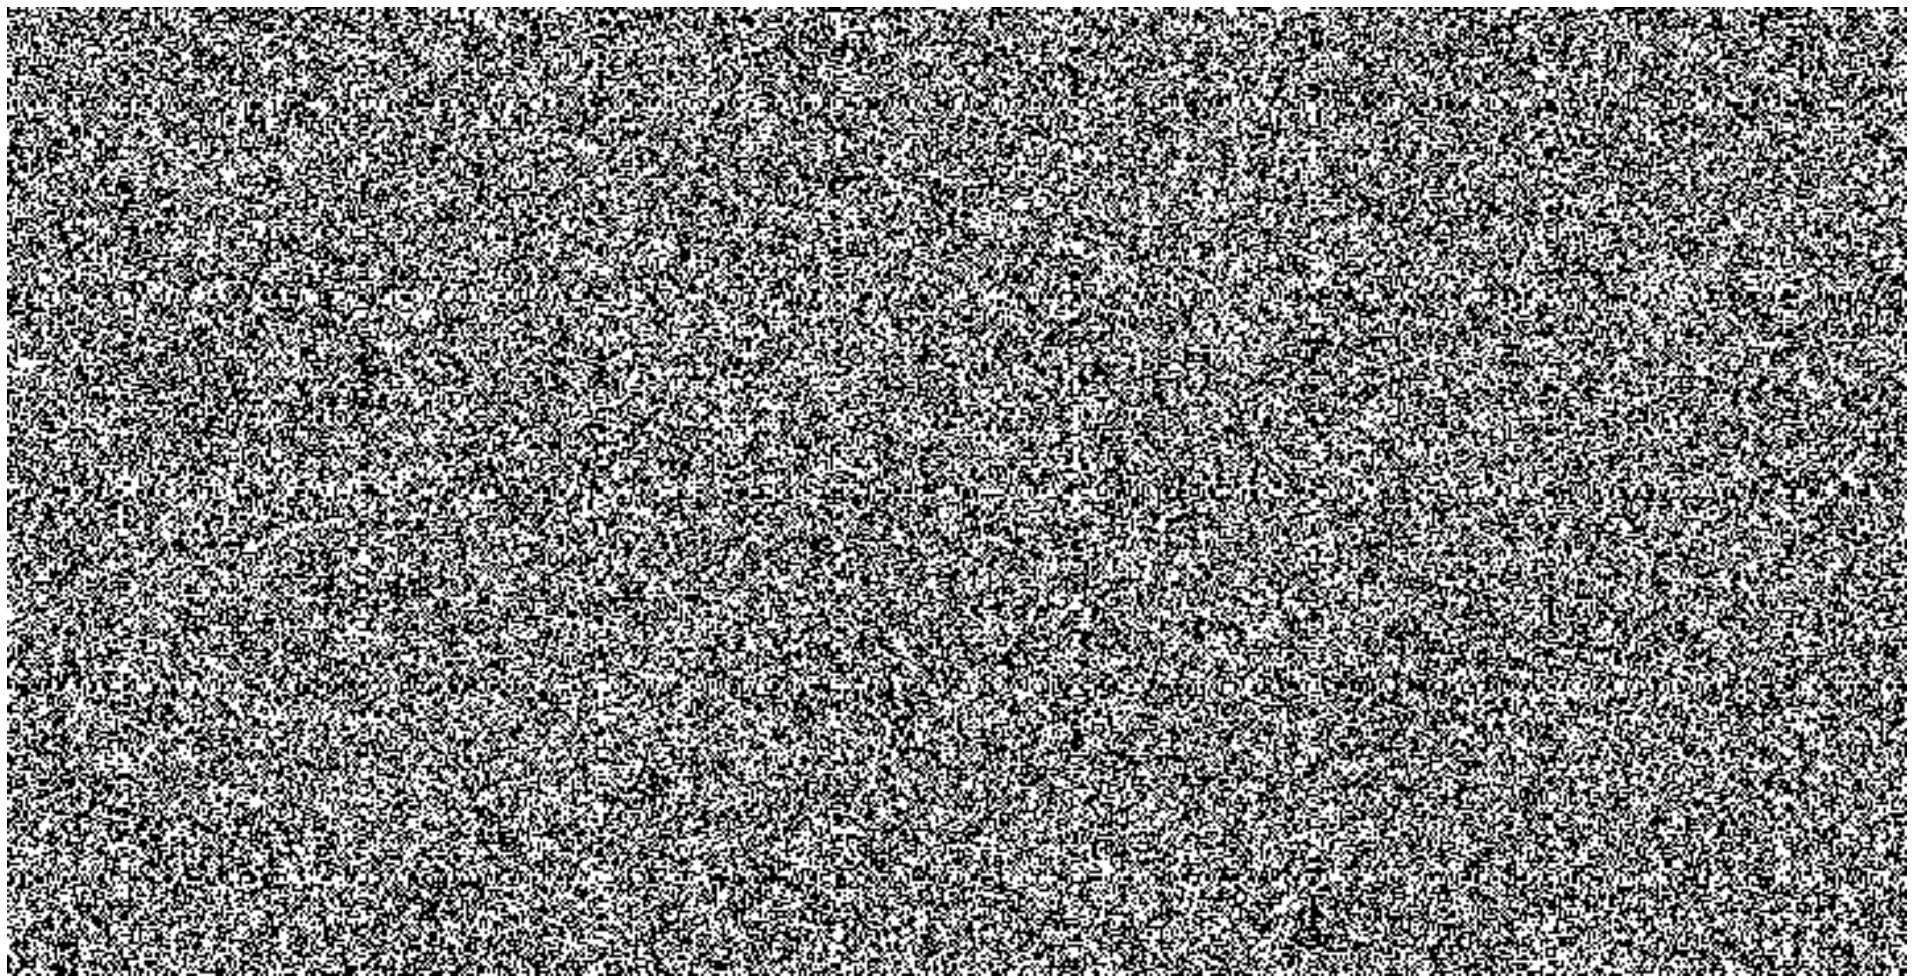



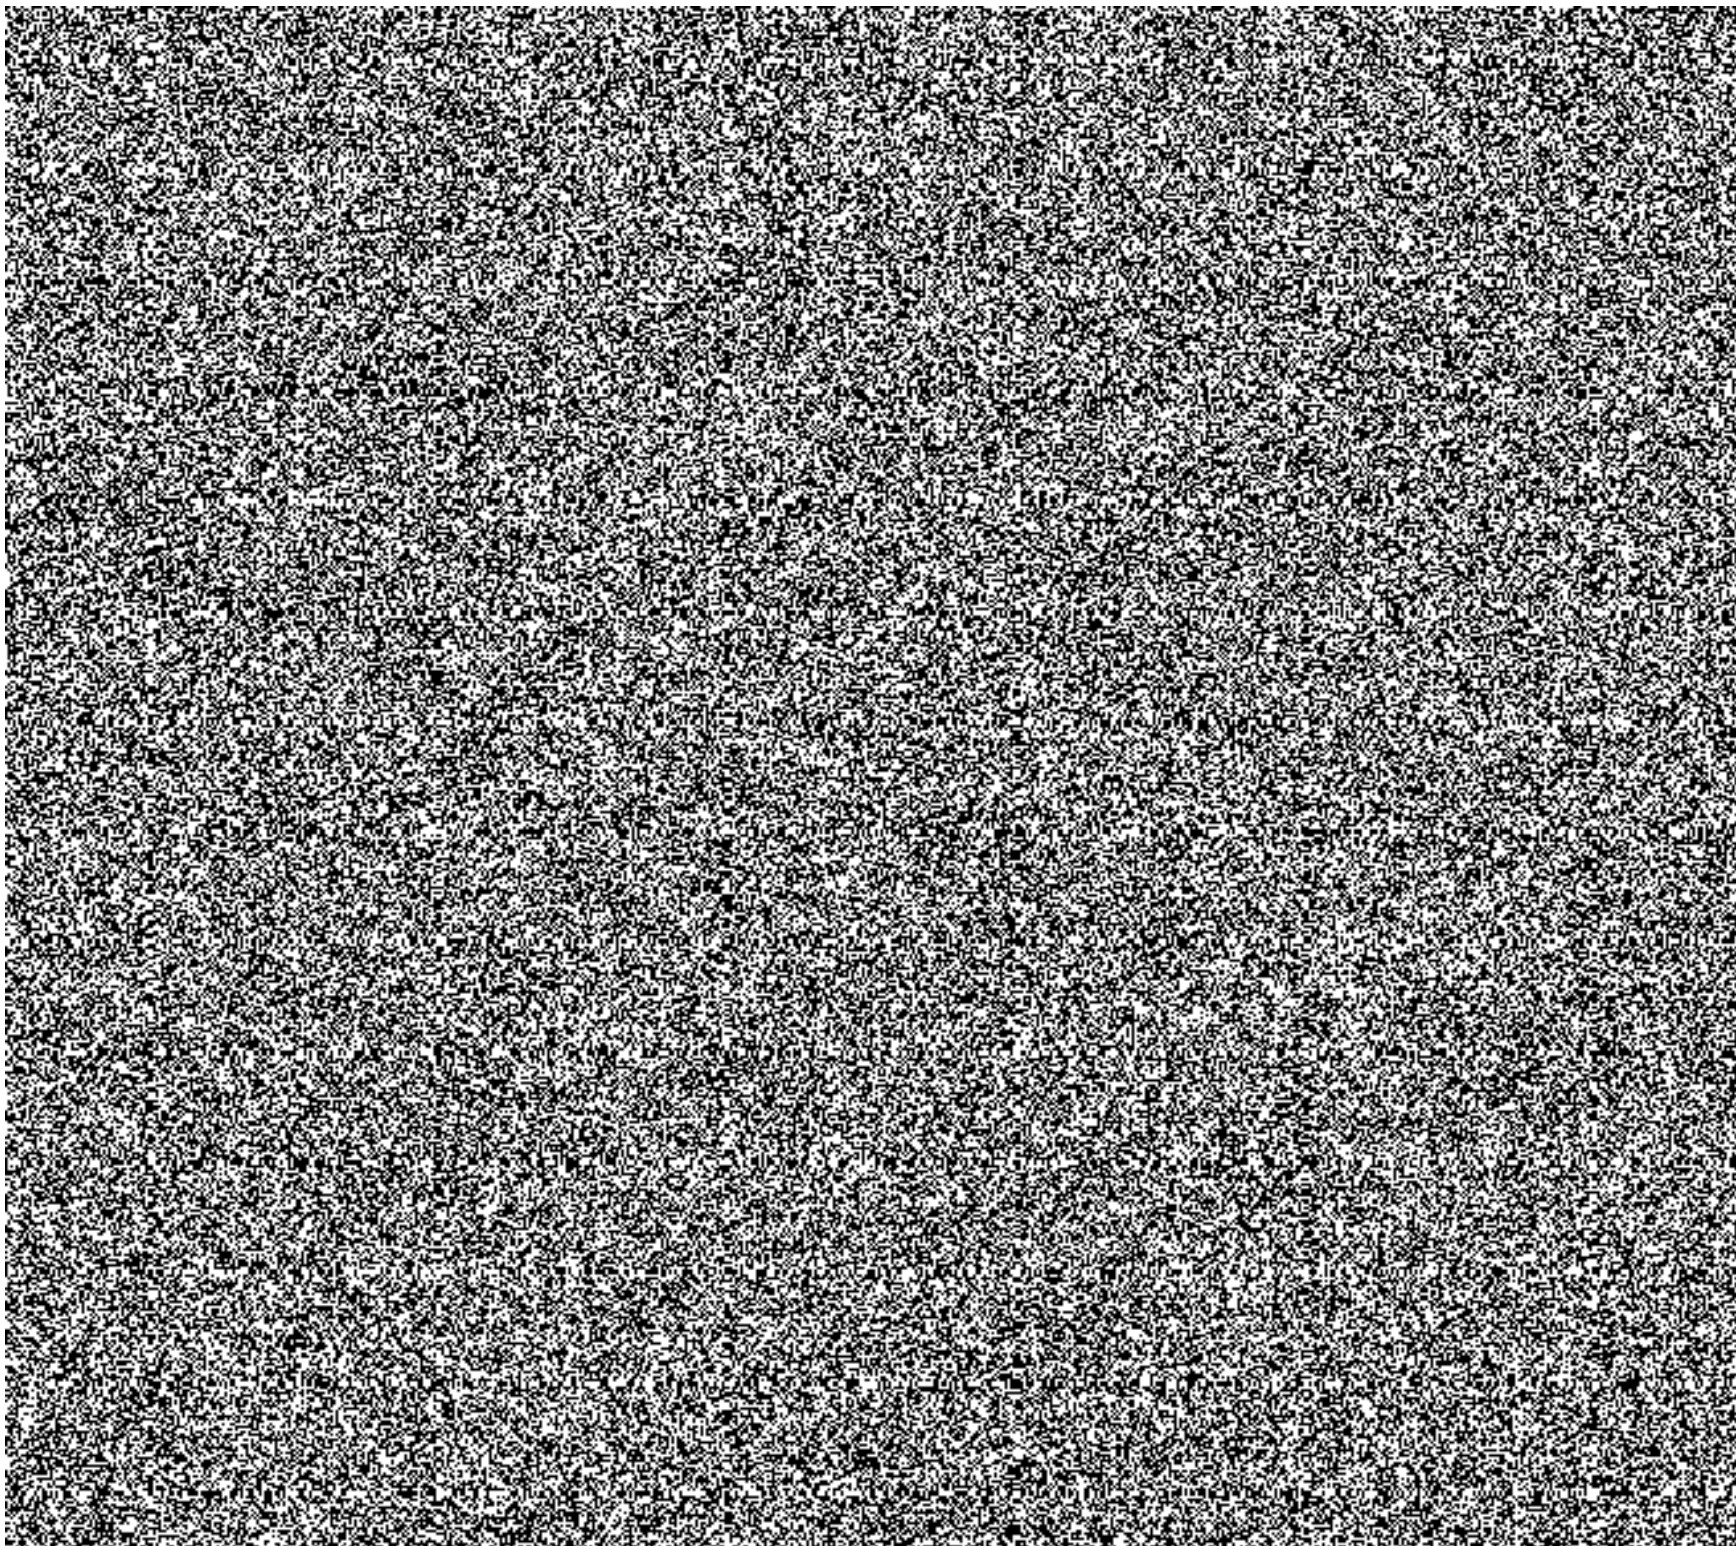

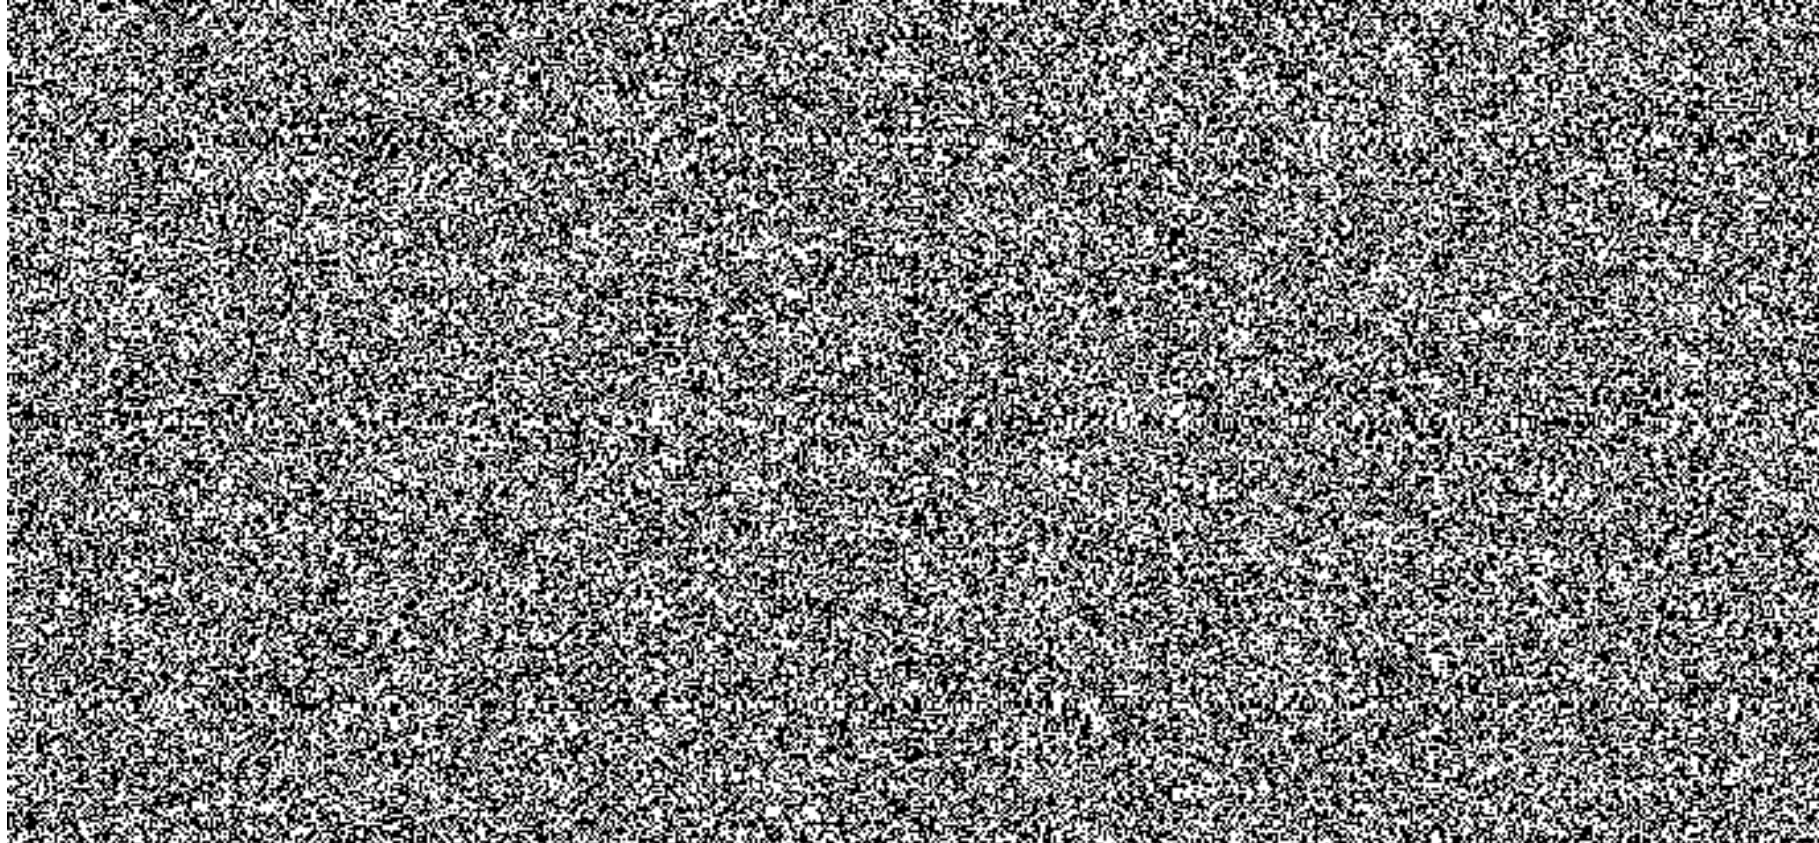





## Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo

č.j. Objednatele HSJI-1495-153/E-2018

č.j. Zhotovitele 201807201/1165/18/PS, AV.19005.1.110

uzavřené podle ust. § 2486 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**

Se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava  
Zastoupená: plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina  
IČO: 708 85 184  
DIČ: CZ70885184 (není plátce)  
Bankovní spojení, č.ú: Česká národní banka; 15032881/0710  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  
Tel.:  
E-mail:  
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

**Společníci společnosti**

**IMOS + GEOSAN + Zlínstav – výstavba CPS Havlíčkův Brod**

společnost založená na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2019 uzavřené ve smyslu ust.  
§ 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený: 

e-mail: imos@imosbrno.eu

telefon: 

fax: +420 548 129 390

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., č. ú.: 17018733/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211.

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zastoupený: 

IČO: 281 69 522



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

DIČ: CZ28169522

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459.

a

Třetí společník: Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený:

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5743.

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019 je oprava hodnoty změn závazku chybně deklarovaných dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo. V souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, v případě, že dochází ke změně části plnění předmětu smlouvy na veřejnou zakázku, je třeba zohlednit jak cenu nového plnění, tak cenu původního (neprovedeného) plnění, kdy je změna závazku vyjádřena součtem absolutních hodnot těchto plnění. V případě provedených změn závazku upravených v dodatku č. 4 byly hodnoty těchto změn neoprávněně kompenzovány. Tímto dodatkem se mění absolutní hodnota provedených změn, aniž by se měnila celková cena díla deklarovaná v dodatku č. 4.

Oprava absolutních hodnot změn závazku, tj. víceprací a méněprací, je doložena v příložených změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 mění takto:

**Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 1., část „Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 4“** se mění a nově zní takto:

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 4:

Cena víceprací bez DPH: 3 229 230,35 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 2 781 346,55 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 447 883,80 Kč

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy - registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.






3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.

4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: opravené změnové listy ELEKTRO 1 – dílčí část ZL č.E01

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

