


Časový harmonogram postupu prací Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

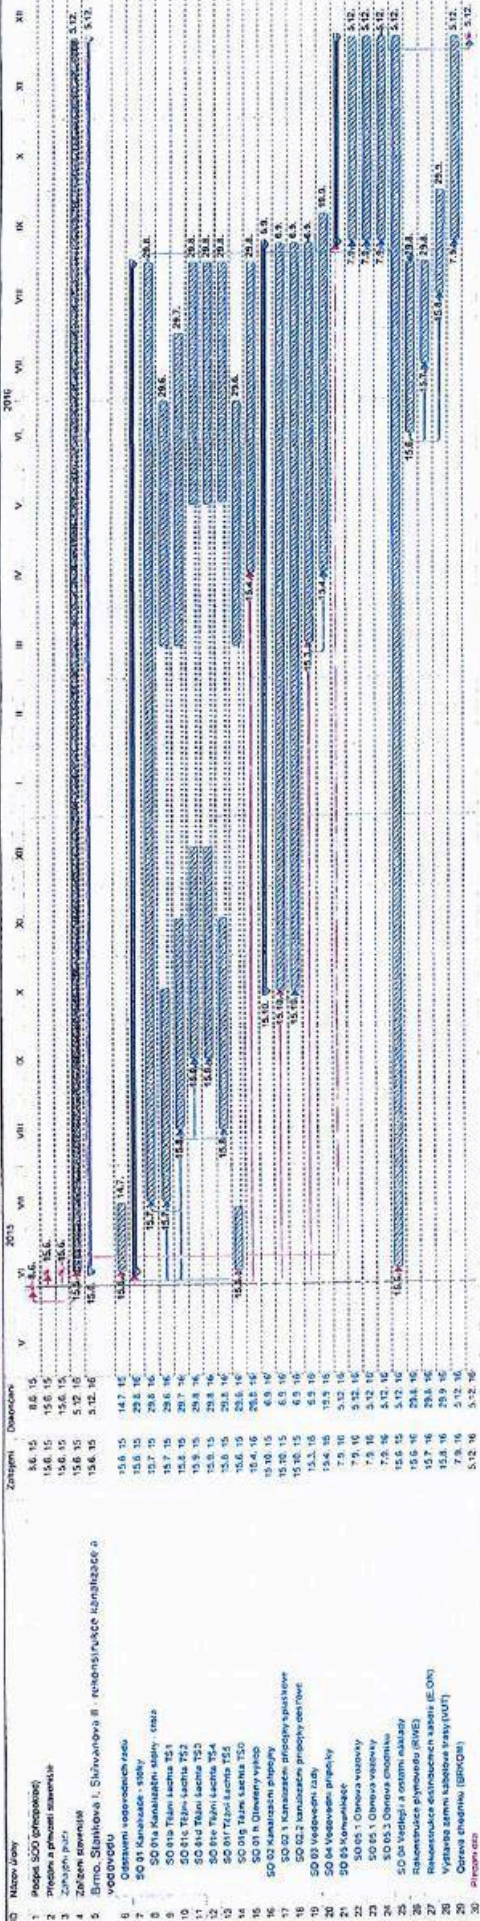

11-06-2015

V Brně dne
Za objednatel:

V Brně dne 10.6.2015
Za zhotovitel:

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



 Jihl. 25, 602 00 Brno, Yvetky
 IČ: 493 42 773, DIČ: CZ49342756

Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

	5.2015	6.2015	7.2015	8.2015	9.2015	10.2015	11.2015	12.2015	1.2016	2.2016
Popis SOD (předpoklad)										
Předání a převzetí staveniště										
Zahájení prací										
Zařízení staveniště										
Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu										
Obstavení vodovodních řadů										
SO 01 Kanalizace - stoky	50 089,00 Kč									
SO 01a Kanalizace - stoky - síčla										
SO 01a Težní šachta TS1	1 958 302,44 Kč	1 982 281,65 Kč	1 918 337,08 Kč	1 918 337,08 Kč	1 982 281,65 Kč	1 918 337,08 Kč	1 918 337,08 Kč	1 982 281,65 Kč	1 982 281,65 Kč	
SO 01a Težní šachta TS2	74 546,33 Kč	75 459,14 Kč	73 024,97 Kč	73 024,97 Kč	75 459,14 Kč	75 459,14 Kč	75 459,14 Kč	75 459,14 Kč	75 459,14 Kč	
SO 01a Težní šachta TS3		126 304,70 Kč	123 727,05 Kč	123 727,05 Kč	127 851,28 Kč	127 851,28 Kč	127 851,28 Kč	127 851,28 Kč	127 851,28 Kč	
SO 01a Težní šachta TS4			84 142,71 Kč	84 142,71 Kč	88 557,32 Kč	88 557,32 Kč	88 557,32 Kč	88 557,32 Kč	88 557,32 Kč	
SO 01a Težní šachta TS5			53 451,76 Kč	53 451,76 Kč	54 207,50 Kč	54 207,50 Kč	54 207,50 Kč	54 207,50 Kč	54 207,50 Kč	
SO 01a Težní šachta TS6			88 067,98 Kč	88 067,98 Kč	85 227,08 Kč	85 227,08 Kč	88 067,98 Kč	88 067,98 Kč	88 067,98 Kč	
SO 01b Oblevny výkop										
SO 02 Kanalizační přípojky										
SO 02.1 Kanalizační přípojky splaškové										
SO 02.2 Kanalizační přípojky dešťové										
SO 03 Vodovodní řady										
SO 04 Vodovodní přípojky										
SO 05 Komunikace										
SO 05.1 Ochrana vzevový										
SO 05.2 Obvodními komunikace										
SO 05.3 Ochrana chodníku										
SO 04 Vedlejší a ostatní náklady										
Rekonstrukce plynovodu (RWE)										
Rekonstrukce distribučních kabelů (E.ON)										
Výstavba zemní kabelové trasy (VUT)										
Oprava chodníků (BARRONI)										
Předání díla										
Celkem:	292 533,97 Kč	2 296 639,59 Kč	2 491 388,07 Kč	2 491 388,07 Kč	2 561 924,07 Kč	3 168 897,95 Kč	3 072 637,08 Kč	3 175 056,32 Kč	3 175 056,32 Kč	

Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 Příloha č. 1 SOD Finanční harmonogram prací (s uvedením součtů finančního plnění za
 kalendářní čtvrtletí a roky realizace)

Měsíc	Měsíční postavěnost	Postavěnost od zahájení stavby	Čtvrtletní postavěnost	Dílčí fakturace	
Červen	293	293	293		
Červenec	2 287	2 580			
Srpen	2 491	5 071		20.8.2015	2 580
Září	2 562	7 633	7 340		
Říjen	3 169	10 802		19.10.2015	5 053
Listopad	3 073	13 875			
Prosinec	3 175	17 050	9 417	18.12.2015	6 242
Celkem rok 2015			17 050		
Leden	3 175	20 225			
Únor	2 970	23 195		18.2.2016	6 350
Březen	3 970	27 165	10 115		
Duben	4 189	31 354		18.4.2016	6 940
Květen	4 333	35 687			
Červen	4 111	39 798	12 633	20.6.2016	8 522
Červenec	4 101	43 899			
Srpen	3 258	47 157		18.8.2016	8 212
Září	3 326	50 483	10 685		
Říjen	3 394	53 877		18.10.2016	6 584
Listopad	2 230	56 107			
Prosinec		56 107	5 624 (kf)		5 624
Celkem rok 2016			39 057		
Celkem stavba			56 107		

Poznámka:

Ceny v tis. Kč bez DPH

Fakturace bude realizována dle odsouhlasené postavěnosti, v souladu s SOD, čl. V. Platební podmínky.

V Brně dne 11.06.2015
 Za objednatele:

V Brně dne 10.6.2015
 Za zhotovitele:

veřejné vodárny a kanalizace, a.s.

OTIL

1594

OTIL, s.r.o.
 Borešova 936/17, s.r.o.
 IČ: 453 62 796, BRN

1594
