

DODATEK č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2020/0953

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru

- tel. 495 707 680

- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Ing. Valentýn Avramov - investiční technik

- tel. 495 707 690, mob. 731131161

- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz*dále jen „objednatel“*

a

- 2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zastoupený: Ing. Radimem Aulickým a Ing. Alešem Fišerem, prokuristy
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Spisová značka: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
ze dne 01.03.1994
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.05.2020 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové“

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II odst. 5. Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení těchto méněprací a víceprací:

Vícepráce – ZL č. 2 a 5

Provedení základů dle požadavku geologa a statika

Uvedené řeší provedení prohloubení pasů na únosné podloží a nadspotřebu betonu s tím spojenou.

ZL řeší také odvoz a likvidaci vykopané zeminy částečně znečištěné komunálním odpadem po kdysi provedené demolici původních objektů.

Změna řešení čerpacích a výtahových šachet v 1.PP

Uvedené řeší změnu provedení ČS 1 s ohledem na v projektu neočekávaný výskyt podzemní vody.

Jedná se o osazení prefa jímky pod hladinu spodní vody, odpočet původně v PD uvažovaných ocelových kesonů a přípočet hydroizolace místo nich.

Méněpráce – ZL č. 3 a 4

Náhrada přízdivek nopovou folií-

odpočet ochranné přízdívky ze ztraceného bednění tl.150mm a náhradu této.

Změna řešení anglických dvorků-

změnu provedení anglických dvorků v PD řešených monolitickou konstrukcí a jejich náhradu systémovými prefabrikovanými dvorky při zachování všech parametrů.

Všechny změny jsou podrobně popsány v příložených změnových listech č. 2 – 5 a položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou přílohou a součástí tohoto dodatku.

2. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	přípočty	odpočty	celkem
Smlouva o dílo			95.584.578,00 Kč
Dodatek č. 1	1.723.244,00 Kč	-1.735.263,00 Kč	-12.019,00 Kč
Dodatek č. 2	725.221,00 Kč	-101.249,00 Kč	623.972,00 Kč
Celkem bez DPH	2.448.465,00 Kč	-1.836.512,00 Kč	96.196.531,00 Kč

Celková smluvní cena činí: devadesát šest milionů sto devadesát šest tisíc pět set třicet jedna korun českých bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 18.1.2021, číslo usnesení ZM/2021/1008.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,
50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
DS: 8yuchp8

- vymezení předmětu dodatku:
Smlouva o dílo – Odlehčovací služba, Honkova ul. v Hradci Králové – dodatek č.2 – vícepráce
+ méněpráce, změna ceny díla
- cena: 96.196.631,00 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
změnový list č. 2, 3, 4, 5 + položkové rozpočty


16. 02. 2021

V Hradci Králové dne 2.2.2021

V Hradci Králové dne



za zhotovitele
Ing. Radim Aulický
prokurista



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



za zhotovitele
Ing. Aleš Fišer
prokurista

Příloha

Změnové listy ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5 vč. položkových rozpočtů

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

02

ZE DNE:

09.12.2020

OBJEDNATEL:

Název:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00, Hradec Králové
--------	--

Zastoupený:

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
--------	---

STAVBA:

Název:	ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, HONKOVA ULICE, HRADEC KRÁLOVÉ
--------	---

1. Předmět změny:

	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
Změna řešení čerpacích a výtahových šachet v úrovni 1PP, výskyt spodní vody	1	kpl.	18 386 Kč	18 386 Kč
CELKEM				18 386 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	95 572 666
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	18 388
3	Cena díla celkem po odeouhlasení "Změnového listu"	95 590 944

3. Czas plnóni:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

bez dopadu do termínů

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín

původní termín

nový termín

celkový termín dokončení díla dle SOD

olici terminy

původní termín

nový termín

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotoviteľa (podpis a dátum)

Rozdělovník:

4

Objednatel

3

Zhotovitel

Přílohy: Položkový rozpočet

KRYCÍ LÍST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hornoková ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí
Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
Soupis: Změnový list č. 2 - Změna řešení čerpacích a výtahových šachet v úrovni 1PP, výskyt spodní vody

Místo: K.Ú.Pražské předměstí č.p.č.1738/928/1.9302/2340

CC-CZ: Datum: 02.11.2020

Zadavatel: Státní město Hradec Králové Českého armády408

IO: 00264610

Uchazeč: STRABAG a.s.

IO: 80836744
DIČ: C80836744

Projektant:

IO:

Zpracovatel:

DIČ:

Podpis:

Cena bez DPH 18 385,81

DPH: Základní sazba 21,00% Výše daně 3 860,98
Měrná sazba 19,00%

Cena s DPH V CELKEM 22 246,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hornoková ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí
Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
Soupis: Změnový list č. 2 - Změna řešení čerpacích a výtahových šachet v úrovni 1PP, výskyt spodní vody

Místo: K.Ú.Pražské předměstí č.p.č.1738/928/1.9302/2340

Datum: 02.11.2020

Zadavatel: Státní město Hradec Králové Českého armády408

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód SO - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 385,81

HSV - Práce s dodávkou HSV 141 910,69

1 - Zemní práce 29 345,45

3 - Zastřešení 112 565,23

PSV - PSV -123 526,08

711 - Úprava profilu vodní, výhledu a plynů 23 052,41

787 - Konečná zpráva o stavbě 192 607,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hornoková ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí
Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
Soupis: Změnový list č. 2 - Změna řešení čerpacích a výtahových šachet v úrovni 1PP, výskyt spodní vody

Místo: K.Ú.Pražské předměstí č.p.č.1738/928/1.9302/2340

Datum: 02.11.2020

Zadavatel: Státní město Hradec Králové Českého armády408

Projektant: 0


Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: 0

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						18 385,81	
b HSV Práce s dodávkou HSV						141 910,69	
0	1	Zemní práce				29 345,45	
1	K	Hroubení zapuštěných jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spodu v horně š. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	10,824	78,78	829,09	CS ÚRS 2019 02
2	K	Vodorovné přemístění výkopku nebo spárky po sádku na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklopním bez rozhrnutí z horně š. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	10,824	39,35	414,13	CS ÚRS 2019 02
3	K	Vodorovné přemístění výkopku nebo spárky po sádku na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklopním bez rozhrnutí z horně š. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m	m ³	2,274	143,45	328,23	CS ÚRS 2019 02
4	K	Uložení spárky na skládce	m ³	2,274	8,30	21,15	CS ÚRS 2019 02
5	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovní) zeminy a kameniva zeřfžděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,880	157,35	608,10	CS ÚRS 2019 02

6	K	174101101	Základní vodní jiskřivka kromy z ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	m3	8,250	53,91	444,70	CS UHS 2018 02
7	K	156811333	Zřezání pískových kůst pro palivní a masyerů sáhn rýh postavením vedení křivky výhledu do 6 m, šířka pásu 2,5 do 6 m	m2	28,000	164,00	5 044,00	CS UHS 2020 02
8	K	156811233	Odstavení pískových kůst pro palivní a masyerů sáhn rýh postavením vedení křivky výhledu do 4 m, šířka pásu 2,5 do 6 m	m2	28,000	122,00	3 172,00	CS UHS 2020 02
9	K	11530128R	Zřezání křivky sádky pro ušlechtlý výhled postavením vedení, šířka DN 600, obepř. křivky křivky	km	1,000	11 830,00	11 830,00	
10	K	115101323	Odstupky vody na odstupu výhledu do 10 m a ušlechtlým výhledem pískem pásu 1 000 do 2 000 mm	had	12,000	168,00	2 264,00	CS UHS 2020 02
11	K	115101234	Odstupky vody na odstupu výhledu do 10 m a ušlechtlým výhledem pískem pásu 2 000 do 4 000 mm	had	8,000	328,00	2 850,00	CS UHS 2020 02
12	K	115001101	Převodní vody postavení DN do 100	m	5,000	297,00	1 335,00	CS UHS 2020 02
D 2								
13	K	27211313Z	Základní vodní jiskřivka kromy z ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	m2	23,445	648,00	112 656,23	CS UHS 2020 02
14	K	272061621	Výhled základních vodní jiskřivky kromy z ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	1	0,473	18 910,00	7 897,00	CS UHS 2018 01
15	K	30, R	Odstupky vody na odstupu výhledu do 10 m a ušlechtlým výhledem pískem pásu 1 000 do 2 000 mm	km	1,000	16 200,00	16 200,00	
16	M	92274, R	Odstupky vody na odstupu výhledu do 10 m a ušlechtlým výhledem pískem pásu 2 000 do 4 000 mm	km	1,000	66 000,00	66 000,00	
D PSV								
17	K	711111001	Isolace písků ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	m2	15,550	17,80	28,00	CS UHS 2018 02
18	K	711111201	Převodní vodní jiskřivka kromy z ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	m2	26,440	28,20	744,30	CS UHS 2018 02
19	M	1118135Z	Isolace písků ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	1	0,016	54 196,19	54 196,19	
20	K	711114189	Převodní vodní jiskřivka kromy z ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	m2	31,700	116,40	3 702,47	CS UHS 2018 02
21	K	711142559	Převodní vodní jiskřivka kromy z ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	m2	56,800	130,24	7 402,05	CS UHS 2018 02
22	M	62823264	Isolace písků ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	m2	107,550	148,19	16 041,83	CS UHS 2018 02
D								
23	K	787200040m01	Konstrukce základních vodní jiskřivky kromy z ušlechtlým výhledem ve vlněném se zhrubnutím jím, sádky, rýh nebo kolem odbočky v křivce vysočích	km	-1,000	37 618,51	-37 618,51	
24	K	787200040a01	Odstupky vody na odstupu výhledu do 10 m a ušlechtlým výhledem pískem pásu 1 000 do 2 000 mm	km	-1,000	47 205,07	-47 205,07	
25	K	787200041R01	Odstupky vody na odstupu výhledu do 10 m a ušlechtlým výhledem pískem pásu 2 000 do 4 000 mm	km	-1,000	30 281,17	-30 281,17	
26	K	787200042R01	Odstupky vody na odstupu výhledu do 10 m a ušlechtlým výhledem pískem pásu 4 000 do 6 000 mm	km	-1,000	34 601,64	-34 601,64	


ŽÁDOST O ZMĚNU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

Objednatel:  HRADEC KRÁLOVÉ		Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové	
Projekt: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, HONKOVA ULICE, HRADEC KRÁLOVÉ			
Zhotovitel: 		STRABAG a.s. Kačírkova 962/4 169 00 Praha 6	
Datum: 09.12.2020		Číslo: 02	
Popis: Změna řešení čerpacích a výtahových šachet v úrovni 1PP, výskyt spodní vody Uvedené konstrukce se nachází v úrovni spáry základové desky v 1PP tj. -3,85		Schváleno:	
Původní řešení: Snížené části tj. čerpací jímky a dojezdy výtahových šachet byly navrženy jako monolitické konstrukce. Byly do nich osazeny ocelové kesony a které byly napojeny hydroizolací. Uvedené řešení nelze provést pod hladinou spodní vody, které se oproti předpokladům objevila. HPV byly ustáleny v úrovni - 4,7. Výskyt spodní vody PD nepředpokládala.			
Varianta řešení: Čerpací jímky 1 a výtahové šachty byly provedeny jako monolitické na celé izolované asfaltovým hydroizolačním pásem 2x 4mm. pro možnost provedení uvedeného bylo použito kompletní obezdění stěnů ze ztraceného bednění pro možnost provedení hydroizolace. Čerpací jímka ČS1 byla provedena jako monolitická jímka. Vybetonovaná do pod hladinu spodní vody osazené, hydroizolované prefabrikované jímky. Po dobu provádění osazení pref. jímky bylo prováděno čerpání spodní vody.			
Přílohy: zápis o čerpání spodní vody ze SD fotodokumentace			
Podpis zástupce Objednatel - TDS:  OT Datum: 15.12.2020			
Podpis Objednatel:  OT Datum:			
Podpis Projektant:  OT Datum: 15.12.2020			
Distribuce: ☒ TDS ☒ Objednatel ☒ Projektant ☒ Zhotovitel			

FOTODOKUMENTACE PRO ZL č. 2 – Změna řešení čerpacích a výtahových šachet v úrovni 1PP, výskyt spodní vody



Zřízení čerpací šachty

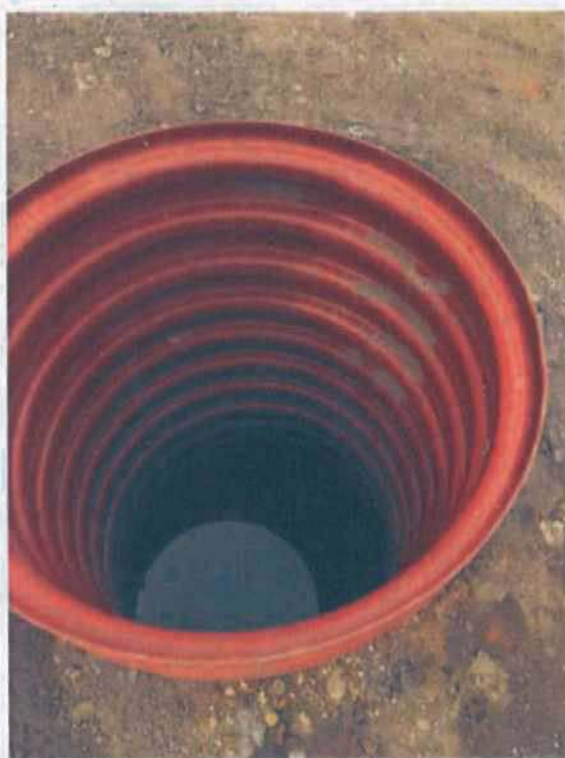

Čerpací šachta



Osazení prefabrikované jímky pod hladinu spodní vody pro budoucí ČS1



Prefabrikovaná šachta pro budoucí ČS1



Provedení podkladních betonů, jámek pro čerpací šachty, dojezdů výtahů. Provedení celoplošné hydroizolace (2 x asfaltový pás) pod základovou deskou.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Honkova ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí
 Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
 Soupis: Změnový list č. 3 - Náhrada příslušenství 1PP novou folií

KSO: 801 80
 Místo: K.Ú. Pražské předměstí č.p. 1738/929/1/930/2/2340

CC-CZ Datum: 02.11.2020

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Českotel armády 608

IC: 00268810

Uchazeč:

IC: 50835744

Projektant:

IC: CZ00635744

Zpracovatel:

IC:

Pozmínka:

IC:

Cena bez DPH -100 935,52

DPH základní snížená Základ daně -100 935,52 Sazba daně 21,00% Výše daně -21 186,46

Cena s DPH v CZK -122 121,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Honkova ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí
 Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
 Soupis: Změnový list č. 3 - Náhrada příslušenství 1PP novou folií

Místo: K.Ú. Pražské předměstí č.p. 1738/929/1/930/2/2340

Datum: 02.11.2020

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Českotel armády 608

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód řádku - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -100 935,52
 HSV - Práce a dodávky HSV -241 096,37
 2 - Zakládání -241 096,37
 PSV - PSV 140 180,85
 T11 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 140 180,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Honkova ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí
 Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
 Soupis: Změnový list č. 3 - Náhrada příslušenství 1PP novou folií

Místo: K.Ú. Pražské předměstí č.p. 1738/929/1/930/2/2340

Datum: 02.11.2020

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Českotel armády 608

Projektant: 0

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: 0

Číslo Typ Kód Popis MJ Množství Jmena [CZK] Cena celkem [CZK] Číslo účtu

Náklady soupisu celkem -100 935,52

0 HSV Práce a dodávky HSV -241 096,37
 2 Zakládání -241 096,37
 1 K 279113131 Základová a z. izolace střešní konstrukce základní vlnitá výměř 100 mm na vln. podkladě šířky C 1020, tloušťka 100 mm m2 -382,256 695,52 -174 862,57 CS ČRS 2019 02
 2 K 279301021 Vrstva základových a z. izolací střešní konstrukce od základu, rovinných nebo oblých, deskových nebo betonových, včetně výztuže železa s betonářskou ocelí 10 806 (R) nebo B81 800 t -3,894 18 919,88 -88 933,80 CS ČRS 2019 01
 0 PSV PSV 140 180,85
 0 T11 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 140 180,85
 3 K 711401176 Provádění izolace proti povrchové a podzemní vodě izolací na ploše vodorovné V případech izolace uvnitř stěn m 60,125 33,70 2 127,91 CS ČRS 2020 01
 4 M 59323009 Izolace stěn pro drenážní pásy prosvětlení 8 mm m 88,436 50,70 3 520,48 CS ČRS 2020 01
 5 K 711101212 Izolace proti závlahové vlhkosti a bazénové vodě napojené těleží na ploše vlnitá s vlnou ochranná, ochranná a drenážní vlna napří 8,0 mm, 8, 806 do 0,8 mm m2 236,718 598,24 134 813,00 CS ČRS 2019 02

ŽÁDOST O ZMĚNU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

Objednatel:



HRADEC KRÁLOVÉ

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

Projekt:

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, HONKOVA ULICE, HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

158 00 Praha 6

Datum:

09.12.2020

Číslo:

03

Popis:	Schváleno:
Náhrada přízdívek 1PP novou folií	
Původní řešení:	
Monolitické konstrukce 1PP byly kompletně po obvodu opatřeny hydroizolací 2 x asfalt pás 4mm + 150mm XPS polystyren. Na tuto skladbu byly navržena ochranná přízdívka ze ztraceného bednění.	
Varianta řešení:	
Na provedenou monolitickou konstrukci bude provedena hydroizolace asfaltovým pásem 2x 4mm. Následně provedeno zateplení polystyrenem 150mm. Celá skladba bude ochráněna vrstvou novou folií zakončené systémovou ukončovací lištou.	
Přílohy:	

Podpis zástupce Objednatel - TDS:

014

Datum

15.12.2020

Podpis Objednatel:

Datum

Podpis Projektanta:

Datum:

15.12.2020

Distribuce:



TDS



Objednatel



Projektant



Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

04

ZE DNE:

09.12.2020

OBJEDNATEL:

Název:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00, Hradec Králové

Zastoupený:

ZHOTOVITEL:

Název:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:

Název:

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, HONKOVA ULICE, HRADEC KRÁLOVÉ

1. Předmět změny:

	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
Změna řešení anglických dvorků	1	kpl.	313 Kč	-313 Kč
CELKEM				-313 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	95 490 008
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	-313
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	95 489 695

3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

bez dopadu do termínů

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1. Objednatel
2. Zhotovitel

Přílohy: Položkový rozpočet

-378.88

72 774,871

-312-10

213.10[illegible]

ŽÁDOST O ZMĚNU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

Objednatel:  HRADEC KRÁLOVÉ		Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové	
Projekt: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, HONKOVA ULICE, HRADEC KRÁLOVÉ			
Zhotovitel: 		STRABAG a.s. Kačírkova 882/4 158 00 Praha 5	
Datum: 09.12.2020		Číslo: 04	
Popis: Změna provedení anglických dvorků (světílků). Jedná se o 4 kusy světílků osazených pro přisvětlení místností umístěných v 1PP.		Schváleno:	
Původní řešení: Jsou navrženy monolitické betonové anglické dvorky - světítky.			
Variantní řešení: Místo monolitických na místě betonovaných anglických dvorků provedeme osazení systémových betonových prefabrikátů. Všechny parametry světílků zůstávají stejné.			
Přílohy:			
Podpis zástupce Objednatel - TDŠ: 		Datum: 15.12.20	
Podpis Objednatel:		Datum:	
Podpis Projektanta:		Datum: 15.12.2020	
Distribuce: ☒ TDŠ ☒ Objednatel ☒ Projektant ☒ Zhotovitel			

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

ZE DNE:

14.12.2020

OBJEDNATEL:

Název: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00, Hradec Králové

Zastoupený:

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 6

STAVBA:

Název: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, HONKOVA ULICE, HRADEC KRÁLOVÉ

1. Předmět změny:

	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
Provedení základových pasů dle požadavku statika a geologa	1	kpj	706 835 Kč	706 835 Kč
CELKEM				706 835 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	95 489 695
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	706 835
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	96 196 530

3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v důležitých termínech ani v termínu celkovém

bez dopadu do termínů

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1. Objednatel
2. Zhotovitel

Přílohy: Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odlučovací služba Horního ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí

Objekt:

SO 01 - Odlučovací služba

Seznam:

Změnový list č. 5 - Provedení základových pasů dle požadavku statika a geologa

Místo:

001 00

Město:

K.Ú. Pražské předměstí č.p. st. 1735/928/1, 930/2, 2340

CC-CZ:

Delim:

14.12.2020

Zadevatel:

Statutární město Hradec Králové, Československý úřad

IC:

00289810

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC:

60831744

Projektant:

IC:

C28083744

Zpracovatel:

IC:

IC:

IC:

Celková cena DPH

706 834,80

Cena základní

Základní cena

706 834,80

Sazba daně

21,00%

148 433,31

Celková cena DPH

CZK

855 278,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odlučovací služba Horního ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí

Objekt:

SO 01 - Odlučovací služba

Seznam:

Změnový list č. 5 - Provedení základových pasů dle požadavku statika a geologa

Místo:

K.Ú. Pražské předměstí č.p. st. 1735/928/1, 930/2, 2340

Datum:

14.12.2020

Zadevatel:

Statutární město Hradec Králové, Československý úřad

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

706 834,80

Provedení základových pasů dle požadavku statika a geologa

706 834,80

1 - Severní křídlo

333 247,80

2 - Jižní křídlo

373 587,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlučovací služba Horního ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí

Objekt:

SO 01 - Odlučovací služba

Seznam:

Změnový list č. 5 - Provedení základových pasů dle požadavku statika a geologa - Severní křídlo

Místo:

K.Ú. Pražské předměstí č.p. st. 1735/928/1, 930/2, 2340

Datum:

12.12.2020

Zadevatel:

Statutární město Hradec Králové, Československý úřad

Projektant:

0

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

0


Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo výkazu
Náklady soupisu celkem							333 247,80	
o HBV							333 247,80	
p 1							148 108,89	
Práce a dodávky HBV							333 247,80	
Zemní práce							148 108,89	
1	K	132201202	Obtížnost započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádů v horních V, 3 přes 180 do 1 000 m ³	m ³	66,150	163,05	7,00	OS ÚRS 2019 02
2	K	132201209	Obtížnost započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádů v horních V, 3 Přístěvek k odtoku ze ležových horních V, 3	m ³	66,150	15,81	1 077,45	CS ÚRS 2019 02
3	K	161101102	Úkládání přepracované výkopky bez nákladů do dopravního nákladu a vyprázdnění dopravního nákladu na kromě: nebo do dopravního prostředku z horních V, 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	66,150	83,83	5 692,57	CS ÚRS 2019 02
4	K	162301101	Vodotěsnost přepracované výkopky nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nákladů výkopky, evakace se skládáním bez rušení z horních V, 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	66,150	39,35	2 661,70	CS ÚRS 2019 02
5	K	162701105	Vodotěsnost přepracované výkopky nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nákladů výkopky, evakace se skládáním bez rušení z horních V, 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m	m ³	66,150	143,45	9 776,12	CS ÚRS 2019 02
6	K	162701109	Přístěvek k vyprázdnění přepracované výkopky z horních V, 1 až 4 ZDO 1900 m přes 10000 m	m ³	2 821,561	19,80	48 828,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	167101102	Nákladní, skládky a přepracované nákladní výkopky nebo spárky nákladní, množství přes 100 m ³ , z horních V, 1 až 4	m ³	66,150	34,51	2 351,86	CS ÚRS 2019 02
8	K	171201201	Úkládání spárky na skládání	m ³	66,150	9,30	633,50	CS ÚRS 2019 02
10	K	097013031	Přístěvek za ukládání na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného křídla odpadu 17 09 04	t	119,283	265,00	70 561,19	CS ÚRS 2019 02

11	D	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
10	K	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
9	D	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
8	K	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
7	K	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
6	K	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
5	K	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
4	K	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
3	K	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
2	K	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02
1	K	2	Základní	Základ z betonu železobetonu (bez výztuže) proužk z betonu bez vyztužení nároží na prostředí v. C 16/20	m3	68,150	2 790,00	180 138,50	CS LR6 2020 02

ŽÁDOST O ZMĚNU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

Objednatel:  HRADEC KRÁLOVÉ		Statutární město Hradec Králové Československé armády 403 502 00 Hradec Králové	
Projekt: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, HONKOVA ULICE, HRADEC KRÁLOVÉ			
Zhotovitel: 		STRABAG a.s. Kačírkova 882/4 158 00 Praha 5	
Datum: 14.12.2020		Číslo: 05	
Popis: Provedení základových pasů v rozsahu dle požadavku statika a geologa. Jedná se o řešení základových pasů na kterých jsou založena napodsklepaná jižní a severní křídla budovy.		Schwáleno:	
Původní řešení: V tendrové dokumentaci jsou navrženy základové pasy, s požadavkem, že základovou spáru musí zkontrolovat statik a geolog. Statik a geolog určí únosnou základovou spáru a její úroveň a posoudí její vhodnost pro provedení základových pasů.			
Varianta řešení: Proběhlo posouzení zeminy a v zpracované dělené dokumentaci navržen způsob založení obou křídel budovy. Základní podmínkou je zakládat na únosné vrstvě tzn. štěrkoštěpek viz. zápisy geologa a statika v SD. V průběhu realizace byla hloubka základové spáry kontrolována a měřena. Tam kde došlo k překopání rýhy pro základové pasy oproti předpokladům je navrženo jejich zalití prostým betonem. Tato nadspotřeba je doložena ve SD a kontrolována dle DL - nadspotřeba je pro Jižní křídlo 76,4m ³ a pro severní křídlo 68,15m ³ . O uvedené množství také narostou zemní práce, manipulace s výkopkem, jeho odvoz a likvidace. Výkopek byl byl značčen když provedenou likvidací původních staveb a jeho likvidace si tedy také vyžádala zvýšené náklady. A odvoz a likvidaci na vhodné skládce.			
Přílohy: Fotodokumentace Seznam DL - betonu pro část JIH a SEVER Výpočet rozdílu spotřeby betonu pro část JIH a SEVER půdorysy základů			
Podpis zástupce Objednatel - TDS: 		Datum: 15.12.20	
Podpis Objednatel: 		Datum:	
Podpis Projektanta: 		Datum: 15.12.2020	
Distribuce: ☒ TDS ☒ Objednatel ☒ Projektant ☒ Zhotovitel			

FOTODOKUMENTACE PRO ZL č. 5 – Provedení základových pasů dle požadavku statika a geologa

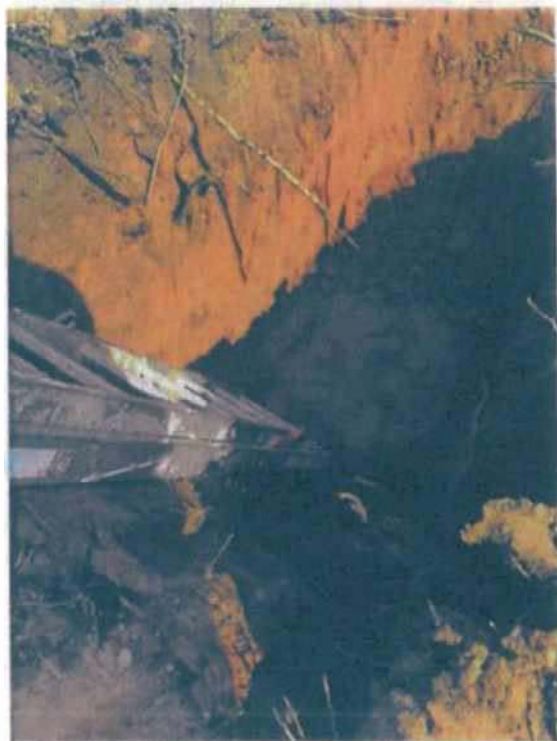

10.8.2020 Kopání sond pro zatřídění zemlin



4.9.2020 Výkop základů křídlo JIH (znečištění zbytky odpadů – komunál)



3.11.2020 výkop základů křídlo SEVER (výkop zbytků starých základových konstrukcí)



16.11.2020 Výkop základů SEVER



Výkop základů – křídlo JIH

(Navíc oproti tendrové PD 105cm v tomto místě)



Výkop základů – křídlo JIH

(Navíc oproti tendrové PD v tomto místě 71cm)





Výkop základů – křídlo SEVER

(Navíc oproti tendrové PD 120cm v tomto místě)



Výkop základů – křídlo SEVER

(Navíc oproti tendrové PD 105cm v tomto místě)



Výkop základů – křídlo SEVER

(Navíc oproti tendrové PD 85cm v tomto místě)

[illegible]


Podkladní beton dle Tendrové PD BKN			
Délka	Šířka	výška	celkem
15,921	0,8	0,85	10,83
24,056	0,8	1,15	22,13
4,2	0,8	0,85	2,18
24,456	0,8	0,95	18,59
3,226	1	0,85	2,10
7,5	1	0,85	6,38
12,9	1	0,95	12,20
8,125	1	1,15	7,04
4,3	1	1,15	4,95
4,3	1	1,15	4,95
6,125	1	1,15	7,04
31,55	1	1,15	36,28
1,05	0,5	1,15	0,60
7,525	1	1,5	11,29
Celkem			140,60

Podkladní betony provedené doloženo DL			
Délka	Šířka	výška	celkem
Dle DL			223,00

Celkem 223,00

JIŽNÍ KŘIDLO

	Realita	BKN	Výsledek
Rozdíl	223,00	140,60	76,40

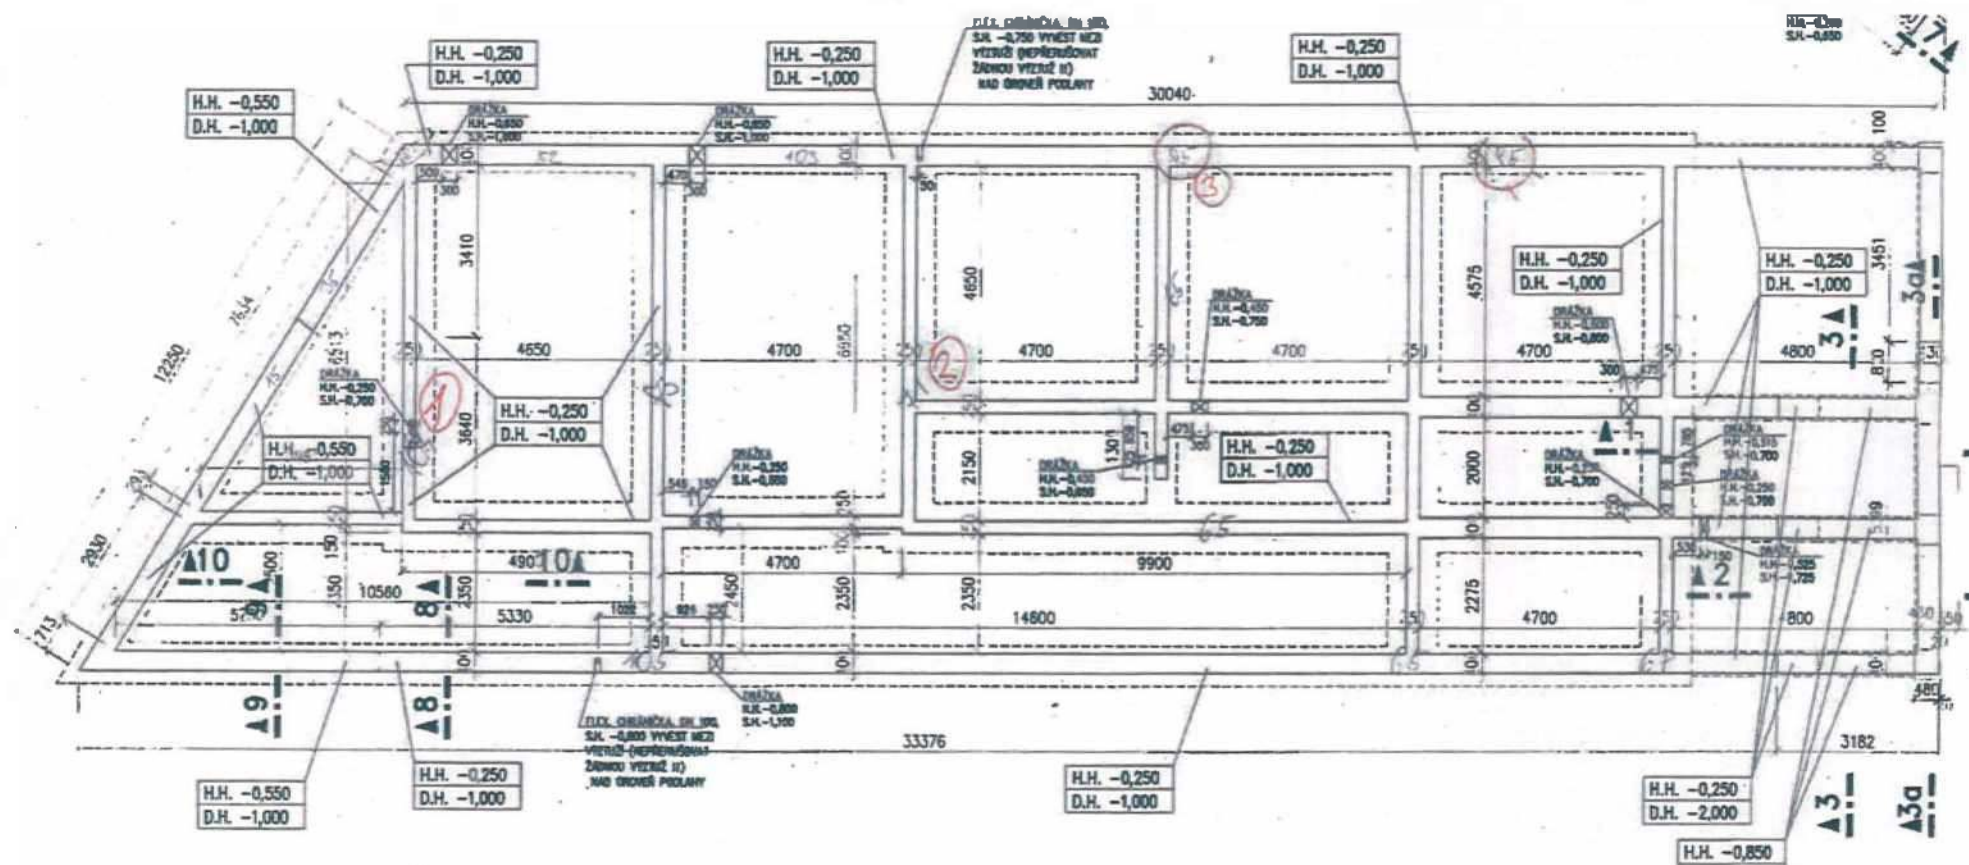

Podkladní beton die Tendrové PD BKN			
Délka	Šířka	Výška	celkem
70,863	1	0,35	24,80205
26,49	0,8	0,35	7,4172
1,1	0,7	0,35	0,2695
1,87	1	0,9	1,683
0,935	0,8	0,9	0,6732
1,05	1	1,6	1,68
3,285	0,8	1,8	4,7016
5,55	1	2,3	12,765
3,6	1,2	2,3	9,936
1,34	1	3,2	4,288
1,35	0,8	3	3,24
2,465	1	3	7,395
Celkem			
78,85			

SEVERNÍ KRÍDLLO			
Rozsah	Podklad	BKN	Výsledek
147,00	78,85	68,15	

Podkladní beton provedené doloženo DL			
Délka	Šířka	Výška	celkem
147,00			
Celkem			
147,00			

PODKLADNÍ BETON
min.TL.100mm

