

Změnový list č. 6

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
		SO 152	6.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 152 Úprava polních cest Chramostek - km 5.33		
Název ZBV:	Variace č. 9 – doplnění dopravního značení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu: 1. Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu variace ze dne 29.6.2020 2. situace doplněného dopravního značení 3. Ocenění Variace č.9 stavby 002.A	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká doplnění dopravního značení **stavby 002.A most Chramostek.**

Na základě ústního doporučení zástupce stavebního úřadu bylo dohodnuto, že Zhotovitel provede doplnění dopravního značení obdobně jako u mostu 002.B Zelčín. Dopravní značení bylo předloženo a 19.1.2021 schváleno a zhotovitel provedl doplnění dopravního značení do koladačního řízení.

Dle ZZVZ se jedná o nezbytné dodatečné práce dle §222 odstavce (5).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	73.981,60	73.981,60
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

**Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)**

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

- a) potřeba změny vznikla v důsledku nezbytně dodatečných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nezbytně dodatečné okolnosti spočívající v realizaci dodatečného dopravního značení a jsou popsány v Zápisě Zhotovitele a Správce stavby ze dne 21.12.2020. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.
- b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.
Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- b) nemění celkovou povahu zakázky;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Garant smlouvy objednatel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
Správce stavby	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.</p>				
	číslo smlouvy: S/ŘVC/119/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	31.3.2021
	týká se bodu: C	89.517,74	<i>Dle skutečně provedených prací</i>	ANO
Objednatel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Statutární orgán – ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Číslo paré:				

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/119/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-002-JBAB

Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 002.A, dopravní značení

Datum jednání: 21.12.2020

Místo jednání: Lužec nad Vltavou

Účastníci jednání:

Objednatel: Ředitelstvím vodních cest ČR

- Ing. Pavel Král, zástupce objednatele

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

- [REDACTED] vedoucí týmu

- [REDACTED] specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS –
OK Třebestovice

- [REDACTED], ředitel stavby

- [REDACTED] specialista

Na základě ústního doporučení zástupce stavebního úřadu bylo dohodnuto, že Zhotovitel provede doplnění dopravního značení obdobně jako u mostu 002.B Zelčín.

Dle Zhotovitele se jedná o nepředvídatelné fyzické podmínky. Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a souhlasí s provedením předloženého návrhu formou Variace č.9 dle Pod-článku 13.1 OP/ZP.

Jedná se o doplnění:

SO 152 Úprava polních cest Chramostek - km 5,33

Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel předloží do 15.1.2021 návrh dopravního značení.

Dále bylo dohodnuto, že dopravní značení bude provedeno nejpozději do termínu kolaudace stavby.


Práce budou oceněny v samostatném rozpočtu – podrobné ocenění Variace č.9.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by se ohrozilo kolaudační řízení stavby, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.9 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby

Za Správce stavby

Za objednatele

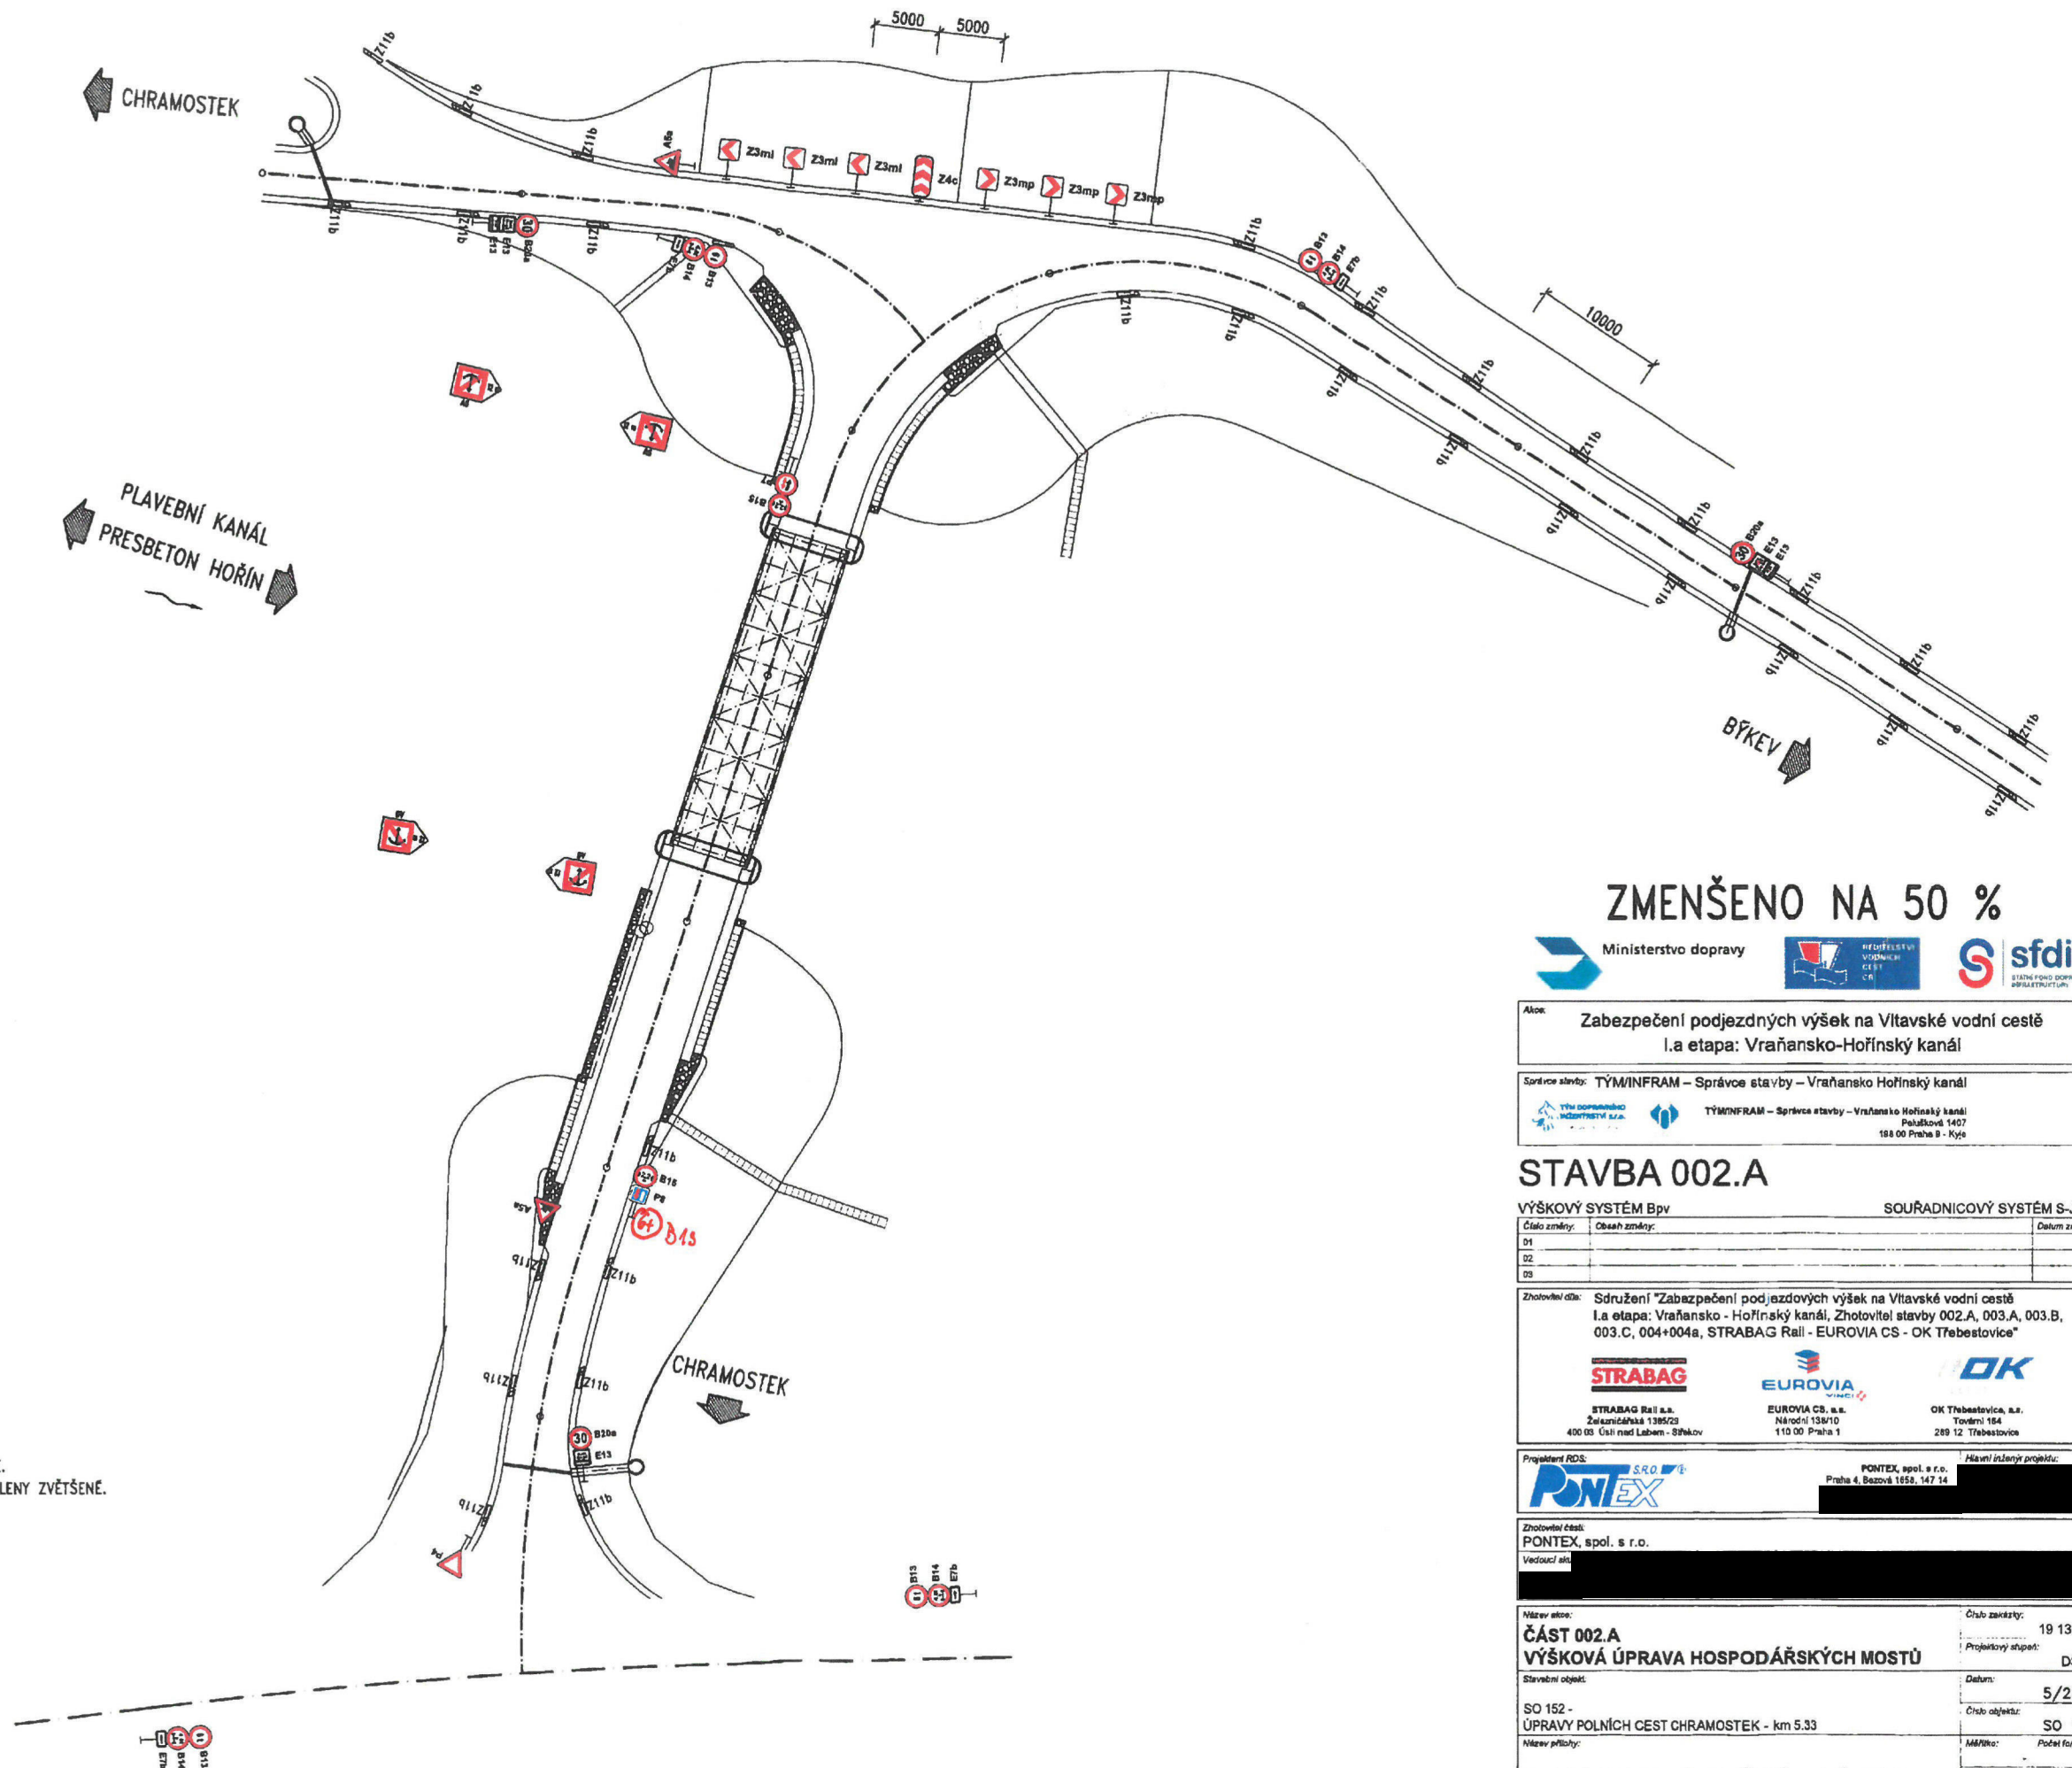

POZNÁMKY:

- 1) SMĚROVÉ DESKY Z4c A Z3M VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 5 m.
- 2) SMĚROVÉ DESKY Z REFLEXNÍ FÓLIE.
- 3) SMĚROVÉ SLOUPKY Z11b VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 10 m.
- 4) SMĚROVÉ SLOUPKY Z11b – Z DRUHÉ STRANY Z11a.
- 5) SMĚROVÉ DESKY I SLOUPKY VYKRESLENY VE SKUTEČNÉ POLOZE.
- 6) DESKY I SLOUPKY Z DŮVODU GRAFICKÉHO ZDŮRAZNĚNÍ VYKRESLENY ZVĚTŠENĚ.

ZMENŠENO NA 50 %



Akce: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál	
Správce stavby: TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko-Hořínský kanál	
	TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko-Hořínský kanál Palačkov 1407 188 00 Praha 9 - Kytč

STAVBA 002.A

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
D1		
D2		
D3		

Zhotovitel díla: Sdružení "Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a, STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice"



Projektant RDS:	Hlavní inženýr projektu: PONTEx, spol. s r.o. Praha 4, Bezdová 1658, 147 14
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel díla: PONTEx, spol. s r.o.	Číslo zakázky: 19 130 00
Vedoucí díla:	Projektový stupeň: DSPS

Název díla: ČÁST 002.A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA HOSPODÁŘSKÝCH MOSTŮ	Číslo objektu: SO 152
Stavební objekt: SO 152 - ÚPRAVY POLNÍCH CEST CHRAMOSTEK - km 5.33	Datum: 5/2020
Název přílohy: TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PŮDORYS	Číslo přílohy: 007

Změnový list č. 6

stavby Úprava hospodářských mostů 002.A - most Chramostek

2A Chramostek

Variace č. 9 - Doplnění dopravního značení

§ 222

odst.

(5)

ZZVZ

stručný popis	SO/PS	SOD	SOD + ZL	Saldo ZL	vícepráce	méněpráce	saldo
VRN	000						
Příprava území	022						
Úprava polních cest	152				73 981,60	0,00	73 981,60
DIO	183.1						
DIO	183.2						
Výšková úprava	242						
Přeložka závlah.	381						
Přípojka - plav. Znak	432						
Přípojka - teplovod	433						
Sděl. Kabely	451						
Vegetační úpravy	822						

CELKEM

41 910 210,31 Kč

55 110 669,99 Kč

13 200 459,68 Kč

73 981,60 Kč

0,00 Kč

73 981,60 Kč

Název stavby : **002.A most Chramostek I. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál**

Změnový list č. 6

Číslo PS, SO : **SO 152**

Variace č. 9 - Doplnění dopravního značení

Název PS,SO : **Úprava polních cest Chramostek - km 5,33**

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
601	02943R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DSPS	KPL	0,000	1,000	1,000	0,00					CN
	podpoložka	výkresová dokumentace skutečného provedení	kpl		1,000	1,000	0,00					CN Pontex
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)	%		10,000	10,000	0,00					ve smyslu pod-čl. 12.3 OP/ZP pododstavce (D) a pod-čl. 4.12 OP/ZP pododstavce (b) náleží zhotoviteli příložka na
602	R01	DOPLNĚNÍ DZ, D+M (B13 - 1ks, Z4c - 1ks, Z3 - 6ks, Z11a + Z11b - 31ks, US-60 - 14ks, víčka plastová - 7ks, FeZn sloupky - 7ks)	KPL	0,000	1,000	1,000	0,00					CN
	podpoložka	dopravní značení - Dopravní značení Mělník s.r.o.	kpl		1,000	1,000	0,00					CN DZ Mělník
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)	%		10,000	10,000	0,00					ve smyslu pod-čl. 12.3 OP/ZP pododstavce (D) a pod-čl. 4.12 OP/ZP pododstavce (b) náleží
Celková cena CZK									0,00	73 981,60	73 981,60	
												Cena jen kladných položek = víceprací 73 981,60
												Cena jen záporných položek = méněprací 0,00
												kontr. 73 981,60

pol.	Materiál a práce	Typ	DPS	ks	DZ Mělník		DZ Litoměřice		JAZNAK			
					JC	CC	ks	JC	CC	ks	JC	CC
1	Dopravní značka	Z3	6	6			6			6		
2	Dopravní značka	Z4c	1	1			1			1		
3	Dopravní značka - Směrový sloupek - flexibilní s hrotem	Z11a,b	31	31			31			31		
4	Dopravní značka	B13	1	1			1			1		
5	FeZn sloupek průměr 60mm délka 4m		7	7			7			7		
6	Universální upínka US-60		14	14			14			14		
7	Víčko plastové na FeZn sloupek		7	7			7			7		
8	montáž a seřízení DZ		31	31			31			31		
9	instalace směrových sloupků		31	31			31			31		
10	doprava a přesun hmot		1	1			1			1		
					44 856,00 Kč		31 770,00 Kč		30 971,00 Kč			

poznámka k termínu nabízených prací dle CN	DZ Mělník - provedení prací ihned
	DZ Litoměřice - provedení prací nejdříve za měsíc
	JAZNAK - provedení prací nejdříve za měsíc

Vypracoval: [REDACTED]



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.

Truhlářská 998, 276 01 Mělník
IČO - 26694867, DIČ - CZ26694867

Vypracováno pro:

STRABAG Rail a.s.
Dopravní stavitelství
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Nabídka č.:008/2021

platnost:31.12.2021

počet listů:1

TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Materiál pro trvalé dopravní značení	Typ	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Dopravní značka	Z3 (500x500 mm)	ks	6		
Dopravní značka	Z4c	ks	1		
FeZn sloupek průměr 60mm délka 4m		ks	7		
Universální upínka US-60		ks	14		
Víčko plastové na FeZn sloupek		ks	7		
Dopravní značka	B13	ks	1		
Směrový sloupek - flexibilní s hrotem	Z11a,b	ks	31		

Materiál celkem

27 734,00

Práce	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž a seřízení DZ	ks	31		
instalace směrových sloupků	ks	31		
doprava a přesun hmot	mj	1		


Práce celkem

17 122,00

CELKEM -

44 856,00

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH !



JAZNAK spol. s r. o.

Vinec 26
Mladá Boleslav

Vypracováno pro:

STRABAG Rail a.s.
Dopravní stavitelství
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

platnost:31.12.2021

počet listů:1

TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Materiál pro trvalé dopravní značení	Typ	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Dopravní značka	Z3 (500x500 mm)	ks	6		
Dopravní značka	Z4c	ks	1		
FeZn sloupek průměr 60mm délka 4m		ks	7		
Universální upínka US-60		ks	14		
Víčko plastové na FeZn sloupek		ks	7		
Dopravní značka	B13	ks	4		
Universální upínka US-60		ks	8		
Směrový sloupek - flexibilní s hrotem	Z11a,b	ks	31		

Materiál celkem

21 968,00

Práce	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
instalace FeZn sloupku do betonového základu	ks	15		
montáž a seřízení DZ	ks	30		
demontáž a montáž DZ	ks	4		
výšková úprava stávajících sloupků	hodin	2		
instalace směrových sloupků	ks	31		
doprava a přesun hmot	mj	1		

Práce celkem

24 725,00

CELKEM -

46 693,00

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH!

Zpracoval:

[Redacted signature]

[Redacted stamp]

STRABAG Rail a. s.
Dir. TJ, Oblast vodohospodářské stavby a
inženýring, PJ JB
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Per e-mail

e-mail: [REDACTED]

Č. nabídky:

Datum: Praha, 20. 1. 2021

Vyřizuje: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Věc: **Cenová nabídka**

Název akce: **Úpravy a doplňky dokumentace RDS Zabezpečení podjezdných výšek na VVC - I.a etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, stavba 002A -Most Chramostek**

Dobrý den,


s ohledem na změny, které byly provedeny v rámci projednání kolaudačního řízení atd. Vám tímto posíláme nabídku na úpravu DSPS SO 152.

NABÍDKOVÁ CENA:

Prohlídka na místě ... [REDACTED]	[REDACTED]
Změna SO 152, DZ a další... [REDACTED]	[REDACTED]
nabídková cena bez DPH	20 400,00 Kč
DPH 21%	4 284,00 Kč
nabídková cena vč. DPH	24 684,00 Kč

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S pozdravem



jednatel společnosti
