

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"	
reg.č.stavby: smlouva: 134V112000027	čísloZL: 56_20
objednatel: zhotovitel: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542 Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav a.s., IČO: 00014915	
název ZL:	"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu -Odpočet pokladna + regál na víno

předmět změny:

Odpočet pokladna + regál na víno


Izdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technická důvody atp.):

Předmět změny: Odpočet pokladna + regál na víno

zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:

Původně navržené vybavení se nebude realizovat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení práci a samostatného zadání:



vtrh na cenu díla:

ANO

rozpočet:

ménépráce
ANO

		cena:	bez DPH	-298 280,64	Kč
			21%DPH	62 638,93	Kč
			<i>celkem</i>	-360 919,57	Kč
vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:			vícepráce
					Ne
		cena:	bez DPH	0,00	Kč
			21%DPH	0,00	Kč
			<i>celkem</i>	0,00	Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VICEPRACÍ		cena;		+298 280,64	Kč
			<i>bez DPH 21KDPH</i>	■ 62 638,93	Kč
			<i>celkem</i>	-360 919,57	Kč
vliv na termín dokončení:					
práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS					
jiné vlivy (na změnu PD apod.):					

přílohy: Rozpočet: Přehled změn a dodatků

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednáte Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Původní vybavení se nebude realizovat.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Další vyjádření

		čisto ZL: 56_20
--	--	---------------------------

Vyjádření TDS

--	--	--

Změnový list zhotovitele stavby č.56
Odpočet: VEM04 - Pokladna a VOM24 - Regál na vino

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

298 280,64

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SO 01 Pluhovské domy

Díl: VEM Vestavěné prvky

521	VEM04	pokladna, rozm.: 5345/820/výška 2080	ks	1,00000	242 760,00	
-----	-------	--------------------------------------	----	---------	------------	--

Odpočet celého prvku / položky

Díl: VOM Volné prvky

556	VOM24	í regál na vino, rozm.:850/300/1050	ks	3,00000	18 506,88	55 520,64
-----	-------	-------------------------------------	----	---------	-----------	-----------

Odpočet celého prvku / položky



-298 280,64

rozsah ZL					
-----------	--	--	--	--	--

0,00		-298 280,64		0,00	
-------------	--	--------------------	--	-------------	--

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

0,00000	0,00	-1,00000	-242 760,00	0,00000	0,00
---------	------	----------	-------------	---------	------

0,00000	0,00	-3,00000	-55 520,64	0,00000	0,00
---------	------	----------	------------	---------	------

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	57_20
objednatel: zhotovitel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav a.s., IČO: 00014915	
název ZL:	"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu - Odpočet odvíhčovací jednotky	

předmět změny:

Odpočet odvíhčovací jednotky **zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):**

Předmět změny: Odpočet odvíhčovací jednotky **zdůvodnění příčin event nepředví telnosti změny:**

Při realizaci stavby zjištěno že odvíhčovací jednotka není zapotřebí z důvodu celkové změny řešení 1 PP **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		méněpráce
		cena:	-138 458,71 Kč	ANO
			-29 280,33 Kč	
			-168 745,04 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		vícepráce
		cena:	0,00 Kč	Ne
			0,00 Kč	
			0,00 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	
			21%DPH	
			celkem	


vliv na termín dokončení:

zadat.

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS **jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

přílohy : Rozpočet: Přehled změn a dodatků

bez DPH
21%DPH
celkem

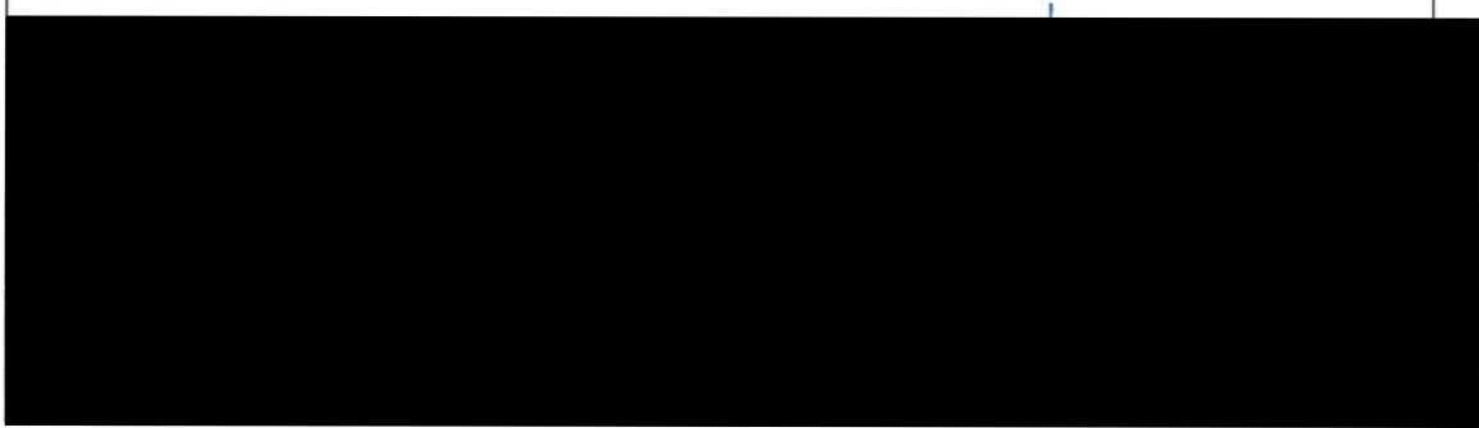

číslo ZL:

57_20

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl upřesněn na základě nezbytných prací k dokončení díla. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222, (5)..... (-)

Vyjádření TDS

řesný vzhled požadavek investora

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, , respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5).

Další vyjádření

Změnový list zhotovitele stavby č.57
Vzduchotechnika a chlazení - Odpočet odvlhčovací jednotky

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

rozsah ZL

Náklady soupisu celkem **139 458,71**

0,00 **-139 458,71** **0,00**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	Celkem
	SO 01	Pluhovské domy				
	Část: D.1.4c	Vzduchotechnika a chlazení				
	Díl: 02	ZAŘÍZENÍ Č.2				
31	Pol_31	MOBILNÍ ODVLHČOVACÍ JEDNOTKA VC=500 m3/hod, 11°C/60%% R.H, NAPĚTÍ 230 V, PŘÍKON 1.2 KW, PROUD 5,3, A. ODVOD KONDENZÁTŮ DO NÁDOBKY	ks	1,00000	130 062,24	130 062,24
32	Pol_32	ODVOD KONDENZÁTŮ DO NÁDOBKY VYKON 0,6-1,3 L/H, HLADINA AKUSTICKEHO TLAKU 33-50 dB(A) NAPĚTÍ 230 V, PŘÍKON 72 W, OBJEM ZÁSOBNÍKU VODY 20 L,	ks	1,00000	2 682,13	2 682,13
33	1103311036	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY (2.6% z dodávky potrubí)	%	2,60000	2 582,44	6 714,34

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-1,00000	-130 062,24	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-2 682,13	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-2,60000	-6 714,34	0,00000	0,00

-139 458,71

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektu a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	58_20
objednatel: zhotovitel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav a.s., IČO: 00014915	
název ZL:	"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu -Datové zásuvky - změna	

předmět změny:

Datové zásuvky - změna

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Datové zásuvky - změna **zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:** sjednocení zásuvek u silno proudu a slaboproudu - místní šetření s orgánem památkové péče **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	ANO
		bez DPH	-9 764,76 Kč
		21%DPH	-2 050,60 -11 815,36 Kč
		celkem	Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
		cena:	ANO
		bez DPH	19 162,80 Kč
		21%DPH	4 024,19 Kč
		celkem	23 186,99 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	9 398,04 Kč
		21%DPH celkem	1 973,59 Kč
			11 371,63 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS jiné vlivy (na změnu PD spod.):

přílohy:

Rozpočet: Přehled změn a dodatků



Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatel. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

			číslo ZL:
			58_20

Vyjádření TDS

Jedná se o práce vzniklé z nálezoých situací. Bylo nutné upravit a přehodnotit vzhled zásuvek v souladu se situací na stě


Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Další vyjádření

~

H




Změnový list zhotovitele stavby č.58
Slaboproudé elektroinstalace: Datové zásuvky - změna

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.OI - Pluhovské domy, SO.O2 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 9 764,76

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	Celkem
	SO 01	Pluhovské domy				
	D.1.4d,e5	Slaboproud SK				
	Díl: 2	Dodávka a montáž kabelových rozvodů				
28	Pol_28	Tango kryt zásuvky komunikační a datové, reproduktorové, pro nosnou masku s popisovým polem, bílá	kus	31,00000	164,62	5 103,22
29	Pol_29	Tango rámeček jednonásobný, bílá	kus	50,00000	31,09	1 554,50
30	Pol_30	Maska nosná pro 2 zásuvky RJ keystone (IEC 607-7)	kus	36,00000	63,64	2 291,04
N-ZL31		Tango kryt zásuvky komunikační a datové, reproduktorové, pro nosnou masku s popisovým polem, bílá	kus	5,00000	163,20	816,00
N-ZL58		Solo kryt zásuvky komunikační a datové, reproduktorové, pro nosnou masku s popisovým polem, bílá	kus	0,00000	339,25	0,00
N-ZL58		NOSNA MASKA PRO 2XRJ45 5014A-B1018	kus	0,00000	49,30	0,00
N - ZL58		Solo, rámeček jednonásobný, studio bílá	kus	0,00000	143,75	0,00

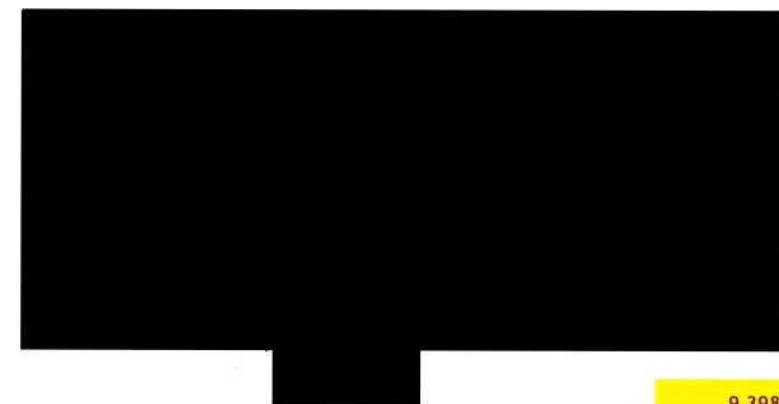

9 398,04

rozsah ZL

19 162,80 -9 764,76 19 162,80

změna množství +	cena +	změna množství -	cena-	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-31,00000	-5 103,22	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-50,00000	-1 554,50	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-36,00000	-2 291,04	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-5,00000	-816,00	0,00000	0,00
36,00000	12 213,00	0,00000	0,00	36,00000	12 213,00
36,00000	1 774,80	0,00000	0,00	36,00000	1 774,80
36,00000	5 175,00	0,00000	0,00	36,00000	5 175,00

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

134V112000027	číslo ZL:
reg.č.stavby: smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	59_20
objednatel zhotovitel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL:	"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - Úpravy vnitřních povrchů změny
-----------	--

předmět změny:

Úpravy vnitřních povrchů změny

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Úpravy vnitřních povrchů změny **zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:**

Při místním šetření na stavbě bylo zjištěn větší rozsah vnitřních omítek než v PD **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**


Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a samostatně zadat

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena:	
		bez DPH	-696 999,00 Kč
		21%DPH	-146 369,79 Kč
		celkem	-843 368,79 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	
		bez DPH	760 946,55 Kč
		21%DPH celkem	159 798,78 Kč
			920 745,33 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	63 947,55 Kč
		21%DPH celkem	13 428,99 Kč
			77 376,54 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy: Rozpočet: Přehled změn a dodatků



Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl upřesněn tak aby řešil nepředvídatelné skutečnosti v průběhu stavby. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (6).

59_20

Vyjádření TDS

Jedná se o práce vzniklé z náleзовých situací Bylo nutné upravit a přehodnotit rozsah vnitřních omítek

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi respektování požadavku orgánu státní památkové péče Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (6).

Další vyjádření

Změnový list zhotovitele stavby č.59
Úpravy vnitřních povrchů - změny

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

63 947,55

rozsah dle SoD

rozsah ZL

Náklady soupisu celkem

1 414 470,03

760 946,55

-696 999,00

1 478 417,57

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

76	601031113R00	Potažení dřev.stropů rákosovou rohoží, 2.vrstvy	m2	273,31000	399,84	109 280,27
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

0,00000	0,00	-273,31000	-109 280,27	0,00000	0,00
---------	------	------------	-------------	---------	------

Rozsah dle SoD:

Celkem

455,58000

Změna rozsahu dle ZL č.08:

odpočet dle ZL č.08

-182,27000

MEZISOUČET (SoD + ZL č.08)

273,31000

Změna rozsahu dle ZL č.59:

odpočet celé položky

-273,31000

82	611474611R00	Omlítka stropů vnitřní, vápenná jádro,vápen.štuk, ručně	m2	273,31000	642,60	175 629,01
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

0,00000	0,00	-148,34000	-95 323,28	124,97000	80 305,72
---------	------	------------	------------	-----------	-----------

Celkem

273,31000

Změna rozsahu dle ZL č.59:

odpočty

PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9

-16,90000

PD.405 technická rezerva : 28,72

-28,72000

PD.406 úklid : 2,88

-2,88000

PD.408 a zbylé plochy: 99,84

-99,84000

Mezisoučet

-148,34000

96	612433214RT3	Omlítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm, postřik, podklad, jádrová omlítka, štuk	m2	13,33000	2 380,001	31 725,401
----	--------------	---	----	----------	-----------	------------

0,00000	0,00	-13,33000	-31 725,40	0,00000	0,00
---------	------	-----------	------------	---------	------

Rozsah dle SoD:

PD.104 2,5'(4,032+1,3)

13,33000

Změna rozsahu dle ZL č.59:

odpočet celé položky

13,33000

97	61244531QR00	Štěrka sádrová, penetrace, tl. 10 mm	m2	97,27690	333,19	32 411,69
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------

0,00000	0,00	-97,27690	-32 411,69	0,00000	0,00
---------	------	-----------	------------	---------	------

Rozsah dle SoD:

příčka v PD.107 :

Položka pořadí 47 : 26.036202

52,07240

Položka pořadí 49 : 22.602252

45,20450

Změna rozsahu dle ZL č.59:

odpočet celé položky

-97,27690

99	619442431R00	Vytažení fabionu,hran a koutů jakékoliv délky	m	495,87600	237,05	117 547,41
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

0,00000	0,00	-439,71600	-104 234,68	56,16000	13 312,73
---------	------	------------	-------------	----------	-----------

Rozsah dle SoD:

Celkem

495,87600

Změna rozsahu dle ZL č.59:

odpočet nerealizovaných částí vytažením (abionu)

-439,71600

119	61944R	Příplatek za rozměr a složitost v provedení fabionu jako kopie stávajících	m	495,87600	151,37	75 060,79
-----	--------	--	---	-----------	--------	-----------

0,00000	0,00	-439,71600	-66 559,81	56,16000	8 500,94
---------	------	------------	------------	----------	----------

Rozsah dle SoD:

Celkem

495,87600

Změna rozsahu dle ZL č.59:

odpočet nerealizovaných částí vytažením fabionu

-439,71600

122	61210003ORAA	Omlítka stěn vnitřní vápencementová štuková, klenby a stropy samostatně součástí vododivných skladeb, otlučení a zřízení ze 100 %, malba	m2	482,33575	752,08	362 755,07
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

0,00000	0,00	-342,33575	-257 463,87	140,00000	105 291,20
---------	------	------------	-------------	-----------	------------

Rozsah dle ?oP:

Celkem

482,33575

Změna rozsahu dle ZL č.59:

odpočet nerealizovaných částí

-342,33575

N	619442431R21	Montáž sádrového fabionu včetně dodávky lepidla	m	0,00000	532,00	0,00
---	--------------	---	---	---------	--------	------

232,09000	123 471,88	0,00000	0,00	232,09000	123 471,88
-----------	------------	---------	------	-----------	------------

Nová položka:

m.č.304: 4,12 + 6,6 + 1 + 5,67 + 5,05

22,44000

m.č.303: 8,1 + 6,4 + 8,3 + 6,5

29,30000

m.č.302:10,8 + 5,7 + 5,46 + 6,50

28,46000

m.č.301: 6,4 + 3,34 + 7,72 + 4,26 + 8,1 + 9,92

39,74000

m.č.212: 8,9 + 6,86 + 6,49 + 8,21

30,46000

m.č.213:1,85 + 5,17 + 4,92 + 6,78

18,72000

m.č.209: 5,6 + 5,37 + 4,1 + 4,21 + 1,98 + 10,11

31,37000

m.č.210: 7 + 3 + 1,2 + 7,5 + 4,7 + 8,2

31,60000

Mezisoučet

232,09000

N	619442431R22	Dodávka sádrového fabionu	m	0,00000	596,00	0,00
---	--------------	---------------------------	---	---------	--------	------

255,29900	152 158,20	0,00000	0,00	255,29900	152 158,20
-----------	------------	---------	------	-----------	------------

Nová položka:

m.č.304: 4,12 + 6,6 + 1 + 5,67 + 5,05

22,44000

m.č.303:8,1 + 6,4 + 8,3 + 6,5

29,30000

m.č.302:10,8 + 5,7 + 5,46 + 6,50

28,46000

m.č.301: 6,4 + 3,34 + 7,72 + 4,26 + 8,1 + 9,92

39,74000

m.č.212: 8,9 + 6,86 + 6,49 + 8,21

30,46000

m.č.213:1,85 + 5,17 + 4,92 + 6,78

18,72000

m.č.209: 5,6 + 5,37 + 4,1 + 4,21 + 1,98 + 10,11

31,37000

m.č.210: 7 + 3 + 1,2 + 7,5 + 4,7 + 8,2

31,60000

Celkem 184,75000

Změna rozsahu dle ZI č.59:

Naklepávání rýh v cihelných hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy 3*4*8

96,00000
Mezisoučet 96,00000

784121001

Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,00000
---	----	---------

0,00

1 279,97000	41 855,02	0,00000	0,00	1 279,97000	41 855,02
-------------	-----------	---------	------	-------------	-----------

Nová položka:

m.č.405	17,40000
m.č.402	26,30000
m.č.304	76,27000
m.č.303	105,42000
m.č.301,302	209,00000
m.č.307	98,96000
m.č.308	107,76000
m.č.306	52,40000
m.č.309	55,59000
m.č.310	55,89000
m.č.311	84,75000
m.č.213a	37,56000
m.č.213b	57,96000
Schodiště 3.NP	63,46000
Schodiště 2.NP	50,61000
m.č.206a,b	56,55000
m.č.207	43,48000
m.č.205a,b,d,e	51,04000
Vedlejší schodiště	29,57000
Mezisoučet	1 279,97000

N	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,00000	131,80	0,00
---	-----------	--	----	---------	--------	------

1 279,97000	168 700,05	0,00000	0,00	1 279,97000	168 700,05
-------------	------------	---------	------	-------------	------------

Nová položka:

m.č.405	17,40000
m.č.402	26,30000
m.č.304	76,27000
m.č.303	105,42000
m.č.301,302	209,00000
m.č.307	98,96000
m.č.308	107,76000
m.č.306	52,40000
m.č.309	55,59000
m.č.310	55,89000
m.č.311	84,75000
m.č.213a	37,56000
m.č.213b	57,96000
Schodiště 3.NP	63,46000
Schodiště 2.NP	50,61000
m.č.206a,b	56,55000
m.č.207	43,48000
m.č.205a,b,d,e	51,04000
Vedlejší schodiště	29,57000
Mezisoučet	1 279,97000

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektu a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	60_21
objednatel: zhotovitel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav as., IČO: 00014915	
název ZL:	"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - Sanitární příčky, změna řešení	

předmět změny:

Sanitární příčky, změna řešení

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Sanitární příčky, změna řešení

zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:


V PD bylo provedení předstěn na sociálním zařízení sanitárních příček. Při šetření na stavbě bylo použito levnější řešení obklady. Vše bylo projednáno s orgány památkové péče. Tímto řešením došlo k výraznému ušetření finančních prostředků aniž by byl poškozen vzhled památkového objektu **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		méněpráce ANO
		cena:	-842 412,89 Kč -176 906,71 Kč -1 019 319,60 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		vícepráce ANO
		cena:	663 439,70 Kč 139 322,34 Kč 802 762,04 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH -178 973,19 Kč 21%DPH -37 584,37 Kč celkem-216 557,56 Kč	


vliv na termín dokončení:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a samostatně zadat práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy: bez DPH
21%DPH

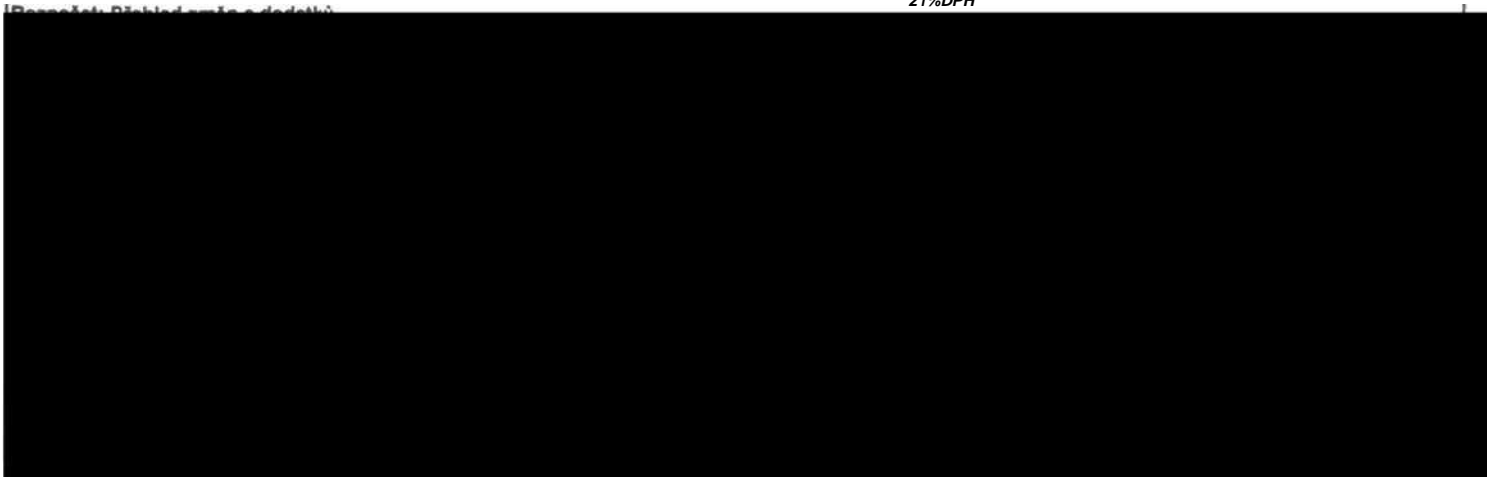

Vyjádření Projektanta



Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (7).

Vyjádření TDS




Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (7).

Další vyjádření

číslo ZL:
60_21



ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektu a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL: 62_21
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	
objednatel: zhotovitel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav a.s., IČO: 00014915	
název ZL:	"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - Turnikety	

i Turnikety **zdůvodnění nezbytnosti změny** (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Turnikety **zdůvodnění příčin event nepředvidatelnosti změny**:

Při šetření v místě s bezpečnostními technikami byly turnikety přesunuty i s bezpečnostními rámy. Tím se dosáhlo větší propustnosti návštěvníků. Také bylo tímto dosaženo lepšího zabezpečení objektu **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání**:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		méněpráce
		cena:	-526 190,00 Kč -110 499,90 Kč <u>-636 689,90 Kč</u>	ANO
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		vícepráce
		cena:	816 152,00 Kč 171 391,92 Kč <u>987 543,92 Kč</u>	ANO
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 21%DPH celkem	

vliv na termin dokončení:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat práce nemají vliv na termin dokončení akce SMVS **jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

přílohy: Rozpočet: Přehled změn a dodatků

bez DPH
21%DPH
celkem





Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl upřesněn na základě nezbytných prací k dokončení díla. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5)

Vyjádření TDS

Q-A^ \ hau «^ \ JUÁcí

|D\CxOLtA_i


Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, respektování požadavku orgánu státní památkové péče Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5)

Další vyjádření

číslo ZL:

62_21



Změnový list zhotovitele stavby č.62

D.1.4d,e9 - Dodávka a montáž technologie - TURNIKETY A BEZPEČNOSTNÍ RÁMY

Turnikety - změna

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

289 962,00

rozsah dle SoD

rozsah ZL

Náklady soupisu celkem

526 190,00

816 152,00

-526 190,00

816 152,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

SO 01		Pluhovské domy				
D.1.4d,e5		Slaboproud SK				

N ZL31	Z110	Tripodový turniket s integrovanou řídicí jednotkou	ks	1,00000	72 190,00	72 190,00
-----------	------	--	----	---------	-----------	-----------

0,00000	0,00	-1,00000	-72 190,00	0,00000	0,00
---------	------	----------	------------	---------	------

včetně ovládacího RC panelu
provedení kartáčovaná nerezová ocel, elektromotorický pohon, ovládací jednotka v těle turniketu
přístupy k ovládání z kterékoliv strany
napájení: 12 VDC
rozměry: 1100 x 1050 x 840 mm (v x š x h)

N ZL31	Z120	Klídkový turniket středový s integrovanou řídicí jednotkou	ks	2,00000	174 800,00	349 600,00
-----------	------	--	----	---------	------------	------------

0,00000	0,00	-2,00000	-349 600,00	0,00000	0,00
---------	------	----------	-------------	---------	------

včetně ovládacího RC panelu
provedení kartáčovaná nerezová ocel + výplň a dvířka bezp. sklo 10 mm, elektromotorický pohon, ovládací jednotka v těle turniketu přístupy k ovládání z kterékoliv strany
napájení: 12 V DC
rozměry: 1150 x 1500 x 620 mm (v x š x h)

N ZL31	Z130	Elektromechanická otočná branka s elektromagnetickým zámkem	ks	1,00000	42 160,00	42 160,00
-----------	------	---	----	---------	-----------	-----------

0,00000	0,00	-1,00000	-42 160,00	0,00000	0,00
---------	------	----------	------------	---------	------

šířka průchodu: 810 mm
rozměry: 870 x 145 x 993 (v x š x h)
hmotnost: 20 kg

N ZL31	Z140	Zábradlí 900 (v) x 1200 (d) mm	ks	1,00000	8 975,00	8 975,00
-----------	------	--------------------------------	----	---------	----------	----------

0,00000	0,00	-1,00000	-8 975,00	0,00000	0,00
---------	------	----------	-----------	---------	------

provedení zábradlí s úbitní vodotěsnou příčnou (k zaměření možností obcházení tripodů turniketů)
provedení matová nerez, průměr 42 mm, pro vnitřní i venkovní použití

N ZL31	Z150	Zábradlí 900 (v) x 600 (d) mm	ks	4,00000	7 590,00	30 360,00
-----------	------	-------------------------------	----	---------	----------	-----------

0,00000	0,00	-4,00000	-30 360,00	0,00000	0,00
---------	------	----------	------------	---------	------

provedení zábradlí s úbitní vodotěsnou příčnou (k zaměření možností obcházení dvířek turniketů Praktika T-05)
provedení matová nerez, průměr 42 mm, pro vnitřní i venkovní použití

N ZL31	Pol 1	100 W napájecí zdroj	h	5,00000	2 220,00	11 100,00
-----------	-------	----------------------	---	---------	----------	-----------

0,00000	0,00	-5,00000	-11 100,00	0,00000	0,00
---------	------	----------	------------	---------	------

průmyslový spínaný zdroj s jedním výstupním napětím a výkonem 100 W k napájení turniketů

N ZL31	IPOI 2	Příprava na čtečku - umístění na vstupní stranu těla turniketů a branek	l f l	6,00000	1 960,00	11 760,00
-----------	--------	---	-------	---------	----------	-----------

0,00000	0,00	-6,00000	-11 760,00	0,00000	0,00
---------	------	----------	------------	---------	------

N ZL62	Pol 1 ZI62	Rychloběžná branka, otočná, jednostranný modul, šířka průchodu 600-900 mm, kus		0,00000	132 820,00	0,00
-----------	------------	--	--	---------	------------	------

2,00000	265 640,00	0,00000	0,00	2,00000	265 640,00
---------	------------	---------	------	---------	------------

Materiál nerez, oblá skříň, DMS120-1

N ZL62	Pol 2 ZI62	Rychloběžná branka, otočná, jednostranný modul, šířka průchodu 600-900 mm, kus		0,00000	233 784,00	0,00
-----------	------------	--	--	---------	------------	------

1,00000	233 784,00	0,00000	0,00	1,00000	233 784,00
---------	------------	---------	------	---------	------------

Materiál nerez, oblá skříň, DMS120-2

N ZL62	Pol 3 ZI62	Držák displeje (počítání osob)	kus	0,00000	23 679,00	0,00
-----------	------------	--------------------------------	-----	---------	-----------	------

1,00000	23 679,00	0,00000	0,00	1,00000	23 679,00
---------	-----------	---------	------	---------	-----------

N ZL62	Pol 4 ZI62	Zábradlí - tvrzené sklo s nerez sloupky 0 40 mm, š. 2000 mm, v. 1010 mm, materiál: tvrzené sklo 10	kus	0,00000	16 752,00	0,00
-----------	------------	--	-----	---------	-----------	------

2,00000	33 504,00	0,00000	0,00	2,00000	33 504,00
---------	-----------	---------	------	---------	-----------

N ZL62	Pol 5 ZI62	Turniket tripod, nerez, aut., antipánik, krátký, motorový	kus	0,00000	59618,00	0,00
-----------	------------	---	-----	---------	----------	------

2,00000	119 236,00	0,00000	0,00	2,00000	119 236,00
---------	------------	---------	------	---------	------------

N ZL62	Pol 6 ZI62	Motorová branka, nerez, skleněné křídlo, obousměrná, max. 900 mm	kus	0,00000	71 324,00	0,00
-----------	------------	--	-----	---------	-----------	------

1,00000	71 324,00	0,00000	0,00	1,00000	71 324,00
---------	-----------	---------	------	---------	-----------

N ZL62	Pol 7 ZI62	Nerez zábradlí - nerez sloupky 0 40 mm, atyp tvar dle PD	kus	0,00000	14 665,00	0,00
-----------	------------	--	-----	---------	-----------	------

1,00000	14 665,00	0,00000	0,00	1,00000	14 665,00
---------	-----------	---------	------	---------	-----------

N ZL62	Pol 8 ZI62	Nerez elektromechanické sklopné rameno délky 900mm - atyp	kus	0,00000	54 320,00	0,00
-----------	------------	---	-----	---------	-----------	------

1,00000	54 320,00	0,00000	0,00	1,00000	54 320,00
---------	-----------	---------	------	---------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu**

reg.č stavby: smlouva:	134V112000027	číslo ZL:
objednatel: zhotovitel:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542 Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav a.s., IČO: 00014915	63_21
název ZL:	Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu - Odborná kamenická oprava přiznaného žulového zdivá na východním průčelí	

předmět změny:

Odborná kamenická oprava přiznaného žulového zdivá na východním průčelí

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Odborná kamenická oprava přiznaného žulového zdivá na východním průčelí

zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:

Při šetření v místě bylo rozhodnuto po žádosti SSHZ o opravě východního průčelí

zdůvodnění nemožnosti oddělení práci a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a samostatně zadat


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet		méněpráce
				ne
cena:			<i>bez DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>celkem</i> 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet		vícepráce
				ano
cena:			<i>bez DPH</i> 48 183,80 Kč	
			<i>21%DPH</i> 10 118,60 Kč	
			<i>celkem</i> 58 302,40 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACI A VÍCEPRACI		cena:	<i>bez DPH</i> 48183,80 Kč	
		<i>21%DPH</i>	10 118,60 Kč	
			<i>celkem</i> 58 302,40 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD a pod.): přílohy:

Rozpočet: Přehled změn a dodatků



číslo ZL:

63 21

Vyjádření Projektanta
Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatel. Vše dle zákona 113/2011 Sb., § 222 (4).

Vyjádření TDS
Vyjádření TDS

Vyjádření objednatel

Realizace těchto prací bude realizována dle zjištěného stavu a v případě potřeby v souladu s požadavky objednatel. Vše dle zákona 113/2011 Sb., § 222 (4).

Další vyjádření
Další vyjádření

Změnový list zhotovitele stavby č.63 Odborná kamenická oprava přiznaného žulového zdivá na východním průčelí

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

rozsah ZL

Náklady soupisu celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
	SO 01	Pluhovské domy				

48 183,80		
změna množství +	cena +	změna množství -

0,00	48 183,80
cena -	množství po ZL

N		OPĚRÁKY, Východní fasáda odborná kamenická oprava přiznaného žulového zdivá	m2	0,00000	2 540,00	0,00
---	--	--	----	---------	----------	------

18,97000	48183,80	0,00000	0,00	18,97000	48 183,80
----------	----------	---------	------	----------	-----------

Díl: 782

Konstrukce z přírodního kamene

Odborná kamenická oprava žulového zdivě

umístění:

Východní fasáda

Nová položka:

Opěráky 1 rozměry:

levý bok: trojúhelníková plocha 971 mm x 4400 mm

2,14 m2

pravý bok: trojúhelníková plocha 960 mm x 4400 mm

2,11 m2

čelo: 1258 mm x 4400 mm-((800x1900)/2)

4,78 m2

Ccěrafa 2 rozměry:

levý bok: 567 mm x 3780 mm

2,14 m2

pravý bok: 411 mm x 3780 mm

1,55 m2

Čelo: 1653 mm x 3780 mm

6,25 m2 omyti tlakovou vodou

vysekání uvolněných spár

vyprávky a doplnění chybějících částí kameného zdivá

nově přesparování

celoplošná retuš - sjednocení povrchu (zpatinování)
