



DODATEK Č. 2 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“

číslo smlouvy objednatele: 2020000768
číslo smlouvy zhotovitele: S21-017-0030
číslo veřejné zakázky: 20013

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Ing. Michalem Pavlíkem a Martinem Dudákem, oba na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Vít Sirotek, stavbyvedoucí
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 26. 5. 2020. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 29. 10. 2020. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
 ceny díla ☒
 doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě požadavků provozovatelů, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací, a cenových podmínek provádění díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
 § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 6 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

Nabídková cena díla činí 17 893 999,00 Kč bez DPH.

(slovy: sedmnáctmilionůosmsetdevadesáttřítisícdevětsetdevadesátdevětkorunčeských)

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01, 01a, 02, 02a, 03, 04a, 07 a 08) a dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 09, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a a 14) činí 18.657.066,19 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	17.893 999,00 Kč
Dodatek č. 1	205.178,26 Kč
Dodatek č. 2	557.888,93 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	623.334,35 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 65.445,42 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	18.657.066,19 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 09, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a a 14.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 12. 4. 2021, č. 365/2021.

V Českých Budějovicích

V Kájově

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

**Michal
Pavlík**
Digitálně
podepsal
Michal Pavlík
Datum:
2021.04.26
14:00:45 +02'00'

Ing. Michal Pavlík
dle plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Martin
Dudák**
Digitálně
podepsal
Martin Dudák
Datum:
2021.04.26
13:54:45
+02'00'

Martin Dudák
dle plné moci

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“		č. smlouvy objednatele:	2020000768
		č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: SO 05 Vodovod Suchovod skutečnost Vzhledem k absenci projektu náhradního zásobování vodou "suchovodů" v PD, došlo k nacenění odhadu projektanta v soupise prací. Tento odhad však nemohl být realizován, protože nebral v potaz, že zde nebyla vyloučena doprava MHD a potrubí k přilehlým domům muselo být částečně vedeno po obou stranách komunikace. Dále musely být úseky rozděleny po etapách a blokách ulic a domů, abychom neohrozili zásobování okolních ulic, které je nutné zokružovat. Tento postup byl vždy konzultován s provozním střediskem ČEVAKu, který navrhl dimenze vodovodů, aby zde na rozhraní tlakových pásem nedošlo k poklesu tlaku nebo ohrožení zásobování.			
Cena celkem bez DPH:		59 448,90 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing.  Pavlík 	
	datum a podpis:		
	jméno:	Martin Dudák 	
	datum a podpis:		
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. 	
	datum a podpis:		
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing.  Türk 	
	datum a podpis:		
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko 	
	datum a podpis:		
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko 	
	datum a podpis:		
Přílohy:	položkový rozpočet		

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 24.09.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-017-0307**ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy**

ZL 9 Suchovod skutečnost						
Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
60	8900504	Suchovod PE 90x5,4mm SDR 17, D+M svařování potrubí natupo	48,50	m	150,00	7 275,00
Skutečnost dle tlakových zkoušek: 268,5m						
V rozpočtu: 220m						
Navíc oproti rozpočtu: 268,5-220=48,5m						
200	890 05 04R	Suchovod PE 110 - SKUTEČNOST DLE TLAKOVÝCH ZKOUŠEK - VÍCE	261,00		199,90	52 173,90
Skutečnost dle tlakových zkoušek: 261m						
		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:		59 448,90
Celkem						
		21,00	12 484,27	Odbytová cena s DPH:		71 933,17

Stavba: „České Budějovice, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“		č. smlouvy objednatele:	2020000768
		č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	EKO EKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: SO 01 Komunikace a chodníky Dobetonávky podezdívek, lampa VO Z důvodu nemožného provádění osazení obrub podél podezdívek okolních parcel dle předpokládaných výškových poměrů muselo dojít ke změně osazení chodníkových obrub a tudíž i dobetonování nově vzniklých prostorů. Dále vzhledem k nevycházejícím šířkovým poměrům bylo nutné stávající lampu VO demontovat a poté opětovně osadit.			
Cena celkem bez DPH:		33 816,40 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík [redacted]	
	datum a podpis:		
	jméno:	Martin Dudák [redacted]	
	datum a podpis:		
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. [redacted]	
	datum a podpis:		
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk [redacted]	
	datum a podpis:		
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko [redacted]	
	datum a podpis:		
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko [redacted]	
	datum a podpis:		
Přílohy:	položkový rozpočet		

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 10 Dobetonávky podezdívek, lampa VO						
Položka	Text		Množství	m.j.	Cena	Celkem
81	R001	Demontáž a opětovná montáž lampy VO	1,00	kpl	17 810,40	17 810,40
82	8996231511	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	6,04	m3	2 650,00	16 006,00
	60*0,2*0,3=3,6m3					
	28*0,2*0,3=1,74m3					
	5*0,2*0,3=0,3m3					
	10*0,2*0,2=0,4m3					
	CELKEM: 6,04m3					

Celkem		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	33 816,40
		21,00	7 101,44	Odbytová cena s DPH:	40 917,84

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“		č. smlouvy objednatele:	2020000768
		č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel : statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
TDS: TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice			
Projektant: EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Předmět změny: SO 01 Komunikace a chodníky Komunikace a chodníky dle DSPS Po vypracování DSPS došlo k přepočítání původního soupisu prací aby odpovídal na skutečně provedené výměry.			
Cena celkem bez DPH:		214 879,82 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík [redacted]	
	datum a podpis:		
	jméno:	Martin Dudák [redacted]	
	datum a podpis:		
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. [redacted]	
	datum a podpis:		
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Tůrk [redacted]	
	datum a podpis:		
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko [redacted]	
	datum a podpis:		
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko [redacted]	
	datum a podpis:		
Přílohy: položkový rozpočet			

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 11 Komunikace a chodníky dle DSPS					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
45	596215040 Klázení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm <i>sjezdy na pozemky, dlažba hladká šedá: (171-145)-14,2=11,8m2 sjezdy na pozemky, dlažba reliéfní červená: (32-31)-0,7=0,3m2 "JEDEN VJEZD NA POZEMEK NEZAPOČÍTÁN - HRAZEN SOUKROMÝM INVESTOREM"</i>	12,10 m2		309,00	3 738,90
46	59248040 Dlažba zámková hladká šedá tl.8cm <i>Ztratiné se doporučuje ve výši 5 %. sjezdy na pozemky, dlažba hladká šedá: 11,8*1,05 "JEDEN VJEZD NA POZEMEK NEZAPOČÍTÁN - HRAZEN SOUKROMÝM INVESTOREM"</i>	12,39 m2		238,00	2 948,82
47	59248059 Dlažba zámková reliéfní červená tl.8cm <i>Ztratiné se doporučuje ve výši 5 %. sjezdy na pozemky, dlažba reliéfní červená: 0,3*1,05 "JEDEN VJEZD NA POZEMEK NEZAPOČÍTÁN - HRAZEN SOUKROMÝM INVESTOREM"</i>	0,32 m2		398,00	125,37
48	567122114 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm <i>sjezdy na pozemky: 12,1*1,15=13,915m2 "JEDEN VJEZD NA POZEMEK NEZAPOČÍTÁN - HRAZEN SOUKROMÝM INVESTOREM"</i>	13,92 m2		341,00	4 745,02
49	564861111 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm <i>sjezdy na pozemky: 12,1*1,25=15,125m2 "JEDEN VJEZD NA POZEMEK NEZAPOČÍTÁN - HRAZEN SOUKROMÝM INVESTOREM"</i>	15,13 m2		159,00	2 404,88
50	596215020 Klázení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm <i>chodníky, dlažba reliéfní červená: 59-54=5m2</i>	5,00 m2		296,00	1 480,00
51	59248057 Dlažba zámková reliéfní červená tl.6cm <i>Ztratiné se doporučuje ve výši 5 %. chodníky, dlažba reliéfní červená: 5*1,05</i>	5,25 m2		371,00	1 947,75
52	564861111 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm <i>chodníky: 5*1,15</i>	5,75 m2		159,00	914,25
53	577132111 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm <i>celková rekonstrukce: 2966-2820=146m2 komunikace mimo celkovou rekonstrukci : 253-180=73m2</i>	219,00 m2		166,00	36 354,00
54	573231110 Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 <i>celková rekonstrukce: 2966-2820=146m2 komunikace mimo celkovou rekonstrukci : 253-180=73m2</i>	219,00 m2		12,00	2 628,00
55	577152123 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm <i>celková rekonstrukce: 2966-2820=146m2 komunikace mimo celkovou rekonstrukci : 253-180=73m2</i>	219,00 m2		251,00	54 969,00
65	917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	199,50 m		385,00	76 807,50

obrubníky nájezdové: (140-120)-4,5=15,5m
 obrubníky přechodové levé: 33-32=1m
 obrubníky přechodové pravé: 34-32=2m
 obrubníky Kasselské přechodové levé: 2-1=1m
 obrubníky Kasselské přechodové pravé: 2-1=1m
 obrubníky záhonové: (470-412)-4=54m
 obrubníky linea: 125m
 "JEDEN VJEZD NA POZEMEK NEZAPOČÍTÁN - HRAZEN
 SOUKROMÝM INVESTOREM"

66	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý <i>Zitravné se doporučuje ve výši 1%. 15,5*1,01</i> "JEDEN VJEZD NA POZEMEK NEZAPOČÍTÁN - HRAZEN SOUKROMÝM INVESTOREM"	15,66 kus	91,00	1 424,61
67	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 <i>Zitravné se doporučuje ve výši 1%. 1*1,01</i>	1,01 kus	277,00	279,77
68	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 <i>Zitravné se doporučuje ve výši 1%. 2*1,01</i>	2,02 kus	277,00	559,54
69	592174988	Obrubník zastávkový přechodový levý <i>Kasselský obrubník : délka 1000 mm šířka 435 mm výška 300/330 mm</i>	1,00 kus	1 908,00	1 908,00
70	592174987	Obrubník zastávkový přechodový pravý <i>Kasselský obrubník délka 1000 mm šířka 435 mm výška 330/300 mm</i>	1,00 kus	1 908,00	1 908,00
71	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/250 šedý <i>Zitravné se doporučuje ve výši 1%. 54*1,01</i> "JEDEN VJEZD NA POZEMEK NEZAPOČÍTÁN - HRAZEN SOUKROMÝM INVESTOREM"	54,54 kus	54,00	2 945,16
72	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 1000x80x250mm <i>125*1,01</i>	126,25 m	133,00	16 791,25

Celkem		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	214 879,82
		21,00	45 124,76	Odbytová cena s DPH:	260 004,58

Hlinecká ulice (Dobrovodská-Vrbenská), stavební úpravy
Popis změn oproti DSP

Z-01, Z-02

Oprava povrchu vozovky silnice II/156 ve správě SÚS dle skutečného rozsahu výkopů pro kanalizaci, vodovodu, veřejné osvětlení a pokládku nových obručníků.

Z-03

Nový vjezd na parcelu proveden na pokyn objednatele, hradil majitel pozemku.

Z-04

Prodloužení rekonstrukce. Těsně za hranicí rekonstrukce dle DSP byla poškozená vozovka. Dle požadavku SVS MMČB.

Z-05

Rozšíření vjezdu hradil majitel pozemku.

Z-06

Rozšíření plochy opravy povrchu vozovky. Za hranicí rekonstrukce dle DSP byla poškozená vozovka. Dle požadavku SVS MMČB.

Z-07

Oprava povrchu vozovky provedena po rekonstrukci plynovodu. Hradil zhotovitel plynovodu.

Z-08

Vjezd zrušen na pokyn objednatele.

Z-09 + Z-12

Po jednání s majitelem objektu byl vjezd přesunut z ul. El.Krásnohorské do ul. Hlinecká.

Z-10

Po projednání s objednatelem, SVS MMČB a projektantem byla hranice rekonstrukce posunuta do ul. EL.Krásnohorské a zároveň upraveno místo pro přecházení.

Z-11

Prodloužení rekonstrukce. Těsně za hranicí rekonstrukce dle DSP byla poškozená vozovka. Dle požadavku SVS MMČB.

Z-12 viz Z-09

Z-13

Hranice rekonstrukce posunuta tak, aby nekončila v polovině přechodu pro chodce.

Z-14

Hranice rekonstrukce posunuta za opravu kanalizačního řádu prováděnou firmou ČEVAK.

Z-15

Rozšíření plochy opravy povrchu vozovky. Za hranicí rekonstrukce dle DSP byla poškozená vozovka. Dle požadavku SVS MMČB.

Z-16

Osazení obrubníku + dobetonování plochy k podezdívce plotu. Po dohodě s objednatelem a SVS MMČB z důvodu výškové kolize dlažby chodníku a základu podezdívky.

Z-17


Osazení obrubníku + dobetonování plochy k podezdívce plotu. Po dohodě s objednatelem a SVS MMČB z důvodu výškové kolize dlažby chodníku a základu podezdívky.

Z-18

Dobetonování plochy ve vjezdech. Po dohodě s objednatelem a SVS MMČB z důvodu výškové kolize dlažby chodníku a základu podezdívky.

Z-19

Dobetonování plochy mezi obrubníkem a podezdívkou plotu. Po dohodě s objednatelem a SVS MMČB z důvodu následné údržby.

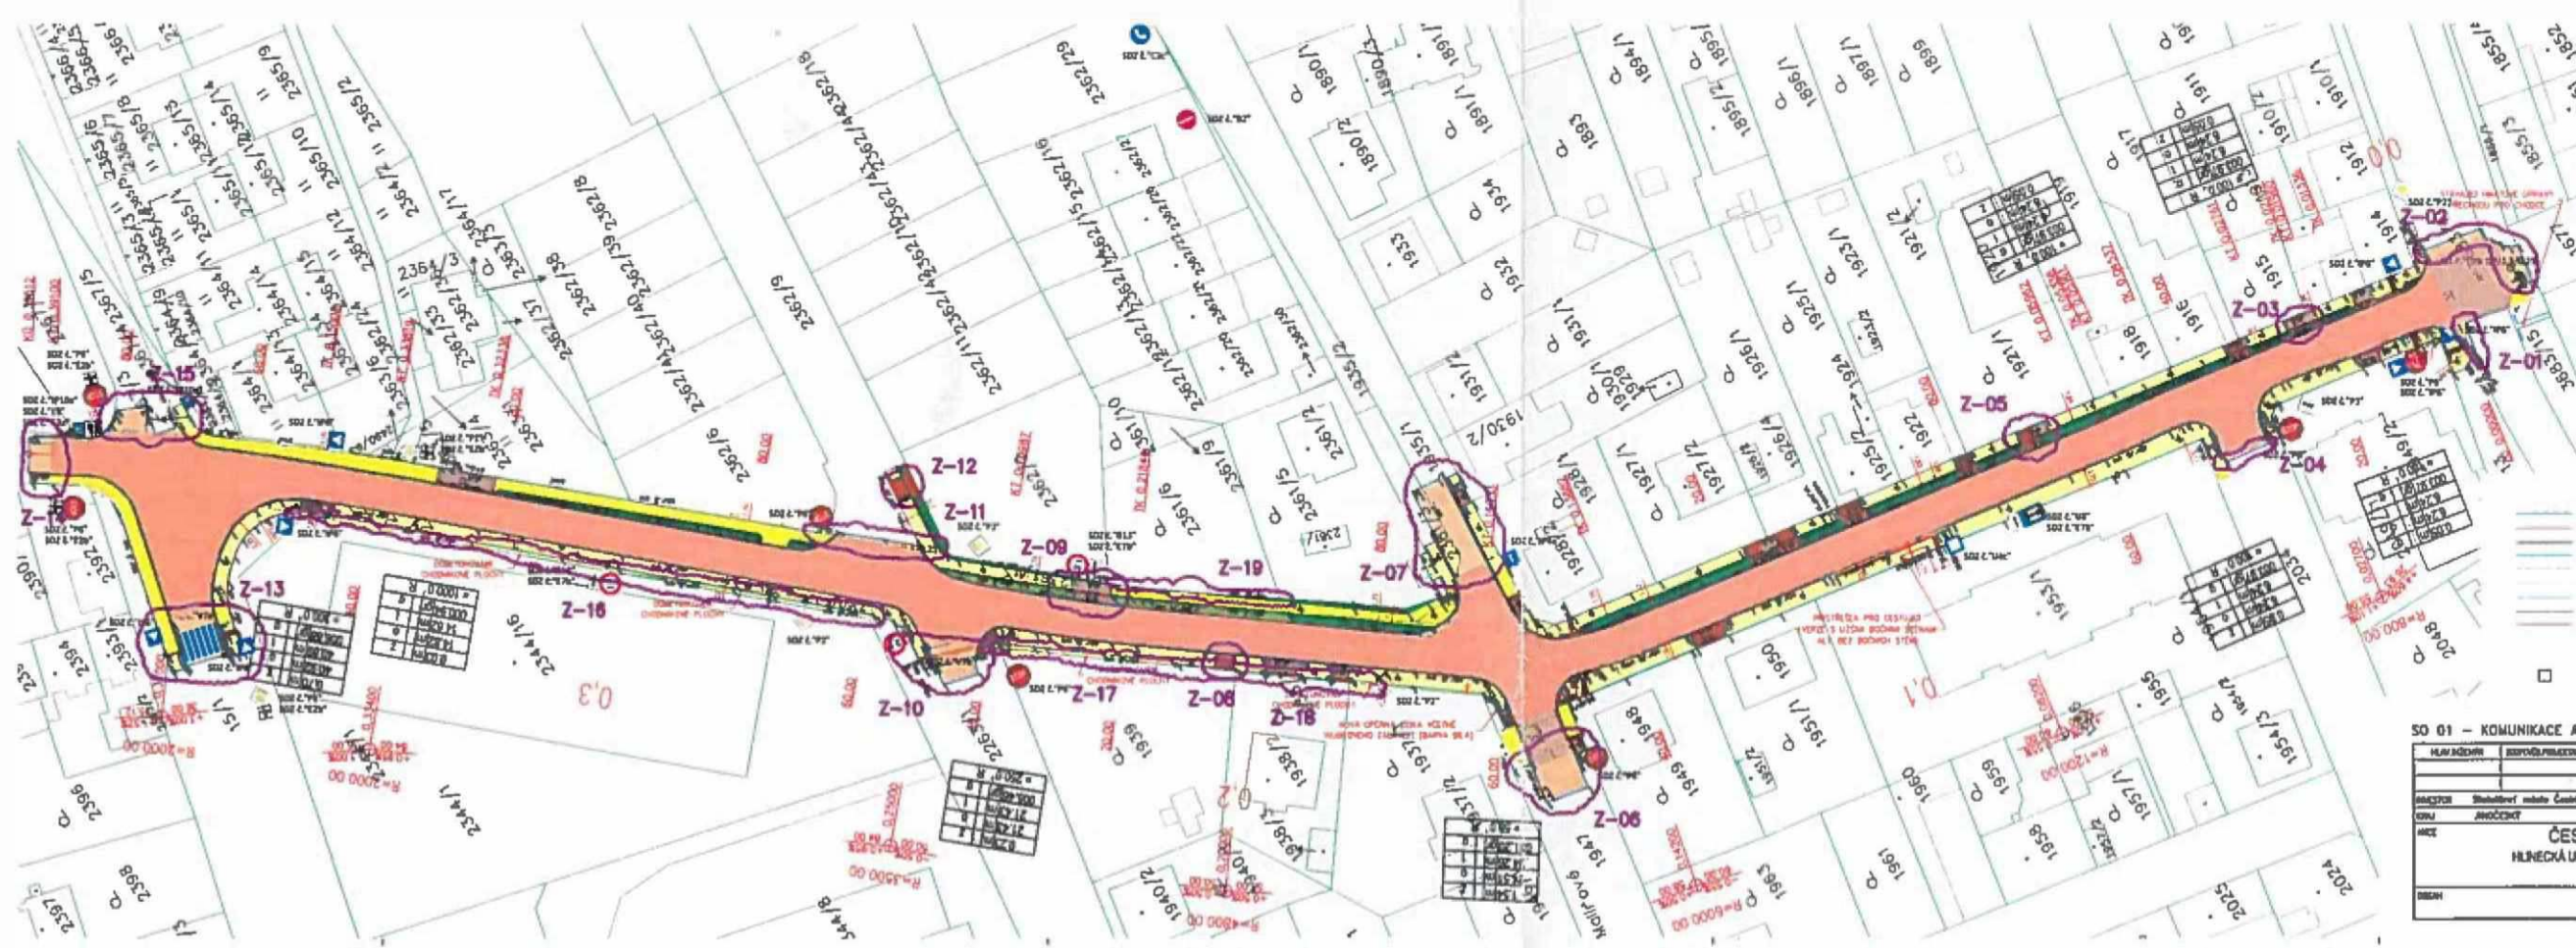

POZNÁMKY

- MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V BOČNÍCH ULICÍCH BYLA DODATEČNĚ POSOUZENA DLE POŽADAVKŮ ČSN 73 8110.
- KŘÍŽOVATKY POSOUZENY PRO STAV KDY NĚK VOZIDLO MŮJE V ZASTÁVCE.
- U KŘÍŽOVATKY DOBROVOUDSKÁ-HULNECKÁ JE PŘECHOD PRO CHODCE ŘEŠEN STÁVAJÍCÍ OPRAVOU.
- POLOŽENY KŘÍŽOVATKY BYLY NAVRŽENY A NÁSLEDNĚ REALIZOVÁNY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU.
- OSVĚTLENÍ ULIČNÍHO PROSTORU BYLO PROVĚŘENO KONKRETNĚ A TO VČETNĚ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ DLE SCHVÁLENÉ PROJEKČNÍ DOKUMENTACE PRO OSVĚTLENÍ A STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ. PŘEVÝŠENÍ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ JE DLE ČSN 73 8110 VODNĚ, NIKOLY POVRNĚ. MEZI STODŽARY VÝŠKOVÝHO OSVĚTLENÍ A MÍSTY PRO PŘECHÁZENÍ SE NEHODÍ PŘEKÁŽKY, KTERÉ BY BRÁNILY OSVĚTLENÍ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ.
- V PRŮBĚHU STAVBY DOŠLO K OPRAVĚ ZVLÁŠTNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ BYLO KONZULTOVÁNO S DI POLICIE ČR A MĚŘÍ ODBORNĚ DOPRAVY.

LEGENDA

- VOZIDLOVA
- ASFAKTOVÝ POVRCH
- SLÉZKY NA POZEMKY-ZELEZNÁ DLAŽBA
- POVRCH HLADKÝ (SEDÁ BARVA)
- CHODNÁ-DLAŽBA
- POVRCH HLADKÝ (SEDÁ BARVA)
- VEŘEJNÁ ZELEŇ
- DLAŽBA PRO NEVODNÉ
- POVRCH RELIEFNÍ (ČERNÁ BARVA)
- SLÉZKY DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SOI C. 74
- VOZIDLOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- POZHLAD Z MÍST PRO PŘECHÁZENÍ
- POZHLAD V KŘÍŽOVATCE
- SOUPĚ PLYN
- SACHTA

SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

NAZEV	ROZPOČETNÍK	VÝKONK	VOZBA	KONTROLA
ANOTACE	ANOTACE	ANOTACE	ANOTACE	ANOTACE
ČESKÉ BUDĚJOVICE, HULNECKÁ ULICE (VŘBEŇSKÁ-DOBROVOUDSKÁ) STAVEBNÍ ÚPRAVY				
BRAN	BRAN	BRAN	BRAN	BRAN

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“		č. smlouvy objednatele:	2020000768
		č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel : statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
TDS: TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice			
Projektant: EKO EKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Předmět změny: SO 01 Komunikace a chodníky Komunikace a chodníky dle DSPS - odpočet Po vypracování DSPS došlo k přepočítání původního soupisu prací aby odpovídal na skutečně provedené výměry.			
Cena celkem bez DPH:		-24 722,42 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík	
	datum a podpis:		
	jméno:	Martin Dudák	
	datum a podpis:		
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS.	
	datum a podpis:		
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk	
	datum a podpis:		
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko	
	datum a podpis:		
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko	
	datum a podpis:		
Přílohy: položkový rozpočet			

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 11a Komunikace a chodníky dle DSPS - odpočet					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
18	122102202 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 <i>Odkopávky v hornině 2 předpoklad 20% objemu. chodníky: $-23 \cdot (0,29 - 0,21) \cdot 0,2$</i>	-0,37 m3		123,00	-45,26
19	122202202 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 <i>Odkopávky v hornině 3 předpoklad 70% objemu. chodníky: $-23 \cdot (0,29 - 0,21) \cdot 0,7$</i>	-1,29 m3		123,00	-158,42
20	122202209 Připlatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <i>Předpoklad 10% objemu odkopávky. $-1,288 \cdot 0,1$</i>	-0,13 m3		17,00	-2,19
21	122302202 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 <i>Odkopávky v hornině 4 předpoklad 10% objemu. chodníky: $-23 \cdot (0,29 - 0,21) \cdot 0,1$</i>	-0,18 m3		168,00	-30,91
22	122302209 Připlatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 <i>Předpoklad 10% objemu odkopávky. $-0,184 \cdot 0,1$</i>	-0,02 m3		36,00	-0,66
23	162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Přemístění přebytečného výkopku na skládku. objem odkopávky v hornině 2: -0,368 objem odkopávky v hornině 3: -1,288 objem odkopávky v hornině 4: -0,184</i>	-1,84 m3		159,00	-292,56
24	171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných <i>objem odkopávky v hornině 2: -0,368 objem odkopávky v hornině 3: -1,288 objem odkopávky v hornině 4: -0,184</i>	-1,84 m3		17,00	-31,28
25	199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 <i>objem odkopávky v hornině 2: -0,368 objem odkopávky v hornině 3: -1,288 objem odkopávky v hornině 4: -0,184</i>	-1,84 m3		221,00	-406,64
31	R18110110 Úprava pláně se zhuťněním <i>chodníky: -23</i>	-23,00 m2		10,00	-230,00
48	596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm <i>chodníky, dlažba hladká šedá: $1385 - 1410 = 25 \text{ m}^2$</i>	-25,00 m2		296,00	-7 400,00
49	59248055. Dlažba zámková hladká šedá tl.6cm <i>Zíratné se doporučuje ve výši 5 %. chodníky, dlažba hladká šedá: $-25 \cdot 1,05$</i>	-26,25 m2		177,00	-4 646,25
50	564861111 Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm <i>chodníky: $-25 \cdot 1,15$</i>	-28,75 m2		159,00	-4 571,25

63	917862111	Osazení stojal. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15 <i>obrubnky silniční: 607-620=-13m</i>	-13,00 m	385,00	-5 005,00
67	59217450	Obrubník silniční betonový 1000/150/250 šedý <i>Zitravné se doporučuje ve výši 1%. -13*1,01</i>	-13,13 kus	100,00	-1 313,00
102	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	-19,00 t	31,00	-589,00
Celkem		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	-24 722,42
		21,00	-5 191,71	Odbytová cena s DPH:	-29 914,13

Změnový list číslo:	12
---------------------	----

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“		č. smlouvy objednatele:	2020000768
		č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: SO 00 Ostatní náklady stavby Skutečnost DIO Vzhledem k nutnosti přepracování návrhu DIO a projednání s příslušnými úřady (MM ČB, PČR, DPM ČB) před realizací stavby dle skutečných požadavků a nároků na průběh stavebních prací a zároveň zachování plynulosti dopravy MHD a IZS došlo k navýšení počtu etap a s tím spojený kusový materiál. Více viz. přiložené přílohy.			
Cena celkem bez DPH:		223 198,00 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík [podpis] datum a podpis:	
	jméno:	Martin Dudák [podpis] datum a podpis:	
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. [podpis] datum a podpis:	
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk [podpis] datum a podpis:	
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko [podpis] datum a podpis:	
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko [podpis] datum a podpis:	
Přílohy:	položkový rozpočet		

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 12 Skutečnost DIO

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	---------------

12 12	Dopravní opatření, DIO	1,00	kpl	223 198,00	223 198,00
-------	------------------------	------	-----	------------	------------

Souhrn veškerého dopravního značení (dopravní značky, velkoplošné dopravní značky, směrové značky, zábrany, ...) včetně pronájmu, včetně projednání DIO s dotčenými orgány, včetně povolení k zvláštnímu užívání komunikace a včetně řešení náhradní MHD v době úplné uzavírky, cca 8 týdnů.

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH:

223 198,00

Celkem

21,00

46 871,58

Odbytová cena s DPH:

270 069,58

Kalkulace dle skutečnosti

Hlínecká úsek Dobrovodská-Vrbenská

od	do	počet dnů	druh DZ	počet kusů	jedn.cena	celkem
01.06.2020	26.07.2020	56	podstavec	15	5,00	4 200,00
01.06.2020	26.07.2020	56	B28s	7	5,00	1 960,00
01.06.2020	06.09.2020	98	Ev	6	8,00	4 704,00
01.06.2020	26.07.2020	56	Es	6	8,00	2 688,00
08.06.2020	26.06.2020	19	Z4	4	8,00	608,00
08.06.2020	26.06.2020	19	SSZ2	1	300,00	5 700,00
08.06.2020	01.12.2020	177	IP22s	8	22,00	31 152,00
08.06.2020	01.12.2020	177	IS11b 1S	4	12,00	8 496,00
08.06.2020	29.09.2020	114	Es	3	8,00	2 736,00
08.06.2020	26.06.2020	19	podstavec	4	5,00	380,00
08.06.2020	01.12.2020	177	IP10a	2	8,00	2 832,00
08.06.2020	01.12.2020	177	IP10b	3	8,00	4 248,00
08.06.2020	26.07.2020	49	Bs	10	8,00	3 920,00
08.06.2020	26.06.2020	19	Cs	1	8,00	152,00
08.06.2020	29.09.2020	114	Ev	4	8,00	3 648,00
08.06.2020	26.07.2020	49	As	6	8,00	2 352,00
08.06.2020	01.12.2020	177	Em	4	8,00	5 664,00
08.06.2020	01.12.2020	177	Z2	4	8,00	5 664,00
08.06.2020	06.09.2020	91	IS11c	5	8,00	3 640,00
08.06.2020	01.12.2020	177	IS11b 1R	1	12,00	2 124,00
26.06.2020	26.07.2020	31	Es	2	8,00	496,00
26.06.2020	26.07.2020	31	Em	2	8,00	496,00
26.06.2020	26.07.2020	31	Bs	4	8,00	992,00
17.07.2020	06.11.2020	113	Ev	7	8,00	6 328,00
17.07.2020	29.09.2020	75	B28s	7	5,00	2 625,00
17.07.2020	06.11.2020	113	podstavec	22	5,00	12 430,00
17.07.2020	01.12.2020	138	Es	4	8,00	4 416,00
22.07.2020	06.11.2020	108	Z4	6	8,00	5 184,00
22.07.2020	01.12.2020	133	podstavec	6	5,00	3 990,00
26.07.2020	01.12.2020	129	IP10a	2	8,00	2 064,00
26.07.2020	06.11.2020	104	IP10b	2	8,00	1 664,00
26.07.2020	29.09.2020	66	IP22s	2	22,00	2 904,00
26.07.2020	06.09.2020	43	IS11c	5	8,00	1 720,00
08.06.2020	26.07.2020	49	Z4	4	8,00	1 568,00
08.06.2020	01.12.2020	177	podstavec	64	5,00	56 640,00
08.06.2020	26.07.2020	49	Cs	1	8,00	392,00
01.06.2020	01.12.2020	184	podstavec	9	5,00	8 280,00
01.06.2020	06.09.2020	98	SSZ2	5	8,00	3 920,00
08.06.2020	06.11.2020	152	Cs	2	8,00	2 432,00
08.06.2020	01.12.2020	177	Es	3	8,00	4 248,00
08.06.2020	01.12.2020	177	Ev	2	8,00	2 832,00
17.07.2020	06.11.2020	113	B28s	4	5,00	2 260,00
01.09.2020	01.12.2020	92	Bs	2	8,00	1 472,00
01.09.2020	30.11.2020	91	podstavec	6	5,00	2 730,00
01.09.2020	01.12.2020	92	As	4	8,00	2 944,00
03.09.2020	29.09.2020	27	podstavec	4	5,00	540,00
03.09.2020	01.12.2020	90	Z4	4	8,00	2 880,00
06.09.2020	01.12.2020	87	IP10a	2	8,00	1 392,00
06.09.2020	30.11.2020	86	As	3	8,00	2 064,00
06.09.2020	06.11.2020	62	Bs	4	8,00	1 984,00
06.09.2020	01.12.2020	87	Cs	2	8,00	1 392,00
06.09.2020	01.12.2020	87	podstavec	17	5,00	7 395,00
06.09.2020	01.12.2020	87	IS11b 2S	3	12,00	3 132,00
06.09.2020	01.12.2020	87	IS11b 1R	2	12,00	2 088,00
06.09.2020	01.12.2020	87	IP10b	2	8,00	1 392,00

06.09.2020	29.09.2020	24	SSZ2	1	300,00	7 200,00
06.09.2020	01.12.2020	87	Z4	9	8,00	6 264,00
22.09.2020	01.12.2020	71	Ev	2	8,00	1 136,00
22.09.2020	01.12.2020	71	B28s	4	5,00	1 420,00
22.09.2020	01.12.2020	71	Es	2	8,00	1 136,00
22.09.2020	01.12.2020	71	Em	2	8,00	1 136,00
22.09.2020	01.12.2020	71	podstavec	8	5,00	2 840,00
29.09.2020	01.12.2020	64	IP10a	2	8,00	1 024,00
29.09.2020	01.12.2020	64	As	1	8,00	512,00
29.09.2020	01.12.2020	64	Bs	1	8,00	512,00
29.09.2020	01.12.2020	64	Ev	3	8,00	1 536,00
29.09.2020	30.11.2020	63	SSZ3	1	960,00	60 480,00
29.09.2020	01.12.2020	64	IP10b	4	8,00	2 048,00
29.09.2020	01.12.2020	64	IP11c	2	8,00	1 024,00
29.09.2020	01.12.2020	64	Cs	2	8,00	1 024,00
29.09.2020	01.12.2020	64	IS11a	1	10,00	640,00
29.09.2020	01.12.2020	64	IS11b 1S	1	12,00	768,00
30.09.2020	01.12.2020	63	Z4	15	8,00	7 560,00
30.09.2020	01.12.2020	63	podstavec	15	5,00	4 725,00
11.11.2020	01.12.2020	21	IP22s	1	22,00	462,00
11.11.2020	01.12.2020	21	podstavec	2	5,00	210,00
01.12.2020	15.02.2021	77	IP22s	9	22,00	15 246,00
01.12.2020	15.02.2021	77	podstavec	18	5,00	6 930,00
04.12.2020	10.12.2020	7	P6s	1	8,00	56,00
04.12.2020	10.12.2020	7	podstavec	1	5,00	35,00

DIO vč.administrativy, vyřízení PČR, ODaSH	0	6 000,00	0,00
výměna AKU	8	0,00	0,00
Čára 50 cm žlutá, vč. Nájezdů	6	306,67	1 840,00
dočasné zneplatnění	7	40,00	280,00
přestavby etap, úpravy, likvidace, nájezdy			5 400,00
DIO vč. Administrativy 2x doplnění MM			3 600,00
CELKEM:			393 198,00

Z toho průběžné doplňování stavby dle požadavků MMČB	40 593,00
---	------------------

Projektové PD DIO je uvedeno slovy "Návrh DIO je pouze předběžný a musí být před realizací stavby projednán a koordinován". Výkresy tedy musely být vypracovány znova a opakovaně projednány na dotčených úřadech, vč. vyjadřovacích protokolů.

PD DIO nereflkuje požadavky MMČB na objízdné trasy, které vznikly před realizací a v PD zcela absentují. V DIR jsou obj.trasy nejen lokální, ale i odklánějící z celé oblasti stavby.

PD člení stavbu na 8 etap. Ve vydaném DIR na 11+1 etap, včetně 80 dní závěrečné 12. etapy na dobu předčasného užívání.

DIR obsahuje další doplňující požadavky MMČB na úpravy vnitrobloků a odklony dopravy na obj.trasy. V původní PD bylo vše ponecháno vnitroblokem i bez návěštění, natož obj.trasy. Tyto změny musely být taktéž vytvořeny, projednány a stanoveny.

DIR obsahuje doplňující požadavky DPM ČB pro zajištění průjezdnosti.

PD DIO počítá s jednoduchým řízením pomocí max.dvouhlavé sestavy SSZ. Skutečnost po projednání s PČR a ODaSH byla dvouhlavá + v dalších etapách tříhlavá sestava SSZ.

PD DIO obsahuje kusový materiál cca 390 ks v 8 etapách a DIR 430 ks v 11+1 etapách.

Z tohoto výčtu je evidentní, že tyto dvě PD (zamýšlená a skutečně požadovaná/realizovaná) jsou naprosto rozdílné co se týká jak množství materiálu, tak rozsahu ovlivněného území - realizované DIO se muselo podřítit aktuálním požadavkům vzniklým při projednání DIR a realizaci samotné.

Kalkulace dle PD - nabídka**Křižovatka Hlinecká-Dobrovodská****předpoklad 2 x 2 dny**

od	do	počet dnů	druh DZ	počet kusů	jedn.cena	celkem
		4	A15	2	8,00	64,00
		4	B20	4	8,00	128,00
		4	Z4	5	8,00	160,00
		4	C4	1	0,00	0,00
		4	podstavec/stojan DZ	12	5,00	240,00
instalace a odstranění DIO vč. dopravy				0	1 800,00	0,00
administrativa, vyřízení DIR				0	1 200,00	0,00
						592,00

Dobrovodská - H.Malířové**předpoklad 100 dní**

od	do	počet dnů	druh DZ	počet kusů	jedn.cena	celkem
		100	E13	8	8,00	6 400,00
		100	IP22	3	22,00	6 600,00
		100	B28	9	5,00	4 500,00
		100	B24	4	8,00	3 200,00
		100	C2,3,4	1	8,00	800,00
		100	B1	3	8,00	2 400,00
		100	Z2	3	8,00	2 400,00
		100	IP10a,b	1	8,00	800,00
		100	podstavec/stojan DZ	41	5,00	20 500,00
instalace a odstranění DIO vč. dopravy				0	1 800,00	0,00
administrativa, vyřízení DIR				0	1 200,00	0,00
						47 600,00

H.Malířové - El.Krásnohorské**předpoklad 45 dní**

od	do	počet dnů	druh DZ	počet kusů	jedn.cena	celkem
		45	IP22	5	22,00	4 950,00
		45	E7	4	8,00	1 440,00
		45	B13	2	8,00	720,00
		45	E13	9	8,00	3 240,00
		45	B24	2	8,00	720,00
		45	C2,3,4	1	8,00	360,00
		45	Z2	4	8,00	1 440,00
		45	B1	4	8,00	1 440,00
		45	B28	3	5,00	675,00
		45	IS11a	6	10,00	2 700,00
		45	podstavec/stojan DZ	52	5,00	11 700,00
instalace a odstranění DIO vč. dopravy				0	1 800,00	0,00
administrativa, vyřízení DIR				0	1 200,00	0,00
						29 385,00

El.Krásnohorské - Vrbenská**předpoklad 2x25 dní**

od	do	počet dnů	druh DZ	počet kusů	jedn.cena	celkem
----	----	-----------	---------	------------	-----------	--------

50	B24	3	8,00	1 200,00
50	E13	12	8,00	4 800,00
50	C2,3,4	1	0,00	0,00
50	IP22	4	22,00	4 400,00
50	E7	3	8,00	1 200,00
50	C4	2	0,00	0,00
50	Z4	2	8,00	800,00
50	B1	3	8,00	1 200,00
50	B20	4	8,00	1 600,00
50	A15	2	8,00	800,00
50	A10	2	8,00	800,00
50	B28	2	5,00	500,00
50	Z2	1	8,00	400,00
50	IP10a,b	2	8,00	800,00
50	S1 - semafor dvocest.	1	300,00	15 000,00
50	podstavec/stojan DZ	50	5,00	12 500,00
instalace a odstranění DIO vč. dopravy		0	1 800,00	0,00
administrativa, vyřízení DIR		0	1 200,00	0,00
				46 000,00

Křižovatka Hlinecká - Vrbenská
předpoklad 2x10 dní

od	do	počet dnů	druh DZ	počet kusů	jedn.cena	celkem
		20	B24	2	8,00	320,00
		20	E13	12	8,00	1 920,00
		20	IP22	4	22,00	1 760,00
		20	E7	3	8,00	480,00
		20	C2,3,4	2	8,00	320,00
		20	Z4	10	8,00	1 600,00
		20	B1	3	8,00	480,00
		20	B20	4	8,00	640,00
		20	A15	2	8,00	320,00
		20	A10	2	8,00	320,00
		20	B28	7	5,00	700,00
		20	Z2	1	8,00	160,00
		20	IP10a,b	3	8,00	480,00
		20	S1 - semafor dvocest.	1	300,00	6 000,00
		20	podstavec/stojan DZ	52	5,00	5 200,00
instalace a odstranění DIO vč. dopravy				0	1 800,00	0,00
administrativa, vyřízení DIR				0	1 200,00	0,00
						20 700,00

Náhradní autobusová doprava
předpoklad 8 týdnů


popis	počet kusů	jedn.cena	celkem
zřízení a odstranění náhradní autobusové zastávky	1	25 723,00	25 723,00
			25 723,00
CELKEM:			170 000,00

U Cihelny

Dopravně-inženýrské opatření
HLINECKÁ ULICE
(Vrbenská - Dobrovodská)
stavební úpravy



Česká
Republika
ČK

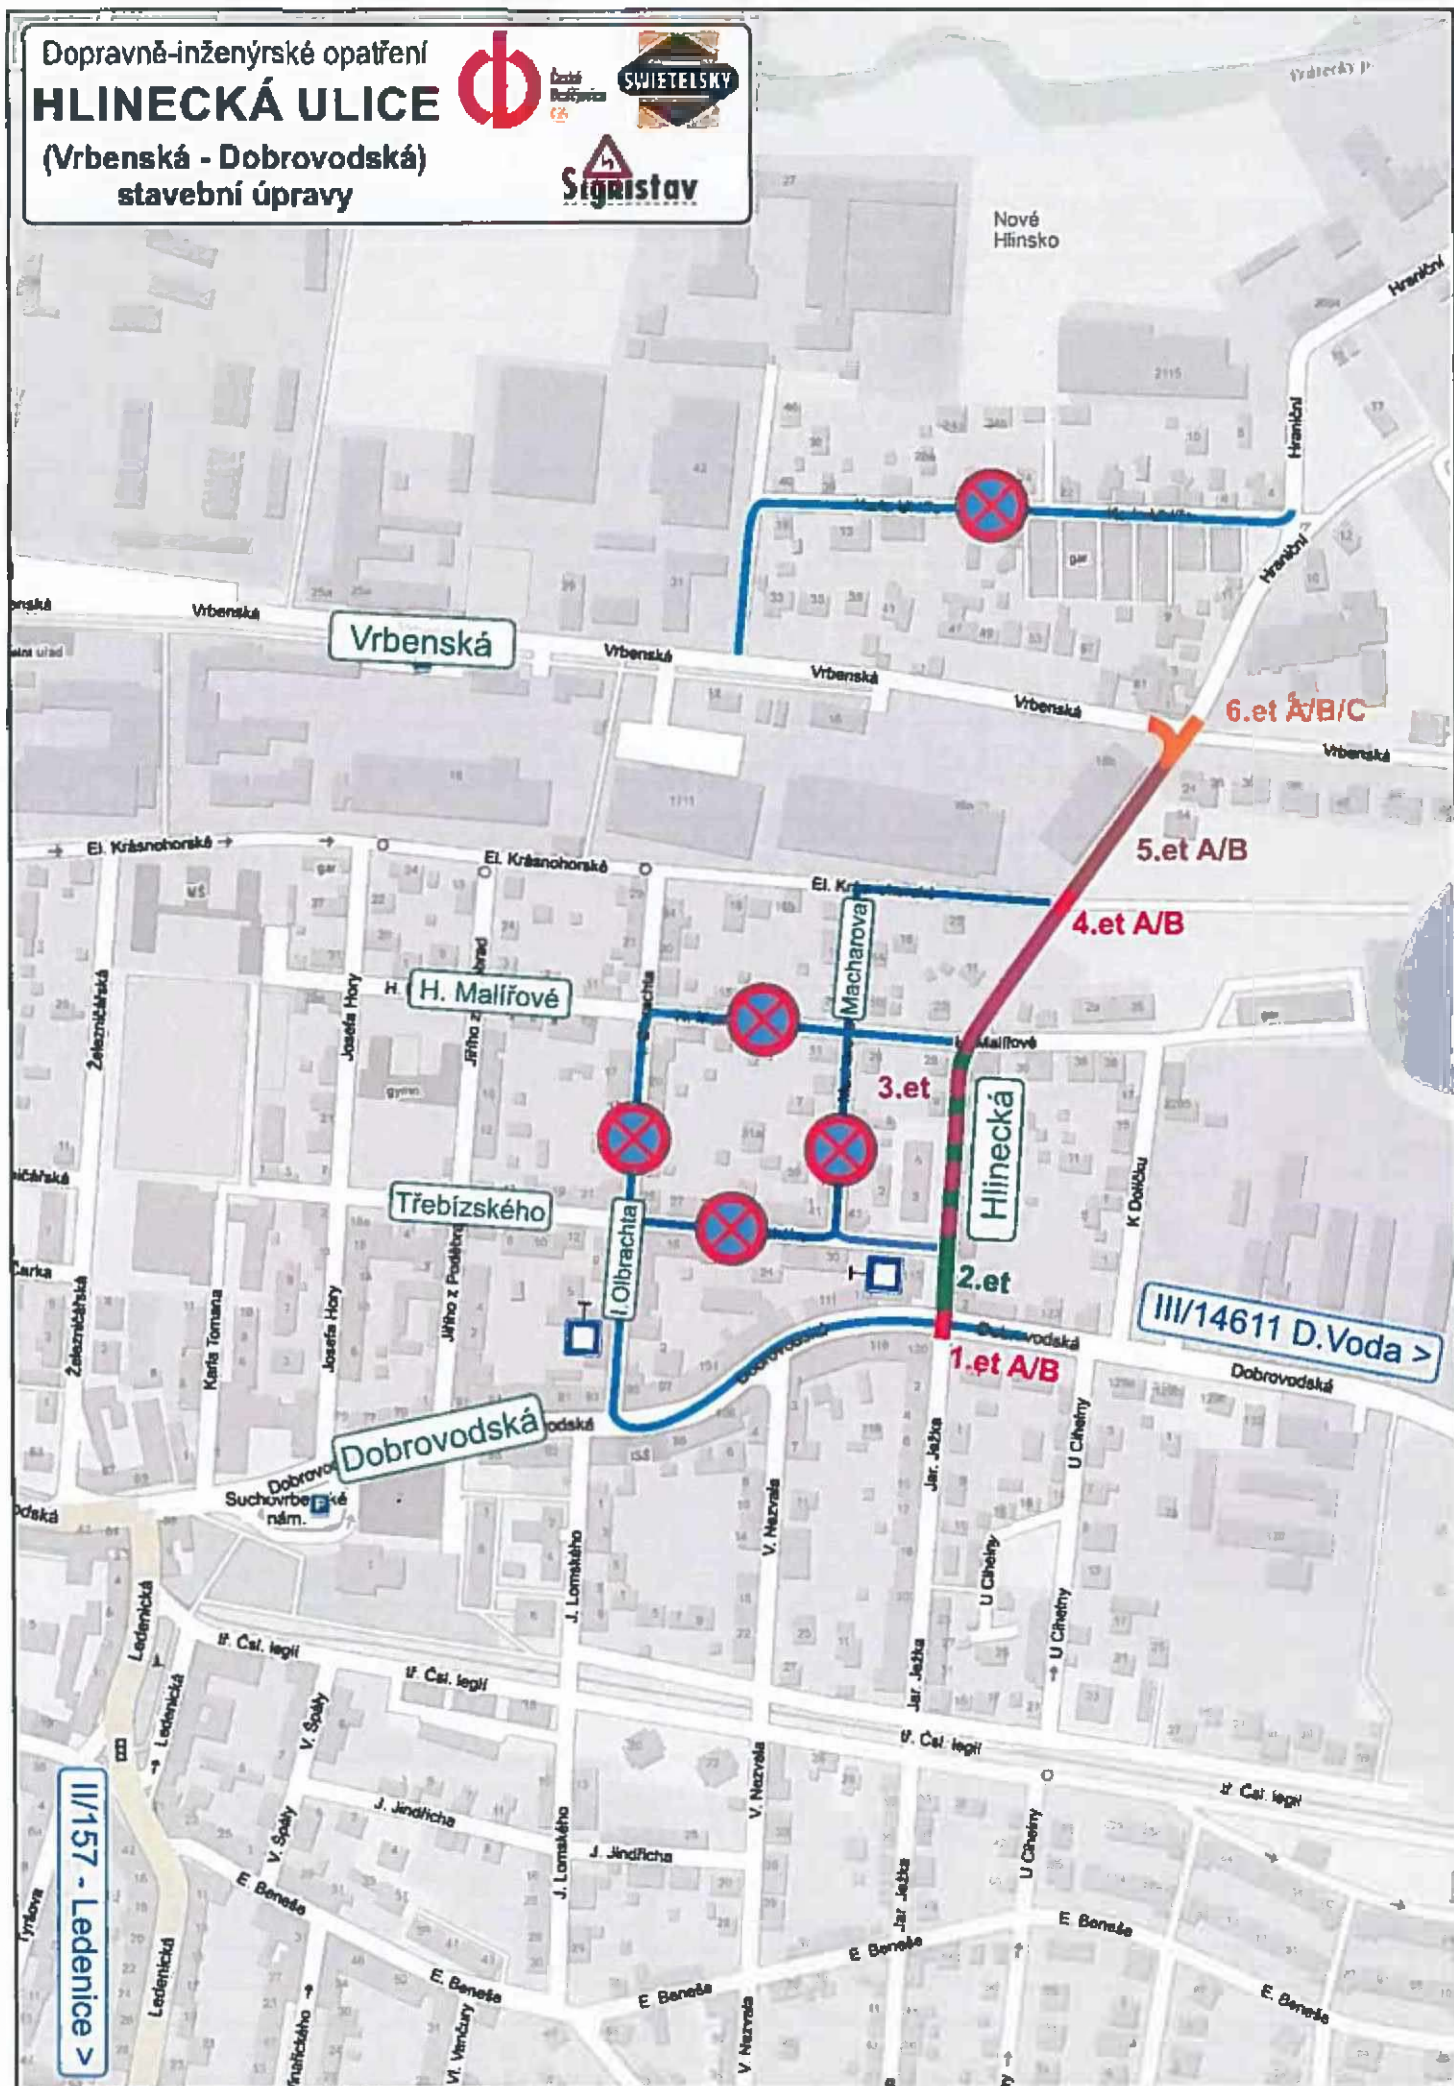

Detail III/156 - 157
Dobrovodská, U Lávky, Vodní

This detail map shows the intersection of Dobrovodská, U Lávky, and Vodní. It highlights two specific traffic signs: III/156 (a triangular warning sign for a narrow road ahead) and 157 (a rectangular warning sign for a narrow road ahead). The map includes street names and a scale bar.

POZOR IP 22

ul. HLAVICKÁ V ÚSEKU
Dobruvovská - Vrbovská
UZAVŘENA

Detail úseku s mSSZ

Diagram illustrating a detail of a road section with a mobile emergency lane (mSSZ). The diagram shows a road with a central dashed line and two solid lines. A blue rectangular area represents the mSSZ, with a width of 3m indicated by a dimension line. The mSSZ is flanked by red and white striped barriers. On the left side, there is a traffic light labeled "Mobilní semaforová souprava" and a dimension of 10m. On the right side, there is another traffic light labeled "Mobilní semaforová souprava" and a dimension of 10m. The mSSZ is labeled "mSSZ" and "C-40".

DZ B28 umístit min 7 dní předem dle TP.
Průchod chodců zajištěn lávkou s ochr. zábradlím.

Dopravné inženýrské opatření:

Stavební úpravy ul. HLINECKÁ - Č.B.

Zadavatel: SWIETELSKÝ stavební a.s. - Ing. Vln Široké 724 205 172	 Sigmastav DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Zpracoval: Michal Jelínek	
Dne: 7.5.2020	
E-mail: jelinek@sigmastav.cz Telefon: 720 281 494	
Poznámka: form. A3 v/ ETAPA 1A/B + 2	

2.etapa



- Č.BUDĚJOVICE IS 11b(1)
- ul. Vrbenská IS 11b(2)
- LEDENICE IS 11b(3)
- DOBRÁ VODA IS 11b(4)



- MIMO VOZIDEL STAVBY E 13
- CHODCI POZOR PROCHÁZÍTE STAVBOU E 13(2)
- MIMO BUS E 13(3)




DZ B28 umístit min 7 dní předem dle TP.
Průchod chodců zajištěn lávkou s ochr. zábradlím.

Dopravné inženýrské opatření:
Stavební úpravy ul. HLINECKÁ - Č.B.

Zadavatel: SWETELSKÝ stavební s.r.o. - Ing. Václav Šírotek 724 285 172
Zpracovatel: Michal Jelinek Dne: 7.5.2020
Email: jelinek@swetelsky.cz Poznámka: form. A3
Telefon: 702 281 494 v1 ETAPA 2




3.etapa

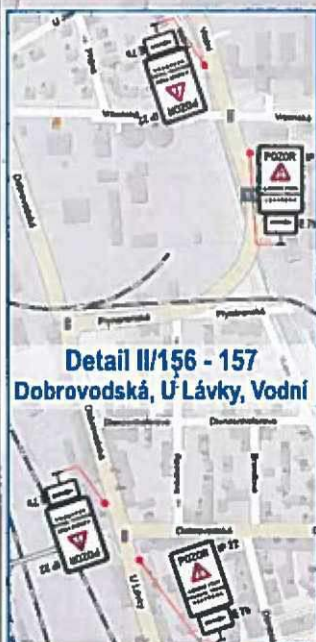

- Č.BUDĚJOVICE IS 11b(1)
- uL Vrbenská IS 11b(2)
- LEDENICE IS 11b(3)
- DOBRÁ VODA IS 11b(4)



- MIMO VOZIDEL STAVBY E 13
- CHODCI POZOR PRACOVNÍ STAVBY E 13(2)
- MIMO BUS E 13(3)
- MIMO VOZIDEL STAVBY J. 005 0PM E 13(4)

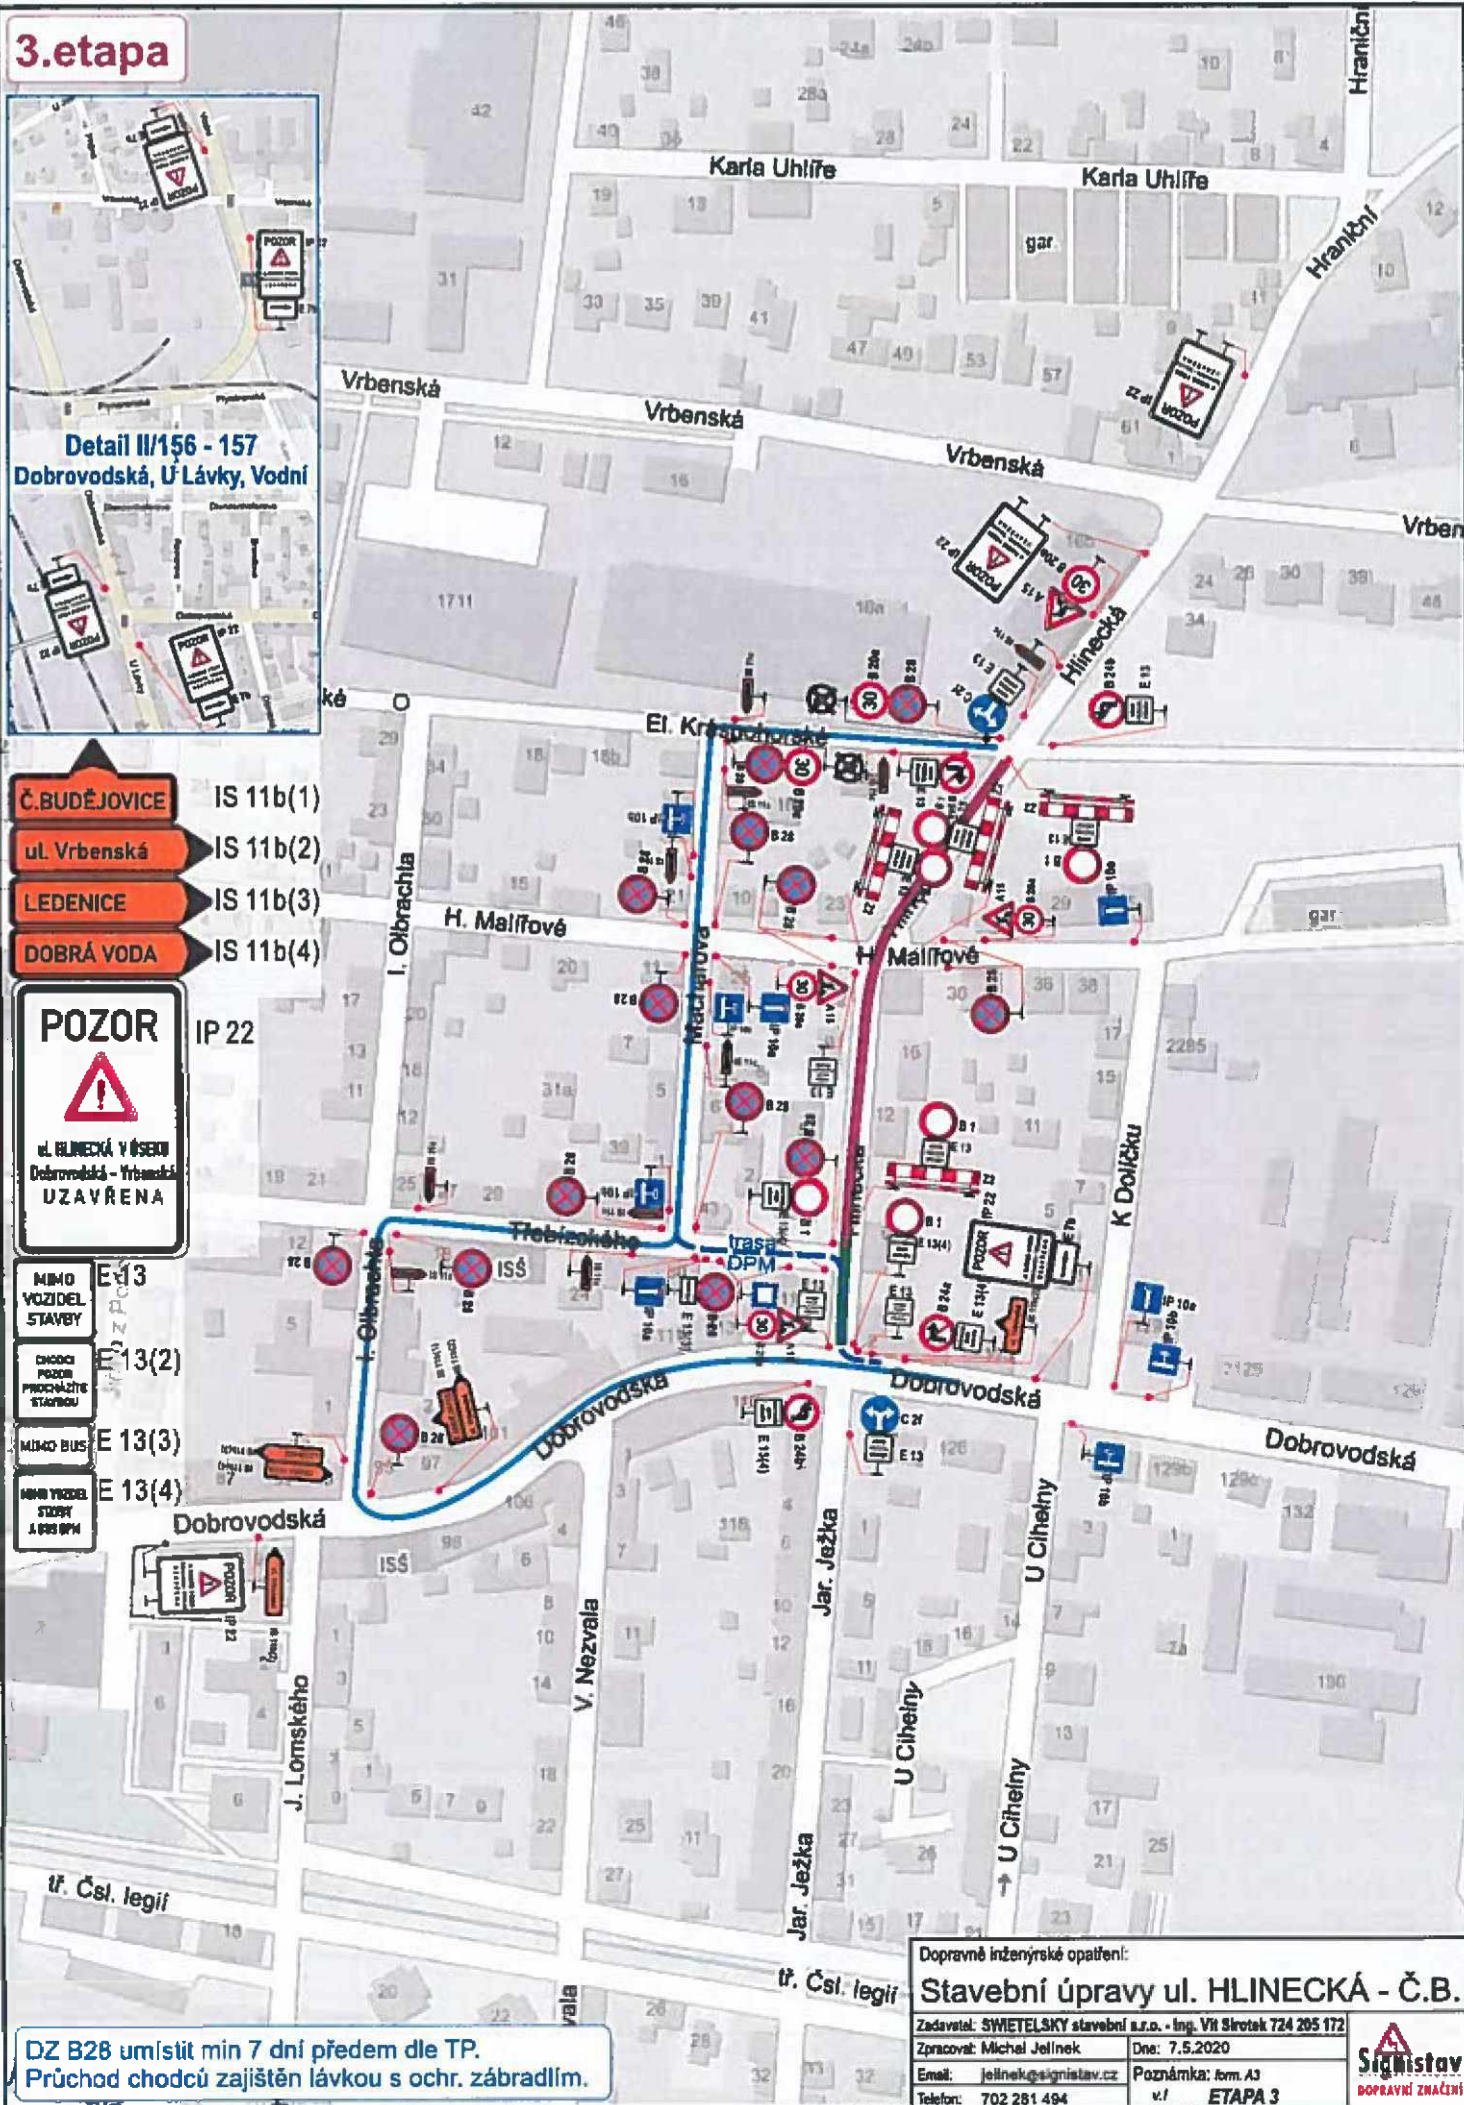

Dopravní inženýrské opatření:

Stavební úpravy ul. HLINICKÁ - Č.B.

Zadavatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. - Ing. Vít Šírotek 724 295 172

Zpracoval: Michal Jelínek

Dne: 7.5.2020

Email: jelinek@signistav.cz

Poznámka: form. A3

Telefon: 702 281 494

v.l. ETAPA 3



DZ B28 umístit min 7 dní předem dle TP.
Průchod chodců zajištěn lávkou s ochr. zábradlím.

Objízdná trasa 4., 5., 6. etapa


ul. Vrbenská IS 11b(2)
LEDENICE IS 11b(3)
DOBŘÁ VODA IS 11b(4)



IP 22

IS 11a(2)

IS 11a(1)

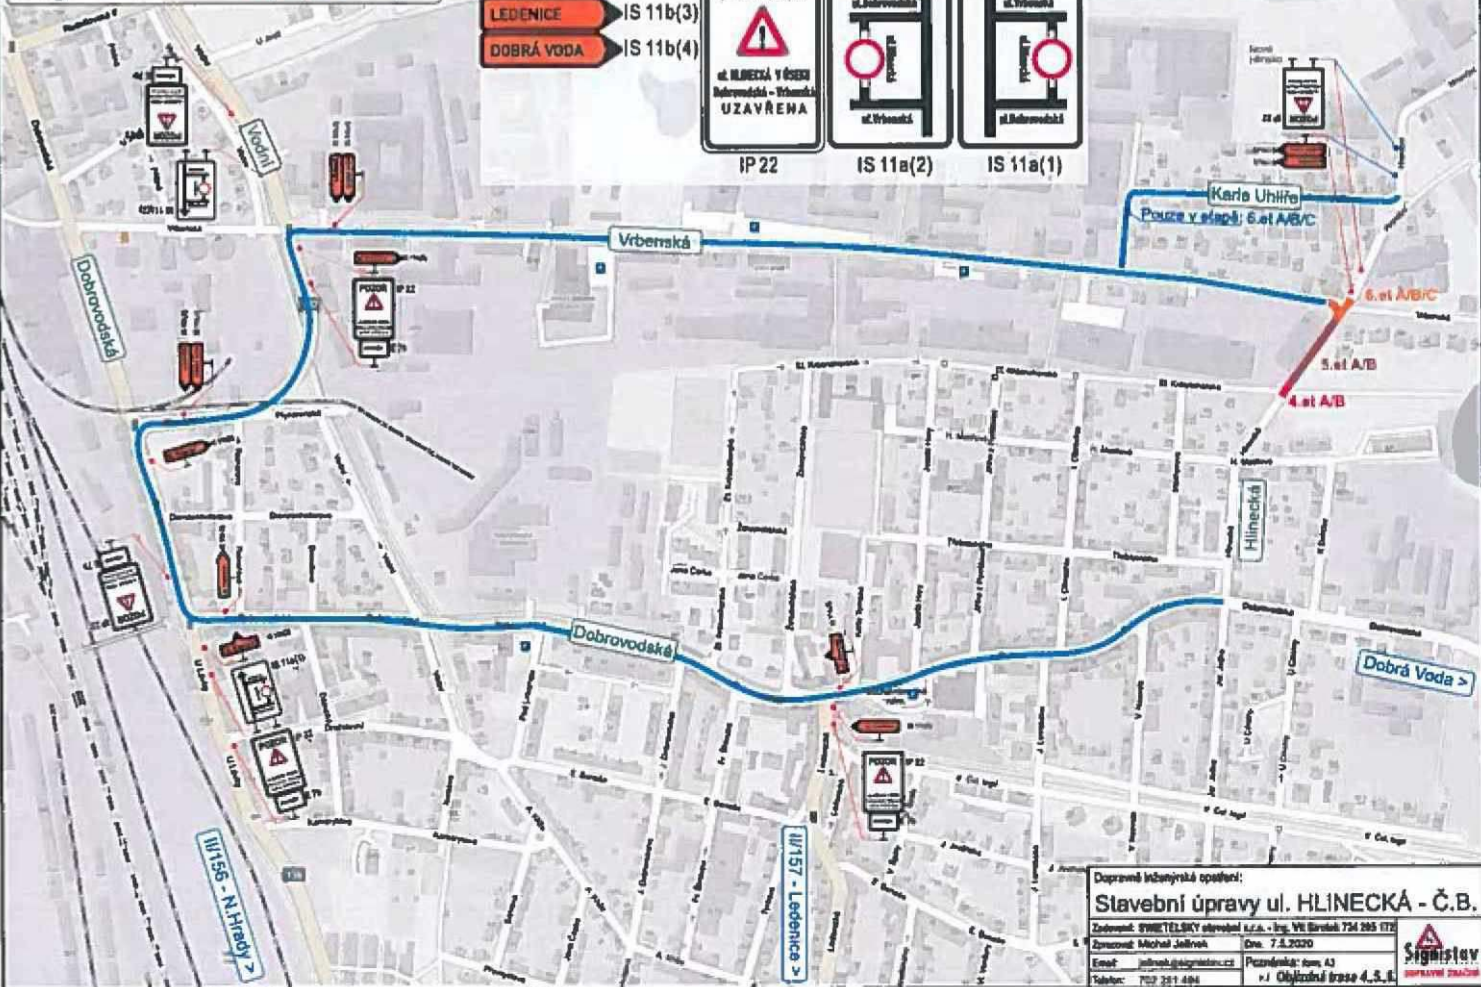


Dopravní inženýrská opatření:
Stavební úpravy ul. HLÍNECKÁ - Č.B.
Zadavatel: STAVEBNÍ ÚPRAVY ul. HLÍNECKÁ - Č.B. - IČ: 254 285 175
Zpracovatel: Michal Jelínek Dne: 7.3.2020
Email: jelinek@stavebni.cz Poznámka: krm 43
Telefon: 702 251 484 v.1 Objízdná trasa 4.5.6.



4A. etapa

+ DIO objížděné trasy
IV/156 - 157

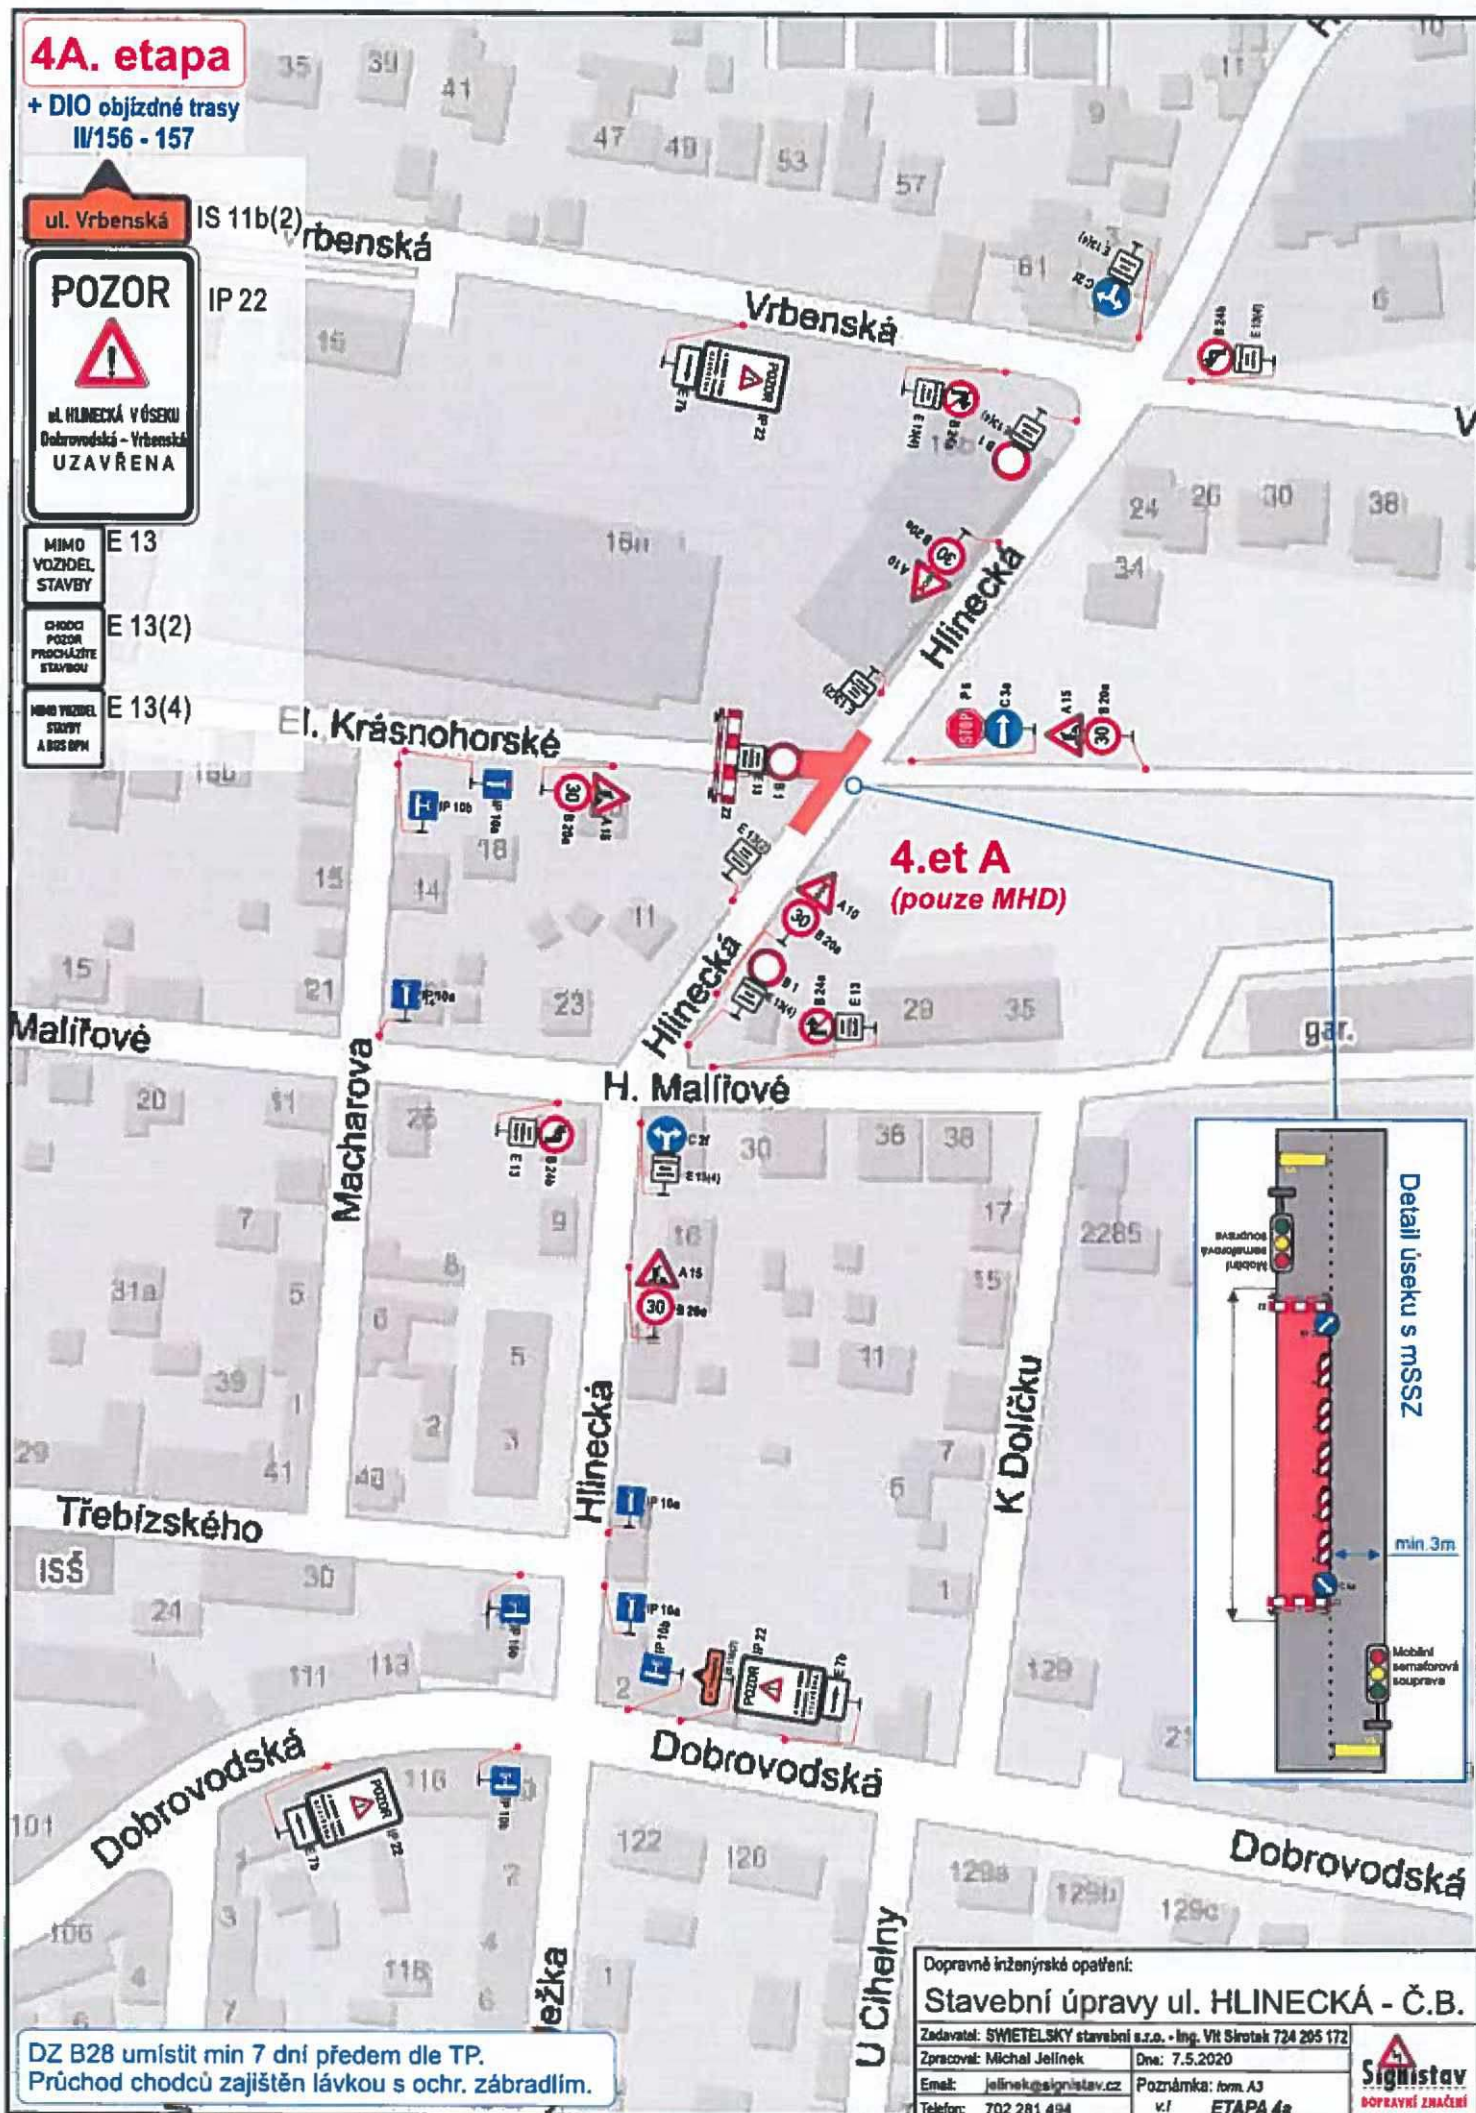

DZ B28 umístit min 7 dní předem dle TP.
Průchod chodců zajištěn lávkou s ochr. zábradlím.

Dopravné inženýrské opatření:
Stavební úpravy ul. HLINECKÁ - Č.B.
Zadavatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. • Ing. Vít Šírotek 724 295 172
Zpracoval: Michal Jelinek Dne: 7.5.2020
Email: jelinek@signistav.cz Poznámka: form. A3
Telefon: 702 281 494 v.l. ETAPA 4a



4B. etapa

+ DIO objížděné trasy
II/156 - 157

ul. Vrbenská

IS 11b(2)

POZOR



ul. HLINECKÁ V ÚSEKU
Dobrovodská - Vrbenská
UZAVŘENA

MIMO
VOZIDEL
STAVBY

E 13

POZOR
PROCHÁZĚJE
STAVBOU

E 13(2)

MIMO VOZIDEL
STAVBY
A 800 BPM

E 13(4)

Malířové

Macharova

Třebízského

ISS

Dobrovodská

Dobrovodská

U Cihelny

lečka

Vrbenská

Hlinecká

El. Krásnohorské


H. Malířové

Hlinecká

K Dolíčku

Dobrovodská

4.et B
(pouze MHD)

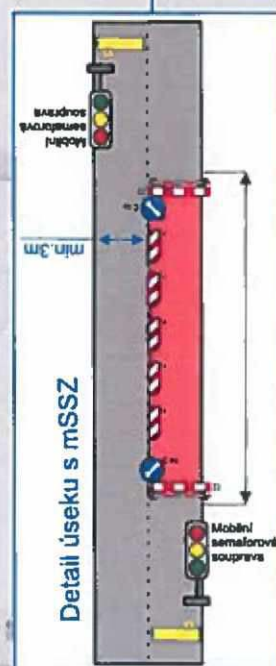

Detail úseku s mSSZ

DZ B28 umístit min 7 dní předem dle TP.
Průchod chodců zajištěn lávkou s ochr. zábradlím.

Dopravně inženýrské opatření:

Stavební úpravy ul. HLINECKÁ - Č.B.

Zadavatel: ŠMÍTELSKÝ stavební s.r.o. - Ing. Vít Šrotak 724 295 172

Zpracoval: Michal Jeřábek

Dne: 7.5.2020

Email: jeřabek@smitelstav.cz

Poznámka: form. A3

Telefon: 702 291 494

v. l. ETAPA 4b

Signstav
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

5A/B. etapa

+ DIO objížděné trasy
II/156 - 157

ul. Vrbenská

IS 11b(2)

POZOR



ul. HLINECKÁ V ÚSEKU
Dobrovodská - Vrbenská
UZAVŘENA

MIMO
VOZIDEL
STAVBY

E 13

CHODCI
POZOR
PROCHÁZÍTE
STAVBOU

E 13(2)

MIMO VOZIDEL
STAVBY
A BUSŮ

E 13(4)

Vrbenská

Vrbenská

5.et A/B
(pouze MHD)

El. Krásnohorské

Malířové

Macharova

H. Malířové

Hlinecká

K Dolíčku

Třebízského


ISS

Dobrovodská

Dobrovodská

Dobrovodská

U Cihelny

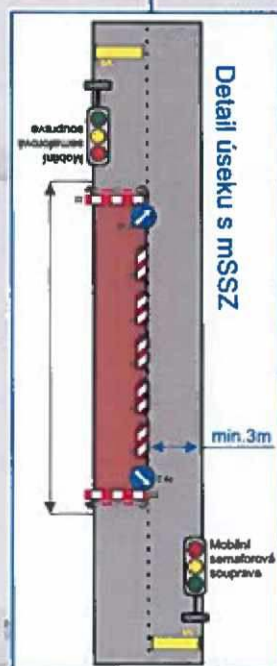

DZ B28 umístit min 7 dní předem dle TP.
Průchod chodců zajištěn lávkou s ochr. zábradlím.

Dopravní inženýrské opatření:

Stavební úpravy ul. HLINECKÁ - Č.B.

Zadavatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. - Ing. Vlt. Šírotek 724 205 172

Zpracovatel: Michal Jeřábek

Dne: 7.5.2020

Email: jelebek@signstav.cz

Poznámka: form. A3

Telefon: 702 281 494

v.r. ETAPA 5ab



6B. etapa

+ DIO objížděné trasy
III/156 - 157

ul. Vrbenská IS 11b(2)

ul. Hraníčnická IS 11b(5)



E 13 E 13(4)



E 13(2) E 13(5)

DZ B28 umístit min 7 dní předem dle TP.
Průchod chodců zajištěn lávkou s ochr. zábradlím.

ul. Vrbenská

ul. Hraníčnická

ul. Vrbenská

ul. Hraníčnická

ul. Vrbenská

ul. Hraníčnická

ul. Vrbenská

ul. Hraníčnická

ul. Vrbenská

ul. Hraníčnická

6. et B
(pouze MHD a slepá
část ul. Vrbenská)

Dopravně inženýrské opatření:

Stavební úpravy ul. HLINECKÁ - Č.B.

Zadavatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. - Ing. Vít Šírotek 724 295 172

Zpracovatel: Michal Jelínek Dne: 7.5.2020

Email: jel@swietelsky.cz

Telefon: 702 281 494

Poznámka: form. A3

v. ETAPA 6b



6C. etapa

+ DIO objížděné trasy
II/156 - 157

- ul. Vrbenská IS 11b(2)
- ul. Hranická IS 11b(5)

POZOR

ul. HLINECKÁ v úseku
Dobrovodská - Vrbenská
UZAVŘENA

- ul. Hranická IS 11a (3)

E 13 E 13(4)

MIMO VOZIDEL STAVBY A BÚV BPH

MIMO VOZIDEL STAVBY A BÚV BPH

CHODCI POZOR PROCHÁZÍTE STAVBOU

MIMO VOZIDEL STAVBY A BÚV BPH

E 13(2) E 13(5)

6. et C
(pouze MHD a slepá část ul. Vrbenská)

Dopravně inženýrské opatření:

Stavební úpravy ul. HLINECKÁ - Č.B.

Zadavatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. - Ing. Vln Široká 724 205 172

Zpracoval: Michal Jeřábek Dne: 7.5.2020

Email: jeřabek@swietelsky.cz

Telefon: 702 281 494

Poznámka: form. A3

v. ETAPA 6c

DZ B28 umístit min 7 dní předem dle TP.
Průchod chodců zajištěn lávkou s ochr. zábradlím.

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“		č. smlouvy objednatele:	2020000768
		č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: SO 00 Ostatní náklady stavby Skutečnost DIO - odpočet Z důvodu přepracování DIO s příslušnými úřady došlo ke změně projektu oproti DPS a tudíž odpočtu části položky č. 12 dopravní opatření, za práce související s náhradní autobusovou dopravou po dobu uzavírky.			
Cena celkem bez DPH:		-25 723,00 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík [podpis]	
	datum a podpis:		
	jméno:	Martin Dudák [podpis]	
	datum a podpis:		
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. [podpis]	
	datum a podpis:		
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Tůrka [podpis]	
	datum a podpis:		
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko [podpis]	
	datum a podpis:		
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko [podpis]	
	datum a podpis:		
Přílohy:	položkový rozpočet		

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 12a Skutečnost DIO - odpočet					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
12 12	Dopravní opatření, DIO <i>odpočet části položky dopravního opatření, DIO za zřízení a odstranění náhradní autobusové zastávky</i>	1,00 kpl		-25 723,00	-25 723,00
Celkem		Sazba DPH		DPH celkem	Odbytová cena bez DPH: -25 723,00
		21,00		-5 401,83	Odbytová cena s DPH: -31 124,83

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“		č. smlouvy objednatele:	2020000768
		č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: SO 05 Vodovod Součinnost provozovatele vodovodu Vzhledem k navýšení počtu zkoušek na suchovodu viz. ZL 9 a zároveň na pracích na vodovodu, kde s ohledem na zachování dopravy MHD a vozidel integrovaného záchranného systému byla rozdělena etapizace výstavby vodovodů po polovinách vozovky. Tím pádem došlo k požadavku na více rozborů, vzorků, asistence provozovatele při odstávkách, zásobování vodou v momentě odstávek a přepojování, manipulací apod.			
Cena celkem bez DPH:		73 991,23 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík [podpis]	
	datum a podpis:	[podpis]	
	jméno:	Martin Dudák [podpis]	
	datum a podpis:	[podpis]	
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. [podpis]	
	datum a podpis:	[podpis]	
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk [podpis]	
	datum a podpis:	[podpis]	
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko [podpis]	
	datum a podpis:	[podpis]	
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko [podpis]	
	datum a podpis:	[podpis]	
Přílohy:	položkový rozpočet		

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 13 Součinnost provozovatele vodovodu							
Položka		Text		Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	8900506	Součinnost provozovatele v rámci výstavby vodovodu - skutečnost součinnost Čevak		1,00	kpl	73 991,23	73 991,23
		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:			73 991,23
Celkem		21,00	15 538,16	Odbytová cena s DPH:			89 529,39

Stav	Dávka	ZSc	eDoc	Ev_číslo	Obor	Dodavatel	Faktura	Předmět_faktury	Celk bez D	CELKEM_s_D	K_úhradě	Převzal	Datum_přij
9	21	A	02.II	1810381	ČEVAK a.s.	9020501478	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		18.06.2020
9	25	A	02.II	1810451	ČEVAK a.s.	2020003459	ČEVAK - tlakový vůz		234	283,14	283,14		03.07.2020
9	30	A	02.II	1810576	ČEVAK a.s.	2020003543	ČEVAK - manipulace s vdv		6191,35	7467,38	7467,38		08.07.2020
9	30	A	02.II	1810577	ČEVAK a.s.	2020003542	ČEVAK - dodávka vody		2771,5	3091,83	3091,83		08.07.2020
9	30	A	02.II	1810578	ČEVAK a.s.	9020501661	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		09.07.2020
9	32	A	02.II	1810679	ČEVAK a.s.	9020501826	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		29.07.2020
9	36	A	02.II	1810766	ČEVAK a.s.	2020004020	ČEVAK - tech. přejímka		472,5	571,73	571,73		06.08.2020
9	35	A	02.II	1810767	ČEVAK a.s.	2020004042	ČEVAK - odstávka vdv		5567	6736,07	6736,07		07.08.2020
9	36	A	02.II	1810805	ČEVAK a.s.	9020501932	ČEVAK - rozbor		1632	1974,72	1974,72		12.08.2020
9	36	A	02.II	1810807	ČEVAK a.s.	9020501949	ČEVAK - rozbor		1632	1974,72	1974,72		11.08.2020
9	43	A	03.III	1810882	ČEVAK a.s.	9020502126	ČEVAK - rozbor vody		3264	3949,44	3949,44		03.09.2020
9	43	A	02.II	1810883	ČEVAK a.s.	9020502181	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		04.09.2020
9	40	A	02.II	1810884	ČEVAK a.s.	9020501984	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		14.08.2020
9	44	A	02.II	1811055	ČEVAK a.s.	2020004687	ČEVAK - odstávka vdv.		1177,5	1424,78	1424,78		24.09.2020
9	44	A	02.II	1811056	ČEVAK a.s.	2020004688	ČEVAK - uzavírka vody		1410	1706,1	1706,1		24.09.2020
9	47	A	02.II	1811120	ČEVAK a.s.	9020502353	ČEVAK - rozbor		1632	1974,72	1974,72		02.10.2020
9	49	A	02.II	1811198	ČEVAK a.s.	2020004852	ČEVAK - voda, odstávka vody		9810,52	11719,53	11719,53		07.10.2020
9	49	A	02.II	1811201	ČEVAK a.s.	2020004915	ČEVAK - odstávka vdv		4595,3	5548,24	5548,24		09.10.2020
9	57	A	02.II	1811325	ČEVAK a.s.	9021500095	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		20.10.2020
9	57	A	02.II	1811328	ČEVAK a.s.	9021500120	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		20.10.2020
9	57	A	02.II	1811330	ČEVAK a.s.	2021000099	ČEVAK - odstávka vdv		1603,2	1931,83	1931,83		22.10.2020
9	57	A	02.II	1811331	ČEVAK a.s.	9021500188	ČEVAK - rozbor vody		3264	3949,44	3949,44		27.10.2020
9	56	A	02.II	1811408	ČEVAK a.s.	9021500252	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		06.11.2020
9	59	A	02.II	1811457	ČEVAK a.s.	2021000410	ČEVAK - odstávka vdv		1530	1851,3	1851,3		13.11.2020
9	62	A	02.II	1811483	ČEVAK a.s.	2021000409	ČEVAK - odstávka vdv		6787,36	8154,92	8154,92		13.11.2020
9	66	A	02.II	1811557	ČEVAK a.s.	9021500295	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		25.11.2020
9	76	A	02.II	1811778	ČEVAK a.s.	2021000883	ČEVAK - technická přejímka		1130	1367,3	1367,3		22.12.2020
9	76	A	01.II	1811781	ČEVAK a.s.	2021000814	ČEVAK - kontrola funkčnosti vod.		2967	3590,07	3590,07		18.12.2020
9	40	A	02.II	13310405	ČEVAK a.s.	9020501595	ČEVAK - rozbor vody		1632	1974,72	1974,72		29.06.2020

43 991,23

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“		č. smlouvy objednatele:	2020000768
		č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel : statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
TDS: TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice			
Projektant: EKO EKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice			
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Předmět změny: SO 05 Vodovod Součinnost provozovatele vodovodu - odpočet Dochází k odpočtu položek za součinnost s provozovatelem podle původně zamýšlené PD v návaznosti na uplatňování navýšení požadovaných prací viz. ZL 13.			
Cena celkem bez DPH:		-15 000,00 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík	
	datum a podpis:		
	jméno:	Martin Dudák	
	datum a podpis:		
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS.	
	datum a podpis:		
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Turk	
	datum a podpis:		
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko	
	datum a podpis:		
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko	
	datum a podpis:		
Přílohy: položkový rozpočet			

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)



Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 13a Součinnost provozovatele vodovodu - odpočet					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
3 8900506	Součinnost provozovatele v rámci výstavby vodovodu - odpočet původního mi součinnost Čevak	-20,00	hod	750,00	-15 000,00
Celkem		Sazba DPH		DPH celkem	Odbytová cena bez DPH: -15 000,00
		21,00		-3 150,00	Odbytová cena s DPH: -18 150,00

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“		č. smlouvy objednatele:	2020000768
		č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: SO 08 Optické kabelové vedení Optické kabelové vedení dle DSPS Po vypracování DSPS došlo k přepočítání původního soupisu prací aby odpovídal na skutečně provedené výměry.			
Cena celkem bez DPH:		18 000,00 Kč	
Zhotovitel:	Jméno:	Ing. Michal Pavlík	
	datum a podpis:		
	Jméno:	Martin Dudák	
	datum a podpis:		
Objednatel:	Jméno:	Jana Kubíková, DiS.	
	datum a podpis:		
Techn. dozor investora:	Jméno:	Ing. Michal Türk	
	datum a podpis:		
Projektant:	Jméno:	Ing. Josef Sauko	
	datum a podpis:		
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Josef Sauko	
	datum a podpis:		
Přílohy:	položkový rozpočet		

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tiskeno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 14 Optické kabelové vedení dle DSPS							
Položka		Text	Množství		m.j.	Cena	Celkem
1	R001	D + M kabelové šachty	1,00		kus	18 000,00	18 000,00
		Skutečnost: 5-4=1kus					
		Sazba DPH	DPH celkem		Odbytová cena bez DPH:		18 000,00
Celkem							
		21,00	3 780,00		Odbytová cena s DPH:		21 780,00
