



KUJIP01AVGRJ

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 140954

20. 10. 2020 9432/20  
1761

uzavřené dne 14. 10. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

## „Nemocnice Pelhřimov – Rozšíření urgentního příjmu“

### Článek 1 - Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Schrekem Vítězslavem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina nebo Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	564 602 419 nebo 564 602 205
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ESOX, spol. s r.o.</b>
IČO:	00558010
DIČ:	CZ00558010
se sídlem:	Libušina třída 23, 623 00 Brno
zastoupený:	Ing. Janem Polickým, výkonným ředitelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel
osoba pověřená vedením stavby:	Tomáš Tschöpl, výrobní ředitel Hynek Brandl, stavbyvedoucí
tel./fax:	777 746 713
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	272941621/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 143

### Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ID: 140954 uzavřené dne 14. 10. 2020, (dále jen „Smlouva“) je změna zastupujících osob jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele, změna termínu dokončení díla a změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Prodloužení termínu je způsobeno především zvětšením potřebného rozsahu provádění bouracích prací, které se propadlo do časového harmonogramu navazujících prací. Termínové posuny přinesly i komplikace se zasažením některých pracovníků stavby a jejího managementu nemocí COVID -19 a z toho vyplývající karanténní opatření.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody v souladu s čl. 2.6., 2.7. a 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

### 1) Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Na základě usnesení zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0479/06/2020/ZK ze dne 18.11.2020 zastupuje kraj hejtman Mgr. Vítězslav Schrek, MBA.

Na základě Pověření hejtmana ze dne 1.2.2021 zastupuje Kraj Vysočina navenek při podepisování všech písemností pro oblast majetek Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje.

Zástupci pro věci technické Kraje Vysočina jsou pracovníci odboru majetkového Ing. Kalina Jan nebo Ing. Zdeněk Berka

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**

Na základě písemného oznámení o změně údajů ve smlouvě o dílo ze dne 9.11.2020 jsou osobami pověřenými vedením stavby Tomáš Tschöpl, výrobní ředitel a Hynek Brandl, stavbyvedoucí

### 2) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech č.1 - 16, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

### 3) Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště; odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 231 dnů ode dne předání staveniště

### 4) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

**Cena díla celkem bez DPH:**

**16 077 681,09 Kč**

slovy: Šestnáctmilionůsedmdesátšedmtisícšestsetosmdesátjedna, 09/100 korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatel stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH.

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením Dodatku č.1 bez DPH: 14 943 310,35 Kč

**Cena víceprací a méněprací:**

Cena víceprací bez DPH: 1 485 025,87 Kč

Cena méněprací bez DPH: 350 655,13 Kč

---

Cena více-méněprací bez DPH: 1 134 370,74 Kč**Cena díla po uzavření Dodatku č.1:**

Cena díla bez DPH: 16 077 681,09 Kč

**Článek 3 - Ostatní ustanovení dodatku**

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

3.5. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku..

3.6. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.


Příloha: 1) Změnové listy č.1 - 16

Brno, 18.5.2021

Jihlava, 18.05.2021

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Pavel Betlach  
prokurista společnosti  
Libušina tř. 23, 623 00 Brno  
e200556010 esoxbrno.cz  
Kraj Vysočina  
Žitkova 57, 567 33 JihlavaMgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

## SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ ke stavbě Nemocnice Pelhřimov - urgentní příjem

Číslo ZL	Popis změny	Objekt	odsouhlasená cena			datum potvrzení ZL	Dodatek číslo
			přípočet	odpočet	konečná cena		
	<b>Cena díla dle SOD</b>				<b>14 943 310,35 Kč</b>		
1	Úprava ocelové požární stěny, zábradlí a přesun otopného tělesa	UP	47 230,08		47 230,08 Kč		1
2	Osazení stávajících dveří D2-2.20 místo dveří D2-2.19	UP	34 475,80		34 475,80 Kč		1
3	Lakování panelů na sál	UP	30 400,00		30 400,00 Kč		1
4	Změny hliníkových oken a dveří, doplnění žaluzie pro dveře D2.2-54	UP	41 597,00	-56 490,00	-14 893,00 Kč		1
5	Výměna vinylové podlahy v místnosti 2.006	UP	33 162,65		33 162,65 Kč		1
6	Doplnění keramického obkladu po drážkování pro profese	UP	28 635,43		28 635,43 Kč		1
7	Změny profese elektro	UP	188 943,27	-47 360,00	141 583,27 Kč		1
8	Nové SDK podhledové desky	UP	195 502,27		195 502,27 Kč		1
9	Nové dveře do ordinací, nové bezpečnostní prvky na stávajících dveřích	UP	70 922,43	-11 857,82	59 064,61 Kč		1
0	Bourání zavěšeného ŽB prvku, odstranění a doplnění fasády, odstranění keramické zavěšené fasády pro uskladnění	UP	205 498,72		205 498,72 Kč		1
11	Výměna jističů	UP	175 059,60		175 059,60 Kč		1
12	Ocelová konstrukce přístřešku, úprava výměry	UP	134 551,41	-5 536,39	129 015,02 Kč		1
13	Neprovedené práce, změna prvku T 2.207	UP	38 357,00	-38 047,50	309,50 Kč		1
14	Doplnění programování čteček karet	UP	26 856,40		26 856,40 Kč		1
15	Změna skládky na recyklační	UP	189 833,81	-191 363,42	-1 529,61 Kč		1
16	Demontáž, úprava a montáž operačního svítidla	UP	44 000,00		44 000,00 Kč		1
	<b>Dodatky</b>		<b>1 485 025,87</b>	<b>-350 655,13</b>	<b>1 134 370,74 Kč</b>		
	<b>Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1</b>				<b>16 077 681,09 Kč</b>		

V Pelhřimově 14.5.2021

**ESOX**<sup>19</sup>  
 Libušina tř. 23, 623 00 Brno  
 cz00558010 esoxbrno.cz

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020  <b>Úprava ocelové požární stěny, zábradlí a přesun otopného tělesa</b>	SO a IO ve změně  <b>001 - Architektonicko-stavební řešení a statika, 004 - Vytápění</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL č.1</b>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu <span style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ANO / NE *</span>									

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavků uživatele bude provedena úprava stávající požární ocelové stěny, úprava zábradlí schodiště a přesunutí otopného tělesa na protější stěnu. Tyto úpravy realizují požadavek na snadnější projetí dveřmi s lůžkem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>47 230,08 Kč</b>	<b>47 230,08</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 5.2.2024	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 5.2.2024	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum 5.2.2024	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 5.2.2024	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## KAPITULACE STAVBY

Kód: 73\_PEL  
 Stavba: Nemocnice Peňhřimov\_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

KSO: 801 11  
 Místo: Peňhřimov

CC-CZ  
 Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:  
 Kraj Vysočina

IC: 70890749  
 DIČ: CZ70890749

Uchazeč:  
 Vypín Ůdaj

IC: Vypín Ůdaj  
 DIČ: Vypín Ůdaj

Projektant:  
 SVIŽN s.r.o.

IC: 83301087  
 DIČ: CZ83301087

Zpracovatel:  
 Ing. Tomáš Alexi

IC:  
 DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenové soustava" oznaženy popisem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			47 230,08
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 47 230,08	Výše daně 9 918,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>57 148,40</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 73\_PEL

Stavba: Nemocnice Peňhřimov\_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Místo: Peňhřimov

Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: SVIŽN s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem:</b>		<b>47 230,08</b>	<b>57 148,40</b>	
ZL 1.1	001 - ASŘ	40 871,20	49 464,15	STA
ZL 1.1	004 - Vytápění	6 358,88	7 684,24	STA

## ČI LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Nemocnice Pohořelov, rozšíření územního plánu - stavební úpravy  
Objekt  
001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Místo  
Pohořelov

Datum  
8. 1. 2020

Zadavatel  
Kraj Vysočina

IC  
70888749  
DIČ  
CZ70888749

Uchazeč  
Vypřil Otaš

IC  
Vypřil Otaš  
DIČ  
Vypřil Otaš

Projektant  
SVIŽN s.r.o.

IC  
63301997  
DIČ  
CZ63301997

Zpracovatel  
Ing. Tomáš Alex

IC  
DIČ

Poznámka

**Cena bez DPH** **40 871,20**

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 771,20	21,00%	6 671,25
DPH snížená sazba	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **47 542,45** **v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Nemocnice Pohořelov, rozšíření územního plánu - stavební úpravy

Objekt  
001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Místo  
Pohořelov

Datum  
8. 1. 2020

Zadavatel  
Kraj Vysočina

Projektant  
SVIŽN s.r.o.

Uchazeč  
Vypřil Otaš

Zpracovatel  
Ing. Tomáš Alex

Kód účt. - Popis Cena účtem [CZK]

**Náklady stavby celkem** **40 871,20**

**PRV - PRVKY** **40 871,20**

**D2 - Dvaře** **31 771,20**

**ZZ - Zámečnické práce** **9 100,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba  
Nemocnice Pohořelov, rozšíření územního plánu - stavební úpravy

Objekt  
001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Místo  
Pohořelov

Datum  
8. 1. 2020

Zadavatel  
Kraj Vysočina

Projektant  
SVIŽN s.r.o.

Uchazeč  
Vypřil Otaš

Zpracovatel  
Ing. Tomáš Alex

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotk. cena [CZK]	Celková cena [CZK]	Číslovce součástí
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>40 871,20</b>	
<b>n PRV PRVKY</b>							<b>40 871,20</b>	
<b>D2 Dvaře</b>							<b>31 771,20</b>	
1	M		Demonitáž stěnové sítě v chodbě u vchodu, její úprava pro změnu osvětlení (střední dvířka a následně opěvnost montáž)	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	vlastní
4	K		Demonitáž zártní	kus	1,000	36,70	36,70	CS ÚRS 2021 01
2	K	700580731	Montáž dveřních dopřeků tlumiče kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	214,80	214,80	dle SoD
3	M	335717310	Úprava FAS pro bezpečnostní zastavení garážového křídla - úprava OK, 3x 100 x 100mm	kus	1,000	850,00	850,00	dle SoD
4	K		Demonitáž nerozsvětláče	kus	1,000	72,30	72,30	CS ÚRS 2021 01
5	M		Montáž samozavěrače	kus	1,000	214,80	214,80	dle SoD
6	K		Zamontážování ALU OK 200x200x4 v 60mm	kus	1,000	3 365,00	3 365,00	dle SoD
7	K		Demonitáž zábrusů a křídla	kus	1,000	58,70	58,70	CS ÚRS 2021 01
8	K		Montáž zábrusů v křídla	kus	1,000	107,50	107,50	dle SoD
9	K		Úprava ALU 200x200 ALU 200x200 v 60mm	kus	1,000	222,00	222,00	dle SoD
10	K		Úprava ocelové podlahy sítě, včetně dotčení ocelových částí	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	vlastní
<b>D ZZ Zámečnické práce</b>							<b>9 100,00</b>	
11	K	337173110	Úprava ocelového zábrusu	kg	1,000	8 950,00	8 950,00	vlastní
12	K	337173110	Úprava nerezového zábrusového madla	kg	1,000	2 800,00	2 800,00	vlastní

## CI LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pohořelov, rozšíření urgentního příjmu - stavěbní úpravy

Objekt:

004 - Vytápění

Místo: 201 11  
Pohořelov

CC-CZ:  
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:  
Kraj Vysočina

IC: 70800748  
DIČ: CZ0896740

Uchazeč:  
Vypň ústí

IC: Vypň ústí  
DIČ: Vypň ústí

Projektant:  
SVIŽN s.r.o.

IC: SVIŽN s.r.o.  
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:  
Ing. Tomáš Alena

IC:  
DIČ:

Popis práce

**Cena bez DPH** **0 358,88**

DPH základna	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
včetně	0,00	21,00%	0,00
včetně	0,00	10,00%	0,00

**Cena s DPH** **Y CENA** **0 394,28**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pohořelov, rozšíření urgentního příjmu - stavěbní úpravy

Objekt:

004 - Vytápění

Místo: Pohořelov

Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: SVIŽN s.r.o.

Uchazeč: Vypň ústí

Zpracovatel: Ing. Tomáš Alena

Kategorie - Popis

Cena celkem (CZK)

**Náklady stavby celkem** **0 358,88**

2.4.4 - Vytápění **0 358,88**

2.4.4.2 - Otopná tělesa **0 358,88**

2.4.4.2.1 - Otopná tělesa - panelová **0 358,88**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pohořelov, rozšíření urgentního příjmu - stavěbní úpravy

Objekt:

004 - Vytápění

Místo: Pohořelov

Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: SVIŽN s.r.o.

Uchazeč: Vypň ústí

Zpracovatel: Ing. Tomáš Alena

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena (CZK)	Celková cena (CZK)	Osobní členění
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>0 398,88</b>
<b>0 2.4.4 Vytápění</b>								<b>0 358,88</b>
<b>0 2.4.4.2 Otopná tělesa</b>								<b>0 358,88</b>
<b>0 2.4.4.2.1 Otopná tělesa - panelová</b>								<b>0 358,88</b>
1			Demontáž potrubí z měděných vodovod. trubek do průměru 35/1,6	m	3,000	44,10	132,30	CS ÚRS 2021 01
2			Potrubí z měděných vodovod. trubek Ø 18 x 1,0 mm	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
3			Nálevková kotelna Ø 19 mm	m	4,000	191,50	766,00	db SoD
4			Demontáž otopného tělesa panelového (učiněno pro zadávací množství)	ks	1,000	202,50	202,50	db SoD
5			Montáž otopného tělesa panelového	ks	1,000	256,00	256,00	db ÚRS 2021 01
6			Měření pro montáž otopných těles (zastřelka, šroubení, uchycení do zdi)	ks	1,000	373,00	373,00	CS ÚRS 2021 01
7			Demontáž SDK podlahy pro úpravu potrubí [osa 2,2m*1,2m]	m2	2,040	142,00	289,68	db SoD
8			Zpětná montáž SDK podlahy	m2	2,040	269,00	548,76	db SoD
9			Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky olem v rozsahu plochy do 30%	m2	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2021 01
10			Penetrace podlahy jednovrstevně základní	m2	3,000	20,20	60,60	CS ÚRS 2021 01
11			Malba stěn hlís. odmrzačovací, dřevěná	m2	3,000	29,28	87,84	CS ÚRS 2021 01



OBČERATEL:  
Název firmy:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:

ESOX, spol. s r.o.  
Martina Čapková  
Libušina třída, 628  
Brno, 62100

IČ:  
DIČ:

60568010  
CJ00608010

Tel.:

777 706 847

E-mail:

esox@esox.cz

sez:  
Cenová nabídka č.:

KRM\_2021\_1\_9  
18.1.2021

ASSA ABLOY Opening Solutions  
Sirojská 8a,  
518 01 Rychov nad Kněžnou  
IČK: C27468921  
K.S. v Praze 1, Křižová, oddíl C, vložka 26822

Název akce:

Nemocnice Petřimov- urgentní příjem

Číslo realizace zakázky:

Cena CN celkem bez DPH: 9 164 Kč

Poř. číslo	Počet (ks)		Skladová zásoba				Množství	Popis výrobku	Základní cena / kus	Základní cena / kus (neto)	Základní cena / kus (brutto)	Převzatá hodnota	Výsledná hodnota s daní (Kč/kus)	Náhradní cena s daní (Kč/kus)
	L	P	Ústav	Ústav	Ústav	Ústav								
X.1.1	0	1	0	0	0	0	Motiv kovovníčnické montáže na střešní ocelovou stěnu. Víceřezová s příslušenstvím včetně stěny	0	0	0	0	9 164 Kč	9 164 Kč	
	0	0	0	0	0	0								
	0	0	0	0	0	0								

CELKEM S DPH: 9 164 Kč  
CELKEM S DPH: 9 164 Kč

Solicaci cenové nabídky není vyžadováno. Všechny údaje jsou uvedeny v souladu s podmínkami před realizací. Souběžně s realizací bude provedena montáž a uvedení do provozu. Souběžně s realizací bude provedena montáž a uvedení do provozu.

POZNÁMKY:

Cenová naučička je dleukována jako oteklé. Ceny položek jednotlivé nabídkou stejné.

Tato cenová naučička obsahuje cenu za výrobu, záruční, servisní, přepravní, obno, montáž a dopravu výrobků do místa stavby dle počtu kalkulovaných objemů.

Cena nezahrnuje schvalovací, dokumentační a akustická, stavební, provedení.

Cena nezahrnuje zpracování projektu, certifikace z hlediska ochranného rozvodu IEC60364, HSE DSHB, end.)

Cena nezahrnuje dopravu, montáž a záruční servisní.

Cena nezahrnuje příslušné testy, stavební mechanizaci.

Cena nezahrnuje náklady, elektroinstalaci na rozvody EPS, E2S, ztrátová ledna, atd. Přípojiti je součástí prací slabo proudu.

Pro detail a vizuální zobrazení podívejte se na stránku ASSA ABLOY vložky se zádem podle normy DIN (V 18 254). V případě výměny vložky je nutno použít vložku stejného typu.

Nutnost použití vložky se zádem podle normy DIN platí i v případě, že vložka není dodávkou firmy ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s.

#### VŠEOBECNÉ PŮDMÍNKY:

Početníky dodání a další práva a povinnosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. verze 004, které jsou ke stažení na webových stránkách [www.assa.eu](http://www.assa.eu).

Základní podmínkami pro dodávku a montáž dveří a ráfů HABIL.

Především všeobecné obchodní podmínky se po uzavření smlouvy stanou její nedílnou součástí.

#### Platby:

Záplata k zahájení výroby ve výši 60 % z celkové ceny bha se splatností do 7 dnů ode dne vystavení.

Do doby uzavření zálohové faktury nebudou zahájeny výroba.

Záplata na vystavení oskú osazení, smlouvy objednatel. Zálohová vyúčtování ceny dle bude provedeno do 10 dnů po protokolemém převzetí díla objednatelém.

Formou bankovního úpisu se splatností do 14 dnů ode dne předání výrobku.

#### Atesty:

Pro uzavření oskúové ceny zakázky objednatel k vypracování oskúování a ojet požární odolnosti. Oskúování je dokladem o provedení výrobku a provazuje se jinými oskúovými požadavky výrobku objednatel. V současně době má společnost ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. certifikovaný všechny materiálové systémy pro požární odolnost konkrétně v současně se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve smrti požárních předpisů a Nařízením vlády č. 153/2002 Sb.

#### Montáž:

Montáž se realizuje podle montážních pokynů, požárních ústavů, upozorňujeme Vás na skutečnost, že na záplatu ustanovené § 6 vyhlášky M.V. č. 246/2001 Sb. musí být montáž

později uzavřena v souladu s ověřenou dokumentací a podmínkami výrobce. Ke správné úklade požadavků Vám nabídneme provedení montáže

našimi odbornými pracovníky nebo smlouvanými firmami, které byly odborně ověřeny a vlastní písemné oskúování a způsobilost provádět tyto montážní práce.

ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. provádí u většiny výrobků konkrétní montáž do dle vybraných stavebních otvorů a na dle požadavků. Spojovací a fixační materiál samozřejmě mají a akrylát jsou v ceně montáže.

#### Práhy:

Podle ustanovení doporučených ČSN 73 0803 a ČSN 73 0804 těmi být dveře, jimiž prochází únikové cesty, certifikované požární odolnosti.

Toto doporučení se nevztahuje na dveře z funkčně uvolněná stoupy místnosti, od kterých se ve směru výše uvedených normen přípouží začátek únikové cesty (např. hotelový pokoj, byt, hygienická zástěrka, laboratoř atd.).

#### Základní listy:

Pokud jde o dvěma vybranými sadami listů musí být hladké (bez průhledových listů) a vykazovat dokončnou rovinnost v ploše obvodu otvorního dveří.

V opačném případě NEJZE GARANTOVAT splněním funkce padací listy, tj. kroužkování a Ru.

#### Štěrky:

Z hlediska struktury materiálů a technologie nanosení nátěrové hmoty, upozorňujeme na možnost rozdílu barevného odstínu dřevěného křídla a oskúové zárubně.

#### Oskúové zárubně:

Oskúové zárubně dřevěné struktury musí být zabudovány dle ČSN 73 60 01.

V případě dodávky oskúové zárubně struktury, je nutno mít tyto "kapsle" pro montáž zárubně.

V případě dodávky požárních dveřních křídla do stávající zárubně, nesmí mít tato kroužkována ani navržena závěsy.

#### Standardní montáž výrobní a rámcové zárubně:

Oskúové zárubně: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Oskúové zárubně: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Oskúové zárubně: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Oskúové zárubně: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Oskúové zárubně: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

#### Zárubka:

Zárubka: 20 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Zárubka: 20 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Zárubka: 20 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Zárubka: 20 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Zárubka: 20 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Zárubka: 20 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

#### Požární dveře a požární zárubně:

Požární dveře a požární zárubně musí být zabudovány dle ČSN 73 60 01.

Požární dveře a požární zárubně musí být zabudovány dle ČSN 73 60 01.

Požární dveře a požární zárubně musí být zabudovány dle ČSN 73 60 01.

Požární dveře a požární zárubně musí být zabudovány dle ČSN 73 60 01.

Požární dveře a požární zárubně musí být zabudovány dle ČSN 73 60 01.

Požární dveře a požární zárubně musí být zabudovány dle ČSN 73 60 01.

#### Pro správnou funkci:

Pro správnou funkci: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Pro správnou funkci: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Pro správnou funkci: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Pro správnou funkci: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Pro správnou funkci: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Pro správnou funkci: 15 mm, koleno na únikové cesty, dřevěné křídla spady jsou v ceně výrobku.

Pokud nebude pravděpodobně provedena kontrola provozuschopnosti PZ, jedná se o součásti zájmové 133165 Sp. a ochranné ochrany.  
V případě, kdy se nebude, lze navrhnout kontrolu PZ, pokud vyžaduje se uživatel nebo další poskytovatel.

Z hlediska dle výše uvedeného upozorňujeme že záruka do našich výrobků a komponent PZ, provedení jich osobou než dozrání nebo k této osobě jiná autorizovaná osoba, budou mít za následek ztrátu záruky.

#### Termíny:

Termín podání je vázán na sdělení technické dokumentace, odsouhlasení vzorků a stavění přípravosti  
Termín dodání je stanoven na 8 - 10 týdnů při splnění výše uvedených podmínek.

Ceny uvedené v tabulce jsou kalkulovány bez DPH.

Platnost cenové nabídky je 30 dnů od zpracování cenové nabídky.

Nabídka je kalkulována pro jednu osobu určenou údržbu. Při rozšíření zakázky do více strojů bude cena upravena o násobky dopravu.

Tato cenová nabídka nemůže být refinancována, a příkazním úkolem může být následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů.  
Tato nabídka není nabídkou na uzavření smlouvy. Děkujeme za zájem o naši nabídku, smlouva je uzavřena až s uzavřením příjmu, smlouva je uzavřena až s uzavřením příjmu, smlouva je uzavřena až s uzavřením příjmu.  
Při výše uvedené společnosti ASSA ABLOY Door Control Systems a.s. vyžaduje poskytnutí této nabídky, když ustanovení první věty § 174 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.

Při přípravě našich jezdů s nimi uvádějí: prosím, vložte cenové nabídky

Děkujeme Vám za projevení zájmu a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem:

Ing. Petr Krmela

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Obchodní společnost Praha

Boudnickova 2308/1 (DOCK IN THREE)

160 00, Praha 6

tel. : + 420 682 454 424

e-mail : petr.krmela@assabloy.com

www.assaabloy.cz

Platnost cenové nabídky je 30 dnů od zpracování cenové nabídky.  
Nabídka je kalkulována pro jednu instalaci dodavky. Při rozšíření zakázky do více etap bude cena upravena o odpovídající doplavy.

Tato cenová nabídka nemusí být omezená a případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou specifikací podmínek a termínů.  
Tato nabídka není nabídkou na uzavření smlouvy. Dopadá-li na základě této nabídky k uzavření smlouvy, smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy společnost ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. akceptuje obdržetnou objednávku.  
Přes výše uvedená společnost ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. vylučuje odpovědnost za od této nabídky, tudíž ustanovení prvního odstavce 3 občanského zákoníku se nevztahuje.  
Při připraveném dalším jednání s námi udělejte, prosím, číslo cenové nabídky.  
Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem

Ing. Petr Křístele

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Obchodní společnost Praha

Bozdahkova 2563/4 (DOCK IN THREE )

100 00, Praha 2

tel. : + 420 902 868 424

e-mail : [pek.kristela@assaabloy.com](mailto:pek.kristela@assaabloy.com)

[www.assaabloy.cz](http://www.assaabloy.cz)

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Polhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020 Osazení stávajících dveří D2-2.20 místo dveří D2-2.19	SO a IO ve změně <b>001 - Architektonicko-stavební řešení a statika</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL č.2</b>
--	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<b>Dopad do termínu</b>									
<b>ANO / NE *</b>									

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavků uživatele budou využity a osazeny stávající automatické dveře D2-2.20 (původně měly být pouze demontovány a uloženy) do nové místnosti 2.058 – příprava pacienta místo dveří D2-2.19. Změnou dojde k výraznému zlepšení manipulace s postelí s pacientem při převozu pacientů na operační sál.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací osikem
0,00	34 475,80 Kč	34 475,80

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
-----------------	---------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## REKAPITULACE STAVBY

73\_PEL

Stavba: Nemocnice Pelhřimov\_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

801 11

Pelhřimov

8. 1. 2020

70990749

CZ70990749

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

SVIŽN s.r.o

03301067

CZ03301067

Ing. Tomáš Alexi

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustavy' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuje popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 34 475,80

**Cena s DPH v CZK 41 715,72**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

73\_PEL

Stavba: Nemocnice Pelhřimov\_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Pelhřimov

8. 1. 2020

Kraj Vysočina

SVIŽN s.r.o.

Ing. Tomáš Alexi

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Máklady stavky celkem		34 475,80	41 715,72	
ZL.6.2	001 - ASŘ	34 475,80	41 715,72	STA

SESTAVENÍ PRÁČNÍ LISTY

001 - Architektonicko-estetické řešení a stříška

30113  
Pobužany

8. 1. 2020  
78890748  
CZ70849748  
Výběh Allosi  
Výběh Allosi  
03301087  
CZ03301087

Kraj Vysočina

Výběh Allosi

SAVON s.r.o.

Ing. Tomáš Allosi

Cena bez DPH

34 478,89

Cena s DPH

41 718,72

V CZK

**ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Podkladov

Kraj Vysočina

Vyšíň (okraj)

6. 7. 2020

SVIŽN s.r.o.

Ing. Tomáš Aleni

Kód řádku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 475,80

PRV - PRVKY

34 475,80

D2: Dveře

34 475,80



RACÍ

021 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Foihiřuv

Kraj Vysočina

Vyřídil úřad

8. 1. 2020

SVAŽN s.r.o.

Ing. Tomáš Alad

PO	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 475,80</b>	
0	PRV	PRVKY					34 475,80	
0	D2	Detail					34 475,80	
3	K	989072456	Výběrání kovových rámu oken a dveří, dveřních zárudní, vrat, stěn, ostění nebo ostění okenička zárudní, plachty přes 2 m2	m2	2,187	1 142,50	2 478,60	Cena SoD
4	K	797932611-1	Úprava montáž pasivních posuvných dveří z hliníkových profilů zdvojnásobná izolace pasivních dveří do 6 m2 včetně standardní úpravy ovládu	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	Cena SoD
5	K	582104901	Revize montážního ostění automatických posuvných dveří	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	Cena SoD

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 73_PEL - Nemocnice Pěšířimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020 Lakování panelů na sál	SO a IO ve změně  <b>010 - Vestavba čistých prostor</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL č.3</b>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále Jan Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1862/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, postkleby <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>		<b>ANO / NE *</b>	
Paré č.	Příjemce												
1	Objednatel												
2	Zhotovitel												
3	Technický dozor												
<b>Dopad do termínu</b>													
<b>ANO / NE *</b>													

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavků uživatele panely na operační sál, které jsou určeny pro zpětné využití, nalakovány dle barvy nových panelů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>30 400,00 Kč</b>	<b>30 400,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 5.2.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny změny, jež jsou potřebné papsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 5.2.2021	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubel	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum 5.2.2021	podpis p. a.
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 5.2.2021	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Peňhůvka, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt: 010 - Vestavba čistých prostor

RSO: 801 11  
Místo: Peňhůvka

CJ-CZ  
Datum: 8. 1. 2020

Zadávatel:  
Kraj Vysočina

IC: 70820740  
DIČ: CZ275890740

Uchazeč:  
Vypřil Údaj

IC: Vypřil Údaj  
DIČ: Vypřil Údaj

Projektant:  
SVIŽN s.r.o.

IC: 03301087  
DIČ: CZ20391087

Zpracovatel:  
Ing. Tomáš Aleník

IC:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** 30 400,00

DPH snížená	Základ daňe	Daň daňe	Výše daňe
	30 400,00	21,00%	6 364,00
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK 36 764,00

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Peňhůvka, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt: 010 - Vestavba čistých prostor

Místo: Peňhůvka  
Zadávatel: Kraj Vysočina  
Uchazeč: Vypřil Údaj

Datum: 8. 1. 2020  
Projektant: SVIŽN s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Tomáš Aleník

Kód účt. - Popis: Cena celkem (CZK)

**Náklady stavby celkem** 30 400,00

2.4.11 - Vestavba čistých prostor 30 400,00

2.4.11.2 - Obkladové panely 30 400,00

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Peňhůvka, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt: 010 - Vestavba čistých prostor

Místo: Peňhůvka  
Zadávatel: Kraj Vysočina  
Uchazeč: Vypřil Údaj

Datum: 8. 1. 2020  
Projektant: SVIŽN s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Tomáš Aleník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
<b>Náklady souplau celkem</b>							30 400,00	
0		2.4.11	Vestavba čistých prostor				30 400,00	
0		2.4.11.2	Obkladové panely				30 400,00	
1	K		Panely obklad. - přestříhání nožem metodou Postup přestříhání panelů - odlepení slávovlákně akrokarotanu (vnitřní strana panelu) - přečištění a vysávání barvy v paži cca 60° - vstavení nového akrokarotanu	m2	0,000	3 009,00	30 400,00	úspěšně
			Akrokarotan se musí odlepnout z okružní odlepení při vyšší teplotě. Údajně se o 15 až panele v ploše 6 m2					

## CENOVÁ NABÍDKA Č.

**NA AKCI:**

Menovnice Pellworm  
 urgentní příjem  
 vestavba čtvcých prostor op. Sář

PRO: ESOX spol. s r. o.  
 Libušina 47 826/23  
 61300 BRNO

**PŘEDKLÁDÁ:**

landoservis s.r.o.  
 Pod Mlýnskem 105/15  
 16000 PRAHA 6

poř.č.	popis	M.J.	množství	cena /M.J.	cena celková
1	Demol. stavební příprava na místě metodou při činnosti práce nové, včetně dopravu do lokality a vyřady. 8k.	m2	8,00	4 354,00	34 832,00 Kč
<b>CENA CELKOVÁ BEZ DPH</b>					<b>34 832,00 Kč</b>

**Není součástí CN:**

1. DPH
2. Měnitář
3. Zpracování
4. Certifikace, školení.
5. Zpracování průpisů a dekulmace, dekulmace skutečného stavu
6. Zedření, naplnění, opod.
7. Materiál materiál (např. průhledky stěnových panelů)
8. Manipulaci, nakládka a vyřadka v místě expedice.

**Platební podmínky:**

1. Platba předem
2. Záloha ve výši 30% z ceny dohodly, splatná při objednávce před zahájením výroby

**Termíny dodávky:**

1. Bude předemem dohodlo jednání

**Platnost CN:**

14 dní

V Praze dne 24.11.2010

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020 Změny hliníkových oken a dveří, doplnění žaluzie pro dveře D2-2.54	BO a IO ve změně <b>001 - Architektonicko-stavební řešení a statika</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL č.4</b>
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna chybné položky zárubně na operační sáň pro dveře D2-2.54. Původní položka běžná ocelová zárubeň, nahrazeno atypickou zárubní nerezovou na tl. Stěny 650mm.

Změna zárubně na operační sáň pro dveře D2-2.54. Původně měla být zárubeň pro stěnu tl.250mm, ve skutečnosti je třeba na stěnu tl.650mm. Odpočítáváme také zdvojenou položku pro tuto zárubeň.

Odpočet hliníkové prosklené stěny. Realizovat se budou pouze automatická křídla dveří D2-2.53. Důvodem je silná provázanost hliníkové stěny s okolními konstrukcemi, které by demontáží byly narušeny.

Dle požadavku uživatele doplnění elektronické žaluzie pro automatické dveře na operační sáň D2-2.54.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-56 490,00	<b>41 597,00 Kč</b>	-14 893,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 14.10.2020	podpis
-----------------	---------------	------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

PIS PRACI

B01 - Architektonicko-stavební řešení a stavba

Podfence  
Kraj Vysočina  
Výpň řídí

8. 1. 2020  
SVIŽN s.r.o.  
Ing. Tomáš Atanz

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za jednotku	
Máklady souhrnné celkem							-14 883,60		
B PRV PRVKY							-14 883,60		
B D2 Dveře							-14 883,60		
1	01	02000007	Dveře osová vnější - plastové bílé s nerezovou rukojetí (180x210 cm, H. jazyk 28 cm), provedení 02000007	ks	1,000	14 883,60	14 883,60	0,00	
2	01		Příslušenství k dveřím 02000007 - 1 ks PD bylo osazeno na H rámu (250 mm, režim je B rámu 60 mm)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	
B K							36 055,00	36 055,00	0,00
1	01	02000007	Dveře dvířková plastová bílá s nerezovou rukojetí, horní a dolní nerezová rukojetí (180x210 cm, úroveň úroveň 250x200 mm, barva RAL s výhledem Al nerezová rukojetí s nerezovým povrchem, provedení 02000007 14 plastové dveře bílé s nerezovou rukojetí (180x210 cm), celková výška dveří 2000 mm, provedení 02000007 14 ks PD bylo osazeno na H rámu (250 mm, režim je B rámu 60 mm)	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	0,00	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Pelhřimov -- rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020  Výměna vinylové podlahy v místnosti 2.066	SO a IO ve změně  <b>001 - Architektonicko-stavební řešení a statika</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL č.5</b>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1362/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Odstranění původní vinylové podlahy, nová vyrovnávací stěrka, nová vodivá vinylová podlaha dle schválené specifikace. V místnosti č. 2.061 a č. 2.062 má být odstraněno PVC po obvodu a instalováno nové – intarzie.  
 Po konzultaci s výrobcem vyměníme PVC v celé ploše a to z důvodu: kvalita podkladu, zbytky lepidla, rovinatost, neuznatelnost reklamaci v budoucnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>33 162,66 Kč</b>	<b>33 162,66</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
-----------------	---------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandt	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ**

**001 - Architektonicko-stavební řešení a statika**

Příjemce

Kraj Vysočina

Vyřizí úřad

8. 1. 2020

SVÚH s.r.o.

Ing. Tomáš Aleš

PG	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustava
Máksimální součet celkem:							33 153,69	
0	MSV		Práce a dodávky MSV - obecné				9 322,32	
0	PSV		Práce a dodávky PSV - obecné				9 322,32	
0	775		Podlahy podlahové				9 322,32	
1	K	775021R01	Montáž podlahovin z vinylu na sádrokartonovém jádru, výšky do 2 m	m <sup>2</sup>	10,740	259,00	2 780,46	dle SaD
			<i>Elektronický výčet homogenní výškové podlahové krytiny z káček a pruhů s výškou úpatových odvodů - bezpodlahová konstrukční úprava. Před vypracováním uspokojivé držby, včetně potřeby aplikace ochranných směrů a ochranné vrstvy (ochranná ochranná fólie - včetně nájezu dle EN 12518 154 a 15013. Čistková šířka 2mm, 2m široká páska, výška 5,00mm) - práce na okraji 150 a 1. součástí součástí dle ČSN 744507 souč. 1.6. TVČC na 20 dních před 10 kg/m<sup>2</sup> dle ISO 16097-6. Bez závažných tepelných mostů a štěrbin spojených do skupiny ČSN4 klasifikace, podlahový materiál dle REACTIV</i>					
2	M	25411R01	Elektronický výčet homogenní výškové podlahové krytiny z káček a pruhů s výškou úpatových odvodů - bezpodlahová konstrukční úprava. Před vypracováním uspokojivé držby, včetně potřeby aplikace ochranných směrů a ochranné vrstvy (ochranná ochranná fólie - včetně nájezu dle EN 12518 154 a 15013. Čistková šířka 2mm, 2m široká páska, výška 5,00mm) - práce na okraji 150 a 1. součástí součástí dle ČSN 744507 souč. 1.6. TVČC na 20 dních před 10 kg/m <sup>2</sup> dle ISO 16097-6. Bez závažných tepelných mostů a štěrbin spojených do skupiny ČSN4 klasifikace, podlahový materiál dle REACTIV	m <sup>2</sup>	10,740	610,00	6 550,64	dle SaD
			<i>Elektronický výčet homogenní výškové podlahové krytiny z káček a pruhů s výškou úpatových odvodů - bezpodlahová konstrukční úprava. Před vypracováním uspokojivé držby, včetně potřeby aplikace ochranných směrů a ochranné vrstvy (ochranná ochranná fólie - včetně nájezu dle EN 12518 154 a 15013. Čistková šířka 2mm, 2m široká páska, výška 5,00mm) - práce na okraji 150 a 1. součástí součástí dle ČSN 744507 souč. 1.6. TVČC na 20 dních před 10 kg/m<sup>2</sup> dle ISO 16097-6. Bez závažných tepelných mostů a štěrbin spojených do skupiny ČSN4 klasifikace, podlahový materiál dle REACTIV</i>					
0	SKL		SKLADBY				23 849,33	
0	HC2		Horizontální odstředivé skladby				634,73	
0			Odstředivé předložkové krytiny				634,73	
3	K	770201R11	Demontáž posádkových podlahovin lepených na podlahy	m <sup>2</sup>	30,010	48,70	594,73	dle SaD
0	HC2		Horizontální odstředivé skladby				22 906,60	
0	HC2	2.04	Montáž podlahovin z vinylu lepením na podlahu s podlahovým osazením				22 906,60	
6	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením na podlahu s podlahovým osazením	m <sup>2</sup>	10,150	237,00	4 303,73	dle SaD
			<i>Elektronický výčet homogenní výškové podlahové krytiny z káček a pruhů s výškou úpatových odvodů - bezpodlahová konstrukční úprava. Před vypracováním uspokojivé držby, včetně potřeby aplikace ochranných směrů a ochranné vrstvy (ochranná ochranná fólie - včetně nájezu dle EN 12518 154 a 15013. Čistková šířka 2mm, 2m široká páska, výška 5,00mm) - práce na okraji 150 a 1. součástí součástí dle ČSN 744507 souč. 1.6. TVČC na 20 dních před 10 kg/m<sup>2</sup> dle ISO 16097-6. Bez závažných tepelných mostů a štěrbin spojených do skupiny ČSN4 klasifikace, podlahový materiál dle REACTIV</i>					
0	M	25411R01	Elektronický výčet homogenní výškové podlahové krytiny z káček a pruhů s výškou úpatových odvodů - bezpodlahová konstrukční úprava. Před vypracováním uspokojivé držby, včetně potřeby aplikace ochranných směrů a ochranné vrstvy (ochranná ochranná fólie - včetně nájezu dle EN 12518 154 a 15013. Čistková šířka 2mm, 2m široká páska, výška 5,00mm) - práce na okraji 150 a 1. součástí součástí dle ČSN 744507 souč. 1.6. TVČC na 20 dních před 10 kg/m <sup>2</sup> dle ISO 16097-6. Bez závažných tepelných mostů a štěrbin spojených do skupiny ČSN4 klasifikace, podlahový materiál dle REACTIV	m <sup>2</sup>	95 150	610,00	17 180,00	dle SaD
			<i>Elektronický výčet homogenní výškové podlahové krytiny z káček a pruhů s výškou úpatových odvodů - bezpodlahová konstrukční úprava. Před vypracováním uspokojivé držby, včetně potřeby aplikace ochranných směrů a ochranné vrstvy (ochranná ochranná fólie - včetně nájezu dle EN 12518 154 a 15013. Čistková šířka 2mm, 2m široká páska, výška 5,00mm) - práce na okraji 150 a 1. součástí součástí dle ČSN 744507 souč. 1.6. TVČC na 20 dních před 10 kg/m<sup>2</sup> dle ISO 16097-6. Bez závažných tepelných mostů a štěrbin spojených do skupiny ČSN4 klasifikace, podlahový materiál dle REACTIV</i>					
7	K	776141123	Příprava podlahy vytvoření cementové stěrky podlah m <sup>2</sup> pevnost 30 MPa, tloušťka 50 do 8 mm	m <sup>2</sup>	70,010	370,50	7 415,78	dle SaD
			<i>Elektronický výčet homogenní výškové podlahové krytiny z káček a pruhů s výškou úpatových odvodů - bezpodlahová konstrukční úprava. Před vypracováním uspokojivé držby, včetně potřeby aplikace ochranných směrů a ochranné vrstvy (ochranná ochranná fólie - včetně nájezu dle EN 12518 154 a 15013. Čistková šířka 2mm, 2m široká páska, výška 5,00mm) - práce na okraji 150 a 1. součástí součástí dle ČSN 744507 souč. 1.6. TVČC na 20 dních před 10 kg/m<sup>2</sup> dle ISO 16097-6. Bez závažných tepelných mostů a štěrbin spojených do skupiny ČSN4 klasifikace, podlahový materiál dle REACTIV</i>					



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Peřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020 Doplnění keramického obkladu po drážkování pro profese	SO a IO ve změně <b>001 - Architektonicko-stavební řešení a statika</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL č.6</b>
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESCX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	<b>ANO / NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	<b>ANO / NE *</b>										

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Dle SoD nebyla nijak řešena náprava původních obkladů do původního stavu po řezání drážek pro profese. SoD řešila pouze zednické zapravení omítkou, ne však keramický obklad.

Tento změnový list řeší vyrovnaní povrchu, dvouvrstvou hydroizolační stěrku a keramický obklad stěn.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	28 635,43 Kč	28 635,43

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukášček	datum	podpis
-----------------	---------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandt	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**SOURIS PRACÍ**

001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Polhemov  
Kraj Vysočina  
Výšňá údaj

8. 1. 2020  
SMIŽN s.r.o.  
Ing. Tomáš Nový

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotk. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cizí měnová
Náklady soupisu celkem							28 632,43	
0	SKL		<b>SKLADBY</b>				28 632,43	
0	V02		Vertikální konstrukční skladby				28 632,43	
0	V02-2-22		Návržený obklad maloforními na obkladě konstrukcí				28 632,43	
159	K	781874117	Montáž obkladu vnějších stěn z dlaždic keramických lepených šroubením spájem maloforními nádobami přes 05 do 45 mm2 obkladu provedení obkladu nádobami z 005 (obklad lepený na spájkách) obklad keramický nádob přes 05 do 45 mm2 - glazované, imit. 15x15 (obkl. m2)	m2	20,500	543,50	11 141,75	do SoD
159	A	150761208	obklad keramický nádob přes 05 do 45 mm2 - glazované, imit. 15x15 (obkl. m2)	m2	22,500	341,50	7 700,50	do SoD
159	K	781131112	izolace stěny pod obkladě izolace nábitím nebo obkladem do dvou vrstev obkladu provedení obkladu 15x15 - glazované, imit. nádobami	m2	20,500	230,50	6 775,25	do SoD
160	K	784181121	Perforace potěrů jednotvárná hrobová v místnostech výšky do 3,80 m obkladu provedení obkladu	m2	20,500	18,70	383,35	do SoD
161	K	781151001	Příprava potěrů před provedením obkladu celostěnně vyzvozná potěrů obkladu, tloušťky 3cm obkladu provedení obkladu	m2	20,500	126,50	2 604,25	do SoD

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 73_PEL - Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020 Změny profese elektro	SO a IO ve změně 005 - Elektroinstalace - silnoproud; 006 - Elektroinstalace - slaboproud	Číslo změny stavby: <b>ZL č.7</b>
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění zásuvek, krabic a nutné kabeláže dle potřeb uživatele. Dle potřeb uživatele byla v místnosti "Rozvodna slaboproudů" umístěna UPS-ka. Z důvodu požadavku na přepínání jednotlivých napájení ( síť-> napětí z UPS) pro slaboproudé racky (tak aby běžely i při výpadku el. energie), je nutný přepínací rozvaděč R-UPS. Tento rozvaděč slouží pro libovolné přepínání a jištění obou zařízení. Pokud dojde k poruše na veřejné nn síti, tento rozvaděč automaticky přepne napájení z UPS. Naopak pokud síť běží, tak tento rozvaděč "posílá" energii do UPS, tak aby se nabíly akumulátory v UPS.

Doplnění datových zásuvek a 1 ks interkomu dle potřeb uživatele. Změna interkomů z analogového typu na IP plyne z projektu, ve kterém byly vrátníky na analogové telefonní linky. Požadavkem uživatele je odstranit analogovou ústřednu z urgentu a napojit vrátníky po IP. 1 ks interkomu je doplněn do stěvacích dveří v chodbě. K tomto se doplňují také mimo jiné položky pro otvírač dveří včetně zapojení.

Doplnění požárního řešení stávajícího rozvaděče. Řešeno stavebně + požární odvětrání. Doplnění požárního řešení rozvodny. Obojí vyžaduje PBR, ale PD neřeší.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-47 360,00	<b>188 943,27 Kč</b>	<b>141 583,27</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšidek	datum	4.1.21	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.					
Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	4.5.2021	podpis	
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	4.5.2021	podpis	
Uživatel	Petr Adam	datum	4.5.2021	podpis	
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	2.6.2021	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

JUPIS PRACÍ

ASŘ

Peřířínov  
Kraj Vysočina  
PATROL group s.r.o.

8. 1. 2020  
SMČM s.r.o.  
Ing. Tomáš Alení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslová soustava
Hládkový soupis částkem							47 589,47	
Nový objekt ke stávajícímu objektu (základní instalace)							19 255,00	
1	K	1742320002	Montáž elektrické osvětlovacího zařízení osvětlení profy elektrického napětí 12 V a stavební sítelkou	kus	1,000	2 185,00	2 185,00	dle SoD
2	M	1742320002	Osvětlení elektrické osvětlení profy elektrického napětí 12 V a stavební sítelkou	kus	1,000	2 185,00	2 185,00	dle SoD
Požární řešení stávajícího rozvaděče, požární řešení rozvodny							32 304,47	
3	K	177111002	Prošpižování náběhu uspořádání přetěžované kovové potrubí průstup svazem tloušťky 500 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	4 065,00	4 065,00	dle SoD
4	K	Pw105	Prošpižování uspořádání kabelových tras v místech plochých dp jiného PEI	m2	0,510	7 691,00	3 896,40	dle SoD
5	K	1703121021	Montáž desek s 12,5 mm na nosnou kci SSK stěna přetěžovaná	m2	12,800	63,40	811,52	CS ÚRS 2021 01
6	K	150000027	deska SSK protipožární DF V 12,5 mm	m2	14,080	57,70	809,77	dle SoD
7	K	1703131033	SKK podhled deska 7xDF 15 s západ jednovrstvá spodní kca proti CO11JD EI 30	m2	4,700	1 024,00	4 814,00	CS ÚRS 2021 01
8			FD 900/100 SILENT ultra tichý ventilátor do potrubí	ks	1,000	7 853,00	7 853,00	vlastní, přiloženo CN
9			MGR100 spinka	ks	2,000	65,82	131,64	vlastní, přiloženo CN
10			Zpětná klapka RSK 160 ED	ks	1,000	373,66	373,66	vlastní, přiloženo CN
11			požární klávesa P1MSK 160 01 bez signalizace	ks	1,000	2 305,00	2 305,00	vlastní, přiloženo CN
12			ohrbová hadice SONOFLEX M 180	m	10,000	225,00	2 255,00	dle SoD
13			NSP 160 - náložnice s křehkou přídělí	ks	1,000	344,20	344,20	vlastní, přiloženo CN
14			Anomální přívodní VVVR 000 v6 plátem čou	ks	1,000	3 370,40	3 370,40	vlastní, přiloženo CN
15			požární osvětlo	m	1,000	572,00	572,00	vlastní, přiloženo CN

JUPIS PRACÍ

005 - Elektroinstalace - sítě proud

Příjemce

Kraj Vysočina

PATROL group s.r.o

8. 1. 2020

SVIŽŇ s.r.o

Ing. Tomáš Ašad

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné usazení
Náklady soupisu celkem							28 656,90	
0	2.4.7		Elektroinstalace - sítě proud				28 656,90	
			<i>Nové rozvaděče IP20</i>				4 224,00	CS ÚRS 2021 01
1			Kabel CKRY-J 5x6	m	55,000	76,80		Cena vložku
2			Rozvaděč R-UPS	ks	1,000	10 600,00	10 600,00	Získává výřadu
3			Vodič CY 8 mm <sup>2</sup> Svět	mp	55,000	24,60	1 353,50	Nezapadá do výřadu
			<i>Nové rozvaděče IP20</i>				1 353,50	účetní ceny na
4			Krabička rozvaděč do zebra d=66mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenová	ks	2,000	150,00	300,00	účetní
5			Spínač jističový velkopřítoký - 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	1,000	188,50	188,50	účetní
6			Zásuvka jednofázová 230V/16A, p. om., IP20 komplet včetně kabelu provedení (MDO, DO, VDO, ZIS)	ks	5,000	315,00	1 575,00	účetní
7			Kabel CKRE-R 3x2,5	m	15,000	34,70	520,50	účetní
			<i>Nové rozvaděče IP20</i>				1 774,50	účetní
8			Krabička rozvaděč do zebra d=66mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenová	ks	4,000	150,00	600,00	účetní
9			Spínač jističový velkopřítoký - 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	1,000	188,50	188,50	účetní
10			Zásuvka jednofázová 230V/16A, p. om., IP20 komplet včetně kabelu provedení (MDO, DO, VDO, ZIS)	ks	2,000	315,00	630,00	účetní
11			Kabel CKRE-R 3x2,5	m	10,000	34,70	347,00	účetní
			<i>Nové rozvaděče IP20</i>				310,50	účetní
12			Krabička rozvaděč do zebra d=66mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenová	ks	2,000	150,00	300,00	účetní
13			Spínač jističový velkopřítoký - 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	1,000	188,50	188,50	účetní
14			Zásuvka jednofázová 230V/16A, p. om., IP20 komplet včetně kabelu provedení (MDO, DO, VDO, ZIS)	ks	1,000	315,00	315,00	účetní
15			Kabel CKRE-R 3x2,5	m	2,000	34,70	69,40	účetní
			<i>Nové rozvaděče IP20</i>				1 462,50	účetní
16			Krabička rozvaděč do zebra d=66mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenová	ks	2,000	150,00	300,00	účetní
17			Spínač jističový velkopřítoký - 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	1,000	188,50	188,50	účetní
18			Zásuvka jednofázová 230V/16A, p. om., IP20 komplet včetně kabelu provedení (MDO, DO, VDO, ZIS)	ks	2,000	315,00	630,00	účetní
19			Kabel CKRE-R 3x2,5	m	5,000	34,70	173,50	účetní
			<i>Nové rozvaděče IP20</i>				1 210,50	účetní
20			Krabička rozvaděč do zebra d=66mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenová	ks	2,000	150,00	300,00	účetní
21			Spínač jističový velkopřítoký - 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	1,000	188,50	188,50	účetní
22			Zásuvka jednofázová 230V/16A, p. om., IP20 komplet včetně kabelu provedení (MDO, DO, VDO, ZIS)	ks	2,000	315,00	630,00	účetní
23			Kabel CKRE-R 3x2,5	m	10,000	34,70	347,00	účetní
			<i>Nové rozvaděče IP20</i>				859,50	účetní
24			Krabička rozvaděč do zebra d=66mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenová	ks	1,000	150,00	150,00	účetní
25			Spínač jističový velkopřítoký - 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	1,000	188,50	188,50	účetní
26			Přívodní zábrusky	ks	2,000	102,00	204,00	včetně

JUPIS PRACÍ

006 - Elektroinstalace - slaboproud

Polohový

3. 1. 2020

Kraj Vysočina  
PATROL group s.r.o.

SVČH s.r.o.  
Ing. Tomáš Ales

AC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady souhrnně celkem							60 968,00	
0	2.4.7		Elektroinstalace - slaboproud				60 968,00	
0	2.4.7.1		PYTS (ACS), ET, JE				52 478,00	
0	2.4.7.1.1		TECHNOLOGIE				52 478,00	
0	2.4.7.1.1		Demontáž kabelů				64 478,00	
1	K	Pa165	Úsporné kontakty pro osvětlení dvojitě (et. zábrana / ochrana)	ks	1,000	602,00	602,00	do SaD
2	K	Pa175a	Dvojití interfony (relé), kompatibilní se stávající instalací osvětlovací, stejné technické vlastnosti jako stávající obnoba relé, instalace do venkovního prostoru, kontakt pro osvětlení dvojitě s dotlačným zařízením, 3 adresy (zábrana, obnoba)	ks	4,000	11 840,00	47 360,00	do SaD
3	K	Pa175b	Dvojití IP relé (relé), kompatibilní se stávající instalací osvětlovací, stejné technické vlastnosti jako stávající obnoba relé, instalace do venkovního prostoru, kontakt pro osvětlení dvojitě s dotlačným zařízením, 3 adresy (zábrana, obnoba)	ks	5,000	16 840,00	84 234,00	ústaní
0	2.4.7.2		SKK CCTV, SYA				16 490,00	
0	2.4.7.2.1		TECHNOLOGIE				3 314,50	
0	2.4.7.2.1		SYA				1 142,00	
4	K	Pa216	Demontáž stávajících komunikačních komponentů	ks	1,000	1 504,50	1 504,50	do SaD
5	K	Pa224	Dvojití zásuvka modulární pro 2x konektory RJ45, cat 6, zápusťná montáž, jednotný design se síťovou dynami kompatibilitou	ks	6,000	220,00	1 320,00	do SaD
6	K	Pa227	Společný konektor RJ45, cat 6	ks	4,000	110,00	440,00	do SaD
0	2.4.7.2.2		ROZVODY				13 175,00	
0	2.4.7.2.2		SKK				13 175,00	
7	K	Pa164	1-CXK45-R 2x1,5 B2ca	m	30,000	25,70	771,00	do SaD
8	K	Pa188	Elektronosběrná obložná plošná matice s vnějším průměrem 25mm, včetně spojovacího a uzavíracího materiálu	m	27,000	26,70	720,90	do SaD
9	K	Pa160	Rozbočovací krabice	ks	5,000	178,00	890,00	do SaD
10	K	Pa198	Kabel STP cat 6A B2ca	m	45,000	26,40	1 188,00	do SaD
11	K	Pa190	Kabelová přechodka pro upnutí kabelů ke stěně	ks	40,000	18,80	752,00	do SaD
12	K	Pa248	Kabel RJ45T cat 6 B2ca	m	280,000	24,40	7 032,00	do SaD
13	K	Pa246	Společný držák pro akrylové 1-20x kabel RJ45T cat 6 B2ca / STP cat 6A B2ca	ks	25,000	32,20	805,00	do SaD
14	K	Pa162	Výhledová drážka do stěny jednobýhých rozvaděčů	ks	4,000	52,00	208,00	do SaD
15	K	Pa250	Vytěžovací páruzu sáetz stěny	ks	7,000	100,00	700,00	do SaD

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020  Nové SDK pohledové desky	SO a IO ve znění  <b>001 - Architektonicko-stavební řešení a statika</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL č.8</b>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/87, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řídné zřívodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se škrtnout

Popis a zřívodnění změny:

Při demontáži původních SDK pohledů, určených ke zpětné montáži, se velké procento panelů ukázalo jako nevhodné pro opětovné použití. Budou tedy použity pouze ty, které budou zhodnoceny jako velmi zachovalé a to pouze do menších místností. I zde bude osazen nový rastr z důvodu bezpečnosti a záruky. Ostatní pohledy se provedou nově. Dále ZL řeší také doplnění demontáží dle skutečnosti. Tam, kde se uvažovala částečná demontáž, bylo nutné (kvůli výměně rastrů apod.) demontovat také v plném rozsahu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	195 502,27 Kč	195 502,27

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 23.4.21	podpis
-----------------	---------------	---------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zřívodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci zřívěny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 23.4.21	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ**

001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Peřimov

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

6. 1. 2020

SVIŽNÍ s.r.o.

Ing. Tomáš Adám

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cizí měna
Měsítný soupis celkem							196 802,27	
D	SKL		SKLADBY				196 502,27	
		703131012	Demontáž, nový rám, nové podhledy kompletní Mantel zavěšená dřevěná nosná konstrukce z perliu CD, LID SIK posílání	m2	26,500	422,00	16 409,00	CZK LRS 2021 01
		2 008	6,7		6 700			
		2 001	14,6		14 600			
		2 002	15,2		15 200			
			celkem		26 500			
		K02 00000300	CDL prosklená 420x72, 60 x 12 x 2600 mm	m	160,100	27,34	4 384,96	CZK LRS 2021 01
			160,10		160,100			
		K02 00000300	LID prosklená 230x27, 50 x 27 x 2600 mm	m	64,915	13,22	857,65	CZK LRS 2021 01
			54,91		54,910			
167	K	703131031	Demontáž podhledu nebo samostatného podhledu předků ze sádrokartonových desek a novou konstrukci jednotlivou z ostatních profilů, optičení jednocoušně LID 211+26.207+11.978+5.971+279.65	m2	218,714	224,00	48 991,94	dle SoD
					218,714			
176	K	703130011	Mantel sádrokartonového podhledu optičení hmot	m2	181,660	377,00	68 486,18	dle SoD
					181,660			
		2 003	20,879 21,6 68,95		124 646			
		2 002	37,9		31 000			
		2 005	112,6		132 100			
		2 006	19,8		49 100			
		2 013	12		12 000			
		2 014	6,9		5 800			
		2 016	10,0		16 800			
		2 021	122 4 309		20 940			
		2 045	44,8		66 500			
		2 051	10,4		25 400			
		2 057	6,8		6 400			
		2 058	57,0		27 600			
		2 059	7,9		7 300			
		2 061	14,0		14 500			
		2 062	12,2		12 200			
			celkem		181 161			
177	K	000000007	Zakázková sazba za 1 rok dílovenní průkazapodání k tomu II. dílna 600x600mm	m2	218,427	284,00	62 033,26	dle SoD
					218,427			
			40 000 76 9 67 200 01 4 64 1 1		210 637			



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 73_PEL - Nemocnice Peňhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020 Nové dveře do ordinací, nové bezpečnostní prvky na stávajících dveřích	SO a IO ve změně <b>001 - Architektonicko-stavební řešení a statika</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL č.9</b>
--	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále jen Smlouva)

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border: 1px solid black; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; font-weight: bold;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Dveře D2-2.29 - D2-2.34 do ordinací, které byly určeny k repasi, jsou zničeny a naprosto nevhodné pro renovaci. Proto budou vyměněny za nové. Veškeré kování, otvírače, zavírače a bezpečnostní prvky acrovyn budou zpětně namontovány do nových dveří. Informační systém bude instalován nový.

Na stávajících dveřích D2-2.01 - D2-2.03 budou instalovány nové bezpečnostní prvky acrovyn z důvodu sjednocení s nově dodávanými prvky.

Doplňuje se orientační systém dle potřeb uživatele a také počet zámků v systému generálního klíče.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-11 857,82	70 922,43 Kč	59 064,61

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 9.11	podpis
-----------------	---------------	------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 1.5.2021	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum 7.5.2021	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum 7.5.2021	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandt	datum 2.8.2021	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ**

001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Polhemov  
Kraj Vysočina  
Výběh údolí

8. 1. 2020

SVIŽM s.r.o.  
Ing. Tomáš Aleni

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena s DPH
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>89 064,51</b>
<b>0 PRV PRVKY</b>								<b>59 054,51</b>
<b>0 02 Dreže</b>								<b>55 258,15</b>
231	K	705601849	Demontáž dřevěných komerukel k opětovnému použití kování interiérového dřeva s tlakou	kus	0,000	498,50	2 799,00	Dle Sad
236	K	742020032	Montáž elektrický osvětleno ovládní ostatní prvky elektrického ústrojí 12 V v stavební síťce	kus	6,000	2 185,00	13 110,00	Dle Sad
238	K	763106801	Odstanění nátěru z truhlářských konstrukcí obrácením	m2	26,000	73,00	-1 898,29	Dle Sad
240	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednobarevný syntetický	m2	52,000	181,50	9 459,89	Dle Sad
266	K	766000002	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zrubné povrchové upravených jednokřídelových, šířky přes 800 mm	kus	0,000	322,00	1 832,00	Dle Sad
274	M	20125	Montáž dřevěných dveří do stěn z dřevěných kování bezpečnostního zámku	ks	0,000	0,000	0,000	Dle Sad
274	K	705600791	Montáž dveřních dopřek dřevěného kování bezpečnostního zámku	kus	11,000	214,50	2 359,50	Dle Sad
277	M	20126	Montáž dřevěných dveří do stěn z dřevěných kování bezpečnostního zámku	ks	0,000	0,000	0,000	Dle Sad
286	K	X019	Ochranné systémy - bezpečnostní (tlačí saduka ruční tlačka dveří), Níhlová konstrukce, D×M	kus	11,000	203,50	2 238,50	Dle Sad
292	K	766600717	Montáž dveřních zablíků samozavírací na zárubni ocelové	kus	9,000	214,50	1 930,50	Dle Sad
<b>0 X2 Ochranné prvky</b>								<b>3 826,53</b>
342	K		Demontáž acrylových pro opětovné použití, výšky do 2 m	m2	0,330	1 500,00	495,00	veškeré
343	K	770521R11	Montáž acrylových na oděky lepených past, výšky do 2 m	m2	1,000	1 600,00	1 792,00	Dle Sad
344	M	X009	Montáž dřevěných dveří do stěn z dřevěných kování bezpečnostního zámku, šířky přes 800 mm	ks	0,000	0,000	0,000	Dle Sad

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10.2020 <b>Bourání zavěšeného ŽB prvku, odstranění a doplnění fasády, odstranění keramické zavěšené fasády pro uskladnění</b>	SO a IO ve změně  <b>001 - Architektonicko-stavební řešení a statika</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL č.10</b>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10.2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dostavování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>	Paro č. 1 2 3	Příjemce Objednatel Zhotovitel Technický dozor
Dopad do termínu		<b>ANO / NE *</b>

\* nahodit se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Kvůli kolizi navrženého přístřešku se stávajícím zavěšeným ŽB prvkem bude tento zavěšený prvek odstraněn. Bude z něj opatrně sejmuta zavěšená keramická fasáda (k opětovnému použití). Potom se odstraní samotný ŽB prvek o rozměru 3500 x 1000 mm a 4200 x 1000 mm o síle ŽB kce 300 mm. Odřezání bude provedeno stěnovou pilou, pojezdová řezací hlava bude osazena na ukotvenou pojezdovou kolejnici, řezání bude probíhat z plošiny. U každé konstrukce budou provedené vrty a soňdy pro prolázení ocelového lana, otvory budou sloužit pro jeřáb aby jistil řezané ŽB bloky po celou dobu řezání. Každá ŽB konstrukce bude napežena na ŽB bloky. Po celou dobu řezání, bude řezané ŽB bloky jistit jeřáb, řezání bude probíhat z terénní nužkové plošiny s minimální hmotnosti koše cca 350 kg. Jednotlivé napežané kusy budou za pomoci jeřábu sneseny na zem a následně přesunuty do kontejneru. Pro provádění je předpokládána plná připravenost a kontinuální provádění prací. Vrtací a řezací práce budou provedeny diamantovou technikou chlazenou vodou.

Tato kolize vyvolává prodloužení termínu o 21 dnů. Toto prodloužení vzniklo řešením této kolize a nutným přezkoumáním možnosti, jak lze řešit nový přístřešek pro sanitní vozy. Během tohoto přezkoumávání bylo nutné přerušit veškeré práce na výrobě konstrukce nového přístřešku, jelikož nebylo jasné, zda navržené řešení bude možno provádět.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	205 498,72 Kč	205 498,72

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukáčok	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, což jsou podrobně popsány, zdůvodněny, skládavány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.	Ing. Jan Kolina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 7.11.2024	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo parčí:

# PRÁCI

Jemocnice Pelsheimov

## 01 - Bourací práce

Datum: 05.04.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Javatel:  
Autoritel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>205 498,72</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				178 953,72	
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 526,09	
1	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	20,000	732,00	14 640,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	HSV.858105723008 0.2	Isover EPS 70F - 80mm, AD = 0.039 (W m-1 K-1), 1000x500x80mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zateplení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	21,000	103,29	2 169,09	CS ÚRS 2021 01
	W		20% 1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,000			
3	K	622541001	Omítka tenkovrstvá sílikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn	m2	20,000	237,00	4 740,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	629999042	Příplatek za cenám úprav vnějších povrchů za zřízené pracovní podmínky práce v nadšištní části objektu	m2	20,000	32,20	644,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	918299231	Očištění tlakovou vodou hrubých, strukturovaných nebo perforovaných ploch PHS výšky do 2,5 m z licové strany	m2	30,000	95,30	2 859,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	918299291	Příplatek k cenám omytí tlakovou vodou za výšku přes 2,5 m	m2	30,000	15,80	474,00	CS ÚRS 2021 01
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				139 276,20	
7	K	620991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	60,000	34,00	2 040,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. WD6 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	75,000	60,10	4 507,50	CS ÚRS 2021 01
9	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další účen použití lešení k ceně - 1111	m2	37,500	0,84	31,50	CS ÚRS 2021 01
10	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. WD6 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	75,000	36,20	2 715,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	964054111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,36 m2	m3	0,090	3 430,00	308,70	CS ÚRS 2021 01
	W		odbourání zbytku konstrukce po odřezání (kam se nedostane píle)		0,090			
	W		0,3*1*0,15*2		0,090			
12	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nážerem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	20,000	65,50	1 310,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	966083	Příplatek za opatrnou demontáž pro opětovné použití obkladů	m2	25,000	500,00	12 500,00	Wesini
14	K	966083118	Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí dvousměrnou hliníkovou stěn	m2	25,000	785,00	19 625,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	977151124	Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, okrajků, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,600	6 820,00	4 092,00	CS ÚRS 2021 01
	W		pro sondy a prozáření ocelového lana ( přetáčení ŽB konstrukce (otřebení)					
	W		2*0,3		0,600			
16	K	977212111	Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm	m2	23,100	3 530,00	81 543,00	CS ÚRS 2021 01
	W		odřezání žb bloků					
	W		3*3,5*3*4,2		23,100			
17	K	977212191	Řezání konstrukcí diamantovým lanem Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	23,100	485,00	11 203,50	CS ÚRS 2021 01
	W		v koši plošiny					
	W		23,1		23,100			
0	987		Přesun sutě				13 933,64	
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m	t	7,797	298,50	2 327,40	dle SoD
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,797	186,50	1 454,14	dle SoD
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	210,519	9,00	1 894,67	dle SoD
	W		7,797*27 Přepočtené koeficientem množství		210,519			

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,635	1 119,50	6 308,38	dle SoD
K 997241526	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenosti Příplatek k ceně za zřízení práce při rekonstrukcích	t	7,797	250,00	1 949,25	CS ÚRS 2021 01
D 998	Přesun hmot				217,59	
23 K 998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,236	922,00	217,59	dle SoD
<b>Jeřáby a plošiny</b>					<b>26 545,00</b>	
24 K 945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s oločným košem výšky zdvihu do 21 m	den	1,000	4 140,00	4 140,00	CS ÚRS 2021 01
25 K 998101	Doprava jeřábů, mobilizace, pronájem (6*2450+67*115)	kpl	1,000	22 405,00	22 405,00	vlastní
				22 405,000		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 73_PEL - Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020 Výměna jističů	SO a IO ve změně <b>005 - Elektroinstalace - silnoproud</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL č.11</b>
--	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(část jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Nynější hlavní jističe jsou od fy MOELLER, která již zanikla a nahrazuje ji fy EATON. Tato firma již nenabízí kompatibilní sortiment jističů atd... pro jističe MOELLER. Z důvodu nekompatibility je nutná výměna hlavních jističů v rozvaděčích v 5.NP pro UPS a v suterénu v RHMT a RHMZ (v každém rozvaděči jsou 2 hlavní jističe), tak aby bylo možné zprovoznit TOTAL a CENTRAL STOP tlačítka. Nutná výměna je z důvodu nutnosti osazení hlavních jističů podpětovou spouští, která při stisku tlačítka (TOTAL, nebo CENTRAL) vybaví příslušný jistič.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	175 059,60 Kč	175 059,60

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukášek	datum 16.4.21	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 18.4.21	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum 23.4.21	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum 6.4.2021	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 16.4.21	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:


**SOUPIS PRACÍ**

005 - Elektroinstalace - silnoproud

Fulčimov  
Kraj Vysočina  
PATROL group s.r.o.

8. 1. 2020  
SVIŽN s.r.o.  
Ing. Tomáš Abal

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v srovnání
Náklady souhrnně celkem						178 059,80	
0	2 4 7	Elektroinstalace - silnoproud				178 059,80	
		výroba zkušebních panelů v rozvaděcích skříních v 10kV				178 059,80	
27		Desky vykonávané 800 A, 3P, I <sub>n</sub> =50kA, hlavní měřič v rozvaděcích RHMT a R <sub>1</sub> R <sub>2</sub> Z	ks	4,000	38 104,00	152 659,80	vlastní
28		Podpítkové spouště hlavních panelů pro vypnutí panelů při stavu TOTALCENTRAL STOP	ks	4,000	3 117,20	12 468,00	vlastní
29		Desky pomocné 4 pólové pro pomocné napájení pro TOTALCENTRAL STOP	ks	1,000	683,00	683,00	vlastní
30		Desky hlavní pro LPS v 6 NP 80 A, 3P, I <sub>n</sub> = 10kA	ks	2,000	3 409,00	6 818,00	vlastní
31		Podpítkové spouště pro hlavní desky LPS v 5 NP	ks	2,000	1 077,60	2 155,20	vlastní

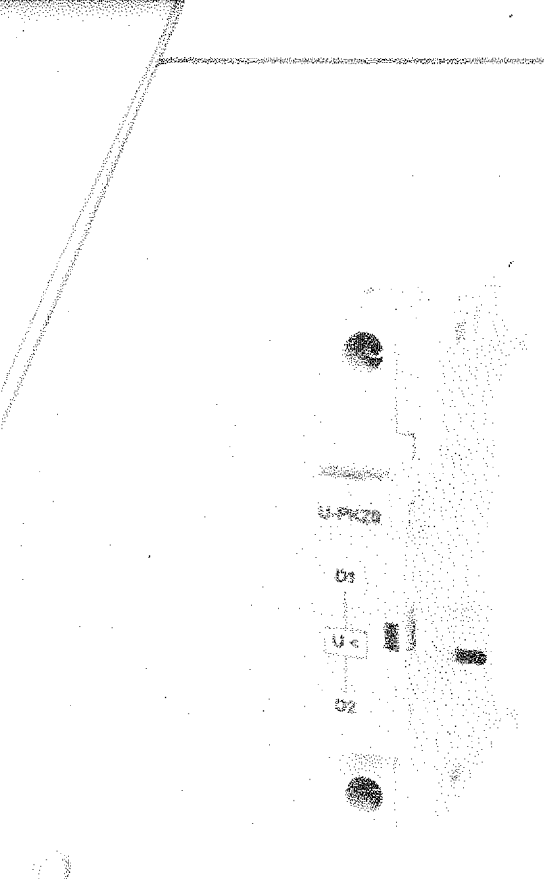

Kód: **1108915**

Výrobce: **EATON**

Označení typu: **U-PKZ0(\*V60HZ)**

Značka: **EATON**

Objednací číslo: **982163**

Produktová řada:

EAN:

Elektroodpad: **Ano**

**Na objednávku**

Cena bez DPH za 1KS

**1 042,26 Kč**

1 261,13 Kč vč. DPH

Příspěvek na recyklaci: + 0,14 Kč / KS

Minimální odběrové množství: **1,0 KS**

Balení: **1,0 KS**

Podpěťová spoušť bez zpoždění, pro spouštěč konstrukční velikosti PKZ(M)0, zvláštní napětí



Provozce	EATON
Značka	EATON
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz	0...0 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz	24...600 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC	0...0 V
Druh napětí pro spuštění	AC
Způsob elektrického připojení	Šroubové připojení
Počet spínacích kontaktů	0
Počet rozpínacích kontaktů	0
Počet přepínacích kontaktů	0
Zpoždění	NE
Vhodné pro výkonový spínač	NE
Vhodné pro odpojovač	NE
Vhodné pro spouštěč motoru (motorový jistič)	ANO
Vhodné pro nadproudové relé	NE

### Mohlo by vás také zajímat



#### Jistič 1p B 16A 6kA PL6

Kód: 7409523 | Skladem 500 a více ks

87,20 Kč

1

+

-

ks



#### Spojovací díl M22-A

Kód: 1220691 | Skladem 500 a více ks

37,70 Kč


1

+

-

ks



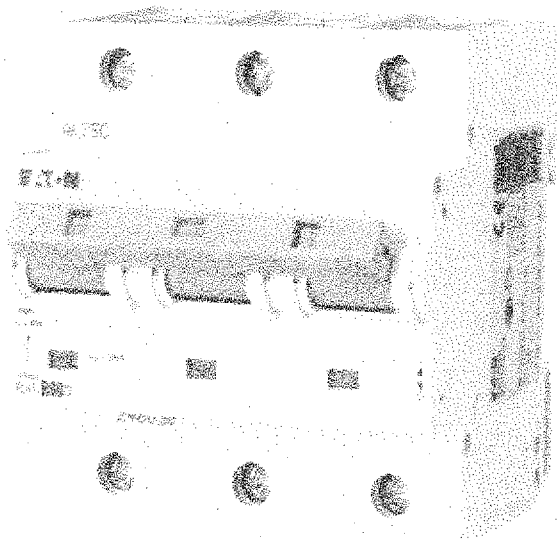

Kód: **1060144**

Výrobce: **EATON**

Označení typu: **PLHT-C80/3**

Značka: **EATON**

Objednací číslo: **248039**

Produktová řada:

EAN: **4015082480394**

Elektroodpad: **Ano**

**Skladem 2 ks**

Cena bez DPH za 1KS

**3 382,32 Kč**

4 092,61 Kč vč. DPH


Příspěvek na recyklaci: **+ 0,70 Kč / KS**

Minimální odběrové množství: **1,0 KS**

Balení: **4,0 KS**

Vysoce kvalitní jističe vedení k použití v domácnostech, průmyslu i dílnách, indikátor polohy kontaktu červeno-zelený, program příslušenství s možností dodatečné montáže, jmenovité povozní proudy do 125 A, spouštěcí charakteristika C, D, jmenovitá spínací schopnost 25 kA podle IEC/EN 60947-2, vhodný k používání pod širým nebem (rozvod proudu ve stavbě a rozvod venkovního vedení) do -25 °C

<b> výrobce</b>	EATON
<b> Značka</b>	EATON
<b> Vypínací charakteristika</b>	C
<b> Počet pólů (celkem)</b>	3
<b> Počet zabezpečených pólů</b>	3
<b> Jmenovitý proud</b>	80 A
<b> Jmenovité napětí</b>	400 V
<b> Jmenovité izolační napětí <math>U_i</math></b>	440 V
<b> Jmenovité impulzní výdržné napětí <math>U_{imp}</math></b>	4 kV
<b> Jmenovitá zkratová vypínací schopnost <math>I_{cn}</math> podle EN 60898 při 230 V</b>	0 kA
<b> Jmenovitá zkratová vypínací schopnost <math>I_{cn}</math> podle EN 60898 při 400 V</b>	0 kA
<b> Jmenovitá zkratová vypínací schopnost <math>I_{cu}</math> podle IEC 60947-2 při 230 V</b>	20 kA
<b> Jmenovitá zkratová vypínací schopnost <math>I_{cu}</math> podle IEC 60947-2 při 400 V</b>	20 kA
<b> Druh napětí</b>	AC
<b> Frekvence</b>	50...60 Hz
<b> Třída omezení proudu</b>	3
<b> Vhodné pro instalaci pod omítku</b>	NE
<b> Souběžný neutrální vodič</b>	NE
<b> Kategorie přepětí</b>	3
<b> Stupeň znečištění</b>	2
<b> Možno doplnit přídatná zařízení</b>	ANO
<b> Šířka v počtu modulových míst</b>	4,5
<b> Vestavná hloubka</b>	75 mm
<b> Stupeň krytí (IP)</b>	IP20
<b> Okolní provozní teplota</b>	-25...55 °C

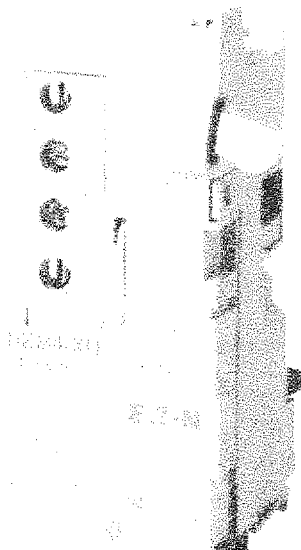

Kód: **1312090**

Výrobce: **EATON**

Označení typu: **NZM4-XU208-240AC**

Značka: **EATON**

Objednáací číslo: **266193**

Produktová řada:

EAN: **4015082661939**

Elektroodpad: **Ano**

**Na objednávku**

Cena bez DPH za 1KS

**3 133,58 Kč**

3 791,63 Kč vč. DPH

Příspěvek na recyklaci: + **0,28 Kč / KS**

Minimální odběrové množství: **1,0 KS**

Balení: **1,0 KS**

Volitelné příslušenství k řadě výkonových spínačů NZM nabízí bohaté portfolio možností využití při nasazení na celém světě. Montáž je vždy pružná a jednoduchá díky modulárním funkčním skupinám. Upozornění: Nezapomenuté vypínání výkonového jističe NZM respektive vypínače N při poklesu řídicího napětí pod 35-70 % Us. Lze použít pro zařízení nouzového vypnutí ve spojení s tlačítkem nouzového vypnutí. Jestliže podpěťová spoušť je bez napětí, brání bezpečně dotyku hlavních kontaktů spínače při pokusech o zapnutí. Podpěťovou spoušť nelze instalovat současně s předběhajícím pomocným spínačem NZM...XHIV.. nebo podpěťovou spouští NZM...XA.. Lze použít pro: NZM4(-4), N(S)4(-4)

roboce	EATON
Značka	EATON
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz	208...240 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz	208...240 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC	0...0 V
Druh napětí pro spuštění	AC
Způsob elektrického připojení	Šroubové připojení
Počet spínacích kontaktů	0
Počet rozpínacích kontaktů	0
Počet přepínacích kontaktů	0
Zpožděné	NE
Vhodné pro výkonový spínač	ANO
Vhodné pro odpojovač	ANO
Vhodné pro spouštěč motoru (motorový jistič)	NE
Vhodné pro nadproudové relé	NE

Mohlo by vás také zajímat



**Motorový spouštěč 2,5A PKZM0-2,5-EA**

Kód: 1465498 | Skladem 20 a více ks

827,39 Kč

1 <sup>+</sup>  
- ks




**Chráníč proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA AC 6kA PFL6**

Kód: 1255511 | Skladem 20 a více ks

1 626,76 Kč

1 <sup>+</sup>  
- ks



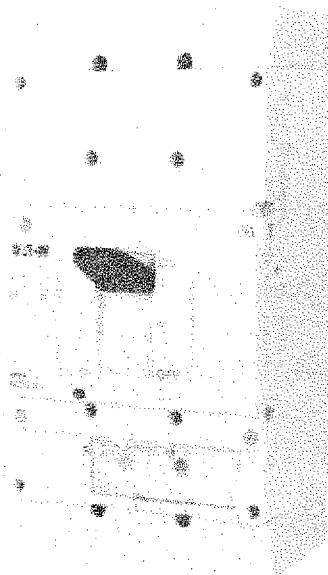

Kód: **1245319**

Výrobce: **EATON**

Označení typu: **NZMN4-AE800**

Značka: **EATON**

Objednací číslo: **265759**

Produktová řada:

EAN: **4015082657598**

Elektroodpad: **Ano**

**Na objednávku**

Cena bez DPH za 1KS

**37 911,16 Kč**

45 872,50 Kč vč. DPH

Příspěvek na recyklaci: + 24,83 Kč / KS

Minimální odběrové množství: **1,0 KS**

Balení: **1,0 KS**

Výkonové jističe řady NZM...-AE pokrývají pouze čtyřmi kompaktními konstrukčními velikostmi všechny případy použití a jsou vhodné pro trh IEC. Montáž je vždy pružná díky modulárním funkčním skupinám. S elektronickým spouštěčem na ochranu zařízení a kabelů. Upozornění: měření efektivní hodnoty a tepelná paměť

<b>Provozce</b>	EATON
<b>Značka</b>	EATON
<b>Jmenovitý trvalý proud I<sub>u</sub></b>	800 A
<b>Jmenovité napětí</b>	690...690 V
<b>Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I<sub>cu</sub> při 400 V, 50 Hz</b>	50 kA
<b>Rozsah nastavení vypínače proti přetížení</b>	400...800 A
<b>Rozsah nastavení krátkodobě zpožděné zkratové spouště</b>	0...0 A
<b>Rozsah nastavení nezpožděné zkratové spouště</b>	1600...9600 A
<b>Integrovaná ochrana závady uzemnění</b>	NE
<b>Způsob připojení hlavního obvodu</b>	Šroubové připojení
<b>Konstrukce přístroje</b>	Vestavný přístroj pevná vestavná technika
<b>Vhodné pro montáž na DIN lištu</b>	NE
<b>Montáž na DIN lištu volitelně</b>	NE
<b>Počet pomocných rozpínacích kontaktů</b>	0
<b>Počet pomocných spinacích kontaktů</b>	0
<b>Počet pomocných přepínacích kontaktů</b>	0
<b>Indikátor vypnutí možný</b>	NE
<b>S podpěřovou spouští</b>	NE
<b>Počet pólů</b>	3
<b>Pozice připojení hlavního proudového obvodu</b>	Vpředu
<b>Typ ovládacího prvku</b>	Páka
<b>Kompletní přístroj s ochranou jednotkou</b>	ANO
<b>Motorový pohon integrovaný</b>	NE
<b>Motorový pohon volitelně</b>	ANO
<b>Stupeň krytí (IP)</b>	IP20

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 73_PEL - Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy  Smlouva o dílo (SdD) ze dne 14.10. 2020  Ocelová konstrukce přístřešku, úprava výměry	SO a IO ve změně  <b>001 - ASŘ</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL č.12</b>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1002/57, Jihlava, 587 03

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span>  Vykresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna se týká navýšení tonáže oceli oproti VV. Rozdíl vzniká rozparem mezi částí ASŘ a statikou. Nové výměry jsou dle výrobní dokumentace, která byla zpracována dle původního statického výpočtu.

Změna se týká také navýšení tonáže v závislosti na změně kotvení ke stávající stěně. Kotvení totiž navazuje na ŽB věnec, jak předpokládá PD, ale vychází do dutého keramického zdiva.

Změna dále řeší úpravu ocelové konstrukce pro kotvení skla na závěsnou stěnu. Původní řešení bylo nevhodné vzhledem k tomu, že v rozpětí cca 10 m mezi sloupy, by ocelové konstrukce vlivem povětří pružila a sklo by praskalo. Proto dodavatel skla zvolil masivnější profily a navíc také vodorovný ztužující profil.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-5 536,39	<b>134 551,41 Kč</b>	<b>129 015,02</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 23.4.21	podpis
-----------------	---------------	---------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



IS PRACÍ

301 - ASŘ a statika

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
<b>Náklady rozpočtu celkem</b>							<b>129 015,02</b>	
<b>PRVKY</b>							<b>129 015,02</b>	
<b>Základní prvky</b>							<b>129 015,02</b>	
301	K	337173110	Montáž ocelová konstrukce skřeleli přístrojů pro osobní vozy - sloupky a průvlak	t	0,008	74 700,00	448,20	dle SoD
302	M	K203	průvlak ocelový železný svařovaný zářezový 200x200x8 mm průvlak a ocel Z2-2 01	t	0,126	43 870,00	5 486,58	dle SoD
			sloupky - profil 200x200x8, 47,00 kg/m -37 02x100x215, 2x+107, 87x1000 0,130					
303	M	130100001	průvlak ocelový zářezový svařovaný 140x81 2001 průvlak 11 370 průvlak a ocel Z2-2 01	t	0,132	43 870,00	5 772,86	dle SoD
			průvlak - NED 320, 81,3 kg/m -01,20x100x12 7+010, 74000 0,132					
304	K	441171111	Montáž ocelová konstrukce osvětlení (světelné, žroby) hmotností jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	0,786	74 700,00	58 670,58	dle SoD
305	M	130100001	průvlak ocelový zářezový svařovaný obdélníkový svařovaný 60x30x8mm průvlak a ocel Z2-2 01	t	0,180	43 870,00	7 896,60	dle SoD
			dle PS "světelný pás" - 11,2x 20, 0,614, 35x1000 0,478 "světelný pás" - 11,2x 30, 0,614, 35x1000 0,498 "světelný pás" - 12,4x 30, 0,614, 35x1000 0,612 "světelný pás" - 12,2x 30, 0,614, 35x1000 0,634 Světelný světelný B2 0,138 světelný B3 0,170 světelný B4 0,170 světelný B5 - 9 10 1,454 světelný B6 0,556 světelný B7 0,706 světelný B8 0,730					
306	K	K207	Montáž nosná konstrukce pro optiční zářivkové světla, rám z ocelových profilů, vyzářené sloupky	t	0,297	74 700,00	22 185,50	dle SoD
			průvlak Z2-2 01 odpínací pravoúhelný železný -4, 100x3 070 0,072 nosná železná -0,307x0 077+6 024 0,370 světelný 0,057					
310	M	140200003	průvlak ocelový zářezový svařovaný obdélníkový svařovaný 80x30x8mm průvlak Z2-2 01	t	0,275	43 870,00	11 062,75	dle SoD
			odpínací pravoúhelný železný rám z profilu 80x30x8mm, 8 kg/m -210, 22x12 710x1000 -0,150 nosná železná rám z profilu 100x100x8mm, 14,6 kg/m -112, 11x12 527+14 51000 0,107 světelný vodorovný profil 80x30x8mm, 8,4 kg/m -12 110 41000 0,077 světelný 0,076					
311	M	140200004	průvlak ocelový zářezový svařovaný obdélníkový svařovaný 60x30x8mm průvlak Z2-2 01	t	0,180	43 870,00	7 896,60	dle SoD
			odpínací pravoúhelný železný světelný vodorovný B 2x 80x30x8mm, 8,4 kg/m -01,20x 011000 0,073 nosná železná světelný vodorovný B 6x 80x30x8mm, 8,4 kg/m -02 001 011000 0,094 světelný 0,121					

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10.2020  <b>Neprovedené práce, změna truhlářského prvku T 2.207</b>	SO a IO ve změně  <b>001 - Architektonicko-stavební řešení a statika</b>	Číslo změny stavby  <b>ZL č.13</b>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeny dne 14.10.2020(dále jen Smlouva).

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**

Obsah  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										

\* nehadící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet položky "odstranění stromů ..." řeší pouze zdvojení této položky. Práce byly provedeny. Odpočet položky "podsypaní pro základové konstrukce ..." řeší odpočet neprovedeného množství. Položka měla chybnou výměru. Práce byly v adekvátním množství provedeny.

U truhlářského prvku T 2.207 bylo nutné zaměnit plexisklovou desku PMMA za bezpečnostní sklo. Důvodem je, že plexisklo by se použitím dezinfekcí rozleptalo. Dále by se v tomto provedení velmi vinilo a bylo by nebezpečí pádu a zranění pacientů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-38 047,50</b>	<b>38 357,00 Kč</b>	<b>309,50</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
-----------------	---------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednan v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# PRACÍ

Nemocnice Peňhřimov

.kt:

Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 05.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>309,50</b>	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				309,50	
			Ódpočet neprovedených prací				-38 047,50	
1	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	140,00	-420,00	dle SoD
2	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuňněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	-29,000	1 297,50	-37 627,50	dle SoD
			Změna truhlářského prvku T 2.207				38 357,00	
3	K	28515000	Truhlářský prvek T 2.207 - Záměna plexiskla za bezpečnostní sklo (43.860 Kč - 8.990 Kč)*1,1	kpl	1,000	38 357,00	38 357,00	vlastní, přiložena CN
							38 357,000	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Polhřimov -- rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020  SW a modul pro programování přístupových karet	SG a ID ve změně  <b>006 - Elektroinstalace SLP</b>	Číslo změny stavby  <b>ZL č.14</b>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14. 10. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESQX, spol. s r.o.

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> - Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, fádně zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 85%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skřítknout

Popis a zdůvodnění změny

Doplnění softwaru včetně licenčního klíče a modulů pro programování paměťových karet. Dle PD by byla nutná fyzická přítomnost každé karty pro její programování, což při množství zaměstnanců nelze. Proto je nutné toto doplnění, kdy takto již lze programovat karty na dálku. Toto PD neřešila.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>26 856,40 Kč</b>	<b>26 856,40</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/D, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Křibal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré.

006 - Elektromatřice - slaboproud Vícepráce č.4

Peřimov  
Kraj Vysočina  
PATROL group s.r.o.

8. 1. 2020  
SVAŽN s.r.o.  
Ing. Tomáš Alexi

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
Náklady souplau celkem							26 856,40	
0	2.4.7		Elektromatřice - slaboproud				26 856,40	
0	2.4.7.1		PZTS (ACS), OT, JČ				26 856,40	
0	2.4.7.1.1		PZTS ACS				21 197,90	
20	K	Pol167	klávesnice se čítačkou K841R	ks	1,000	5 487,90	5 487,90	vládní
21	K	Pol168	IP modul IP150+	ks	1,000	4 620,00	4 620,00	vládní
22	K	Pol169	softwaru NEWARE ACCESS včetně licenčního klíče	ks	1,000	6 090,00	6 090,00	vládní
26	K	Pol173	řadičova, nastavení a oživení počítačového systému	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	vládní
27	K	Pol174	Dobry elektromatřiční rozjezd	kpl	1,000	359,00	359,00	vládní
0	2.4.7.1.2		PZTS ACS				1 332,50	
39	K	Pol145	STP cert.6A B2ca	m	15,000	28,75	396,00	dle SoD
43	K	Pol189	Elektromatřiční hranata plastová fólie o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a spicetovacího materiálu	m	19,900	63,50	952,50	dle SoD
0	2.4.7.1.3		OCYATNÍ				4 400,00	
63	K	Pol205	NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU PZTS, ACS	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	vládní
68	K	Pol213	ZASKOLENÍ OBSLUHY	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	vládní

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Pelnýňov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10. 2020  Změna způsobu uložení odpadu na recyklační	SO a IO ve změně  <b>001 - ASŘ</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL č.15</b>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14. 10. 2020(dále jen Smlouva).

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 93

Zhotovitel: ESOX, spol. s r. o

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, postřehy <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Přijímač</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Přijímač	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Přijímač								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nahodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna uložení výkopku a stavebního odpadu - místo uložení na skládce změna na recyklační skládce. Doplněny položky pro třídění, drození, naložení a větší dopravní vzdálenost.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-191 363,42	189 833,81 Kč	-1 529,61

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Jiří Lukášek	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SOaIO, který je součástí výše uvedené Stavby budou provedeny změny, jelí jsou potřebné k zaplacení, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubal	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZEV) - krycí list

Číslo paré:

PRACÍ

001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Pelhřimov

8. 1. 2020

Kraj Vysočina

SVIZN s.r.o.

Vyplň údaj

Ing. Tomáš Ahoš

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustava
Náklady souhlasu celkem							-1 529,81	
0		HSV	Práce a dodávky HSV - obecné				-1 529,81	
0		J	Zemní práce				57 245,47	
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (nákladové) zeminy a kameniva zakřísněno do Katalogu odpadů pod kódem 170 564	t	70,254	130,80	9 168,15	dle SoD
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (nákladové) štěrku odpadu 17 05 04	t	70,254	253,00	17 774,26	CS ÚRS 2021 01
	K	167151101	Nakládání vykopky z hornin třídy těžkosti 1, skupiny 1 až 3 do 100 m <sup>3</sup>	t	70,254	140,00	9 935,56	CS ÚRS 2021 01
	K	097006005	Drobný stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravnou do 100m a naložením	t	35,127	74,70	2 623,09	CS ÚRS 2021 01
			70 254 50%		35,127			
15	K	182701109	Vodovodné přemíslní výkopky nebo výsypky po suchu na ušlýém dopravním prostředku, bez naložení vykopky, avšak se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dělník i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	702,540	51,50	36 180,81	dle SoD
			70 254 20%		140,508			
0		5	Komunikace pozemní				-58 779,05	
70	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (nákladové) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zakřísněno do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	-162,747	1 118,50	-182 185,27	dle SoD
70	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (nákladové) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků štěrku odpadu 17 01 07	t	162,747	232,00	37 757,30	CS ÚRS 2021 01
	K	097006002	Výhlední stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	162,747	144,50	23 435,57	CS ÚRS 2021 01
	K	097221011	Nakládání suš na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	162,747	165,00	26 853,26	CS ÚRS 2021 01
	K	097006005	Drobný stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravnou do 100m a naložením	t	81,374	74,70	6 078,89	CS ÚRS 2021 01
			702 747 50%		40,687			
69	K	097013509	Důkaz státi a vybouraných hmot na smědku nebo rezavědku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dělník i započatých 1 km plus 1 km	t	3 254,040	9,08	29 294,48	dle SoD
			162 747 50%		1 627,020			

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>73_PEL - Nemocnice Polihřívov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10.2020 Demontáž, úprava a montáž operačního svítidla	SO a IO ve změně  <b>001 - ASŘ</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL č.16</b>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10.2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žitná 1882/57, Jihlava, 587 93**

Zhotovitel: **ESOK, spol. s r.o.**

Oblast:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>  Další dotazy nezbytné pro popis, fédné zřevodnění, dotazování a ocenění změny - počet listů A4 (vložeeno zsmoutaině) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Průběž. č.</td> <td style="width: 85%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Průběž. č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Průběž. č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Dopad do termínu	<b>ANO / NE *</b>						
Dopad do termínu	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se škrtnout

**Popis a zdůvodnění změny:**

V místnosti 2.006 bylo nutno demontovat operační svítidlo vzhledem ke kolizi s novou stěnou. Demontováno se bezpečně uloží. Toto svítidlo je nutno namontovat na nové umístění v místnosti 2.006, kvůli k speciálnímu kotvenímu prvku a upravit na rozměr místnosti.

Ukládá: v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Menoprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Menoprací a Víceprací celkem
0	44 000,00 Kč	44 000,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodávky smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lutsíček	datum	podpis
Objednatel a zhotovitel se souhlasí se touto výše uvedenou SOUHLASÍ K SOUHLASÍ VÝŠE UVEDENÉ STAVBY BUDOU PŘEVODĚNÝ ZMĚNOU JEJÍ PRO PODPISOVÉ PŘESUNY ZDŮVODNĚNÝ DOKLADOVANÝ A OCENĚNÝ V DOKUMENTACI ZMĚNY, JEJÍŽ SOUHLASÍ JE I TOUTO EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY. TOUTO EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY BYL PROJEDNÁN A SOUHLASU SE ZAHŮJANOU O DÍLO.			
Objednatel	Ing. Jan Kolína	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubel	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Marek Brandl	datum	podpis
Změna stavby (ZOV) - krycí list	Číslo paré:		



001 - Architektonicko-ústavňací fees a statika

Pečersnov

8. 1. 2020

Kraj Východná

SMIŽN s r.o.

Výplň úkolu

Ing. Tomáš Alexi

PO	Typ	Nod	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [CZK]	Celková cena [CZK]	Cena za jednotku
Náklady spoločne celkom							44 000,00	
0		HSV	Práce a dodávky HSV - úbežné				44 000,00	
0		1	Demontáže				44 000,00	
1	K		Demontáž operačného stĺpika v intenzite 2.000, inovácie, otáčací ochranný fóli, uložení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	ks/ks
2	K		Kontrola povrchu operačného stĺpika	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	ks/ks
3	K		Upravenie povrchu operačného stĺpika na rozdielnu veľkosť stĺpikov	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	ks/ks
4	K		Rekonštrukcia stĺpika	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	ks/ks
