



TSKRP009X0Y9

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Nedokončená, most X 670, P 15 - běžná údržba“

číslo smlouvy **Objednatel:** TSK – 3/20/4056/207/1

číslo smlouvy **Zhotovitele:** SDI/ZOAA/841/TC/ZO/2020/015

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Pavel Černožorský, asistent vedoucího odd. správy mostů

Radek Vorel, technik odd. správy mostů

dále také jako „Objednatel“

2. Zhotovitel: STRABAG [REDACTED]

Sídlo: [REDACTED] 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Císařem a Ing. Irenou Sedmíkovou, zmocněnci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Irena Sedmíková, ekonomická vedoucí oblasti Mosty,
Ing. František Císař, pověřený technickým vedením oblasti Mosty

- ve věcech technických: Josef Nejedlík, vedoucí provozní jednotky Mosty Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Josef Nejedlík, vedoucí provozní jednotky Mosty Praha

Email pro účely fakturace: [REDACTED]

dále také jako „Zhotovitel“

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK – 3/20/4056/207 ze dne 23. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny (vícepráce):

Při předání staveniště a předání stavby byla zjištěna skutečnost, že v místě navrhovaných nových mostních závěrů je osazen původní zádržný systém, který nevyhovuje novým platným technickým normám. V rámci RDS je nezbytné provedení nového zádržného systému přes mostní závěr dle TP 128 (elektro izolovaná svodnice) včetně doplnění chybějících 6 ks směrových sloupků modré barvy upozorňující na možnost častého výskytu náledí nebo mlhy na mostech.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se v části vyčíslení ceny mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	2 452 041,07 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	71 673,12 Kč
Cena celkem bez DPH:	2 523 714,19 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec 6 následujícího znění:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy

v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

2. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec 7 následujícího znění:

7. Email pro účely fakturace: [REDACTED]

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle odst. 3 tohoto článku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – ZBV – Svodidla - vícepráce
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc k podpisu Dodatku – Ing. F. Císař, Ing. I. Sedmíková
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

[REDACTED]

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

za Zhotovitele

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. František Císař
zmocněnec



[REDACTED]

Ing. Irena Sedmíková
zmocněnec

Vícepráce – Nedokončená, most X 670, P 15 – běžná údržba

Při předání staveniště a předání stavby byla zjištěna skutečnost, že v místě navrhovaných nových mostních závěrů je osazen původní zádržný systém, který nevyhovuje novým normám. V rámci RDS je nezbytné provedení nového zádržného systému přes mostní závěr dle TP 128 (elektro izolovaná svodnice) včetně doplnění chybějících 6 ks směrových sloupků modré barvy upozorňující na možnost častého výskytu náledí nebo mlhy na mostech.

Foto původní stav

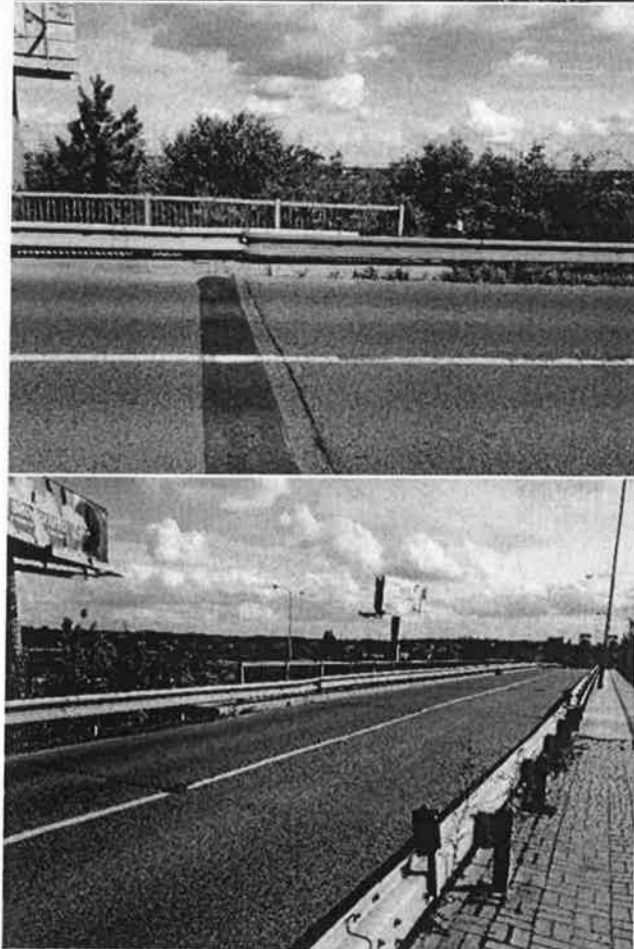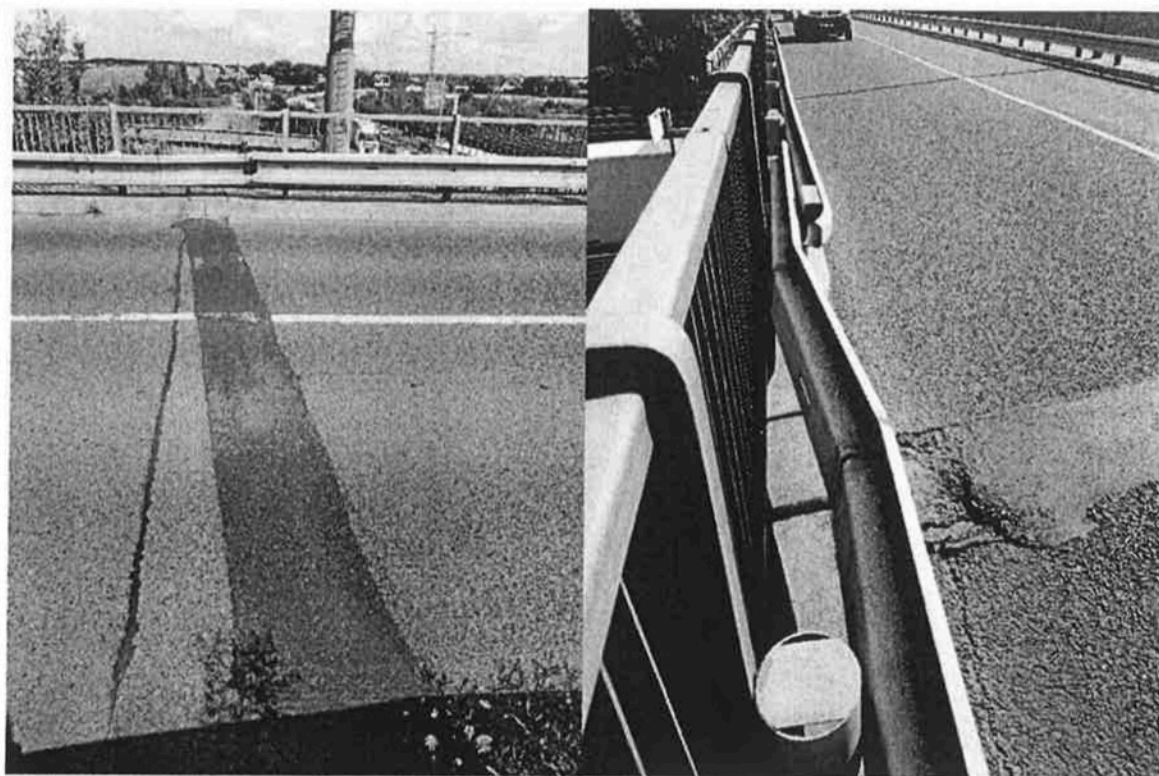



ZBV - Svodidla

Stavba: _Most X-670 Nedokončená, nadjezd ŠR, zpracování DVZ a průzkum IS – výměna MZ a opravné práce_koef1,043

71 673,12

Rozpočet: Most

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
	91150	R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA A MONTÁŽ - SVODNICE včetně dilatačního dílu	m	24,000	2 900,63	69 615,12	individuální kalkulace
			položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodnice - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,000	343,00	2 058,00	OTS KP2020
			položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					

PLNÁ MOC

Obchodní firma **STRABAG a.s.** se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 608 38 744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634, jejímž jménem jednají Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

zmocňuje své zaměstnance:

Ing. František CÍSAŘ, [redacted] *pověřen technickým vedením oblasti Mosty,*

Ing. Irena SEDMÍKOVÁ, [redacted] *- ekonomická vedoucí oblasti Mosty,*

Ing. Tomáš PTÁČEK, [redacted] *- vedoucí obchodně technického úseku oblasti Mosty*

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.
- Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.
- Zmocněnci mohou dále zplnomocnit další osoby v rozsahu výše uvedené plné moci.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 4.1.2021

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. František Císař
pověřen technickým vedením
oblasti Mosty

[redacted]
Ing. Irena Sedmíková
ekonomická vedoucí
oblasti Mosty

[redacted]
Ing. Tomáš Ptáček
vedoucí OTÚ
oblasti Mosty
