



TS-217/OEO-2017

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

u objednatele evidované pod číslem TS-570/OEO-2016  
u zhotovitele evidované pod číslem SOD 16 - 017

**název akce: „MV – Praha 7 – Stromovka – rekonstrukce a zateplení střechy atletické haly dle projektové dokumentace“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

**Název:** **Centrum sportu Ministerstva vnitra**  
organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008.

**Sídlo:** Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

**IČO:** 75151898

**DIČ:** nejsme plátcí DPH

**Bankovní spojení:** Česká národní banka, pobočka Praha 1

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Zastoupená:** Ing. Jiřím Beranem, ředitelem Centra sportu Ministerstva vnitra

**Kontaktní osoba:** Bc. Michal Janků, tel.: [REDACTED]

**Telefon:** [REDACTED]

**Fax:** [REDACTED]

**E-mail:** [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Název:** **PROXIMA a.s.**

**Sídlo:** Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

**Kontaktní adresa:** Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

**IČO:** 60916478

**DIČ:** CZ60916478

**Její jménem jedná:** Ing. Karel Chorvát, statutární ředitel

**Kontaktní osoba:** Ing. Rudolf Jiran

**Bankovní spojení:** KB Praha 6

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Telefon:** [REDACTED]

**Fax:** [REDACTED]

**E-mail:** [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evidované pod číslem TS-570/OEO-2016 (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

**I. OZNAČENÍ SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATELE – ZMĚNA NÁZVU OBJEDNATELE**

**Ministerstvo vnitra jako zřizovatel objednatele vydalo opatření (pod č. j.: MV-128332-8/OZF-2015), kterým se mění Zřizovací listina Centra sportu Ministerstva vnitra.** Tato změna Zřizovací listiny spočívá konkrétně ve změně názvu Centra sportu Ministerstva vnitra, kdy **nově název zní OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.** Došlo pouze ke změně názvu objednatele a veškeré ostatní ustanovení Zřizovací listiny objednatele zůstávají v platnosti nezměněna.

Na základě výše uvedeného v souladu s Článkem X. odst. 1 a Článkem XIII. odst. 5 smlouvy o dílo **po vzájemné shodě smluvních stran se mění ustanovení Článku I. smlouvy o dílo, konkrétně označení Smluvní strany objednatele takto:**

„Článek I.  
Smluvní strany

Název:	<b>OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA</b> organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008.
Sídlo:	Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
IČO:	75151898
DIČ:	nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu:	
Zastoupená:	Ing. Jirím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Kontaktní osoba:	Bc. Michal Janků, tel.: 
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	

(dále jen „objednatel“)

**Ostatní ustanovení Článku I. smlouvy o dílo Smluvní strany zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.**

**II. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA – DOPLNĚNÍ**

Tímto článkem se doplňuje čl. III – *ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA* – odstavec 5. smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany se s ohledem na nepříznivý vliv klimatických podmínek během zimního období, během kterého mělo být dílo realizováno, dohodly na přerušení výstavby díla, a to v období od 3. 12. 2016 do 21. 3. 2017. Stavební práce na díle budou opětovně započaty ode dne 22. 3. 2017 a budou dokončeny nejpozději do 3. 7. 2017 (tj. dílo tak bude dokončeno a předáno nejpozději do 3. 7. 2017), a to vše za současné dodržení podmínky splnění celkové stanovené lhůty pro realizaci a dokončení díla, která je uvedena v čl. III. odst. 5 smlouvy.

Harmonogram prací plánovaný a Harmonogram prací se zohledněním nepříznivých klimatických podmínek tvoří přílohu č. 2 a č. 1 toho dodatku, které se stávají nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní ustanovení Článku III. smlouvy o dílo ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.**

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-570/OEO-2016 u zhotovitele evidované pod č. SOD 16 - 017 zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-570/OEO-2016 u zhotovitele evidované pod č. SOD 16 - 017.

#### Přílohy:

- č. 1 *Harmonogram prací se zohledněním nepříznivých klimatických podmínek (1 list).*
- č. 2 *Harmonogram prací plánovaný (1 list).*

V Praze dne 14.03.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Jiří Beran  
ředitel  
OLYMP CENTRUM SPORTU  
MINISTERSTVA VNITRA

OLYMP  
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA  
Cisafským mynĚm 1063  
170 06 Praha 7  
-3-

  
Ing. Karel Chorvát  
statutární ředitel  
PROXIMA a.s.

  
PROXIMA a.s.  
STAVĚRNÍ SPOLEČNOST  
Číslo účtu: 251603/0100  
IČO: 251603010



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci															
					XII 2016	I 2017	II 2017	III 2017	IV 2017	V 2017	VI 2017	VII 2017	VIII 2017	IX 2017	X					
1	Převzetí staveniště.	0 dny	28.11.16	28.11.16																
2	Zařízení staveniště.	3 dny	28.11.16	30.11.16																
3	Přerušení stavby z klimatických důvodů	0 dny	3.12.16	3.12.16																
4	Zahájení prací v roce 2017	0 dny	22.3.17	22.3.17																
5	Zajištění vstupů do haly.	3 dny	22.3.17	24.3.17																
6	Odstranění hromosvodu.	7 dny	22.3.17	28.3.17																
7	Příprava střechy (v několika etapách)	55 dny	28.3.17	21.5.17																
8	Lešení.	45 dny	28.3.17	11.5.17	176FS-1 den															
9	Odstranění doplňků střešního pláště.	45 dny	31.3.17	14.5.17	8SS+3 dny															
10	Odstranění asfaltové krytiny a bonských šindelů.	45 dny	1.4.17	15.5.17	9SS+1 den															
11	Odstranění dřevěného bednění vč. odhřebikování a uložení pro zpětné použití.	45 dny	4.4.17	18.5.17	10SS+3 dny															
12	Odstranění původní minerální vaty a pojistné izolace.	45 dny	7.4.17	21.5.17	11SS+3 dny															
13	Realizace střechy (v několika epatach)	76 dny	9.4.17	23.6.17																
14	Prohlídka mykologem.	45 dny	9.4.17	23.5.17	12SS+2 dny															
15	Ochranný nátěr dřevěných kci.	45 dny	10.4.17	24.5.17	14SS+1 den															
16	Minerální izolace vč. zajištění proti sesunutí.	45 dny	11.4.17	25.5.17	15SS+1 den															
17	Celoplošné bednění.	45 dny	18.4.17	1.6.17	16SS+7 dny															
18	Pojistná fólie.	45 dny	21.4.17	4.6.17	17SS+3 dny															
19	Kontralatě a latě.	45 dny	24.4.17	7.6.17	18SS+3 dny															
20	Velkoformátová krytina.	45 dny	27.4.17	10.6.17	19SS+3 dny															
21	Detaily napojení a prověťování.	45 dny	4.5.17	17.6.17	20SS+7 dny															
22	Dokončovací práce - zpětná mtž doplňků střešního pláště.	45 dny	7.5.17	20.6.17	21SS+3 dny															
23	Dmtž lešení.	45 dny	10.5.17	23.6.17	22SS+3 dny															
24	Montáž hromosvodu.	14 dny	11.6.17	24.6.17	20															
25	Úklid a drobné dokončovací práce.	14 dny	20.6.17	3.7.17	23FS-4 dny															
26	Předání stavby.	0 dny	3.7.17	3.7.17	25															

22.3. Zahájení prací v roce 2017

22.3. Zajištění vstupů do haly.

22.3. Odstranění hromosvodu.

28.3. Lešení.

31.3. Odstranění doplňků střešního pláště.

1.4. Odstranění asfaltové krytiny a bonských šindelů.

4.4. Odstranění dřevěného bednění vč. odhřebikování a uložení pro zpětné použití.

7.4. Odstranění původní minerální vaty a pojistné izolace.

9.4. Prohlídka mykologem.

10.4. Ochranný nátěr dřevěných kci.

11.4. Minerální izolace vč. zajištění proti sesunutí.

18.4. Celoplošné bednění.

21.4. Pojistná fólie.

24.4. Kontralatě a latě.

27.4. Velkoformátová krytina.

4.5. Detaily napojení a prověťování.

7.5. Dokončovací práce - zpětná mtž doplňků střešního pláště.

10.5. Dmtž lešení.

11.6. Montáž hromosvodu.


20.6. Úklid a drobné dokončovací práce.

3.7. Předání stavby.

Úkol	Vnější úkoly	Pouze s dobou trvání
Milník	Souhrn projektu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Souhrnný	Seskupit podle souhrnu	Ruční souhrn
Zahrnutý úkol	Neaktivní úkol	Pouze zahájení
Zahrnutý milník	Neaktivní milník	Pouze s datem dokončení
Zahrnutý průběh	Neaktivní souhrn	Průběh
Rozdělení	Ruční úkol	

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
PROXIMA a.s.  
Chrabře de Gaule 3, 160 00 Praha 6  
IČO: 603 16478 DIČ: CZ60316478 (1)



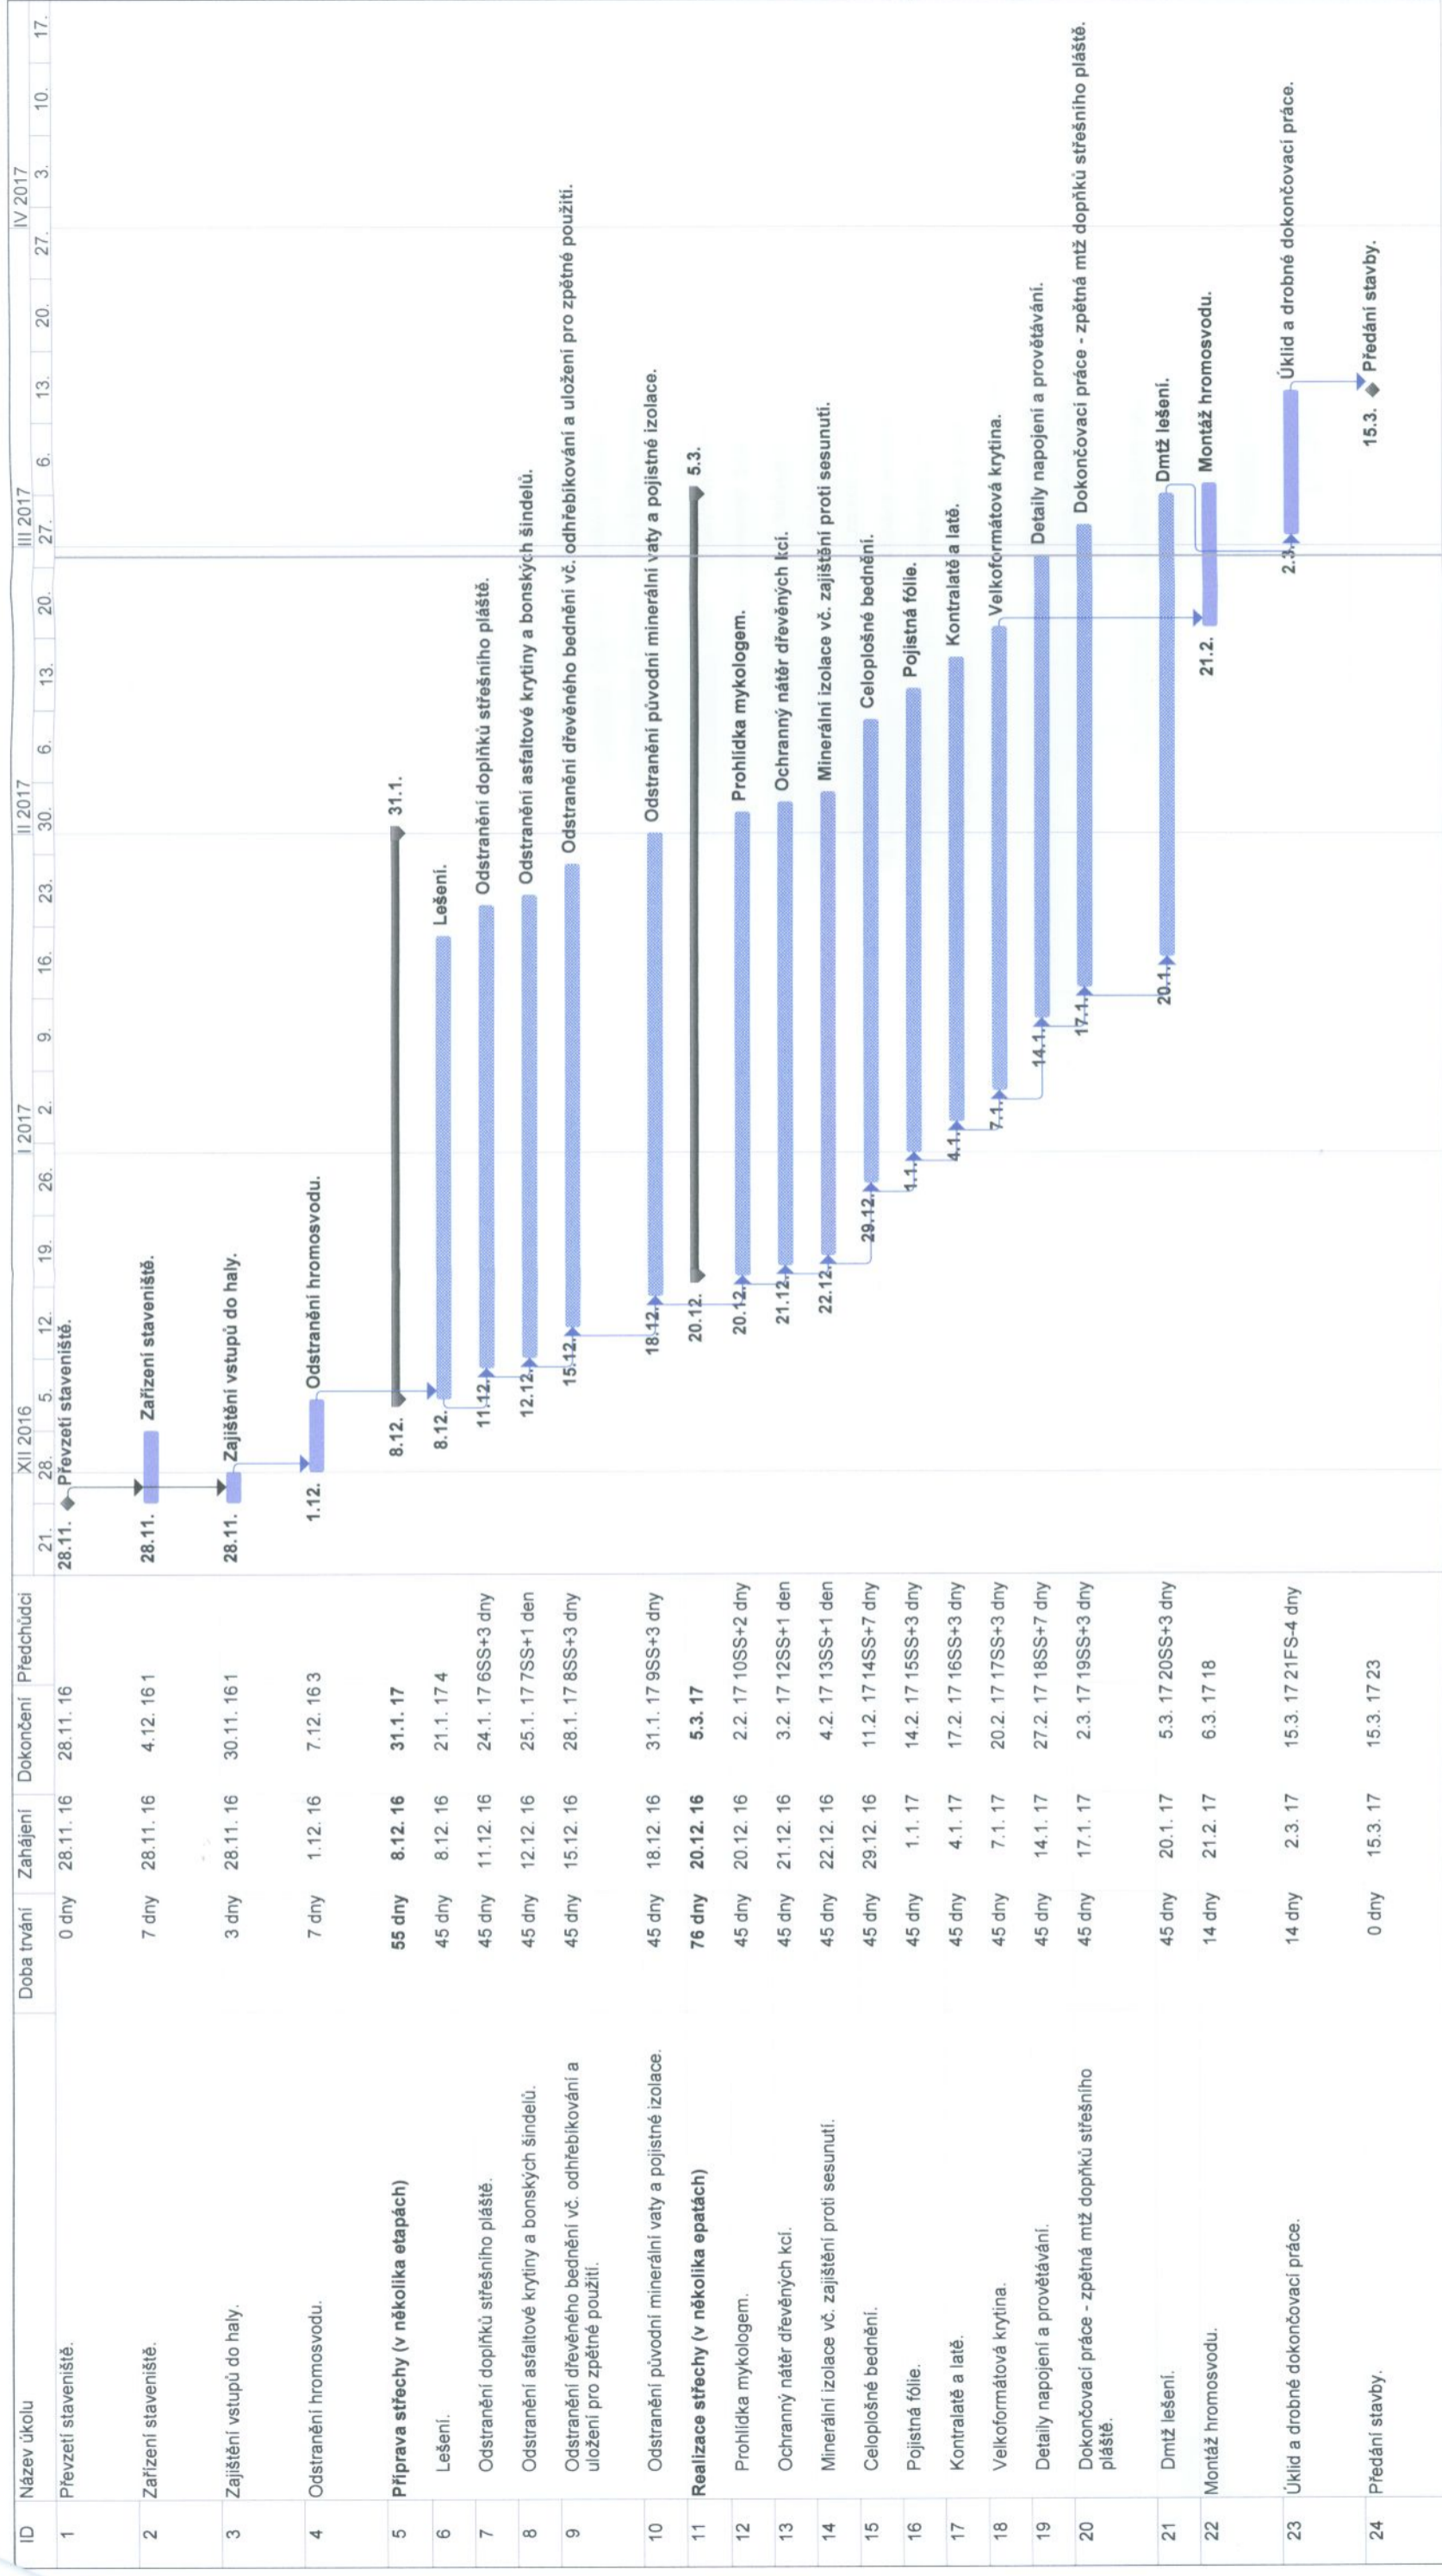

**Střešní plášť atletické haly Otakara Jandery Centrum sportu MV ČR**

**Harmonogram prací plánovaný**
