



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.				
Investor:	Ministerstvo vnitra ČR	Datum:			
Název akce: Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti – CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Oprava vzduchotechniky (VZT)					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po provedení kontroly stávajících vzduchotechnických jednotek a rozvodů na střeše objektu 03.1 bylo zjištěno, že stav rozvodů je degradující a nelze provést přesunutí na nově zateplenou střechu bez poškození tohoto potrubí. Přesun VZT jednotek, se zaručením jejich následné provozuschopnosti, není možné bez jejich odpojení a vypuštění chladící kapaliny.					
Je nutné provést demontáž stávajících rozvodů a nahrazením za nové a provedení odpojení VZT jednotek s vypuštěním chladící kapaliny a po přesunutí jejich opětovné napojení s napuštěním chladící kapaliny.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Po provedení demontáže VZT byl zjištěn skutečný stav rozvodů vzduchotechniky. Na základě zjištěných skutečností bylo nutné z důvodu řádného provozu vzduchotechniky (VZT) a dodržení hygienických norem provést úpravu rozvodů VZT a doplnění zařízení.					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					




Stanovisko technického dozoru

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického speci

Souhlasím. Změna nemá vliv na

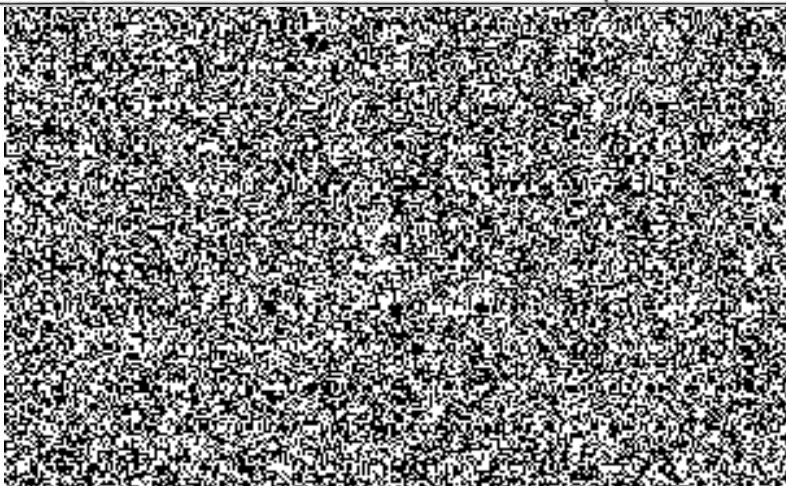

Příloha: Dodávka úpravy VZT jsou vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla bude o tyto práce navýšena (podrobně viz. příloha č. 1 a 2 tohoto ZL - doplněný rozpočet Budova 3 a fotografie).



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava vzduchotechniky (VZT)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po provedení kontroly stávajících vzduchotechnických jednotek a rozvodů na střeše objektu 03.1 bylo zjištěno, že stav rozvodů je degradující a nelze provést přesunutí na nově zateplenou střechu bez poškození tohoto potrubí. Přesun VZT jednotek, se zaručením jejich následné provozuschopnosti, není možné bez jejich odpojení a vypuštění chladící kapaliny.</p> <p>Je nutné provést demontáž stávajících rozvodů a nahrazením za nové a provedení odpojení VZT jednotek s vypuštěním chladící kapaliny a po přesunutí jejich opětovné napojení s napuštěním chladící kapaliny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	550.212,00 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
550.212,00 ,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá zadání kázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MINISTERSTVO VNITRA ČR Policejní prezidium ČR 	APZB t Vojtěch Nové Město IČO 	
Datum: 29-01-2021	Datum: 29-01-2021	

Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet	01	Vlastní objekt 03	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
093	Zateplení objektu 03		Náklady na m.j.	
Projektant	STAVARO SPOL. s r.o.		Typ rozpočtu	
	Bílková 855/19, Praha			
Objednatel				
Dodavatel	APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			0,00
PSV			550 212,00
MON			0,00
Ostatní náklady	%	provozní vlivy	0,00
Vedlejší náklady	%	zařízení staveniště	0,00
Celkem			550 212,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		550 212,00 CZK
DPH	21 %		115 544,52 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			665 756,52 CZK

Popis :

Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba :	093 Zateplení objektu 03	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav	Vlastní objekt 03	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Díl	Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV		0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		0,00
38	Kompletní konstrukce	HSV		0,00
5	Komunikace	HSV		0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		0,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00
711	Izolace proti vodě	PSV		0,00
712	Povlakové krytiny	PSV		0,00
713	Izolace tepelné	PSV		0,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,00
728	Vzduchotechnika	PSV		550 212,00
731	Kotelny	PSV		0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV		0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00
783	Nátěry	PSV		0,00
784	Malby	PSV		0,00
M21	Elektromontáže	MON		0,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		0,00
	CELKEM OBJEKT			550 212,00

Položkový rozpočet - změnové listy

S:	093	Zateplení objektu 03
O:	01	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R:	01	Vlastní objekt 03

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		1	Zemní práce				0,00
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl:		38	Kompletní konstrukce				0,00
Díl:		5	Komunikace				0,00
Díl:		61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
Díl:		62	Úpravy povrchů vnější				0,00
Díl:		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
Díl:		93	Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00
Díl:		94	Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl:		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
Díl:		96	Bourání konstrukcí				0,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:		711	Izolace proti vodě				0,00
Díl:		712	Povlakové krytiny				0,00
Díl:		713	Izolace tepelné				0,00
Díl:		721	Vnitřní kanalizace				0,00
Díl:		728	Vzduchotechnika				550 212,00
VP ZL02	001.ZL02		VZT potrubí 560x355 , demontáž, pozink plech s tepelnou izolací	m	15,00000	595,00	8 925,00
VP ZL02	002.ZL02		VZT potrubí 560x355, dodávka nového, pozink plech	m	15,00000	2 519,00	37 785,00
VP ZL02	003.ZL02		Tepelná izolace a oplechování, minerální vata, pozink plech	m	15,00000	2 250,00	33 750,00
VP ZL02	004.ZL02		VZT potrubí 500x500 , demontáž, pozink plech s tepelnou izolací	m	18,00000	595,00	10 710,00
VP ZL02	005.ZL02		VZT potrubí 560x355, dodávka nového, pozink plech	m	18,00000	2 519,00	45 342,00
VP ZL02	006.ZL02		Tepelná izolace a oplechování, minerální vata, pozink plech	m	18,00000	2 250,00	40 500,00
VP ZL02	007.ZL02		Zvednutí kondenzátoru 300kg, vč konzole, chladiva, odsátí chladiva, odpojení, zpětná montáž, doplnění chladiva	kus	1,00000	68 000,00	68 000,00
VP ZL02	008.ZL02		Přesunutí venkovních kondenzátorů, odsátí chladiva, odpojení, zpětná montáž, doplnění chladiva	kus	14,00000	21 800,00	305 200,00
Díl:		731	Kotelny				0,00
Díl:		762	Konstrukce tesařské				0,00
Díl:		764	Konstrukce klempířské				0,00
Díl:		766	Konstrukce truhlářské				0,00
Díl:		767	Konstrukce zámečnické				0,00
Díl:		783	Nátěry				0,00
Díl:		784	Malby				0,00
Díl:		M21	Elektromontáže				0,00
Díl:		M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00

