



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+</b>			číslo OZ: <b>10</b>		
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice				
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 19.5.2020			
Název akce: <b>Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší</b>					
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	<b>viz. příloha</b>			
	na výkresy:	<b>viz. příloha</b>			
	na rozpočtové podklady:	<b>viz. příloha</b>			
	na jinou část smlouvy:	-			
<b>Stavební objekt</b> (číslo a název): <b>TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice</b>					
<b>Původní řešení:</b> Úprava ploch a skladeb místních komunikací byla v projektové dokumentaci určena v na šířku rýhy 1,035 m.					
<b>Popis problému:</b> Geologické podmínky způsobily nepředvídatelné rozšíření výkopů na až 1,8 m, což bylo podrobně vysvětleno ve ZL č.4 a č.8. Při těchto výkopech došlo pak i k popraskání a následné destrukci asfaltových povrchů, které původně měly vydržet. Především se tak stalo v části úzkých pásů asfaltových krytů, které zbyly mezi skutečným okrajem rýhy a krajnici vozovek jen v šíře do 0,5 m.					
<b>Návrh řešení:</b> Na základě výše uvedených skutečností byla provedena pasportizace skutečně poškozených asfaltových povrchů a místních komunikací, které budou opraveny ve shodě s jejími technickými podmínkami.					
<b>Zdůvodnění řešení:</b> V návaznosti na zdůvodnění zvýšených zemních prací ve ZL-4 až ZL-8 došlo i k poškození asfaltových povrchů. Jedná se o nepředvídatelnou událost, kterou je nutno opravou komunikací napravit.					
Počet připojených listů specifikací:					
<b>Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222:</b> Navržená změna nemění povahu stavby, navržený materiál změny je kvalitativně vyšší než původně navržený materiál v projektové dokumentaci.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b> zhotovitel					
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> souhlas daný podpisem [redacted]					
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> souhlas daný podpisem [redacted]					
<b>Přílohy:</b> POZ 10/1 - položkový rozpočet POZ 10/2 - situace POZ 10/3 - vzor rýhy POZ 10/4 - fotodokumentace POZ 10/5 - pasportizace					



POZ-10.1

## Rozpočet více-méně prací

stavba: Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší

## Rekapitulace rozpočtu ZL č.10

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena včetně DPH</i>
Vícepráce	1 180 455,50	247 895,66	1 428 351,16
Méněpráce	0,00	0,00	0,00
<b><u>Více-méně práce celkem</u></b>	<b><u>1 180 455,50</u></b>		<b><u>1 428 351,16</u></b>

## Rozpočet více prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší**

<b>kód položky</b>	<b>popis</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena</b>	<b>cekem</b>	<b>pozn.</b>
--------------------	--------------	-----------	-----------------	-------------	--------------	--------------

### Živice na místních komunikacích

#### **TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice**

<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcené	m2	978,000	23,90	23 374,20	
113107182	Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm strojně pl	m2	947,000	57,60	54 547,20	ÚRS
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					
573111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem	m2	978,000	32,00	31 296,00	
565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované k	m2	978,000	249,00	243 522,00	
573211109	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfa	m2	947,000	15,00	14 205,00	
577144131	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS III) tř. I tl	m2	947,000	280,00	265 160,00	
5771111111	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komi	m2	947,000	150,00	142 050,00	
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
919735111.1	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	3 289,500	65,10	214 146,45	
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	400,620	43,30	17 346,85	
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkýc	t	3 605,580	10,10	36 416,36	
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou c	t	400,620	168,00	67 304,16	
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na sl	t	250,008	200,00	50 001,60	
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skl	t	150,612	140,00	21 085,68	

#### **Vícepráce celkem**

**1 180 455,50**

## Rozpočet méně prací

stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

<i>kód položky</i>	<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena</i>	<i>cekem</i>	<i>pozn.</i>
--------------------	--------------	-----------	-----------------	-------------	--------------	--------------

### Živice na místních komunikacích

TZ 01.1 Kanalizační stoky (Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)

1	Zemní práce					
---	-------------	--	--	--	--	--

**Méněpráce celkem**

**0,00**

POZ-10.2

ČS-A

Kabrdův vrch  
370

Mniší

Vlčovice


380

Harka  
410


VLČOVICE

389

Holý vrch  
487

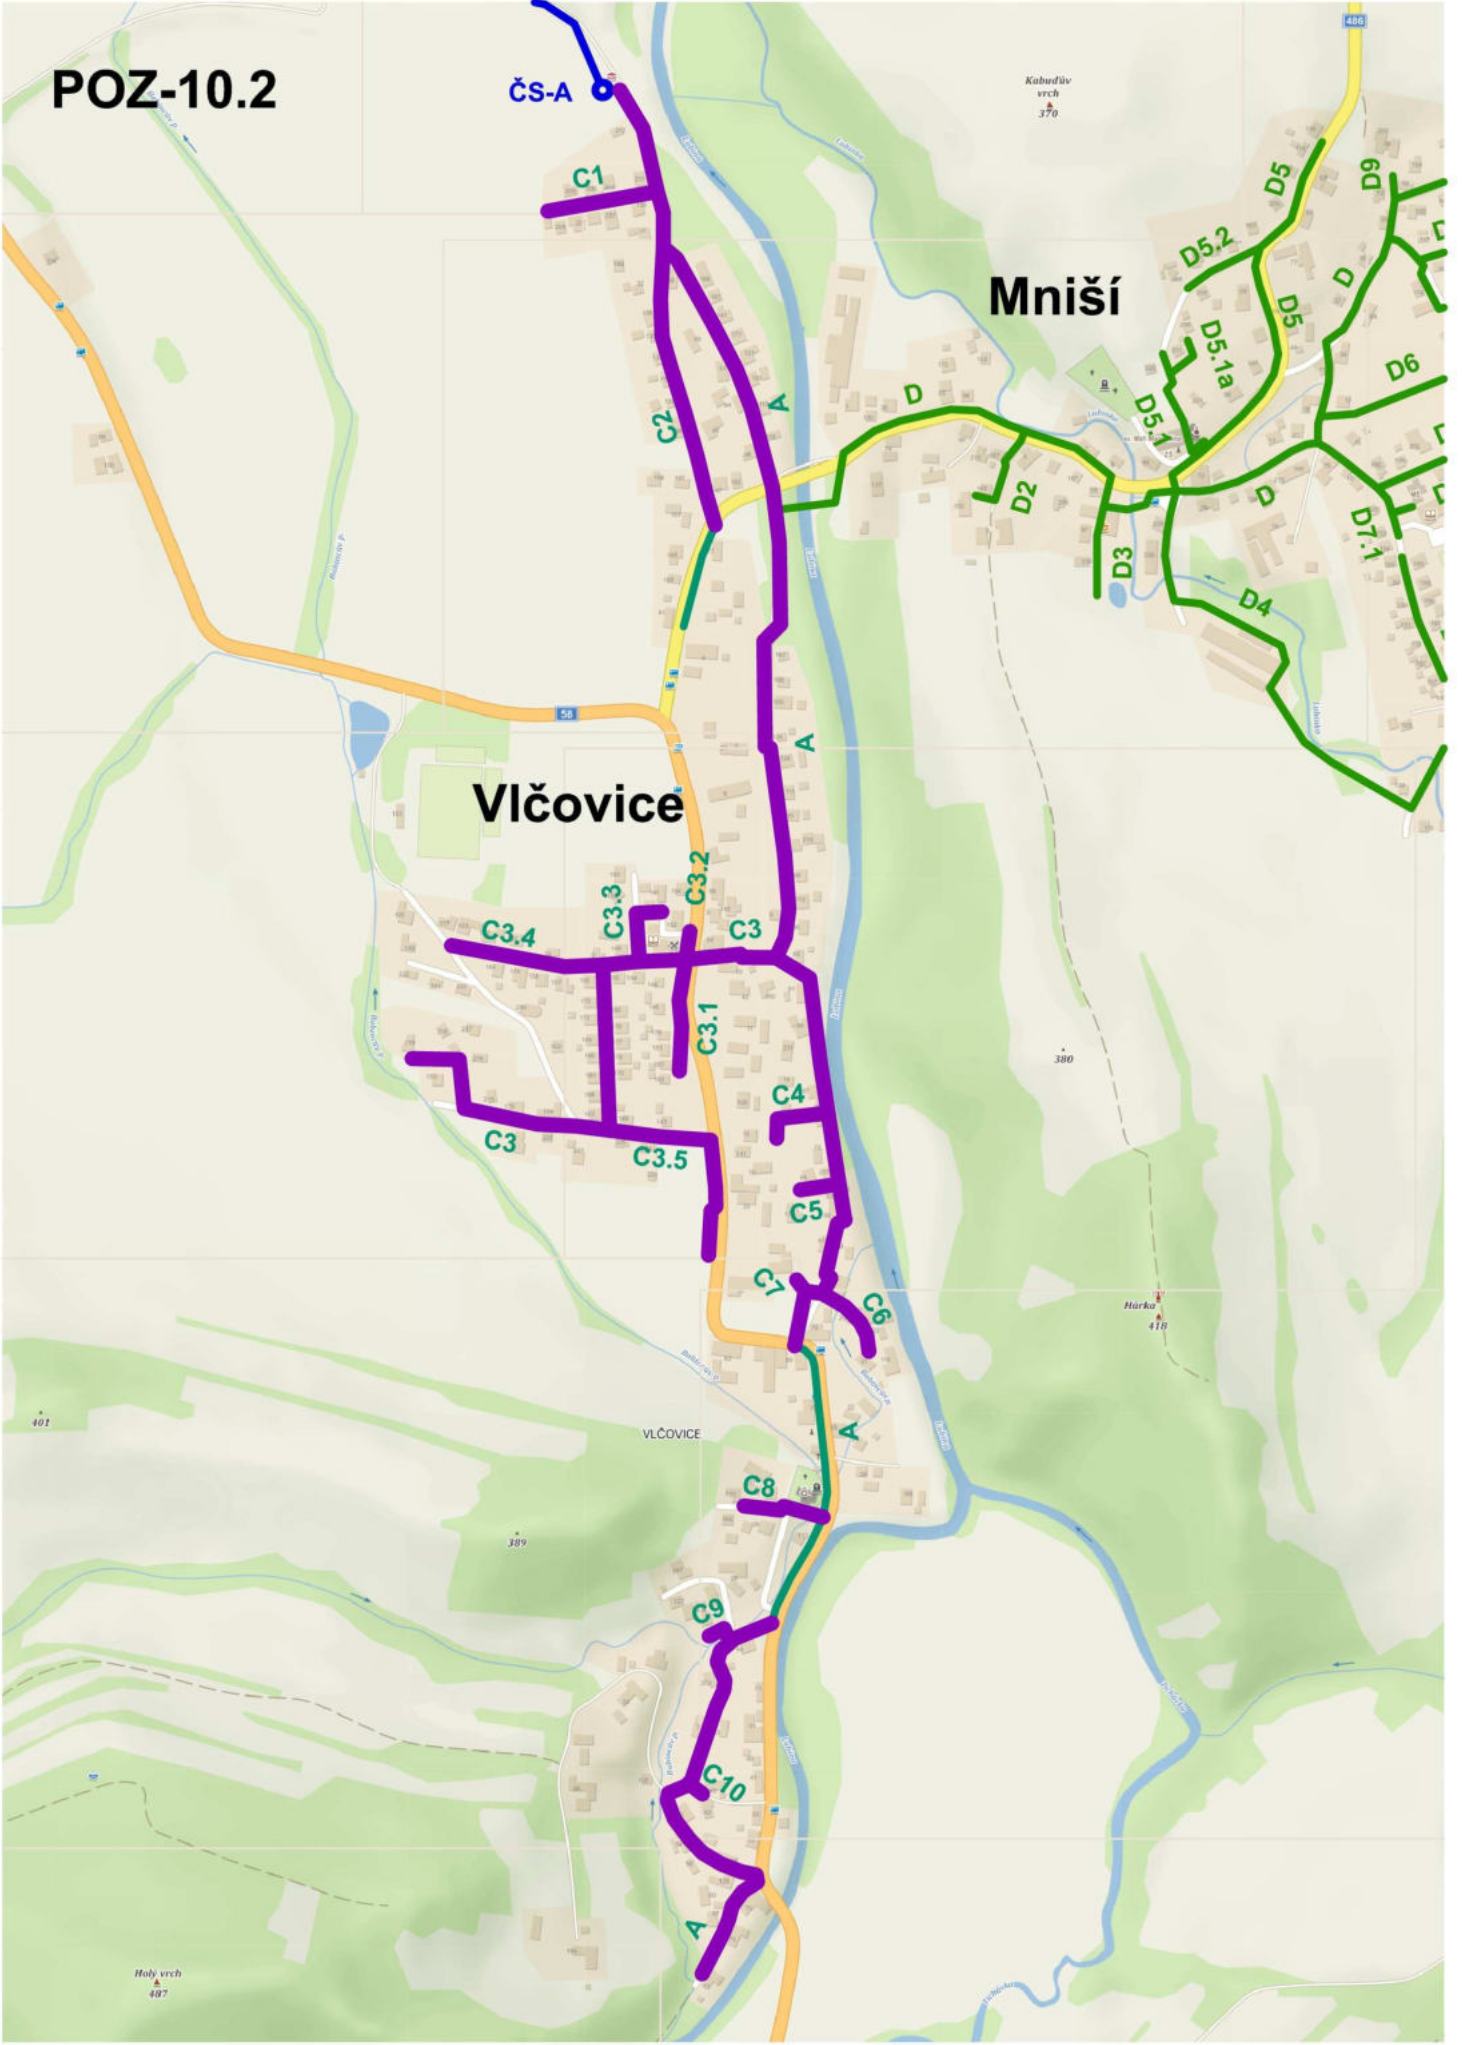

**PP ŽEBROVANÉ, SN 10, DN 300**  
**svislý výkop**  
**v místní komunikaci**

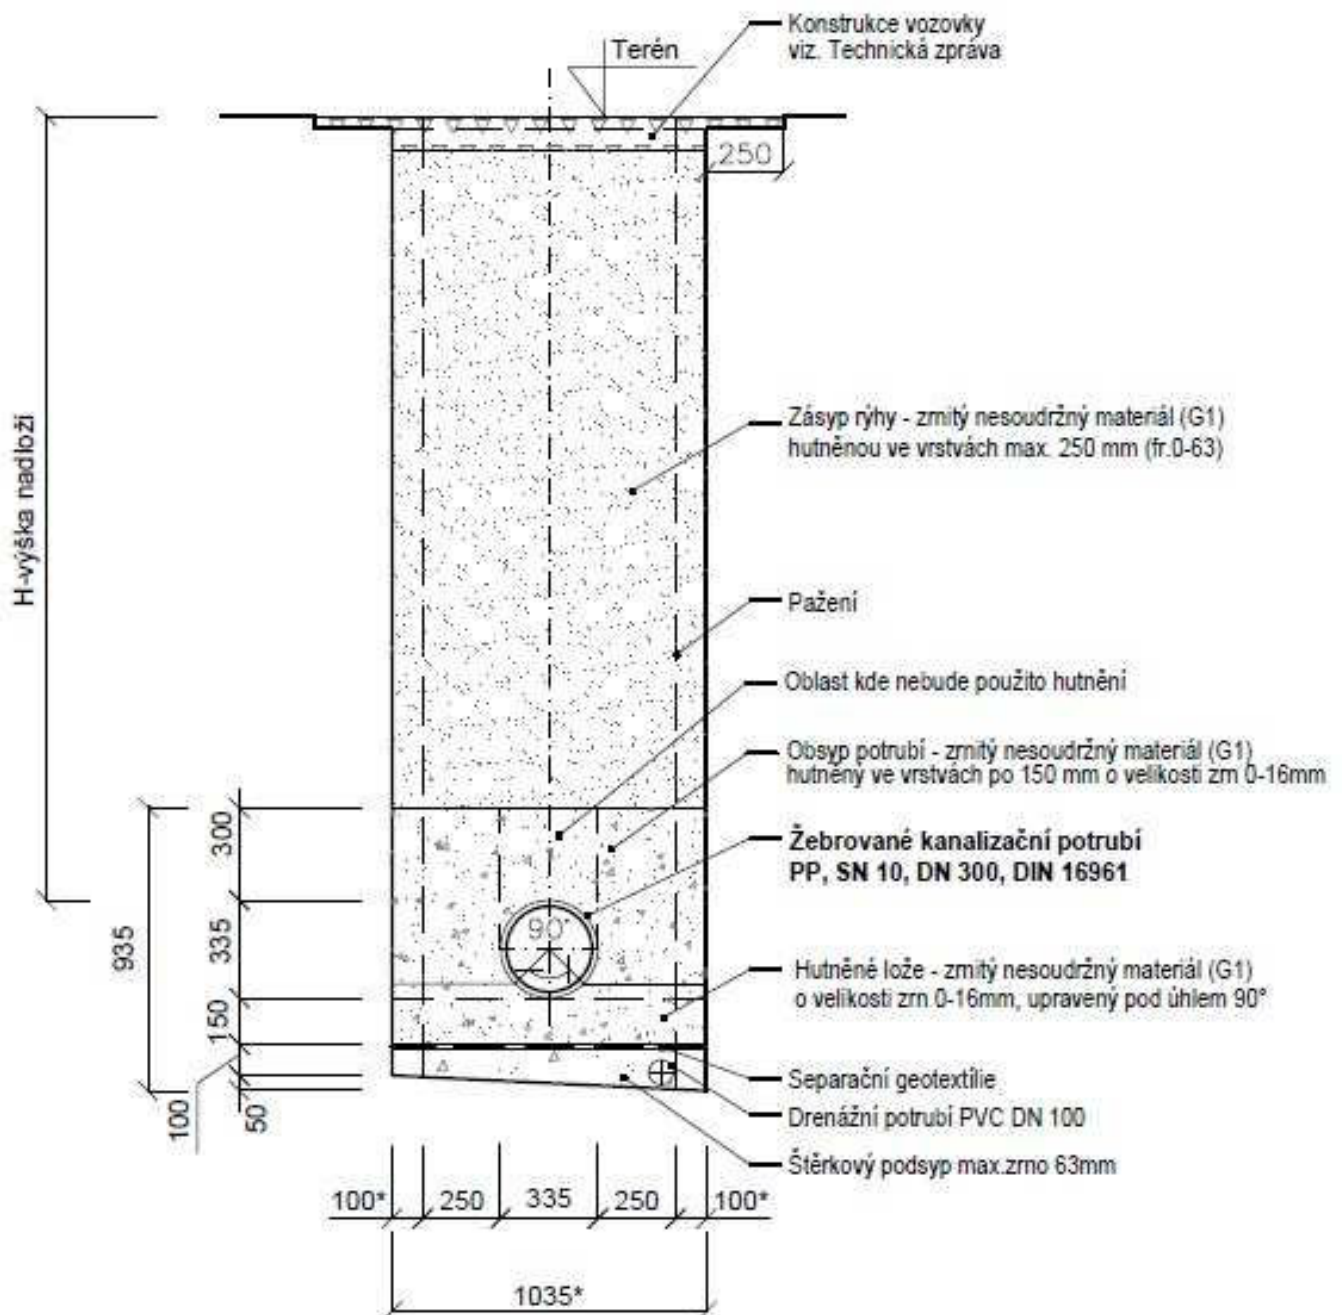

## POZ-10.5

stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší  
objekt: TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice

Objem stavebních prací

přesah 0,50

stoka	úsek	délka	projekt				skutečnost (rýha)				řezání
			ACP		ACO		ACP		ACO		délka
A	ČS-A										
A	Š-A1	9,60	1,035								
A	Š-A2	55,90	zeleně								
A	Š-A2	5,00	2,276	11,38	2,776	13,88	2,50	12,50	3,00	15,00	5,00
A	Š-A4	52,90	1,035	54,75	1,535	81,20	1,50	79,35	2,00	105,80	52,90
A	RŠ-A5	8,90	1,035	9,21	1,535	13,66	1,50	13,35	2,00	17,80	8,90
A	Š-A6	51,70	1,035	53,51	1,535	79,36	1,50	77,55	2,00	103,40	51,70
A	Š-A7	8,30	1,035	8,59	1,535	12,74	1,50	12,45	2,00	16,60	8,30
A	Š-A8	41,90	1,035	43,37	1,535	64,32	1,50	62,85	2,00	83,80	41,90
A	Š-A9	41,40	1,035	42,85	1,535	63,55	1,80	74,52	2,30	95,22	41,40
A	Š-A10	41,40	1,035	42,85	1,535	63,55	1,80	74,52	2,30	95,22	41,40
A	Š-A11	35,40	1,035	36,64	1,535	54,34	1,30	46,02	1,80	63,72	35,40
A	Š-A12	58,00	1,035	60,03	1,535	89,03	1,40	81,20	1,90	110,20	58,00
A	Š-A13	50,00	1,035	51,75	1,535	76,75	1,50	75,00	2,00	100,00	50,00
A	Š-A14	50,00	1,035	51,75	1,535	76,75	1,50	75,00	2,00	100,00	50,00
A	Š-A15	55,00	1,035	56,93	1,535	84,43	1,50	82,50	2,00	110,00	55,00
A	Š-A16	50,00	1,035	51,75	1,535	76,75	1,12	56,00	1,62	81,00	50,00
A	Š-A17	42,00	1,035	43,47	1,535	64,47	1,12	47,04	1,62	68,04	42,00
A	Š-A18	21,00	1,035	21,74	1,535	32,24	1,12	23,52	1,62	34,02	21,00
A	Š-A19	50,00	1,035	51,75	1,535	76,75	1,12	56,00	1,62	81,00	50,00
A	Š-A20	45,00	1,035	46,58	1,535	69,08	1,12	50,40	1,62	72,90	45,00
A	Š-A21	30,00	1,035	31,05	1,535	46,05	1,12	33,60	1,62	48,60	30,00
A	RŠ-A22	5,00	1,035	5,18	1,535	7,68	2,00	10,00	2,50	12,50	5,00
A	Š-A23	55,50	1,035	57,44	1,535	85,19	1,30	72,15	1,80	99,90	55,50
A	Š-A24	60,00	1,035	62,10	1,535	92,10	1,20	72,00	1,70	102,00	60,00
A	Š-A25	60,00	1,035	62,10	1,535	92,10	1,40	84,00	1,90	114,00	60,00
A	Š-A26	40,00	1,035	41,40	1,535	61,40	1,12	44,80	1,62	64,80	40,00
A	Š-A27	11,50	1,035	11,90	1,535	17,65	1,12	12,88	1,62	18,63	11,50
A	Š-A28	27,00	1,035	27,95	1,535	41,45	1,30	35,10	1,80	48,60	27,00
A	Š-A29	40,00	1,035	41,40	1,535	61,40	1,50	60,00	2,00	80,00	40,00
A	Š-A30	42,00	1,035	43,47	1,535	64,47	1,50	63,00	2,00	84,00	42,00
A	Š-A31	37,00	1,035	38,30	1,535	56,80	1,50	55,50	2,00	74,00	37,00
A	Š-A32	38,50	1,035	39,85	1,535	59,10	1,50	57,75	2,00	77,00	38,50
A	RŠ-A33	49,50	1,035	51,23	1,535	75,98	1,30	64,35	1,80	89,10	49,50
A	Š-A34	32,50	1,035	33,64	1,535	49,89	1,30	42,25	1,80	58,50	32,50
A	Š-A35	24,00	1,035	24,84	1,535	36,84	1,20	28,80	1,70	40,80	24,00
A	RŠ-A36	1,00	1,035	1,04	1,535	1,54	1,80	1,80	2,30	2,30	1,00
A	RŠ-A37	36,00	1,035	37,26	1,535	55,26	1,40	50,40	1,90	68,40	36,00
A	RŠ-A38	35,50	1,035	36,74	1,535	54,49	1,40	49,70	1,90	67,45	35,50
A	RŠ-A39	2,00	1,035	2,07	1,535	3,07	1,80	3,60	2,30	4,60	2,00
A	Š-A40	24,20	1,035	25,05	1,535	37,15	1,40	33,88	1,90	45,98	24,20
A	Š-A41	15,40									
A	Š-A42	20,00									
A	Š-A43	19,00									
A	Š-A44-A45	20,00	1,035	20,70	1,535	30,70	1,40	28,00	1,90	38,00	20,00
	ŘSD							0,50			
A	Š-A56-A57	53,30	1,035	55,17	1,535	81,82	1,50	79,95	2,00	106,60	53,30
A	Š-A58	12,50	1,035	12,94	1,535	19,19	1,40	17,50	1,90	23,75	12,50
A	Š-A59	10,50	1,035	10,87	1,535	16,12	1,40	14,70	1,90	19,95	10,50
A	Š-A60	7,70	1,035	7,97	1,535	11,82	1,40	10,78	1,90	14,63	7,70
A	Š-A61	16,00	1,035	16,56	1,535	24,56	1,40	22,40	1,90	30,40	16,00
A	Š-A62	18,00	1,035	18,63	1,535	27,63	1,20	21,60	1,70	30,60	18,00
A	Š-A63	30,00	1,035	31,05	1,535	46,05	1,30	39,00	1,80	54,00	30,00
A	Š-A64	35,00	1,035	36,23	1,535	53,73	1,30	45,50	1,80	63,00	35,00
A	Š-A65	46,00	1,035	47,61	1,535	70,61	1,20	55,20	1,70	78,20	46,00
A	Š-A66	25,00	1,035	25,88	1,535	38,38	1,20	30,00	1,70	42,50	25,00
A	Š-A67	10,00	1,035	10,35	1,535	15,35	1,30	13,00	1,80	18,00	10,00
A	Š-A68	25,00	1,035	25,88	1,535	38,38	1,30	32,50	1,80	45,00	25,00
A	Š-A69	36,00	1,035	37,26	1,535	55,26	1,30	46,80	1,80	64,80	36,00
A	Š-A70	20,00	1,035	20,70	1,535	30,70	1,30	26,00	1,80	36,00	20,00
A	Š-A71	26,00	1,035	26,91	1,535	39,91	1,30	33,80	1,80	46,80	26,00
A	Š-A72	26,50	1,035	27,43	1,535	40,68	1,30	34,45	1,80	47,70	26,50
A	Š-A73	10,50	1,035	10,87	1,535	16,12	1,30	13,65	1,80	18,90	10,50
A	Š-A74	19,00	1,035	19,67	1,535	29,17	1,50	28,50	2,00	38,00	19,00
A	Š-A75	24,00	1,035	24,84	1,535	36,84	1,60	38,40	2,10	50,40	24,00
A	Š-A76	19,00	1,035	19,67	1,535	29,17	1,60	30,40	2,10	39,90	19,00
A	Š-A77	20,10	1,035	20,80	1,535	30,85	1,60	32,16	2,10	42,21	20,10
A	Š-A78	36,80	1,035	38,09	1,535	56,49	1,60	58,88	2,10	77,28	36,80
C1	Š-A4										
C1	RŠ1	10,40									
C1	RŠ2	40,90									
C1	RŠ3	14,60									
C1	Š4	44,80									
C2	Š-A6										
C2	RŠ1	3,40	1,035	3,52	1,535	5,22	1,20	4,08	1,70	5,78	3,40



C2	RŠ2	14,70	1,035	15,21	1,535	22,56	1,20	17,64	1,70	24,99	14,70
C2	Š3	17,20	1,035	17,80	1,535	26,40	1,20	20,64	1,70	29,24	17,20
C2	RŠ4	51,30	1,035	53,10	1,535	78,75	1,20	61,56	1,70	87,21	51,30
C2	RŠ5	50,00	1,035	51,75	1,535	76,75	1,20	60,00	1,70	85,00	50,00
C2	RŠ6	51,50	1,035	53,30	1,535	79,05	1,20	61,80	1,70	87,55	51,50
C2	RŠ7	3,40	1,035	3,52	1,535	5,22	1,20	4,08	1,70	5,78	3,40
C2	Š8	38,70	1,035	40,05	1,535	59,40	1,20	46,44	1,70	65,79	38,70
C2	Š9	54,00	1,035	55,89	1,535	82,89	1,20	64,80	1,70	91,80	54,00
C2	Š9-10	17,70	1,035	18,32	1,535	27,17	1,20	21,24	1,70	30,09	17,70
C2	SSMSK	7,80	1,035	8,07	1,535	11,97	1,20	9,36	1,70	13,26	7,80
S-A26											
C3	Š1	53,00	1,035	54,86	1,535	81,36	1,30	68,90	1,80	95,40	53,00
C3	RŠ2	3,00	1,035	3,11	1,535	4,61	1,12	3,36	1,62	4,86	3,00
C3	Š3	35,00	1,035	36,23	1,535	53,73	1,12	39,20	1,62	56,70	35,00
C3	SP4	19,50									19,50
C3	Š5	54,10	1,035	55,99	1,535	83,04	1,40	75,74	1,90	102,79	54,10
C3	Š6	43,00	1,035	44,51	1,535	66,01	1,40	60,20	1,90	81,70	43,00
C3	Š7	55,00	1,035	56,93	1,535	84,43	1,20	66,00	1,70	93,50	55,00
C3	Š8	52,00	1,035	53,82	1,535	79,82	1,50	78,00	2,00	104,00	52,00
C3	Š9	41,00	1,035	42,44	1,535	62,94	1,50	61,50	2,00	82,00	41,00
C3	RŠ10	32,00	1,035	33,12	1,535	49,12	1,50	48,00	2,00	64,00	32,00
C3	SP11	4,50	1,035	4,66	1,535	6,91	1,80	8,10	2,30	10,35	4,50
C3	Š12	41,00	1,035	42,44	1,535	62,94	1,80	73,80	2,30	94,30	41,00
C3	Š13	51,50	1,035	53,30	1,535	79,05	1,80	92,70	2,30	118,45	51,50
C3	Š14	14,00	1,035	14,49	1,535	21,49	1,40	19,60	1,90	26,60	14,00
C3	Š15	31,00	1,035	32,09	1,535	47,59	1,30	40,30	1,80	55,80	31,00
C3	Š16	28,00	1,035	28,98	1,535	42,98	1,40	39,20	1,90	53,20	28,00
C3	Š17	27,00									
C3	Š18	4,00									
C3	Š19	24,00									
C3	Š20	56,00									
SP4											
C3.1	RŠ1	13,90									
C3.1	RŠ2	30,50									
C3.1	RŠ3	24,20									
C3.1	Š4	31,30									
C3.1	Š5	27,00									
SP4											
C3.2	Š1	27,00									
Š5											
C3.3	Š1	56,60	1,035	58,58	1,535	86,88	1,12	63,39	1,62	91,69	56,60
C3.3	Š2	27,70	1,035	28,67	1,535	42,52	1,50	41,55	2,00	55,40	27,70
Š6 (C-3)											
C3.4	Š1	39,30	1,035	40,68	1,535	60,33	1,40	55,02	1,90	74,67	39,30
C3.4	Š2	45,60	1,035	47,20	1,535	70,00	1,40	63,84	1,90	86,64	45,60
C3.4	Š3	56,00	1,035	57,96	1,535	85,96	1,40	78,40	1,90	106,40	56,00
C3.4	Š4	39,00	1,035	40,37	1,535	59,87	1,40	54,60	1,90	74,10	39,00
SP11											
C3.5	Š1	51,50	1,035	53,30	1,535	79,05	1,20	61,80	1,70	87,55	51,50
C3.5	RŠ2	59,10	1,035	61,17	1,535	90,72	1,12	66,19	1,62	95,74	59,10
C3.5	RŠ3	56,30									
C3.5	Š4	4,60									
C3.5	Š5	45,70									
S-A32											
C4	RŠ1	52,60									
C4	RŠ2	20,30									
RS-A34											
C5	RŠ1	36,90									
C5	RŠ2	11,20									
S-A40											
C6	RŠ1	20,90	1,035	21,63	1,535	32,08	1,30	27,17	1,80	37,62	20,90
C6	RŠ2	15,00	1,035	15,53	1,535	23,03	1,30	19,50	1,80	27,00	15,00
C6	RŠ3	15,90	1,035	16,46	1,535	24,41	1,30	20,67	1,80	28,62	15,90
C6	RŠ4	25,50	1,035	26,39	1,535	39,14	1,30	33,15	1,80	45,90	25,50
S-A41											
C7	RŠ1	20,20									
S-A52											
C8	RŠ1	37,30									
	RŠ2	12,00									
	RŠ3	3,40	1,035	3,52	1,535	5,22	1,12	3,81	1,62	5,51	3,40
	Š4	41,30	1,035	42,75	1,535	63,40	1,12	46,26	1,62	66,91	41,30
S-A57											

C9	RŠ1	14,60									
	Š2	22,40									
	RŠ_316	8,40									
C10	Š-A65										
	RŠ1	19,40	1,035	20,08	1,535	29,78	1,12	21,73	1,62	31,43	19,40

celkem: **3 391**                      **5 026**    kutečnost: **4 432**                      **6 067**    **6 579**

rozpočet: **3 454**                      **5 120**                      rozdíl: **978**                      **947**
