



KUMSP00WCQP8

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

01492

poř. číslo

2020

rok

KPP/1

zkr. odh.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 01492/2020/KPP

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: **Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem**
náměstkem hejtmána kraje

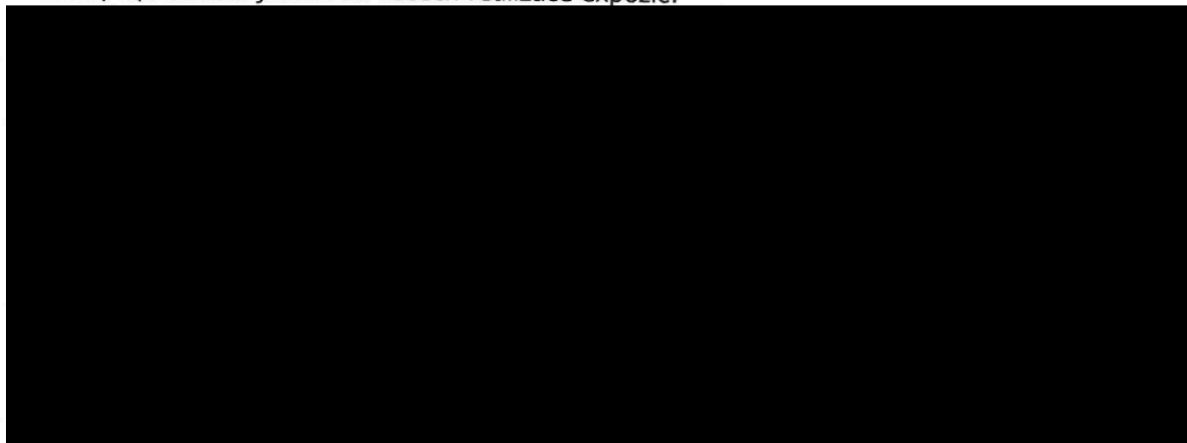
IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace expozic:



(dále jen „objednatel“)

2. Art Consultancy s. r. o.

se sídlem: Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava

zastoupena: dr. Martinem Klimešem, jednatelem

IČO: 29457009

DIČ: CZ29457009

bankovní spojení: Česká spořitelna Opava

číslo účtu: 4222618349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54942

(dále jen „zhotovitel“ nebo „zhotovitel expozic“)

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

B

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2020 smlouvu o dílo, evidenční číslo 01492/2020/KPP (dále jen „**smlouva**“) na realizaci expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“ (dále jen „**realizace expozic**“ či „**dílo**“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci expozic vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu dokončování prací na díle vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci pro realizaci expozic (dále jen „**projektová dokumentace**“) a v soupisu prací, zhotovitel je nezavinil a byly nutné k dokončení díla (dále jen „**vícepráce**“):

- a) **Expoziční zábradlí bariéra vozidel - rohový segment (pol. č. 4.2.)** - konstrukční prvek z 10mm a 8 mm železného plechu svařeného, rohové díly budou vytvářet zatáčky, bariéra bude kotvena do betonové podlahy dle půdorysu do ocelových kotev TDS, které umožňují opakovanou deinstalaci a zaslepení otvoru, povrch černá prášková vypalovaná barva nebo mokrá nástřik barvou, na horní ploše nástřik bílou barvou pro vyznačení symbolu přerušované a plné středové silniční čáry, zábradlí bude sloužit pro instalaci popisek k vozům a také jako odpočinková zóna - sedací prvek.

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích, záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry a nového doplnění zábradlí o koncové (rohové) prvky, které zajišťují bezpečnost při chůzi kolem otevřených konců zábradlí, bylo zjištěno, že rohových segmentů expozičního zábradlí bude zapotřebí více, než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 86 ks rohových segmentů. V rámci víceprací je nutné provést dalších 21 ks rohových segmentů. Cena za 1 ks rohového segmentu činí 1.600 Kč bez DPH.

Cena víceprací: 33.600 Kč bez DPH

- b) **Dioramatická kompozice DK 1 - kočár (pol. č. 4.7.)** - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm; podstavec viz DK 1

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 1 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 5 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést dalších 6,4 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.

Cena víceprací: 2.272 Kč bez DPH

- c) **Dioramatická kompozice DK 3 - NW typ K a TL4 (pol. č. 4.9.)** - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 3 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 36 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést dalších 25 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.

Cena víceprací: 8.875 Kč bez DPH

- d) **Dioramatická kompozice DK 7 - T 27B, 148C (pol. č. 4.13.)** - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm
V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 7 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 70 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést dalších 10 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.
Cena víceprací: 3.550 Kč bez DPH
- e) **Dioramatická kompozice DK 8 - T 805, T 111C (pol. č. 4.14.)** - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm
V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 8 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 51 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést další 1 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.
Cena víceprací: 355 Kč bez DPH
- f) **Dioramatická kompozice DK 9 - T 138 CAS, T 17 (pol. č. 4.15.)** - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm
V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 9 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 50 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést dalších 20 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.
Cena víceprací: 7.100 Kč bez DPH
- g) **Dioramatická kompozice DK 11 - T 24, 25, 85, 115 (pol. č. 4.17.)** - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm
V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 11 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 148 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést dalších 2 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.
Cena víceprací: 710 Kč bez DPH
- h) **Dioramatická kompozice DK 16 - T 805 115 (pol. č. 4.22.)** - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm
V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 16 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno

provedení 98 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést dalších 14 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.

Cena víceprací: 4.970 Kč bez DPH

- i) ***Dioramatická kompozice DK 20 - T 815 (pol. č. 4.26.) - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm***

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 20 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 130 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést dalších 20 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.

Cena víceprací: 7.100 Kč bez DPH

- j) ***Dioramatická kompozice DK 21 - T 813, 815, 816 (pol. č. 4.27.) - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm***

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 21 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 212 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést dalších 10 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.

Cena víceprací: 3.550 Kč bez DPH

- k) ***Dioramatická kompozice DK 24 - T138 816 (pol. č. 4.30.) - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm***

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí většího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 24 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 37 m² šedého kačírku. V rámci víceprací je nutné provést dalších 7 m² šedého kačírku. Cena za 1 m² šedého kačírku činí 355 Kč bez DPH.

Cena víceprací: 2.485 Kč bez DPH

- l) ***Dioramatická kompozice DK 23A, DK 23B - T 815 GTC Kolem světa, T 815 Živá Afrika, T 138 Lambaréné - 70 mm vrstva zpevněného písku; překližkové zvyšováky viz DK 23A, DK 23B***

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice byla projektantem expozice upravena položka č. 4.29 na ***Dioramatická kompozice DK 23A, DK 23B - T 815 GTC Kolem světa, T 815 Živá Afrika, T 138 Lambaréné - 70 mm vrstva zpevněného písku; překližkové zvyšováky viz DK 23A, DK 23B***. S ohledem na to, že exponáty v rámci této položky díla jsou expediční vozidla, je pro jejich umístění v rámci expozice koncepčně vhodnější vrstva zpevněného písku s překližkovými zvyšováky. Cena za 1 m² zpevněného písku s překližkovými zvyšováky je stejná jako v případě původně plánované 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm, tj. 355 Kč bez DPH. Celkem je v rámci víceprací nutné provést 90 m² zpevněného písku s překližkovými zvyšováky.

Cena víceprací: 31.950 Kč bez DPH

- m) **Popisková tabulka pro exponáty vozidel a velkých exponátů z 10mm feromagnetického plechu instalovaná bariéře vozidel, uchycení pomocí 4 zapuštěných neodymových magnetů, text gravírovaný, rozměry 205 x 223 mm**

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích, bylo projektantem expozice navrženo vytvoření rozměrově menších popiskových tabulek se základními informacemi pro každý jednotlivý exponát v ceně 1 ks za 900 Kč bez DPH. V rámci díla je nutné provedení celkem 105 ks rozměrově menších popiskových tabulek.

Cena víceprací: 94.500 Kč bez DPH

- n) **Klíčovací stěna s kabinou**

V průběhu realizace expozice došlo k vylepšení původního interaktivního prvku Klíčovací stěna. Místo původní uvažované Klíčovací stěny pouze s pozadím a infokioskem, je prvek atraktivnějším tím, že se návštěvník expozice bude klíčovat v reálné kabině T 815, přičemž ovládací prvky budou instalovány na místě spolujezdce. Z důvodu současného umístění, které je před vraty sloužícími pro vjezd a výjezd exponátů je prvek oproti původně plánované verzi mobilní, opatřen kolečky. Klíčovací stěna je také oproti původní verzi rozměrově větší.

Cena víceprací: 330.000 Kč bez DPH

4. Při převzetí díla bylo zjištěno, že nebyly provedeny práce a dodávky, které byly obsaženy v projektové dokumentaci a soupisu prací, jelikož byly nadbytečné nebo neodpovídaly skutečnosti (dále jen „méněpráce“):

- a) **Grafické zpracování textový, obrazových a digitálních podkladů (pol. č. 1.1.)**
- předtisková a další příprava pro zhotovení velkoformátových bannerů - panelů (P), popisek, grafiky pro multimédia a mobilní aplikaci

Jelikož vytvoření mobilní aplikace není součástí dodávky zhotovitele, tak vytvoření grafiky pro mobilní aplikaci zhotovitelem se jeví jako neefektivní řešení, proto grafika pro mobilní aplikaci, která je součástí této položky, nebude realizována.

Cena méněprací: 6.000 Kč bez DPH

- b) **Expoziční zábradlí bariéra vozidel - rovný segment (pol. č. 4.1.)** - konstrukční prvek z 10 mm a 8 mm železného plechu svařeného, bariéra se bude skládat z jednotlivých segmentů po 2 - 3 či 4 metrech, poslední segmenty v délce dle přesného zaměření, bariéra bude kotvena do betonové podlahy dle půdorysu do ocelových kotev TDS, které umožňují opakovanou deinstalaci a zaslepení otvoru, povrch černá prášková vypalovaná barva nebo mokvý nástřik barvou, na horní ploše nástřik bílou barvou pro vyznačení symbolu přerušované a plné středové silniční čáry, zábradlí bude sloužit pro instalaci popisek k vozům a také jako odpočinková zóna - sedací prvek.

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že rovných segmentů expozičního zábradlí nebude zapotřebí v původně plánovaném objemu. Ve smlouvě je sjednáno provedení 581,309 bm rovných segmentů. V rámci méněprací nebude provedeno 41,309 bm rovných segmentů v ceně 2.000 Kč/bm.

Cena méněprací: 82.618 Kč bez DPH

- c) **Dioramatická kompozice DK 6 - NW typ T (pol. č. 4.12.)** - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí menšího množství praného šedého kačírku tvořícího dioramatickou kompozici DK 6 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 45 m² šedého kačírku. V rámci méněprací nebude provedeno 23 m² šedého kačírku v ceně 355 Kč/m².

Cena méněprací: 8.165 Kč bez DPH

- d) ***Dioramatická kompozice DK 13 - T 111 (pol. č. 4.19.) - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm***

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice bylo projektantem expozice navrženo z důvodu nevhodnosti vrstvu praného šedého kačírku z dioramatické kompozice DK 13 odstranit vzhledem k umístění této kompozice v prostoru expozice a položku vůbec nerealizovat. V rámci méněprací tak nebude provedeno původně plánovaných 40 m² šedého kačírku v ceně 355 Kč/m².

Cena méněprací: 14.200 Kč bez DPH

- e) ***Dioramatická kompozice DK 17 - T 815 KRAB (pol. č. 4.23.) - 70 mm vrstva asfaltu***

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí menšího množství asfaltu tvořícího dioramatickou kompozici DK 17 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 60 m² asfaltu. V rámci méněprací nebude provedeno 6 m² asfaltu v ceně 1.000 Kč/m².

Cena méněprací: 6.000 Kč bez DPH

- f) ***Dioramatická kompozice DK 19 - T 162 (pol. č. 4.25.) - 70 mm vrstva asfaltu***

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí menšího množství asfaltu tvořícího dioramatickou kompozici DK 19 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 105 m² asfaltu. V rámci méněprací nebude provedeno 25 m² asfaltu v ceně 1.000 Kč/m².

Cena méněprací: 25.000 Kč bez DPH

- g) ***Dioramatická kompozice DK 22 - T Dakar, Jamal (pol. č. 4.28.) - 70 mm vrstva zpevněného písku, překližkové zvyšováky viz DK 22***

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že bude zapotřebí menšího množství zpevněného písku tvořícího dioramatickou kompozici DK 22 než bylo původně plánováno. Ve smlouvě je sjednáno provedení 145 m² zpevněného písku. V rámci méněprací nebude provedeno 5 m² zpevněného písku v ceně 355 Kč/m².

Cena méněprací: 1.775 Kč bez DPH

- h) ***Dioramatická kompozice DK 23 - T 815, T805 (pol. č. 4.29.) - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm***

3

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice bylo projektantem expozice navrženo vrstvu praného šedého kačírku z dioramatické kompozice DK 23 odstranit a položku nerealizovat, jelikož se jedná o expediční vozidla a tento povrch je u této kompozice nevhodný a koncepčně nelogický. V rámci méněprací tak nebude provedeno původně plánovaných 56 m² šedého kačírku v ceně 355 Kč/m².

Cena méněprací: 19.880 Kč bez DPH

- i) **Popisková tabulka pro exponáty vozidel a velkých exponátů (pol. č. 5.2.)** z 10mm feromagnetického plechu instalovaná bariéře vozidel, uchycení pomocí 4 zapuštěných neodymových magnetů, text gravírovaný, rozměry 410 x 223 mm - výtvarné řešení viz grafický manuál, konkrétní texty viz odborný scénář, počet 92 + 10 rezervních pro nové akvizice, aktuální výroba TATRA, textové podklady pro výrobu jsou součástí odborného scénáře, aktuální verzi před dodávkou expozice dodá Technické muzeum Tatra.

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích, bylo projektantem expozice navrženo zredukovat počet větších popiskových tabulek, které obsahují technická data k jednotlivým modelům vozidel značky Tatra. Ve smlouvě je sjednáno provedení 102 tabulek. V rámci méněprací nebude provedeno 52 tabulek v ceně 1.000 Kč/ks.

Cena méněprací: 52.000 Kč bez DPH

- j) **Zrcátka (pol. č. 6.8.)**

Interaktivní prvek nebude v rámci díla realizován, jelikož zrcátka spolu s křeslem pro sezení a volantem bude součástí nového interaktivního prvku *Klíčovací stěna s kabinou* (viz čl. II odst. 3 písm. n) této dohody).

Cena méněprací: 60.000 Kč bez DPH

- k) **Podvozek Tatra (pol. č. 6.12.)**

V průběhu realizace expozice v návaznosti na změnu odborného scénáře a půdorysu expozice ve smyslu nového a logičtějšího uspořádání exponátů v expozičních celcích a záměny vozidel ve špatném stavu za vhodnější vozidla mnohdy s jinými rozměry, bylo zjištěno, že neexistuje vhodné umístění pro tento interaktivní prvek, a to především z hlediska jeho velkých rozměrů a současně absence dostatku místa v prostoru expozice. Z výše uvedených důvodů tak nebude tento interaktivní prvek v rámci díla realizován.

Cena méněprací: 380.000 Kč bez DPH

- l) **Model interiéru Tatry kolem světa (pol. č. 6.16.),** pouze LTD podložka do vitríny pod model, konkrétní specifikace bude vycházet až z dodaného modelu

Položka nebude realizována, jelikož na modelu stále probíhají truhlářské práce a model nebyl zhotoviteli expozice dodán.

Cena méněprací: 2.000 Kč bez DPH

- m) **Klíčovací stěna (pol. č. 6.17.)** - Interaktivní prvek nebude realizován v původní podobě, bude upraven a rozšířen v rámci interaktivního prvku *Klíčovací stěna s kabinou* (viz čl. II odst. 3 písm. n) této dohody).

Cena méněprací: 220.000 Kč bez DPH

5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.
6. Při přejímání díla bylo zjištěno, že:
- a) u položek č. **3.1., 3.2. a 3.3. Vitrína solitérní** (celkem 17 ks) je tloušťka tepelně tvrzeného bezpečnostního skla ESG o 2 mm větší oproti projektové dokumentaci (8 mm namísto 6 mm), a to z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti.
- b) u položky č. **5.7. Tištěný průvodce pro zahraniční návštěvníky** došlo oproti projektové dokumentaci ke změně formátu papíru z A4 na A5 a k rozšíření průvodce o další dvě jazykové mutace (češtinu a angličtinu) s tím, že celkový rozsah textu, grafických příloh a specifikací je zachován. V návaznosti na rozšíření tištěného průvodce o anglickou mutaci nejsou již texty v anglickém jazyce uvedeny na bannerech umístěných v expozici tak, jak je popsáno v bodě 5. Infografika v Technické zprávě projektové dokumentace. Bannery nově obsahují pouze texty v českém jazyce.
- Změny díla uvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce dohody nebudou mít dopad na cenu těchto položek díla.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 4 této dohody a oproti sjednanému rozsahu předmětu díla byly provedeny vícepráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody, se kterými projektová dokumentace nepočítala.
2. Vícepráce uvedené v této dohodě se staly nedílnou součástí díla a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšířil.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je provedeno v souladu se smlouvou i co se týče změn díla uvedených v čl. II odst. 6 této dohody; rozsah díla se o tyto změny rozšířil.
4. **Cena víceprací činí 531.017,00 Kč bez DPH/642.530,57 Kč vč. DPH.**
5. **Cena méněprací činí 877.638,00 Kč bez DPH/1.061.941,98 Kč vč. DPH.**
6. **Cena za dílo, sjednaná v čl. VI odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací, snižuje o cenu méněprací a činí:**

cena bez DPH	15.083.878,96 Kč
DPH 21 %	3.167.614,58 Kč
cena včetně DPH	18.251.493,54 Kč
7. Doba provedení díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy byla v průběhu realizace pozastavena zápisem v realizačním deníku a následně díky mimořádným okolnostem, které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat prodloužena.

Předání a převzetí vyhrazených prostor k realizaci expozic proběhlo dne 12. 1. 2021, v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy. Dne 4. 2. 2021 zhotovitel přerušil na základě čl. V odst. 5 smlouvy práce na díle. Důvodem přerušení bylo nedodání vozidel ze strany společnosti TATRA TRUCKS a.s. před patu muzea, a to v termínu uvedeném v harmonogramu dle čl. X odst. 1 písm. d) smlouvy. Důvodem nedodání vozidel byl nevydaný kolaudační souhlas, který s navážením vozidel souvisí. Z důvodu nedodání vozidel nemohl zhotovitel započít s jejich ustavováním na určená místa v expozici a rovněž nemohl vykonávat činnosti a práce na díle, které jsou na ustavení vozidel navázány. Dne 6. 4. 2021 zhotovitel zápisem do

3

realizačního deníku opět zahájil práce na díle. Dle čl. V odst. 5 smlouvy o dílo byl termín pro předání díla zhotoviteli prodloužen o dobu pozastavení, a to do 11. 6. 2021.

Smluvní strany se tak dohodly, že zhotovitel splnil dílo včas a v souladu se smlouvou.

8. Smluvní strany se dohodly, že se do čl. II. odst. 9 písm. a) smlouvy doplňuje text: „pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.“
9. Smluvní strany se za účelem odstranění jakýchkoliv pochybností dohodly, na opravě chybného číslování čl. II. odst. 9 smlouvy tak, že se celé ustanovení čl. II odst. 9 se nahrazuje tímto zněním:
„9. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel:
 - a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít,“
 - b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost,
 - c) předem projednávat rovněž se zástupcem odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci expozic, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,
 - d) umožnit zaměstnancům objednatele, zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj CR, Ministerstvu financí CR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - e) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí CR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - f) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu do konce roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.“

B

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno její vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 - Rekapitulace víceprací a méněprací


Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 22/1413 ze dne 19. 7. 2021.

V Ostravě dne 28 -07- 2021

V Opavě dne

19. 7. 2021


Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
na základě pověření
hejtmana kraje


dr. Martin Klimeš
jednatel



Příloha č. 1 - Rekapitulace víceprací a méněprací

VÍCEPRÁCE

část projektové dokumentace	číslo položky	číslo položky dle projektu	název položky	měrná jednotka	množství		cena za jednotku (v Kč)		cena celkem bez DPH (v Kč)		vícepráce (v Kč)	
					dle SoD	výsledné	dle SoD	výsledná	dle SoD	výsledná	bez DPH	s DPH
DALŠÍ EXPOZIČNÍ PRVKY	4.2.	4.2.	Expoziční zábradlí bariéra vozidel - rohový segment-konstrukční prvek z 10mm a 8 mm železného plechu svařeného, rohové díly budou vytvářet zátěžky, bariéra bude katvena do betonové podlahy dle půdorysu do ocelových kotvů TD5, které umožňují opakovanou deinstalaci a zastavení otvoru, povrch černá prášková vypalovaná barva nebo morky nástřik barvou, na horní ploše nástřik bílou barvou pro vyznačení symbolu přerušované a plně středové silniční čáry, zábradlí bude sloužit pro instalaci popisek k vozům a také jako odpočínková zóna - sedací prvek.	ks	86	107	1 600,00	1 600,00	137 600,00	171 200,00	33 600,00	40 656,00
	4.7.	4.7.	Dioramatická kompozice DK 1 - kočár - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm; podstavec viz DK 1	m ²	5	11,4	355,00	355,00	1 775,00	4 047,00	2 272,00	2 749,12
	4.9.	4.9.	Dioramatická kompozice DK 3 - NW typ K a TL4 - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	36	61	355,00	355,00	12 780,00	21 655,00	8 875,00	10 738,75
	4.13.	4.13.	Dioramatická kompozice DK 7 - T 27B, 148C - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	70	80	355,00	355,00	24 850,00	28 400,00	3 550,00	4 295,50
	4.14.	4.14.	Dioramatická kompozice DK 8 - T 805, T 111C - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	51	52	355,00	355,00	18 105,00	18 460,00	355,00	429,55
	4.15.	4.15.	Dioramatická kompozice DK 9 - T 138 CAS, T 17 - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	50	70	355,00	355,00	17 750,00	24 850,00	7 100,00	8 591,00
	4.17.	4.17.	Dioramatická kompozice DK 11 - T 24, 25, 85, 115 - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	148	150	355,00	355,00	52 540,00	53 250,00	710,00	859,10
	4.22.	4.22.	Dioramatická kompozice DK 16 - T 805 - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	98	112	355,00	355,00	34 790,00	39 760,00	4 970,00	6 013,70
	4.26.	4.26.	Dioramatická kompozice DK 20 - T 815 - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	130	150	355,00	355,00	46 150,00	53 250,00	7 100,00	8 591,00
	4.27.	4.27.	Dioramatická kompozice DK 21 - T 813, 815, 816 - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	212	222	355,00	355,00	75 260,00	78 810,00	3 550,00	4 295,50
	4.30.	4.30.	Dioramatická kompozice DK 24 - T138 - 70 mm vrstva práného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	37	44	355,00	355,00	13 135,00	15 620,00	2 485,00	3 006,85
	xxx	xxx	Dioramatická kompozice DK 23A, DK 23B - T 815 GTC Kolem světa, T 815 Živá Afrika, T 138 Lambaréné - 70 mm vrstva zpevněného písku; překližkové zvyšovací viz DK 23A, DK 23B	m ²	0	90	0,00	355,00	0,00	31 950,00	31 950,00	38 659,50
INFOGRAFIKA	xxx	xxx	Popisová tabulka pro exponáty vozidel a velkých exponátů z 10mm feromagnetického plechu instalovaná bariéře vozidel, uchycení pomocí 4 zapuštěných neodýmových magnetů, text gravovaný, rozměry 205 x 223 mm	ks	0	105	0,00	900,00	0,00	94 500,00	94 500,00	114 345,00
INTERAKTIVNÍ PRVKY	xxx	xxx	Klířovací stěna s kabinou	ks	0	1	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	399 300,00
VÍCEPRÁCE CELKEM											531 017,00	642 530,57

B

MĚNĚPRÁCE

část projektové dokumentace	číslo položky	číslo položky dle projektu	název položky	měrná jednotka	množství		cena za jednotku (v Kč)		cena celkem bez DPH (v Kč)		měněpráce (v Kč)	
					dle SoD	výsledné	dle SoD	výsledná	dle SoD	výsledná	bez DPH	s DPH
OBEČNÉ POLOŽKY	1.1.	1.2.	Grafické zpracování textových, obrazových a digitálních podkladů - předtisková a další příprava pro zhotovení velkoformátových bannerů - panelů (P), popisek, grafiky pro multimédia a mobilní aplikace	ks	1	0,94	100 000,00	100 000,00	100 000,00	94 000,00	6 000,00	7 260,00
DALŠÍ EXPOZIČNÍ PRVKY	4.1.	4.1.	Expoziční zábradlí bariéra vozidel - rovný segment- konstrukční prvek z 10 mm a 8 mm železného plechu svařeného, bariéra se bude skládat z jednotlivých segmentů po 2 - 3 či 4 metrech, poslední segmenty v délce dle přesného zaměření, bariéra bude kotvena do betonové podlahy dle půdorysu do ocelových kotev TDS, které umožňují opakovanou deinstalaci a zaslepení otvorů, povrch černá prášková vypalovaná barva nebo mokry nástřik barvou, na horní ploše nástřik bílou barvou pro vyznačení symbolu přeřizované a plně středové silniční čáry, zábradlí bude sloužit pro instalaci popisek k vozům a také jako odpočinková zóna - sedací prvek	bm	581,309	540	2 000,00	2 000,00	1 162 618,00	1 080 000,00	82 618,00	99 967,78
	4.12.	4.12.	Dioramatická kompozice DK 6 - NW typ T - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	45	22	355,00	355,00	15 975,00	7 810,00	8 165,00	9 879,65
	4.19.	4.19.	Dioramatická kompozice DK 13 - T 111 - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	40	0	355,00	355,00	14 200,00	0,00	14 200,00	17 182,00
	4.23.	4.23.	Dioramatická kompozice DK 17 - T 815 KRAB - 70 mm vrstva asfaltu	m ²	60	54	1 000,00	1 000,00	60 000,00	54 000,00	6 000,00	7 260,00
	4.25.	4.25.	Dioramatická kompozice DK 19 - T 162 - 70 mm vrstva asfaltu	m ²	105	80	1 000,00	1 000,00	105 000,00	80 000,00	25 000,00	30 250,00
	4.28.	4.28.	Dioramatická kompozice DK 22 - T Dakar, Jamal - 70 mm vrstva zpevněného písku; překližkové zvyšovačky viz DK 22	m ²	145	140	355,00	355,00	51 475,00	49 700,00	1 775,00	2 147,75
	4.29.	4.29.	Dioramatická kompozice DK 23 - T 815, T805 - 70 mm vrstva praného šedého kačírku frakce 16-22 mm	m ²	56	0	355,00	355,00	19 880,00	0,00	19 880,00	24 054,80
INFOGRAFIKA	5.2.	5.2.	Popisková tabulka pro expozitury vozidel a velkých expozitů z 10mm feromagnetického plechu instalovaná bariéře vozidel, uchycení pomocí 4 zapuštěných neodýmových magnetů, text gravírovaný, rozměry 410 x 223 mm - výtvarné řešení viz grafický manuál, konkrétní texty viz odborný scénář, počet 92 + 10 rezervních pro nové akvizice, aktuální výroba TATRA, textové podklady pro výrobu jsou součástí odborného scénáře, aktuální verzi před dodávkou expozice dodá Technické muzeum Tatra.	ks	102	50	1 000,00	1 000,00	102 000,00	50 000,00	52 000,00	62 920,00
INTERAKTIVNÍ PRVKY	6.8.	7.8.	Zrcátka	ks	1	0	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	72 600,00
	6.12.	7.12.	Podvozek Tatra	ks	1	0	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	459 800,00
	6.16.	7.16.	Model interiéru Tatra kolem světa, pouze LTD podložka do vitríny pod model, konkrétní specifikace bude vycházet až z dodaného modelu	ks	1	0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00
	6.17.	7.17.	Klíčovací stěna	ks	1	0	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	266 200,00
MĚNĚPRÁCE CELKEM											877 638,00	1 061 941,98
