

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0068/2021/OI/VZ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena předsedou představenstva
Ing. Petrem Buchtou
Zapsána v OR: u KS v Ostravě oddíl B, vložka
2419

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 8 smlouvy o dílo č. 0068/2021/OI/VZ ze dne 20.01.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3, 4, 5 a 6 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4, 5, 6 a 7 této smlouvy.“
- Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
- Příloha č. 2 Časový harmonogram realizace díla se nahrazuje novou přílohou č. 2, která je součástí tohoto dodatku.
- Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá: příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 01, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku; příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 02, která tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku; příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 03, která tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku a příloha č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 04, která tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku.
- Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
A) Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlovova	7 576 552,25 Kč	1 591 075,97 Kč	9 167 628,22 Kč
B) Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova	8 158 597,13 Kč	1 713 305,40 Kč	9 871 902,53 Kč
CENA CELKEM	15 735 149,38 Kč	3 304 381,37 Kč	19 039 530,75 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

7. Čl. V. Termín plnění, odst. 2. se doplňuje o text následujícího znění:

*„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí pro stavební objekty **SO 101.1 včetně DZ, SO 451.1 v úseku 0,00 až 0,30 km dle výkresu C 02 situace, SO 101.2 pro dílčí část přeložky kabelu SŽDC 21 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII, této smlouvy.“***

čl. II.

Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 07171/RM1822/110 ze dne 27.07.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0068/2021/OI/VZ ze dne 20.01.2021 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla, který nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy
Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 01
Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 02
Příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 03
Příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 04

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci




Za zhotovitele



Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY									
Stavba:		Cyklotrasa U - U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova							
Cena bez DPH		15 735 149,38							
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně				
	snížená	21,00%	15 735 149,38		3 304 381,37				
		15,00%	0,00		0,00				
Cena s DPH		v CZK 19 039 530,75							
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ									
Stavba:		Cyklotrasa U - U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova							
Kód	Soubor, objekt	Cena bez DPH [CZK]	VCP bez DPH [CZK]	MP bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK] SOD + VCP - MP	Cena s DPH [CZK] SOD + VCP - MP			
Náklady stavby celkem		15 478 736,91	899 765,23	-643 352,76	15 735 149,38	19 039 530,75			
E	Zásady organizace výstavby	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	133 100,00			
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	513 808,00	0,00	0,00	513 808,00	621 707,68			
SO 101 A	Cyklistická stezka a chodníky - DEFINITIVNÍ DZ	173 279,22	0,00	0,00	173 279,22	209 667,86			
SO 101.1	Cyklistická stezka a chodníky	3 834 271,18	538 317,32	-613 486,52	3 759 101,98	4 548 513,40			
SO 101.2	Úpravy na ul. Výškovická	2 613 706,76	126 000,00	0,00	2 739 706,76	3 315 045,18			
SO 102	Úprava na ulici Výškovická, Pavlova	258 421,31	99 665,13	0,00	358 086,44	433 284,59			
SO 351	Přeložka vodovodu	530 158,33	135 782,78	-29 866,24	636 074,87	769 650,59			
SO 451.1	Veřejné osvětlení	694 151,00	0,00	0,00	694 151,00	839 922,71			
SO 451.2	Návrh SSZ	5 418 890,37	0,00	0,00	5 418 890,37	6 556 857,35			
SO 651	Přeložka trakčních stožárů a kabelů	1 006 993,94	0,00	0,00	1 006 993,94	1 218 462,67			
SO 652	Ochrana kabelů NN DPO a.s.	325 056,80	0,00	0,00	325 056,80	393 318,73			

Časový harmonogram realizace díla

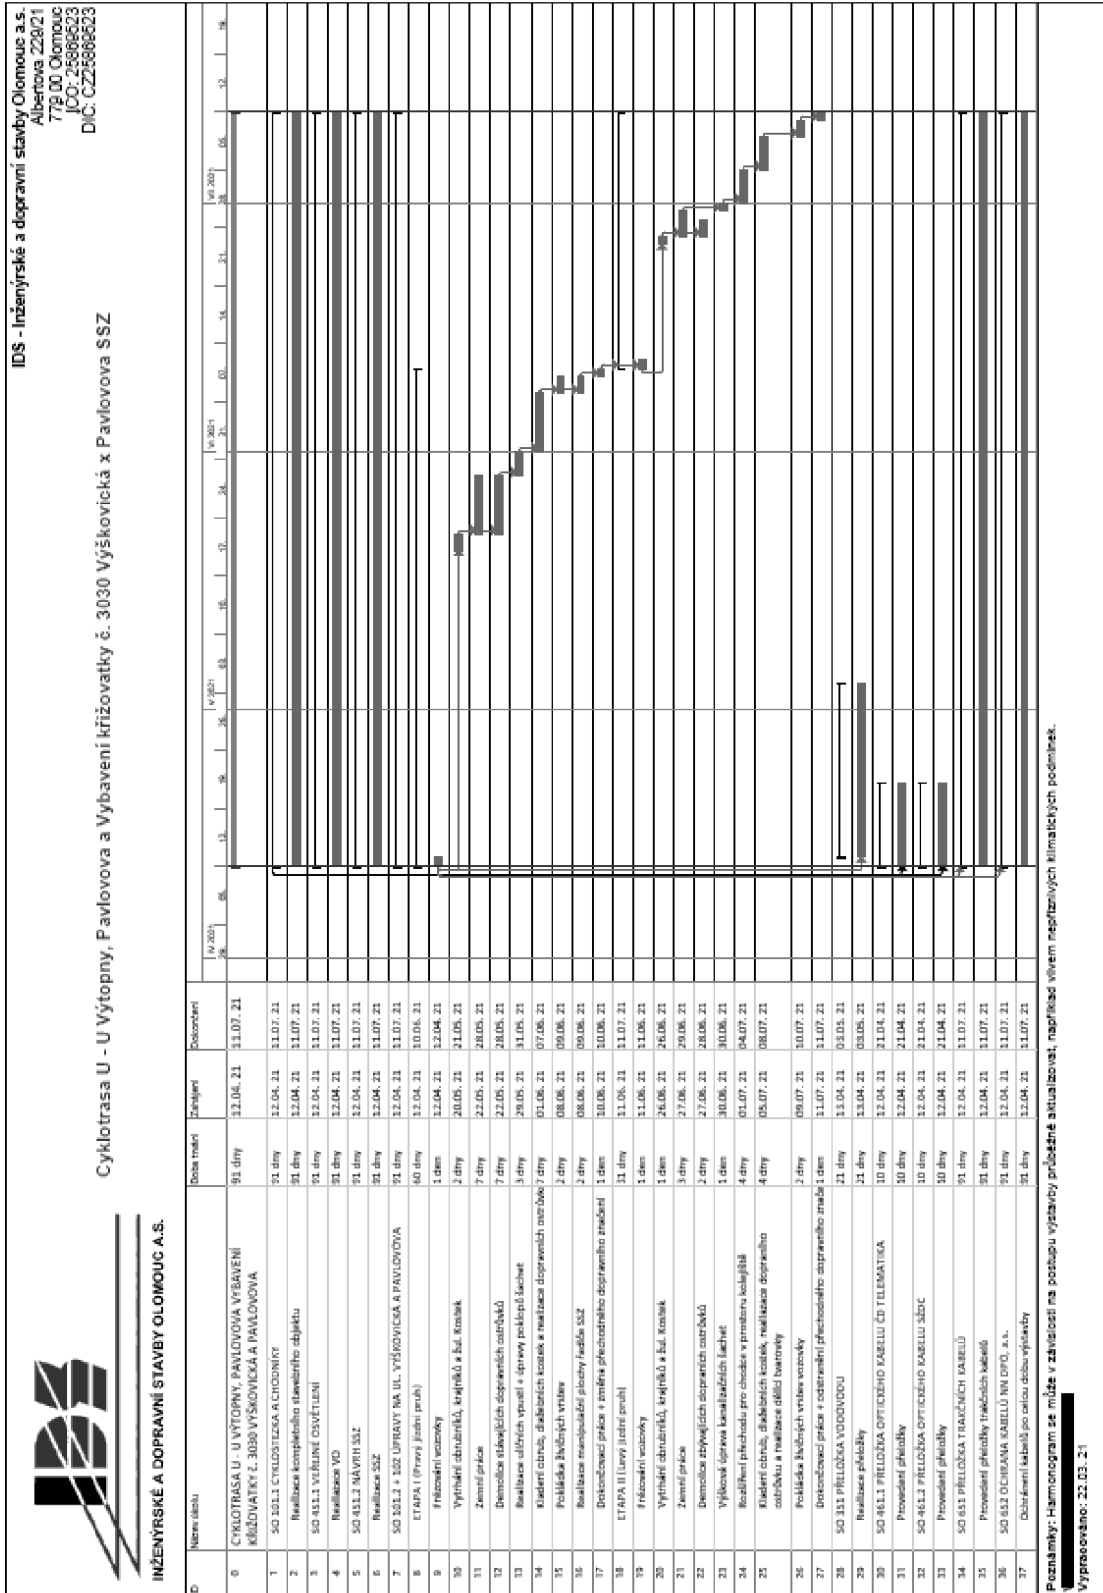

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21 779 00 Olomouc IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523		Cyklotrasa U - U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova SSZ		Gantt chart timeline (VI 2021, VII 2021, IX 2021, X 2021)											
				[Timeline grid with dates from 14.05.2021 to 04.06.2021]											
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení											
0	CYKLOTRASA U - U VÝTOPNY, PAVLOVA VYBAVENÍ KŘÍŽOVATKY Č. 3030 VÝŠKOVICKÁ A PAVLOVA	92 dny	01.07. 21	30.09. 21											
1	SO 101.1 CYKLOSTEZKA A CHODNÍKY	51 dny	11.08. 21	30.09. 21											
2	Bourací a zemní práce	7 dny	11.08. 21	17.08. 21											
3	Příprava pláně násyp konstrukčních vrstev	12 dny	18.08. 21	29.08. 21											
4	Napojení chodníku a cyklostezky	5 dny	30.08. 21	03.09. 21											
5	Pokládka obrub a dlažeb	15 dny	04.09. 21	18.09. 21											
6	Terénní úpravy	5 dny	19.09. 21	23.09. 21											
7	Dopravní značení	2 dny	24.09. 21	25.09. 21											
8	Dokončovací práce	2 dny	26.09. 21	27.09. 21											
9	Vykližení staveniště	3 dny	28.09. 21	30.09. 21											
10	SO 451.1 VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	17 dny	01.08. 21	17.08. 21											
11	Realizace VO	17 dny	01.08. 21	17.08. 21											
12	SO 461.1 PŘELOŽKA OPTICKÝCH KABELŮ SŽDC A ČD TELEMATIKA	31 dny	01.07. 21	31.07. 21											
13	Provedení přeložek	31 dny	01.07. 21	31.07. 21											

Poznámky: Harmonogram se může v závislosti na postupu výstavby průběžně aktualizovat, například vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
 Výpracováno: 30.06. 21

Evidenční list změny stavby č. 01

Evidenční list změny stavby																								
<p>Název a evidenční číslo stavby: Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlovova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova, org. 3097 a 3165 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 351 Přeložka vodovodu</p>		<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 351 / 1</p>		<p>Číslo změny stavby: 01</p>																				
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0068/2021/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: N200258/O40144/01</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451</p> <p>Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523</p>																								
<p>Gen.projektant (autorský dohled): Dopravoprojekt Ostrava, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 42767377</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): ENVIROAD s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25394436</p>																								
<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Výkres situace, vzorový řez 2) Zápis z kontrolního dne, zápis Ovak v SD, ceníková cena * 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet paré:</th> <th>Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)										
Počet paré:	Příjemce:																							
3 x	Objednatel																							
1 x	TDS																							
1 x	Zhotovitel																							
1 x	Projektant (autorský dozor)																							
<p>Popis a zdůvodnění změny: SO 351 Přeložka vodovodu Technický popis původního stavu: V rámci stavebního objektu SO 351 Přeložka vodovodu je řešena strojním výkopem a zpětným zásepem původní vyléženou zemínou. Napojení na stávající potrubí je řešeno nákrůžekem lemový PE 100 SDR 11 225 mm s přírubou volnou. Technický popis nově navrhovaného stavu: V rámci stavebního objektu SO 351 Přeložka vodovodu je nově řešeno částečně hloubení ručním výkopem v množství 23,59 m3 z důvodu velkého množství nacházejících se inženýrských sítí, s nemožností strojního výkopu. Z důvodu nemožnosti použití původní zeminy a požadavku Ovak je zapotřebí provést opískování v celé délce nového potrubí ŠP 014 v množství 96,87 t a zásepem napojení v místě chodníku ŠD 022 v množství 55,50 t. Všechny přebytek zeminy nepoužitelné na zpětný násep odvezeny na skládku v množství 58,28 t. V rámci výkopových prací zjištěna skutečnost jiného napojení na stávající potrubí než předpokládala PD, je nutno použít spojku Waga-MU 3007 Plus, spojka přímá, jítěná v tahu, Uni/Fixers. Zdůvodnění změny: Tato změna vznikla v průběhu výstavby, při výkopových pracích a nutnosti částečného ručního výkopu kolem inženýrských sítí. Dále je zjištěna nevhodná zemina na zásep kolem vodovodního potrubí je zapotřebí ji nahradit zásepovým pískem a v místě nového chodníku kamenivem. V rámci napojení na stávající potrubí je nutno použít Waga spojku než předpokládala PD. Jedná se o vícepráce na spojkě potrubí, výkopech a zásepoch ve výši 135 782,78 Kč bez DPH. Jedná se o méněpráce na spojkě potrubí, výkopech a zásepoch ve výši -29 866,24 Kč bez DPH. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>																								
<p>Číslový vliv na plnění SO: NEMÁ VLIV</p>																								
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th>Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th>Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th>Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-29 866,24</td> <td>-0,19%</td> <td>135 782,78</td> <td>0,88%</td> <td>105 916,54</td> </tr> </tbody> </table>					Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	-29 866,24	-0,19%	135 782,78	0,88%	105 916,54										
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL																				
-29 866,24	-0,19%	135 782,78	0,88%	105 916,54																				
<p>Vyjádření - souhlas se změnou:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Projektant (autorský dohled):</td> <td>souhlasím / nesouhlasím</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>souhlasím / nesouhlasím</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>souhlasím / nesouhlasím</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>souhlasím / nesouhlasím</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </tbody> </table>					Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis																				
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis																				
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis																				
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis																				
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".</p>																								
<p>Změna stavby (ZBV) - krycí list</p>				<p>Číslo paré: 1</p>																				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ke ZL 01			
Stavba:	Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x		
Objekt:	SO 351 - Přeložka vodovodu		
Místo:	Ostrava - Výškovice		
Objednatel:	Statutární město Ostrava		
Zhotovitel:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			105 916,54
1 - Zemní práce			492,72
8 - Trubní vedení			-2 481,10
997 - Přesun sutě			11 407,47
Nové položky			96 497,45
Vícepráce			135 782,78
Méněpráce			-29 866,24
Celkem vícepráce - méněpráce			105 916,54
DPH 21%			22 242,47
Vícepráce - méněpráce vč. DPH			128 159,01

Evidenční list změny stavby č. 02

Evidenční list změny stavby														
Název a svazební číslo stavby: Cyklotrasa U – U Výtopy, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova, org. 3067 a 3165 Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS): SO 102 Úprava na ulici Výškovická, Pavlova		Číslo SOPS / číslo změny SOPS: SO 102 / 1	Číslo změny stavby: 02											
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0068D021/OIA/2, číslo smlouvy zhotovitele: H200258/040144/01 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1603/II, 729 00 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: IDS – Inženýring a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Alberta 21, 779 05 Olomouc, IČO: 25669523														
Dien, projektant (autorský dohled): Dopravoprojekt Ostrava, s.a., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 42767377 Technický dozor stavebníka (TDS): ENVIROAD s.r.o., se sídlem Ruska 386/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25394436														
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Zápis z kontrolního dne, emailový zápis 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo pará.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 a</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 a</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Číslo pará.	Příjemce	2 a	Objednatel	1 a	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Číslo pará.	Příjemce													
2 a	Objednatel													
1 a	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
Popis a zdůvodnění změny: SO 102 Úprava na ulici Výškovická, Pavlova 2.1 Dobeťování šachty Cetin Technický popis původního stavu: V rámci stavebního objektu SO 102 Úprava na ulici Výškovická, Pavlova nebyla řešena dobetování stávající šachty. Technický popis nově navrhovaného stavu: V rámci stavebního objektu SO 102 Úprava na ulici Výškovická je nově řešeno vyzdění příčky o rozměrech 4,5 m ² částí šachty Cetin a dobetování volného prostoru v množství 4,5 m ³ , a to z důvodu rozšíření komunikace, které se nově nachází pod komunikací. Součástí je odběrání vody a rozepření nové vyzdění příčky před betonací. Zdůvodnění změny: Tato změna vzniká v průběhu výstavby, při bouřnicích pracích, kdy se nedalo předpokládat, že šachty se bude nacházet pod novou vozovkou. Za účasti správce Cetin a TDS je navržena tato změna, aby byla zajištěna stabilita šachty při pojezdu vozů pod novou vozovkou. Jedná se o víceprací na vyzdění příčky z dobetováním ve výši 57 839,86 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.														
2.2 Výšková úprava kanalizačních poklopů Technický popis původního stavu: V rámci stavebního objektu SO 102 Úprava na ulici Výškovická, Pavlova nebyla řešena výšková úprava kanalizačních poklopů. Technický popis nově navrhovaného stavu: V rámci stavebního objektu SO 102 Úprava na ulici Výškovická je nově řešena výšková úprava 3 kusů kanalizačních poklopů, z důvodu havarijního stavu a nevyhovující výšky obrusné vrstvy komunikace. Zdůvodnění změny: Tato změna vzniká v průběhu výstavby, při bouřnicích pracích, kdy se nedalo předpokládat havarijní stav poklopů a nutnost výškové úpravy tak aby, se poklopy nacházely ve výšce obrusné vrstvy komunikace. Jedná se o víceprací vyzdění 3 kusů kanalizačních poklopů ve výši 5 297,79 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.														
2.3 Nová uliční vpusť včetně napojení UV4 Technický popis původního stavu: V rámci stavebního objektu SO 102 Úprava na ulici Výškovická, Pavlova nebyla řešena rekonstrukce této uliční vpusť. Technický popis nově navrhovaného stavu: V rámci stavebního objektu SO 102 Úprava na ulici Výškovická je nově řešeno osazení nové uliční vpusť z důvodu nefunkčnosti této vpusť. Nově vybudovaná uliční vpusť je napojena do stávající uliční vpusť v délce napojení 31 m. Uliční vpusť navržena z betonových komponentů s keramickým nálesem a polypropylenovou mříží. Zdůvodnění změny: Tato změna vzniká v průběhu výstavby, při bouřnicích pracích, kdy se nedalo předpokládat nefunkčnost této uliční vpusť a z důvodu odvedení srážkové vody z komunikace je nutné tuto vpusť zachovat. Jedná se o víceprací zřízení 1 kusu uliční vpusť včetně zemních prací ve výši 36 400,48 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.														
Smluvní vliv na plnění SO: - NEMA VLIV														
Údaje v Kč bez DPH														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
0,00	0,00%	99 665,13	0,64%	99 665,13										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno: [redacted]	datum: 2.7.2021	podpis: [redacted]										
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno: [redacted]	datum: 2.7.2021	podpis: [redacted]										
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno: [redacted]	datum: 2.7.2021	podpis: [redacted]										
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno: [redacted]	datum: 2.7.2021	podpis: [redacted]										
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Výhled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".														
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo ceně										
				1										

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ke ZL 02		
Stavba:		
	Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x	
Objekt:		
	SO 102 - Úprava na ulici Výškovická, Pavlova	
Místo:	Ostrava - Výškovice	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	
Zhotovitel:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		99 665,13
1 - Zemní práce		17 024,72
8 - Trubní vedení		14 473,00
Nové položky		68 167,41
Vícepráce		99 665,13
Méněpráce		0,00
Celkem vícepráce - méněpráce		99 665,13
DPH 21%		20 929,68
Vícepráce - méněpráce vč. DPH		120 594,81

Evidenční list změny stavby č. 03

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlova, org. 3097 a 3165 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 Úpravy na ul. Výškovická		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 1		Číslo změny stavby: 03
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0068/2021/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: N200256/040144/01 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Alberta 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523				
Gen.projektant (autorský dohled): Dopravoprojekt Ostrava, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 42787377		Technický dozor stavebníka (TDS): ENVIROAD s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25394436		
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Zápis z kontrolního dne 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet par: Příjemce: 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: SO 101.2 Úpravy na ul. Výškovická <u>Technický popis původního stavu:</u> V rámci stavebního objektu SO 101.2 Úpravy na ul. Výškovická nebyly řešeny spojovací postřiky mezi asfaltové vrstvy ACL a SMA. <u>Technický Popis nově navrhovaného stavu:</u> V rámci stavebního objektu SO 101.2 Úpravy na ul. Výškovická jsou nově řešeny spojovací postřiky v množství 0,60 kg/m ² vrstvy ACL ve výměře 1800,00 m ² a vrstvy SMA ve výměře 1800,00 m ² . <u>Zdůvodnění změny:</u> Tato změna vznikla v průběhu výstavby, při realizaci asfaltových vrstev byly zjištěny, chybějící položky spojovacích postřiků mezi vrstvy ACL a SMA. Nutná realizace těchto postřiků, aby došlo k důkladnému spojení asfaltových vrstev a bylo možné držet záruku díla. Jedná se o vícepráce na spojovacích postřicích ve výši 126 000,00 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění. časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	126 000,00	0,81%	126 000,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo par: 1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ke ZL 03			
Stavba:	Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlovova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x		
Objekt:	SO 101.2 - Úpravy na ul. Výškovická		
Místo:	Ostrava - Výškovice		
Objednatel:	Statutární město Ostrava		
Zhotovitel:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			126 000,00
5 - Komunikace			126 000,00
Vícepráce			126 000,00
Méněpráce			0,00
Celkem vícepráce - méněpráce			126 000,00
DPH 21%			26 460,00
Vícepráce - méněpráce vč. DPH			152 460,00

Evidenční list změny stavby č. 04

Evidenční list změny stavby																								
<p>Název a evidenční číslo stavby: Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlovova a Vybavení knihovnatky č. 3030 Výškovčická x Pavlovova, org. 3097 a 3165 Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS): SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky</p>		<p>Číslo SOPS / / číslo změny SOPS: SO 101.1 / 1</p>	<p>Číslo změny stavby: 04</p>																					
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0068/2021/OIVZ, číslo smlouvy zhotovitele: N200250404144/01 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 00 Ostrava, IČO: 00645451 Zhotovitel: IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Alšbátova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523</p>																								
<p>Gen.projektant (autorský dohled): Dopravoprojekt Ostrava, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 42767377 Technický dozor stavebníka (TDS): ENVIROAD a.s.p., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25394436</p>																								
<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Výkres situace, podélný profil 2) Zápis z kontrolního dne, cenové nabídky, vyjádření ČEZ 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace, rozdílový rozpočet - zpracovaný AD 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet 		<p>Počet par: Příjemce:</p> <table border="1"> <tr> <td>2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>			2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)												
2 x	Objednatel																							
1 x	TDS																							
1 x	Zhotovitel																							
1 x	Projektant (autorský dozor)																							
<p>Popis a zdůvodnění změny: SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky 4.1 Změna povrchu včetně napojení <u>Technický popis původního stavu:</u> V rámci stavebního objektu SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky byla řešena v rámci PD cyklistická stezka podél železniční trati z červeného asfaltu ADD 8 včetně napojení na připravovanou stezku z předchozí rekonstrukce Výškovčického mostu. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> V rámci stavebního objektu SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky je nově řešena záměna červeného asfaltového povrchu ADD 8 cyklostezky za dlážděný povrch z červené dlažby KLASIKO 20 x 10 x 6 cm bez fazety v celé výměře 663,2 m², včetně výměny konstrukční vrstvy ze štrkodráti ŠD 0/32 tl. 150 mm. Dále součástí je rutno upravené napojení připravené části cyklostezky, tak aby byl dosažen požadovaný spád cyklostezky. Nově navržená úprava spočívá ve vybourání 8 m² cyklostezky a plynulého napojení s předžádáním nározi přechodu přes cyklostezku ve výměře 16 m². <u>Zdůvodnění změny:</u> Tato změna vznikla v průběhu výstavby, ČEZ požaduje nad kabelovou trasou rozbitelný povrch a tímto požadavkem došlo k záměně asfaltového povrchu cyklostezky za dlážděný povrch. Úprava napojení vznikla z důvodu nerovnovážného podélného spádu připravované části cyklostezky v rámci rekonstrukce Výškovčického mostu. Iby cyklostezka byla napojena na stávající stez a v rámci námi realizovaného projektu dochází k výškové úpravě nivelety cyklostezky. Jedná se o vícepráce pokládání dlažby cyklostezky včetně napojení na stávající cyklostezku ve výši 515 470,27 Kč bez DPH. Jedná se o méněpráce pokládání asfaltového povrchu cyklostezky včetně konstrukčních vrstev ve výši -613 488,52 Kč bez DPH. Uvedená změna má vliv na celkový termín plnění. 4.2 Soudy kabelové trasy ČD-Telematika a SŽDC <u>Technický popis původního stavu:</u> V rámci stavebního objektu SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky byla plánována pouze stranová plechka kabelu SŽDC a zbylé přeložky kabelu ČD-Telematiky a SŽDC zajišťuje město Ostrava. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> V rámci stavebního objektu SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky jsou provedeny kopané sondy v počtu 9 kusů, pro vytyčení a zjištění množství inženýrských sítí ČD-Telematiky a SŽDC, tyto provedené sondy odhalily větší množství inženýrských sítí ve zpravě ČD-Telematiky a SŽDC, tyto přeložky kabelů zajišťuje město Ostrava. <u>Zdůvodnění změny:</u> Tato změna vznikla při kopání sondách byly nalezeny nevyřešené zabezpečovací kabely, které nebyly srušeny a není možné provést jakoukoliv výkopové práce v blízkosti těchto inženýrských sítí, jelikož všechny kabely se nacházejí v jedné rýze a jsou přetíženy sítí až do Píerova. Všechny tyto inženýrské sítě budou přeloženy do bezpečné vzdálenosti blže k trati od nové budované cyklostezky. Jedná se o vícepráce 9 kusů ručních kopaných sond ve výši 22 847,05 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna má vliv na celkový termín plnění objektu SO 101.1 Cyklistická stezka a chodníky posun termínu o 8 týdnů.</p>																								
<p>Číslový vliv na plnění SOPS: MÁ VLIV, produkováno o 8 týdnů od dokončení přeložek sítí.</p>																								
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL</th> <th>Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby</th> <th>Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL</th> <th>Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby</th> <th>Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-613 488,52</td> <td>-3,96%</td> <td>538 317,32</td> <td>3,48%</td> <td>-75 169,20</td> </tr> </tbody> </table>					Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL	-613 488,52	-3,96%	538 317,32	3,48%	-75 169,20										
Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL																				
-613 488,52	-3,96%	538 317,32	3,48%	-75 169,20																				
<p>Vyjádření - souhlas se změnou:</p> <table border="1"> <tr> <td>Projektant (autorský dohled):</td> <td>souhlasím / nesoouhlasím</td> <td>Jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>souhlasím / nesoouhlasím</td> <td>Jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>souhlasím / nesoouhlasím</td> <td>Jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>souhlasím / nesoouhlasím</td> <td>Jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>					Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesoouhlasím	Jméno	datum	podpis	TDS:	souhlasím / nesoouhlasím	Jméno	datum	podpis	Zhotovitel:	souhlasím / nesoouhlasím	Jméno	datum	podpis	Objednatel:	souhlasím / nesoouhlasím	Jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesoouhlasím	Jméno	datum	podpis																				
TDS:	souhlasím / nesoouhlasím	Jméno	datum	podpis																				
Zhotovitel:	souhlasím / nesoouhlasím	Jméno	datum	podpis																				
Objednatel:	souhlasím / nesoouhlasím	Jméno	datum	podpis																				
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".</p>																								
<p>Změna stavby (ZEV) - krycí list</p>				<p>Číslo par: 1</p>																				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ pro ZL 04		
Stavba:		
	Cyklotrasa U – U Výtopny, Pavlovova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x	
Objekt:		
	SO 101.1 - Cyklistická stezka a chodníky	
Místo:	Ostrava - Výškovice	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	
Zhotovitel:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		-75 169,20
1 - Zemní práce		9 821,30
5 - Komunikace		-320 797,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		19 239,65
Nové položky		216 567,77
Vícepráce		538 317,32
Méněpráce		-613 486,52
Celkem vícepráce - méněpráce		-75 169,20
DPH 21%		-15 785,53
Vícepráce - méněpráce vč. DPH		-90 954,73
