

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892

IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 32

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19

ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: IO – 02 Oplocení – změna předmětu díla

DATUM: 02/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změna předmětu díla z důvodu skutečného stavu oplocení se sousedním pozemkem. Z důvodu realizace oplocení majitelem sousedního pozemku před realizací díla není prostor pro provedení oplocení dle PD, v této části nové oplocení není třeba

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

| | |
|--|--------------|
| Cena díla se sníží o : | 89.336,96 Kč |
| Cena díla se zvýší o : | 0 Kč |
| Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o | 89.336,96 Kč |

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dnů


Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 31.03. 2021

Termín dokončení díla do: 03/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.

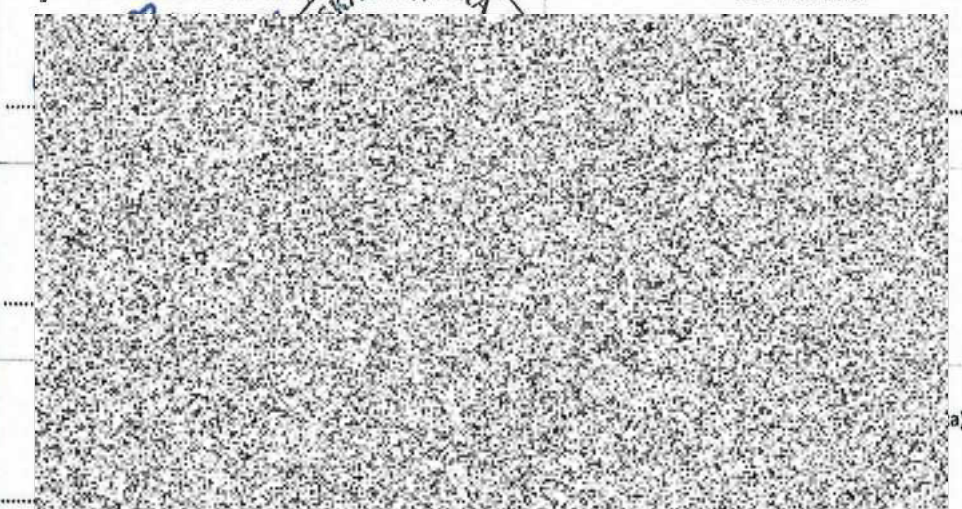

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ226768607
www.cl-evans.cz

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 31 – SO-01 Uzamykací systém EPS

Popis problému: dle revize PD, změna uzamykacího systému, osazen systém generálního klíče v souladu s požadavky HZS na jeden klíč umožňující otevřít všechny dveře, který je uložený v klíčové trezoru dle PBR

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 12.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 GENERÁLNÍ KLÍČ - UZAMYKACÍ SYSTÉM EPS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

| POŘ.Č. | C.POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | M.J. | POČET M.J. | JEDN.CENA | CENA CELKEM |
|---|-----------|----------------------------------|------|------------|-----------|------------------|
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | |
| 1 | | D+M vložka cylindrická s 3 klíči | ks | -45,000 | 97,50 | -4 387,50 |
| 1 | | Cylindrická vložka 77/82 mm | ks | 44,000 | 718,00 | 31 592,00 |
| 2 | | Cylindrická půlvložka 32 mm | ks | 1,000 | 528,00 | 528,00 |
| 3 | | Montáž a zaměření | ks | 45,000 | 105,00 | 4 725,00 |
| 4 | | Dopravní náklady | ks | 2,000 | 735,00 | 1 470,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické - celkem | | | | | | 33 927,50 |

SO-01 GENERÁLNÍ KLÍČ (UZAMYKACÍ SYSTÉM EPS) - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) 33 927,50 Kč

Poznámka : není součástí předmětu díla, požadavek objednatele
dle odsouhlaseného technického návrhu zhotovitele ze dne 07.12.2020

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 05. února 2021

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 16.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.31 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s provedením generálního klíče v objektu dle požadavku uživatele.




S pozdravem

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky
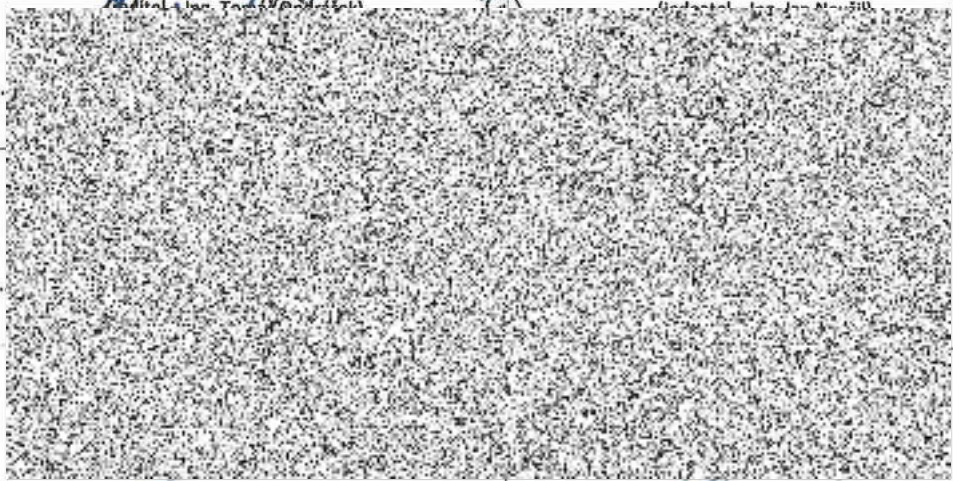
| | |
|--|---|
| Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace | IČ 000 69 892 |
| Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. | IČ 267 68 607 |
| DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 31 | SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019 |
| PROJEKT: | „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“ |
| LOKALIZACE ZMĚNY: | SO-01 Uzamykací systém EPS |
| DATUM: | 02/2021 |
| Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci. | |
| POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Dle revize PD změna uzamykacího systému, osazen systém generálního klíče v souladu s požadavky HZS na jeden klíč umožňující otevřít všechny dveře, který je uložený v klíčové trezoru dle PBŘ | |
| CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací | |
| SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací | |
| POČET PŘÍLOH: 1 | |
| Cena díla se sníží o : | 0 Kč |
| Cena díla se zvýší o : | 33.927,50 Kč |
| Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o | 33.927,50 Kč |
| Změna termínů provádění/dokončení díla: | |
| Doba nutná pro provedení sjednaných změn: | 10 dnů |
| Datum dokončení díla se prodlouží o: | 0 dní |
| Změna bude realizována do: | 10.03. 2021 |
| Termín dokončení díla do: | 03/2021 |
| Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. | CL-EVANS s.r.o. |
|  | |
| podpis/datum | podpis/datum |



CL-EVANS s.r.o.
 Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
 OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
 tel.: +420 487 522 992
 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
 www.cl-evans.cz

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – duben 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení



Popis předmětu informace: ZL č. 30 – Opěrná stěna – odvodnění a hydroizolace

Popis problému: dle revize PD, nerezové odvodňovací potrubí přechnívající z líce prefabrikátu opěrné stěny bylo nahrazeno potrubím PVC, lícující s vnějším povrchem prefabrikátu, z důvodu zvýšené bezpečnosti při provozu na zahradě MŠ, betonové panely jsou v podzemní části ošetřené asfaltovou penetrací, z důvodu delší trvanlivosti

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 12.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

OPĚRNÁ STĚNA - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

| POŘ.Č. | Č.POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | M.J. | POČET M.J. | JEDN.CENA | CENA CELKEM |
|--|------------|---|------|------------|-----------|------------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 42 | 936943R11 | Montáž odvodnění OS z potrubí nerezového do DN 100 | m | -11,000 | 119,60 | -1 315,60 |
| 43 | 55261R07 | trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN 60 | m | -11,000 | 1 590,00 | -17 490,00 |
| 64 | 936964R12 | D+M trubka plastová DN 60 do prefa prvku | ks | 53,000 | 185,00 | 9 805,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce - celkem | | | | | | -9 000,60 |
| 711 - Izolace proti vodě | | | | | | |
| 65 | 7111112001 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 193,130 | 22,00 | 4 248,86 |
| 66 | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg, spotřeba 0,3 - 0,4 kg/m2 | T | 0,077 | 53 753,00 | 4 138,98 |
| 67 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % | 0,028 | 8 387,84 | 234,86 |
| 711 - Izolace proti vodě - celkem | | | | | | 8 622,70 |

OPĚRNÁ STĚNA - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA - CELKEM (bez DPH) - 377,90 Kč

Poznámka : změna předmětu díla - viz bod 54.4. z KD stavby

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 05. února 2021

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 16.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.30 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s úpravou provedení odvodnění nové opěrné stěny.

S pozdravem



.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 30

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: Opěrná stěna – odvodnění a hydroizolace

DATUM: 02/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: dle revize PD, nerezové odvodňovací potrubí přečnivařící z líce prefabrikátu opěrné stěny bylo nahrazeno potrubím PVC, lícující s vnějším povrchem prefabrikátu, z důvodu zvýšené bezpečnosti při provozu na zahradě MŠ, betonové panely jsou v podzemní části ošetřené asfaltovou perietrací, z důvodu delší trvanlivosti

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

| | |
|--|-----------|
| Cena díla se sníží o : | 377,90 Kč |
| Cena díla se zvýší o : | 0 Kč |
| Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o | 377,90 Kč |

Změna termínů provádění/dokončení díla:


| | |
|---|-------------|
| Doba nutná pro provedení sjednaných změn: | 10 dnů |
| Datum dokončení díla se prodlouží o: | 0 dní |
| Změna bude realizována do: | 10.04. 2021 |
| Termín dokončení díla do: | 04/2021 |

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

Zhotovitel – Ing. Tomáš Důdrášek

CL-EVANS s.r.o.

Objednatel – Ing. Jan Neuvžil

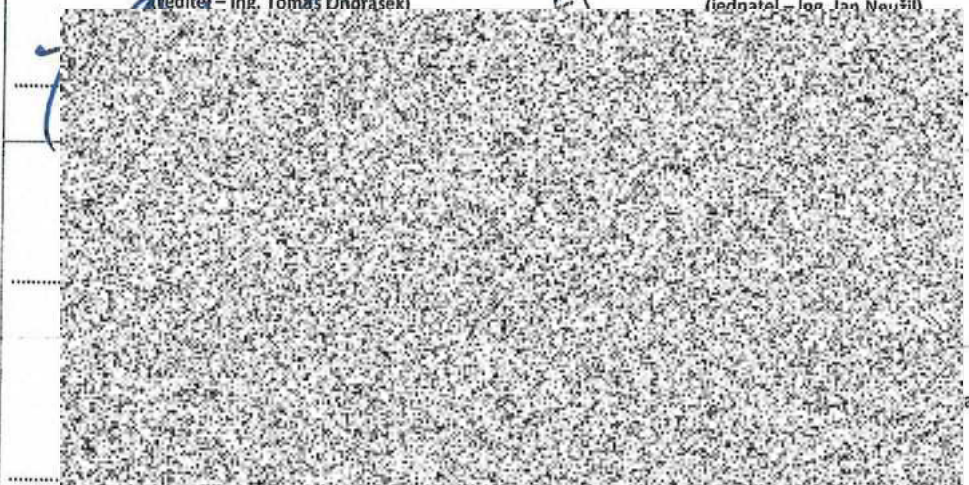

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 29 – SO-01 EPS – otevírání dveří D4

Popis problému: dle revize PD,dveře D4 mezi m.č. 1.01 a 1.04,elektro magnety drží otevřená křídla dveří,při vyhlášení poplachu EPS se dveře zavřou,byl doplněn ruční vypínač,dovolující zavření dveří mimo aktivaci EPS,důvodem změny je upřesnění budoucího provozu depozitáře s ohledem na manipulaci s knižním fondem

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 12.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ELEKTROINSTALACE - EPS - OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ D4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

| POŘ.Č. | Č.POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | M.J. | POČET M.J. | JEDN.CENA | CENA CELKEM |
|--------|---|--|------|------------|-------------|-----------------|
| | 95 - Slaboproudá elektroinstalace | | | | | |
| 1 | 742 21-0151 | Montáž tlačítkového hlásiče | ks | 1,00 | 372,00 Kč | 372,00 |
| 2 | Pol217 | Hlásič tlačítkový | ks | 1,00 | 1 747,00 Kč | 1 747,00 |
| 3 | Pol237 | JXFE-V 4x2x0,8 - stíněný kabel 4x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) - výkres č. 02 | m | 6,00 | 48,00 Kč | 288,00 |
| | 95 - Slaboproudá elektroinstalace - celkem | | | | | |
| | | | | | | 2 407,00 |

SO-01 EPS - OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - ZMĚNA DILA CELKEM (bez DPH) 2 407,00 Kč

Poznámka : zpracováno dle zápisu č. 59.4. z KD stavby - revize PD

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 05. února 2021

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 16.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.29 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s doplněním slaboproudé kabeláže a tlačítek ke dveřím ozn. D4, které souvisí s doplněním vybavení dveří specifikovaných v rámci ZL č. 12.

S pozdravem




KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

| | |
|--|---|
| Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace | IČ 000 69 892 |
| Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. | IČ 267 68 607 |
| DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 29 | SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019 |
| PROJEKT: | „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“ |
| LOKALIZACE ZMĚNY: | SO-01 EPS – otevírání dveří D4 |
| DATUM: | 02/2021 |
| Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci. | |
| POPIS A DŮVOD ZMĚNY: | Dle revize PD změna otevírání dveří D4 |
| CENOVÁ KALKULACE: | Viz příložený Položkový rozpočet prací |
| SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: | 1) Položkový rozpočet prací |
| POČET PŘÍLOH: | 1 |
| Cena díla se sníží o : | 0 Kč |
| Cena díla se zvýší o : | 2.407,00 Kč |
| Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o | 2.407,00 Kč |
| Změna termínů provádění/dokončení díla: | |
| Doba nutná pro provedení sjednaných změn: | 5 dnů |
| Datum dokončení díla se prodlouží o: | 0 dní |
| Změna bude realizována do: | 05.03. 2021 |
| Termín dokončení díla do: | 03/2021 |
| Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. Ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek | CL-EVANS s.r.o. (objednatel – Ing. Jan Noužil) |
| | |



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 28 – SO-01 Nika u hlavního vstupu

Popis problému: dle revize PD, zakrytí řídicích komponentů EPS v otevřené nise ve vstupu do objektu SDK zástěnou s dvířky, povrchová úprava – betonová stěrka. Pro zajištění celistvosti vzhledu tohoto důležitého prostoru bylo navrženo jeho uzavření a provedení povrchové úpravy dle okolních stěn.

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 12.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 NIKA U HLAVNÍHO VSTUPU

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

| POR.Č. | C.POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | M.J. | POČET M.J. | JEDN.CENA | CENA CELKEM |
|--|-----------|--|------|------------|-----------|-----------------|
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | | | | | |
| 1 | 763111R01 | SDK příčka CW/UW50 15 DF | m2 | 2,112 | 982,75 | 2 075,57 |
| 2 | 763755R02 | D+M revizní dvířka do SKD, velikost 500*1800 mm, bez požární odolnosti | ks | 1,000 | 7 105,00 | 7 105,00 |
| 3 | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby | % | 0,052 | 9 180,57 | 477,39 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby - celkem | | | | | | 9 657,96 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | |
| 4 | 784661101 | Dekorační imitace - betonová stěrka v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2,112 | 1 535,00 | 3 241,92 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety - celkem | | | | | | 3 241,92 |

SO-01 NIKA U HLAVNÍHO VSTUPU - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) 12 899,88 Kč

Poznámka : revize PD dle podkladů od GP ze dne 22.12.2020 a revize ze dne 29.01.2021

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 05. února 2021

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:



Datum: 16.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.28 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s navrženou úpravou niky hlavního vstupu do objektu, kdy tato nebyla uvažována jako krytá. Pro zajištění celistvosti vzhledu tohoto důležitého prostoru bylo navrženo jeho uzavření a provedení povrchové úpravy dle okolních stěn.

S pozdravem



KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 28

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: SO-01 Nika u hlavního vstupu

DATUM: 02/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle revize PD úprava niky u hlavního vstupu, zakrytí řídicích komponentů EPS v otevřené nise SDK zástěnou s dvičky, povrchová úprava – betonová stěrka. Pro zajištění celistvosti vzhledu tohoto důležitého prostoru bylo navrženo jeho uzavření a provedení povrchové úpravy dle okolních stěn.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

| | |
|--|--------------|
| Cena díla se sníží o : | 0 Kč |
| Cena díla se zvýší o : | 12.899,88 Kč |
| Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o | 12.899,88 Kč |

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 20 dnů

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 05.03. 2021


Termín dokončení díla do: 03/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.

(ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)

(objednatel – Ing. Jan Neuvžil)

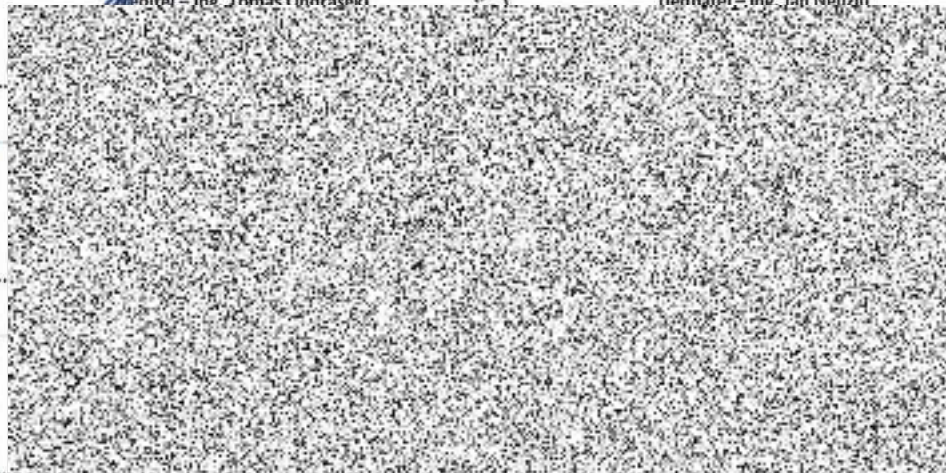

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 27 – SO-01 Změna svítidel ve 3. NP - PBR

**Popis problému: dle revize PD ve 3.NP z důvodu požadavku PBR, osazení rámečků pro
přisazení svítidel na protipožární SDK pohled**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke
zvýšení ceny stavby**

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 10.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ELEKTROINSTALACE - PBR - ZMĚNA SVÍTIDEL VE 3. NP

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

| POR.Č. | C.POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | M.J. | POČET M.J. | JEDN.CENA | CENA CELKEM |
|---|-----------|---|------|------------|-------------|------------------|
| 96 - Silnoproudá elektroinstalace | | | | | | |
| 1 | Pol C2S | PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL - montážní rámeček pro přisazenou montáž | ks | 4,00 | 870,00 Kč | 3 480,00 |
| 2 | Pol D1S | DWL 020U 40PC00 2K2 08 20 V.3 - Downlight přisazená montáž | ks | 7,00 | 1 405,00 Kč | 9 835,00 |
| 3 | Pol N2S | LUMI LUN CB220 1x3 vWD WH | ks | 2,00 | 1 315,00 Kč | 2 630,00 |
| 4 | Pol N3S | LUMI LUN CB220 1x3 WD WH | ks | 1,00 | 1 353,00 Kč | 1 353,00 |
| 5 | Pol N8S | VERSO LED VSN.VSN-CB220 1,2 | ks | 1,00 | 1 805,00 Kč | 1 805,00 |
| 6 | Pol 201 | Montáž rámečku a vsazení svítidla | ks | 15,00 | 285,00 Kč | 4 275,00 |
| 7 | Pol 202 | Ostatní režijní náklady - doprava, přesun | kpl | 1,00 | 2 050,00 Kč | 2 050,00 |
| 95 - Silnoproudá elektroinstalace - celkem | | | | | | 25 428,00 |

SO-01 PBR - ZMĚNA SVÍTIDEL VE 3. NP - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH)

25 428,00 Kč

Poznámka : zpracováno dle revize PD PBR z 20. 10.2020

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 11. listopadu 2020

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 16.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.27 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s navrženou úpravou svítidel v pohledu 3.NP, která souvisí se změnou provedení SDK pohledu s požární odolností.

S pozdravem



.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892

IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 27

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19

ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: SO-01 Změna svítidel ve 3. NP

DATUM: 11/2020

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle revize PD změna svítidel ve 3. NP z důvodu požadavku PBŘ, osazení rámečků pro přisazení svítidel na protipožární pohled

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o : 0 Kč

Cena díla se zvýší o : 25.428,00 Kč

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o 25.428,00 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 20 dnů


Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 15.02. 2021

Termín dokončení díla do: 03/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.

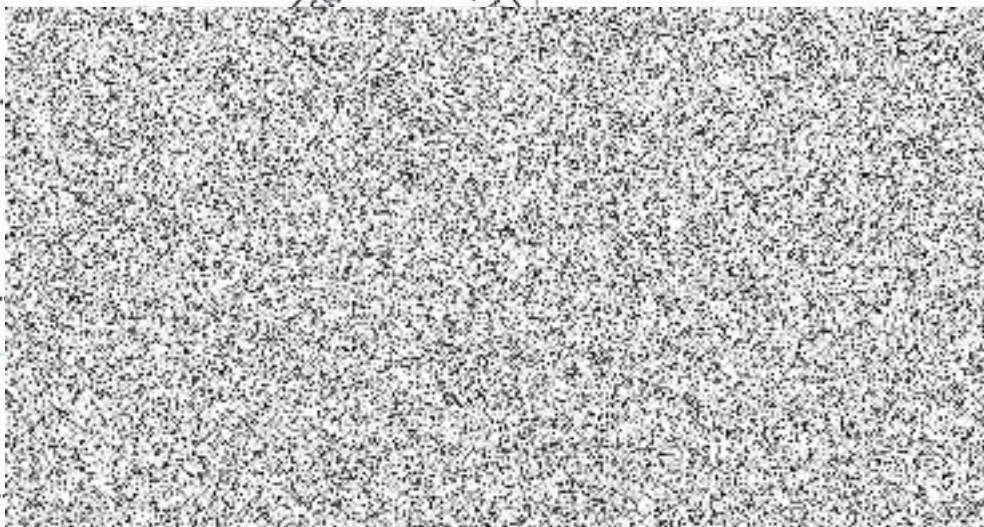

připis/datum

připis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: C226768607
www.cl-evans.cz

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 26 – SO-01 Změna ovládání sekčních vrat, připojení ovládání čtečky karet

Popis problému: dle revize PD, připojení ovládání čtečky karet, důvodem změny je upřesnění budoucího provozu depozitáře s ohledem na zásobování a distribuci knih

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 10.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ZMĚNA OVLÁDÁNÍ SEKČNÍCH VRAT

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

| POR.Č. | Č.POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | M.J. | POČET M.J. | JEDN.CENA | CENA CELKEM |
|--------|---|---|------|------------|-----------|-----------------|
| | 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | |
| 1 | 767258N28 | 3-kanálové dálkové ovládání - připojení ovládání od čtečky karet, v případě povelu kontakt sepnut 1 s | ks | 1,000 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 2 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce | sb | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| | 767 - Konstrukce zámečnické - celkem | | | | | 3 250,00 |

SO-01 ZMĚNA OVLÁDÁNÍ SEKČNÍCH VRAT - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) 3 250,00 Kč

Poznámka : změna ovládání sekčních vrat

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 30. října 2020

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 16.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.26 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s navrženou úpravou ovládání sekčních vrat ozn.: D16 mč. 1.04.

S pozdravem



.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 26

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: SO-01 Změna ovládání sekčních vrat

DATUM: 10/2020

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle revize PD změna ovládání sekčních vrat, připojení ovládání čtečky karet, důvodem změny je upřesnění budoucího provozu depozitáře s ohledem na zásobování a distribuci knih

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1


| | |
|--|-------------|
| Cena díla se sníží o : | 0 Kč |
| Cena díla se zvýší o : | 3.250,00 Kč |
| Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o | 3.250,00 Kč |

Změna termínů provádění/dokončení díla:

| | |
|---|-------------|
| Doba nutná pro provedení sjednaných změn: | 15 dnů |
| Datum dokončení díla se prodlouží o: | 0 dní |
| Změna bude realizována do: | 15.02. 2021 |
| Termín dokončení díla do: | 03/2021 |

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.

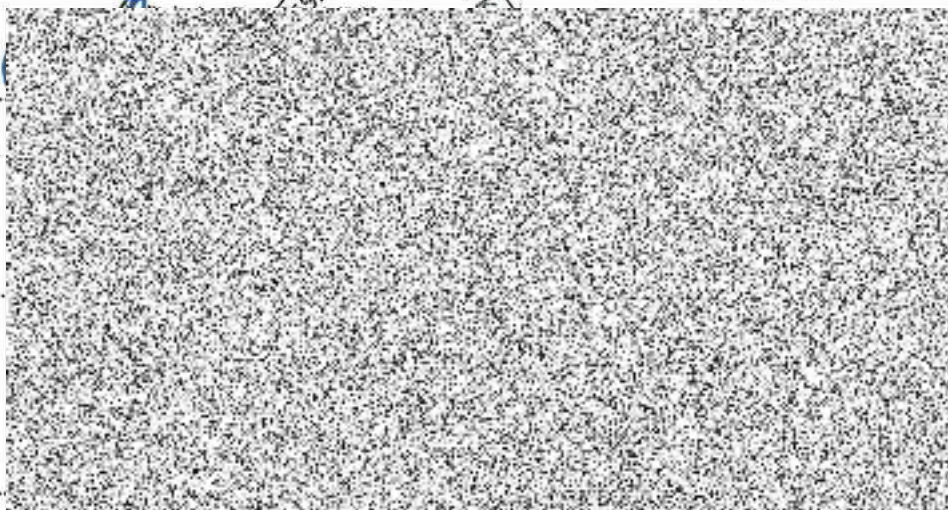

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

-1-

Příloha č. 1
Změnové listy č. 26-43
