



PCR18ETRpo39815684

DODATEK č. 6

**č.j.: KRPL-106745-52/ČJ-2017-1800VZ
ke SMLouvě O Dílo**

č.j.: KRPL-106745-22/ČJ-2017-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar,
náměstek ředitele pro ekonomiku
Tel.: 974 461 224
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 245
Jan Hrdina,
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 362
E-mail: jan.hrdina@pcr.cz

dále jen "**objednatel**"

a

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: Nová 392, 460 10, Liberec X – Františkov
IČ: 02862492
DIČ: CZ02862492
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 264359068/0300
Tel.: 
E-mail: 
Fax: -
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34018

dále jen "**zhotovitel**"

**„KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje -
U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509“**



II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek. Úprava je vyvolána změnami uvedenými ve změnových listech č. 2, 4, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, které vznikly během realizace díla. Podle dohody stran, do okamžiku úplného zaplacení ceny díla, jakékoliv sankce z vop nevznikají.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravu termínu administrativního dokončení díla. Na stanovení termínu nebyla do uzavření tohoto dodatku oboustranná shoda. Termín je odvislý od součinnosti zhotovitele při sestavování změnových listů a jejich úpravě dle oprávněných připomínek objednatele.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 6 upravuje o změny uvedené ve změnových listech č. 2, 4, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 2, 4, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 5:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	10 954 388,59 Kč
DPH 21%:	2 300 421,61 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	13 254 810,17 Kč
slovy: jedenáctmilionůtřístadesátčtyřtisícdevětsetdevadesátčtyřkorunčeských	

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	11 318 141,04 Kč
DPH 21%:	2 376 809,62 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	13 694 950,66 Kč
slovy: třináctmilionůšestsetdevadesátčtyřtisícdevětsetpadesátčtyřkorunčeských 66/100	

V. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Termín pro předání a převzetí staveniště: v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději 02.04.2018

Termín dokončení stavebních prací: 30.04.2019 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 393 dní)

Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.05.2019 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)

Termín pro odstranění vad a nedodělků: 31.05.2019 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 30 dní od dokončení stavebních prací)

Termín administrativního dokončení díla: 31.01.2020 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.01.2020



Textem:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Termín pro předání a převzetí staveniště: v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději 02.04.2018

Termín dokončení stavebních prací: 30.04.2019 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 393 dní)

Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.05.2019 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)

Termín pro odstranění vad a nedodělků: 31.05.2019 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 30 dní od dokončení stavebních prací)

Termín administrativního dokončení díla: 31.05.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.05.2021

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty, odstavci 5.4 se doplňuje text ve znění

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 6, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 6 nebo pozdějším.

I. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.


Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 03-08-2021

objednatel:

plk. Ing.
náměstek



Liberci dne: 03-08-2021

zhotovitel:



jednatelka společnosti:

... kvalitní bydlení

Nová 392, 460 10 Liberec X - Františkov
IČ 02862492, DIČ CZ02862492



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Předmět změnového listu

Žebřík na střechu strojovny, nové mříže v 1. nadzemním podlaží

Část díla dotčená změnovým listem

Střecha, 1. nadzemní podlaží

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení předpokládalo, že u stupadel, která zpřístupňují střechu strojovny výtahů, bude pouze prodlouženo kotvení. Ponechány měly být i mříže na oknech v 1. nadzemním podlaží.

Nové řešení :

Pro zpřístupnění střechy strojovny výtahů byl dodán a osazen nový žebřík.

Mříže na oknech v 1. nadzemním podlaží byly dodány nové.

Zdůvodnění změny :

Stávající stupačky (žebřík) neposkytovaly pro provedných stavebních úpravách (zateplení fasády strojovny) bezpečný přístup na střechu strojovny výtahu. Stupačky po úpravě dle PD neměly dostatečnou pevnost a dostatečný náslap (min. 50 mm).

Stávající mříže z oken v 1. nadzemním podlaží nebylo možné po provedení zateplovacího systému znovu použít.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník č. 2 strana 6623059 ze dne 11.5.2017

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla, jeho životnost ani parametry energetických úspor.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	69 995,87 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 3 500,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	66 495,87 Kč
DPH:	13 964,13 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	460,00 Kč

Za zhotovitele:



9 - -02- 2021

Úpln

021

ZMĚNOVÝ LIST č. 2**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovní
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické		69 995,87			
CELKEM OBJEKT	0,00	69 995,87	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			69 995,87	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY


Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovní
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické		-3 500,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-3 500,00	0,00
CELKEM VRN				0,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 2 PŘÍPOČTY

Stavba:

KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509

Objednatel:

014V122009020

Zhotovitel:


KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

Projektant:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				69 995,87
		767	Konstrukce zámečnické žebřík				69 995,87
urs	1	767832111	Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové konstrukce se suchovodem	m	6,500	2 450,00	15 925,00
urs	2	44983047	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	6,500	3 460,00	22 490,00
urs	4	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000	235,00	1 410,00
urs	5	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista	hod	6,000	343,00	2 058,00
			mříže				
urs	6	767662210	Montáž mříží otvřívacích	m2	33,600	195,00	6 552,00
urs	7	13010021	Dutá ocel - EN 10216-5 - 1.4301: 40 x 20 x 10	t	0,378	27 500,00	10 395,00
			14 * 3 * 1,2				
urs	8	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	378,504	29,50	11 165,87
Celkem změnový list							69 995,87

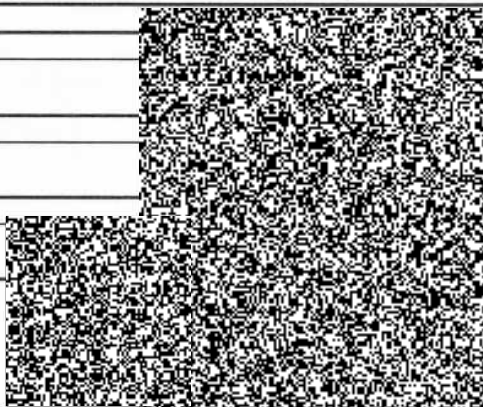

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ODPOČTY

Stavba:

KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509

Objednatel:

014V122009020

Zhotovitel:



KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.



Projektant:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				-3 500,00
767			Konstrukce zámečnické			-	3 500,00
SoD	1	položka SoD č. 128	Úprava a renovace ocelového schodiště na střeše	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00
Celkem změnový list							-3 500,00

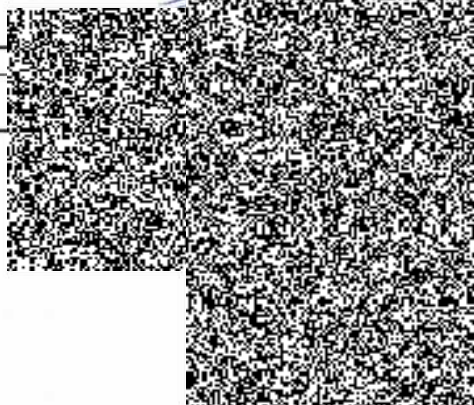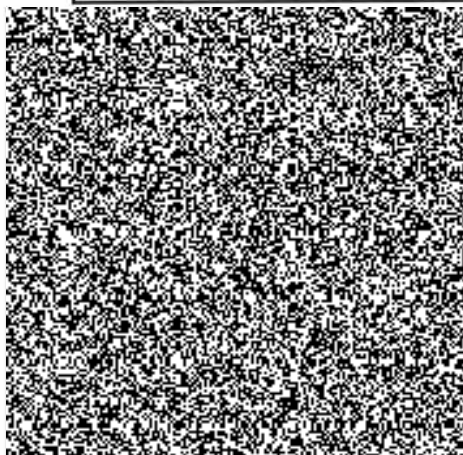

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	4
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
Předmět změnového listu	
Provedení kotvícího prvku pro kamerový systém	
Část díla dotčená změnovým listem	
Celá stavba	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace neřešila přesný způsob ukotvení kamer na fasádu.	
Nové řešení :	
Pro ukotvení koncových prvků kamerového systému byl použit prvek doporučený odborem informačních a komunikačních systémů (správce kamer), s ohledem na velikost kamer bylo nutné použít pod každou kameru prvky dva.	
Zdůvodnění změny :	
Pro ostrahu objektu byly na vnějším nezatepleném plášti objektu osazeny kamery. Pro zachování jejich funkčnosti bylo nutné je přesadit na novou zateplenou fasádu. Použitím prvků doporučených odborem informačních a komunikačních systémů bylo zajištěno stabilní a pevné přikotvení kamer osazených na novém vnějším plášti budovy opatřeném kontaktním zateplovacím systémem.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zapsáno v zápise z KD č. 1 bod 1/2 ze dne 10.4.2018	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano, 2 dny	
Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla, jeho životnost ani na parametry energetických úspor.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	10 037,72 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10 037,72 Kč
DPH:	2 107,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	12 145,64 Kč
 14. 4. 2021 Za projektanta  15. 4. 2021 	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
	

ZMĚNOVÝ LIST č. 4**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
741 Elektroinstalace - silnoproud 0		10 037,72 0,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	10 037,72	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			10 037,72	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY



Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

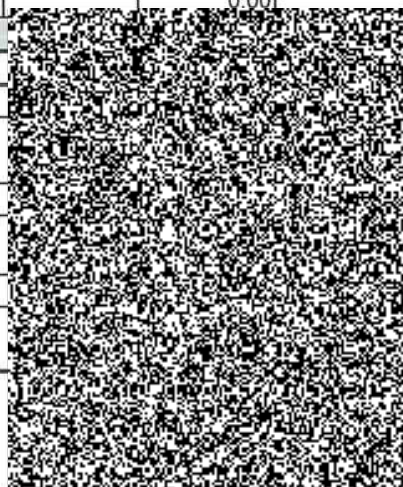


ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY


Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				
741			Elektroinstalace - silnoproud				
ÚRS	1	741112042	Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm	ks	22,000	78,70	1 731,40
ÚRS	2	34571530		ks	22,000	361,00	7 942,00
ÚRS	3	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,099	3 680,00	364,32
Celkem změnový list							10 037,72



Nový list



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo		7
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509	
Číslo akce SMVS:	014V122009020	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.	
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
řešení rovinatosti stávajícího štítového zdiva		
Část díla dotčená změnovým listem		
hlavní stěny		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace navrhovala provedení kontaktního zateplovacího systému na stávající štítové stěny (po odstranění stávající úpravy - obkladu s minerální izolací).		
Nové řešení :		
Nové řešení je v souladu se zadáním. Změna se týká kvality podkladu a jeho rovinatosti. Podklad byl natolik nerovný, že bylo nutné provést lokální reprofilaci stěn.		
Zdůvodnění změny :		
Při realizaci zateplení fasády stávajících štítových stěn objektu byly zjištěny významné odchylky vzájemného osazení jednotlivých panelů od svislosti. Předmětem změny je vyrovnaní plochy pro montáž zateplovacího systému		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Stavební deník č. 1 strana 6623059 ze dne 11.5.208		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla, jeho životnost ani na parametry energetických úspor.		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		40 950,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		40 950,00 Kč
DPH:		8 599,50 Kč
cel. DPH:		49 549,50 Kč
	Za projektanta	Za objednatele:
		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 7**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
98 Demolice a sanace	40 950,00				
CELKEM OBJEKT	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			40 950,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
oplechování panelů Kingspan					
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:

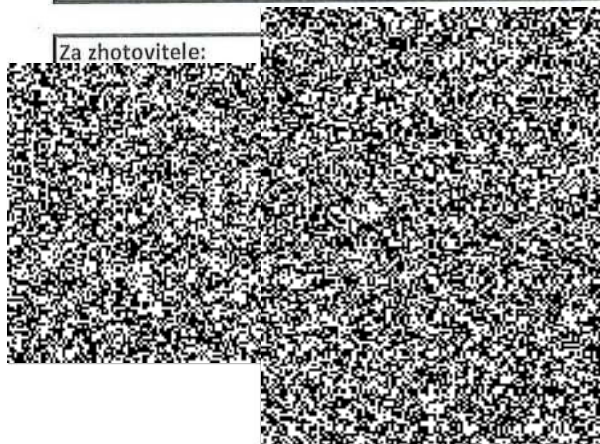



ZMĚNOVÝ LIST č. 7



PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV	Práce a dodávky HSV				40 950,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 950,00
		98	Demolice a sanace				40 950,00
urs	1	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 20 mm	m2	35,00	1170,00	40 950,00
Celkem změnový list							40 950,00 Kč

Za zhotovitele:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 8

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Předmět změnového listu

Parapetní konstrukce balkonu nad terasou

Část díla dotčená změnovým listem

Balkon nad recepcí

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala montáž PUR panelů na stávající stěny lodžii.

Nové řešení :

Chybějící parapetní stěna byla doplněna ocelovou konstrukcí, která byla z vnitřní strany opláštěna cetris deskou.

Zdůvodnění změny :

Dotčený balkon byl původně průchozí na navazující terasu, nebyla zde parapetní stěna. Pro provedení navrženého řešení bylo nutné zhotovit ocelovou konstrukci a následně ji z vnitřní strany opláštit cetris deskou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

změna bez záznamu ve stavebním deníku i KD, odsouhlaseno v průběhu realizace objednatelem


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano


Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla, jeho životnost ani na parametry energetických úspor.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	19 142,44 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	19 142,44 Kč
DPH:	4 019,91 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	23 162,35 Kč



Za projektanta




Za objednatele



14.1.2021

13.1.2021

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:



ZMĚNOVÝ LIST č. 8**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské		5 004,64			
767 Konstrukce zámečnické		14 137,80			
CELKEM OBJEKT	0,00	19 142,44	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			19 142,44	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.



REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:

Nová 392
IČ 0

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

PŘÍPOČTY


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				19 142,44
		766	Konstrukce truhlářské				5 004,64
URS	1	766414243	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	7,480	193,00	1 443,64
			3,40*1,10*2		7,480		
URS	2	FMC.75052	CVD fermacell Powerpanel H2O, 1000x1250x12,5mm	m2	7,854	453,40	3 561,00
			7,48*1,05		7,854		
		767	Konstrukce zámečnické				14 137,80
URS	3	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	22,000	39,90	877,80
			22,00		22,000		
URS	4	55342030	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm	m	3,400	3 900,00	13 260,00
			3,40		3,400		
Celkem změnový list							19 142,44



Nová 392, 460
 IČ 02862
 tel.:

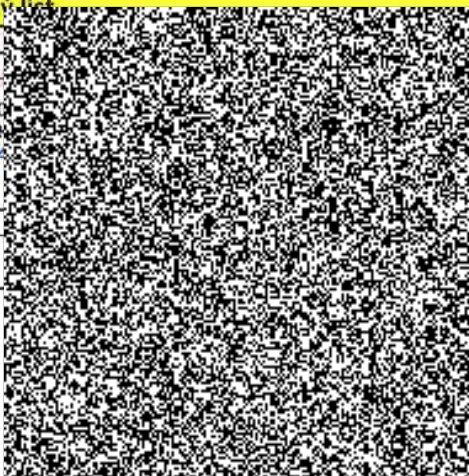

Nová 392, 460
 IČ 02862
 tel.:

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 14

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Předmět změnového listu

Ostění balkonů a lodžii - provedení v souladu s požární normou

Část díla dotčená změnovým listem

Lodžie

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci je navrženo provedení zateplovacího systému na lodžích z polystyrenových desek.

Nové řešení :

Zateplení objektu bylo provedeno z materiálu na bázi minerální vlny.

Zdůvodnění změny :

S ohledem na předpisy vztahující se k zajištění požární odolnosti objektů, muselo být zateplení fasády na lodžích provedeno z materiálů na bázi minerální vlny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno v zápise z KD č. 18 bod 18/1 ze dne 21.8.2018


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla ani jeho životnost.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	49 059,01 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 34 758,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	14 300,43 Kč
DPH:	3 003,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	17 303,52 Kč

	Za projektanta		
9 - -02- 2021		9 - -02- 2021	9 - -02- 2021

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 14

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
 Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úprava povrchů vnějších		49 059,01			
CELKEM OBJEKT	0,00	49 059,01	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			49 059,01	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
 Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úprava povrchů vnějších		-34 758,58			
CELKEM OBJEKT	0,00	-34 758,58	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-34 758,58	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 14

ODPOČTY


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
 Objednatel: 014V122009020
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
HSV			Práce a dodávky HSV				-34 758,58
62			Úprava povrchů vnějších				-34 758,58
SoD	1	SoD pol. 30	622 31-6 Zateplení parapetu , nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlázení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2, ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	-84,468	411,50	-34 758,58
Celkem změnový list							-34 758,58

Za zhotovitele:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	15
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
Předmět změnového listu	
Úprava zádveří	
Část díla dotčená změnovým listem	
Hlavní vstup do objektu	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace předpokládala provedení potřebných rozvodů elektroinstalací v této části objektu do stávajících, případně nových lišt.	
Nové řešení :	
Rozvody elektroinstalací ve vstupu jsou vedeny pod omítkou, stávající stropní konstrukce je zakryta SDK podhledem. V zádveří je provedeno nové osvětlení a výmalba stěn a soklu.	
Zdůvodnění změny :	
Provedení recepce dle zadání se při provádění prací projevilo z estetického hlediska jako nevhodné pro hlavní vstup do budovy krajského ředitelství. Provedením úprav vznikla důstojný vstupní prostor mezi novými automatickými dveřmi.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápisem ve stavebním deníku ze dne 22.1.2019 strana 074648	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano, 7 dní	
Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla, jeho životnost ani na parametry energetických úspor.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	21 244,06 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	21 244,06 Kč
DPH:	4 461,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	25 705,31 Kč
Za projektanta Za objednatele:   11.1.2021 15.1.2021	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
	

ZMĚNOVÝ LIST č. 15**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby		19 534,40			
741 Elektroinstalace silnoproud		762,50			
784 Malby		947,16			
CELKEM OBJEKT	0,00	21 244,06	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			21 244,06	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.




REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 15



PŘÍPOČTY


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				21 244,06
763			Konstrukce suché výstavby				19 534,40
urs	1	763131341	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	13,600	794,00	10 798,40
VV			3,4 * 4		13,600		
urs	2	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	32,000	273,00	8 736,00
VV			4 dny * 8 hod		32,000		
741			Elektroinstalace silnoproud				762,50
urs	3	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	bm	12,500	37,50	468,75
ik	4		kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	bm	12,500	23,50	293,75
784			Malby				947,16
urs	5	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,040	20,90	439,74
			(3 + 2 + 1,2) * 1,2 - stěny		7,440		
			3,4 * 4 - strop		13,600		
urs	6	784221001	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	21,040	18,90	397,66
ik	7		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	14,000	4,29	60,06
ik	8		fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	14,000	3,55	49,70
			Celkem změnový list				21 244,06

Za zhotovitele:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	18
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
Předmět změnového listu	
chodník u vstupu do 1 PP	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 01	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace předpokládala pouze úpravu podzemní části objektu. Chodník přiléhající k objektu u vstupu do 1. podzemního podlaží neměl být upravován.	
Nové řešení :	
Proveden kompletní nový chodník u vstupu do 1. podzemního podlaží, vč. nového odvodnění a zateplení podzemní části základového zdiva. Niveleta chodníku byla upravena tak, aby přístup do 1. podzemního podlaží byl bezbariérový.	
Zdůvodnění změny :	
Rozebráním části chodníku dle zadání byla dotčena polovina jeho plochy. Dlážděný povrch chodníku byl již značně dožilý a navíc neumožňoval bez bariérový přístup do 1. podzemního podlaží. Na základě požadavku objednatele byla proto rozebrána dlažba z celé plochy chodníku, upraveny konstrukční vrstvy a provedeno nové odvodnění.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
zapsáno ve stavebním deníku dne 17.3.2019, list č. 11	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení kvality stavby, která získala bezbariérový přístup do části 1. podzemního podlaží.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	32 669,37 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	32 669,37 Kč
DPH:	6 860,57 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	39 529,94 Kč
	
dne:	dne:
Úplnost:	
	
	

ZMĚNOVÝ LIST č. 18**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Práce a dodávky PSV	14 531,88				
5 Komunikace	16 231,49				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 906,00				
CELKEM OBJEKT	32 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			32 669,37	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.



REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:





ZMĚNOVÝ LIST č. 18
PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
 Objednatel: 014V122009020
 Zhotovitel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Projektant: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				32 669,37
1			Zemní práce				14 531,88
SOD	1	SoD SO01-pol.1	Rozebrání dlažeb, panelů, ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	15,045	41,90	630,39
Plocha celkem: 10,65 * 1,8					19,170		
plocha v SOD : 0,5 * 8,25					-4,125		
plocha rozdíl					15,045		
SOD	2	SoD SO01-pol.2	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	9,027	844,99	7 627,72
SOD	3	SoD SO01-pol.3	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,027	170,00	1 534,59
SOD	5	SoD SO01-pol.5	nakládání výkopku	m3	9,027	130,00	1 173,51
SOD	6	SoD SO01-pol.6	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,027	25,00	225,68
SOD	7	SoD SO01-pol.8	Poplatky za skládku	m3	9,027	370,00	3 339,99
5			Komunikace				16 231,49
SOD	8	SoD SO01-pol.15	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním 400 mm	m2	15,045	598,00	8 996,91
SOD	9	SoD SO01-pol.17	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	15,045	195,00	2 933,78
ÚRS	10	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	bm	12,800	336,00	4 300,80
výpočet: 1,2 + 1,2 + 0,5 + 1,2 + 8,7							
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 906,00
ÚRS	11	115104113	Čerpání vody na v do 20 m l potrubí ve štolě nad 1000 do 3000 m	hod	2,000	278,00	556,00
ÚRS	12	895170101	Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	1,000	1350,00	1 350,00
Celkem změnový list							32 669,37

Za zhotovitele:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	18
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
Předmět změnového listu	
chodník u vstupu do 1 PP	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 01	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace předpokládala pouze úpravu podzemní části objektu. Chodník přiléhající k objektu u vstupu do 1. podzemního podlaží neměl být upravován.	
Nové řešení :	
Proveden kompletní nový chodník u vstupu do 1. podzemního podlaží, vč. nového odvodnění a zateplení podzemní části základového zdiva. Niveleta chodníku byla upravena tak, aby přístup do 1. podzemního podlaží byl bezbariérový.	
Zdůvodnění změny :	
Rozebráním části chodníku dle zadání byla dotčena polovina jeho plochy. Dlážděný povrch chodníku byl již značně dožilý a navíc neumožňoval bez bariérový přístup do 1. podzemního podlaží. Na základě požadavku objednatele byla proto rozebrána dlažba z celé plochy chodníku, upraveny konstrukční vrstvy a provedeno nové odvodnění.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
zapsáno ve stavebním deníku dne 17.3.2019, list č. 11	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení kvality stavby, která získala bezbariérový přístup do části 1. podzemního podlaží.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	32 669,37 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	32 669,37 Kč
DPH:	6 860,57 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	39 529,94 Kč
	
dne:	dne:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:	
Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK	

ZMĚNOVÝ LIST č. 18**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Práce a dodávky PSV	14 531,88				
5 Komunikace	16 231,49				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 906,00				
CELKEM OBJEKT	32 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			32 669,37	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY



Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

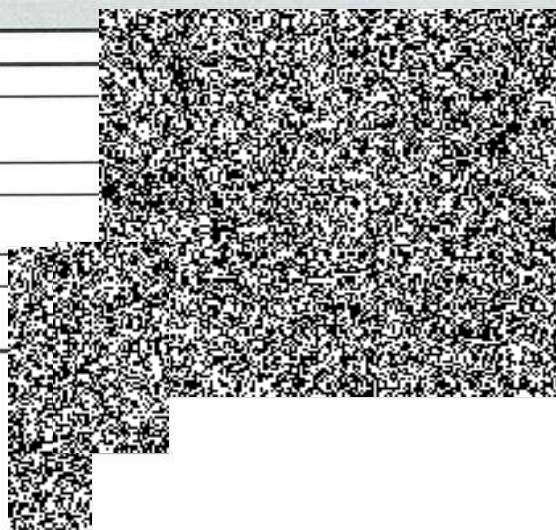

ZMĚNOVÝ LIST č. 18
PŘÍPOČTY

Stavba:

 KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509

Objednatel:

014V122009020

Zhotovitel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje


Projektant:

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				32 669,37
1			Zemní práce				14 531,88
SOD	1	SoD SO01-pol.1	Rozebrání dlažeb, panelů, ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	15,045	41,90	630,39
Plocha celkem: 10,65 * 1,8					19,170		
plocha v SOD : 0,5 * 8,25					-4,125		
plocha rozdíl					15,045		
SOD	2	SoD SO01-pol.2	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	9,027	844,99	7 627,72
SOD	3	SoD SO01-pol.3	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,027	170,00	1 534,59
SOD	5	SoD SO01-pol.5	nakládání výkopku	m3	9,027	130,00	1 173,51
SOD	6	SoD SO01-pol.6	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,027	25,00	225,68
SOD	7	SoD SO01-pol.8	Poplatky za skládku	m3	9,027	370,00	3 339,99
5			Komunikace				16 231,49
SOD	8	SoD SO01-pol.15	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 400 mm	m2	15,045	598,00	8 996,91
SOD	9	SoD SO01-pol.17	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	15,045	195,00	2 933,78
ÚRS	10	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	bm	12,800	336,00	4 300,80
výpočet: 1,2 + 1,2 + 0,5 + 1,2 + 8,7							
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 906,00
ÚRS	11	115104113	Čerpání vody na v do 20 m l potrubí ve štolě nad 1000 do 3000 m	hod	2,000	278,00	556,00
ÚRS	12	895170101	Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	1,000	1350,00	1 350,00
			Celke				32 669,37

Za zhotovitele:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 19

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Předmět změnového listu

Provedení opláštění recepcce

Část díla dotčená změnovým listem

Hlavní vstup do objektu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace řešila dodávku a montáž fasády hlavního vstupu do objektu z cementotřískových desek, bez přesné specifikace jejich nasákavosti a voděodolnosti.

Nové řešení :

Byla provedena fasáda hlavního vstupu do objektu z cementotřískových desek s dodatečně specifikovanými požadavky na nasákavost a voděodolnost fasádních desek.

Zdůvodnění změny :

V původní PD nebyla přesná specifikace fasádních desek fasády hlavního vstupu do objektu z cementotřískových desek. Zhotovitel na základě upřesněného požadavku upravil cenu za provedení této části fasády.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Odsouhlaseno elektronicky projektantem dne 11.1.2019, zapsáno KD č 38 bod 36/2 ze dne 22.1.2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano


Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla, jeho životnost ani na parametry energetických úspor.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	77 120,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 62 400,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	14 720,00 Kč
DPH:	3 091,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	17 811,20 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
		
14.1.2021	15.1.2021	15.1.2021

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:



ZMĚNOVÝ LIST č. 19**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské		77 120,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	77 120,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			77 120,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.



REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské		-62 400,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-62 400,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 19

PŘÍPOČTY

Stavba:

KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

Projektant:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				77 120,00
766			Konstrukce truhlářské				77 120,00
IK	1	ZL19-IK01	Fasádní obklad cementotřískovou deskou tl. 8 mm, skryté kolvení	m2	32,000	2 410,00	77 120,00
Celkem změnový list							77 120,00

Za zhotovitele:

Nová

IK


ZMĚNOVÝ LIST č. 19**PŘÍPOČTY**




Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				-62 400,00
		766	Konstrukce truhlářské			-	62 400,00
SOD	1	SOD pol. 121	Fasádní obklad cementotřískovou deskou tl. 8 mm, skryté kotvení	m2	32,000	-1 950,00	-62 400,00
Celkem změnový list							-62 400,00

Za zhotovitele:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	20
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
Předmět změnového listu	
hromosvody - podzemní část	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace řeší ochranu před bleskem na vnějším plášti budovy, stávající podzemní části hromosvodu ponechává bez úpravy.	
Nové řešení :	
Zkorodované podzemní části hromosvodu byli vyměněny.	
Zdůvodnění změny :	
Při napojování na podzemní část bylo zjištěno, že stávající zemní pásek je značně zkorodován a je nutné jej vyměnit.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
provedeno na základě dohody bez zápisu ve stavebním deníku či zápisu z KD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení životnosti a účinnosti hromosvodů.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	5 200,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	5 200,00 Kč
DPH:	1 092,00 Kč
DPH:	6 292,00 Kč
  	
změnového listu za účastníka programu zkontrolován. Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK	

ZMĚNOVÝ LIST č. 20**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D 1.4.1 Beskosvod		5 200,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			5 200,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.



REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:

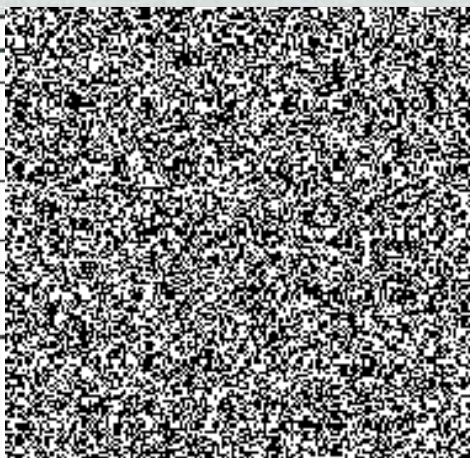


ZMĚNOVÝ LIST č. 20 **PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za m.j.	Cena celkem	Cena za montáž	Celková cena montáž
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D 1.4.1			Beskosvod				2 750,00		2 450,00
			Uzemnění				2750,00		2450,00
SoD	1	SoD SO02-pol.24	Pásek FeZn 30x3,5	m	33	50,00	1650,00	50,00	1650,00
SoD	2	SoD SO02-pol.25	Drát FeZn 10	m	12,5	40,00	500,00	40,00	500,00
SoD	3	SoD SO02-pol.26	Svorka klínová pásek-drát	ks	3	25,00	75,00	25,00	75,00
SoD	4	SoD SO02-pol.27	Svorka připojovací	ks	9	25,00	225,00	25,00	225,00
SoD	5	SoD SO02-pol.28	Antikorozní páska	ks	3	100,00	300,00		
Celkem změnový list									5 200,00

Za zhotovitele:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 21

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Předmět změnového listu

Krycí lišty okenních parapetů a oken

Část díla dotčená změnovým listem

Celá stavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace nepředpokládala žádné speciální řešení styku původních oken s novou fasádou.

Nové řešení :

Svislé spáry u části oken, kde spáry vykazovaly větší šířku, byly opatřeny plastovou lištou k zakrytí. Dále bylo přistoupeno k podobnému ošetření styku oken a parapetů.

Zdůvodnění změny :

Po demontáži krycích lišty bylo měření ověřeno, že jednotlivé okenní otvory nejsou stejně široké, některé vykazují větší šířku než byla předpokládána v projektové dokumentaci. Svislé spáry u této části oken bylo nutné zakrýt plastovou lištou.

Nezakrytím těchto spár by nebyla zajištěna dostatečná odolnost proti povětrnostním vlivům, docházelo by k degradaci výplňového materiálu spáry (PUR pěny).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Odsouhlaseno elektronicky projektantem dne 11.1.2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, 14 dní

Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla, jeho životnost ani na parametry energetických úspor.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	117 150,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	117 150,00 Kč
DPH:	24 601,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	141 751,50 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
1.10.2020		

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkon

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 21**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Ostatní		117 150,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			117 150,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:

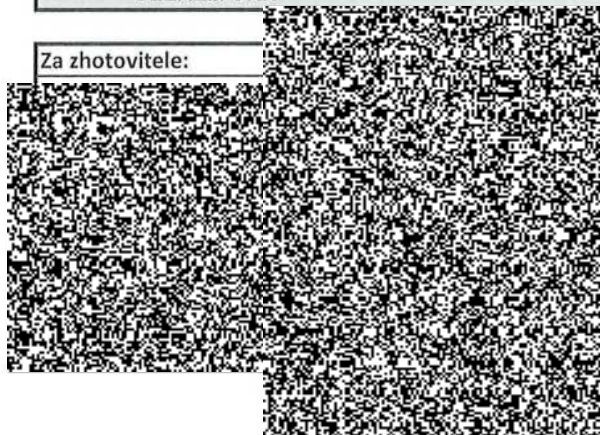





ZMĚNOVÝ LIST č. 21**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				117 150,00
-			Ostatní				117 150,00
IK	1	ZL21-IK01	Dodávka samolepící komorové lišty - kl6015ww9016 60x15	bm	540,000	89,00	48 060,00
popis: nadpraží oken + boky oken							
IK	2	ZL21-IK02	Montáž samolepící komorové lišty seříznutí	bm	540,000	105,00	56 700,00
IK	3	ZL21-IK03	Krycí lišta otevřená bílá 35mm	bm	52,500	125,00	6 562,50
IK	4	ZL21-IK04	Montáž krycí lišty parapetu	bm	52,500	105,00	5 512,50
IK	5	ZL21-IK05	Níple - montážní šroub pod krycí lištu	ks	90,000	3,50	315,00
Celkem změnový list							117 150,00



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace										
Změnový list číslo	22									
Identifikace akce										
Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509									
Číslo akce SMVS:	014V122009020									
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje									
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.									
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.									
Předmět změnového listu										
Změna umístění klimatizací										
Část díla dotčená změnovým listem										
Celá stavba										
Popis změny, popis technického řešení										
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :										
Projektová dokumentace předpokládala zpětné osazení vnějších klimatizačních jednotek na stávající pozice na fasádě.										
Nové řešení :										
Veškeré stávající vnější klimatizační jednotky umístěné na fasádě byly přesunuty na střechu objektu.										
Zdůvodnění změny :										
Přesunutím na střechu se zlepšila obslužnost a kontrola klimatizačních jednotek. Nezanedbatelný je i estetický dopad této změny.										
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :										
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.										
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:										
Odsouhlaseno objednatelem v průběhu realizace, bez konkrétního zápisu ve stavební deníku či zápisu z KD.										
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :										
Vliv na termín: Ano, 5 dní										
Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla, jeho životnost ani na parametry energetických úspor.										
Vliv na cenu: Ano										
Přípočty k ceně díla bez DPH:	16 287,56 Kč									
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč									
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	16 287,56 Kč									
DPH:	3 420,39 Kč									
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	19 707,95 Kč									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Za projektanta</th> <th>Za objednatele:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15.1.2021</td> <td>15.1.2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Za projektanta	Za objednatele:				15.1.2021	15.1.2021	
	Za projektanta	Za objednatele:								
										
15.1.2021	15.1.2021									
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkom										
										

ZMĚNOVÝ LIST č. 22**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
751 Vzduchotechnika		16 287,56			
CELKEM OBJEKT	0,00	16 287,56	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			16 287,56	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U
Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:

Nový

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				
751			Vzduchotechnika				
ÚRS	1	751721821	Demontáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek)	KS	2,000	1 690,00	3 380,00
ÚRS	2	751791811	Demontáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)	m	14,000	7,47	104,58
ÚRS	3	751791111	Montáž měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)	m	14,000	74,90	1 048,60
IK	4	ZL22-IK01	Vysekání rýh do kontaktního zateplení pro uložení Cu	m2	14,000	40,00	560,00
ÚRS	5	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	ks	2,000	3 370,00	6 740,00
IK	6	ZL22-IK02	Demontáž konzol	ks	4,000	100,00	400,00
IK	7	ZL22-IK03	Montáž konzol	ks	4,000	450,00	1 800,00
IK	8	ZL22-IK04	Zednické zacištění rýh	m	14,000	100,00	1 400,00
SOD	9	SOD pol.21	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	3,120	273,84	854,38
Celkem změnový list							16 287,56

Za zhotovitele:

No

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

23

Název akce:

KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje -
U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15 019/0001509

Číslo akce SMVS:

014V122009020

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

Projektant:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

výměna dveří do trafostanice

dveře do trafostanice

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala prostou výměnu dveří do trafostanice ozn. D3.

Dveře do trafostanice jsou vyměněny dle zadání bez změny parametrů, výhradně ale za dohledu osoby ČEZ Distribuce - provozovatele trafostanice.

V prostoru za dveřmi ozn. D3 je instalována trafostanice společnosti ČEZ Distribuce. Bez přítomnosti jejich odborného pracovníka nebylo možné vstoupit do prostoru trafostanice a provádět jakoukoli činnost v těchto prostorách.

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Odsouhlaseno objednatelem v průběhu realizace, bez konkrétního zápisu ve stavební deníku či zápisu z KD.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Změna nemá vliv na kvalitu provedení díla, jeho životnost ani na parametry energetických úspor.

Vliv na cenu: Ne

Přípočty k ceně díla bez DPH:

5 555,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

5 555,00 Kč

DPH:

1 166,55 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:

6 721,55 Kč

This micrograph shows a dense, disordered network of carbon nanotubes (CNTs) embedded within a polymer matrix. The CNTs appear as dark, elongated, and somewhat curved structures against a lighter, textured background representing the polymer. The distribution is relatively uniform across the field of view.

29 10 2020

Za objednatele:

11

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:



ZMĚNOVÝ LIST č. 23**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Ostatní		5 555,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			5 555,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 23**PŘÍPOČTY**

Stavba:

KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

Projektant:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				5 555,00
-			Ostatní				5 555,00
IK	1	ZL23-IK01	Zajištění otevření TS	kpl	1,000	1200,00	1 200,00
IK	2	ZL23-IK02	Dozor	hod	5,500	700,00	3 850,00
IK	3	ZL23-IK03	Koordinace	%	10,000	5050,00	505,00
Částky jsou na základě fakturace od ČEZ, dle faktury v našem účetnictví č. 2190404.							
Celkem změnový list							5 555,00

