

DODATEK Č. 1
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP
MŽP-OG-36/20/SDD
k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem.
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

vedoucí účastník: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

a

účastník: **GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

Za společnost jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKÚ

Kontaktní osoba:



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo – část 1 č. MŽP-OG-36/20/SDD (dále jen „Prováděcí smlouva“)
k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2021 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
- a) Zápis z kontrolního dne č. 4
 - b) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel také 2 vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 30. 7. 2021

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

23. 07. 2021

V Chlumci, dne

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Vedoucí účastník společnosti
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

Ing. Walter Fiedler

ředitel

ZÁPIS

z provedené kontroly konané dne 19. 7. 2021 (KD 4)

1. Kontrolovaná akce:

„Zabezpečení SDD „Souš - p. č. st. 615“ (č. o. 2774) v k. ú. Souš“

Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“, Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

Přímý zhotovitel: Palivový kombinát Ústí s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne: MŽP-OG-36/20/SDD ze dne 24. 11. 2020

Číslo jednacích prováděcí smlouvy: ENV/2020/106109

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Termín zahájení prací: 20. 11. 2020 úvodní rekognoskací

Termín ukončení prací: 31. 8. 2021 dle PS

Číslo oblasti: 1

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Plán zabezpečení SDD „Souš – p. č. st. 615 (č. o. 2774) v katastrálním území Souš“
2. Žádost o uzavření dodatku PS o dílo ze dne 19. 7. 2021

3. Kontrola pracovišť

Dne 20. 11. 2020 byla na lokalitě provedena v rámci závěrečného kontrolního dne I. etapy prací, za účasti zástupce Zhotovitele (Ing. Kostinec) a GDO (Ing. Macka), úvodní rekognoskace, kdy byla provedena opětovná prohlídka areálu v souvislosti s dotčenou nemovitostí. Na základě zjištěných skutečností z realizace I. etapy prací byl vypracován Plán zabezpečení SDD.

Dne 30. 4. 2021 na lokalitě uspořádán druhý kontrolní den. Během prohlídky technologická přestávka. Většina vrtů zaplněna popílkovým stabilizátem, aktuálně probíhá plavení ve vrtu č. 13 a 22. Poté bude pokračováno v západní části oblasti za halou. Během prohlídky nezjištěny zřetelné nedostatky či odchylky oproti projektu, BOZP, pořádek na pracovišti bez připomínek.

Dne 16. 6. 2021 na lokalitě uspořádán třetí kontrolní den. Během prohlídky pracovníci čistili nářadí a mechanizaci po injektáži vrtů u středové části jižní stěny objektu. BOZP, pořádek na pracovišti bez připomínek. Viditelné práce bez zjevných vad. Současně byla také provedena prohlídka již provedených vrtných prací v centrální části haly. Bez připomínek.

Dne 19. 7. 2021 GDO předložena žádost (avízo a koncept již 9. 7. 2021) o uzavření dodatku PS o dílo č. MŽP-OG-36/20/SDD ze dne 24. 11. 2020 k RD – část 1 ze dne 24. 3. 2020, změna Čl. 3 Doba, místo a podmínky plnění – prodloužení dodací lhůty z 31. 8. 2021 na 30. 11. 2021. Důvodem je aktuální akutní nedostatek stavebního materiálu, v tomto případě především ocelového potrubí, jež je potřebné k injektáži dle odsouhlaseného Plánu. K datu žádosti Zhotovitel plně dokončil plavení podzemních prostor a cca polovinu z plánovaného množství vrtných prací pro injektáž, z čehož je ca 25 % vrtů s dokončenou injektáží. Dále budou zbývat dokončovací práce spočívající v úpravě povrchů, terénu, odvozu zbylé horniny vrtných jader atd. Vzhledem k situaci na trhu a vzhledem k průběhu prací na provádění díla, **GDO souhlasí s prodloužením termínu plnění do data uvedeného v žádosti, tj. do 30. 11. 2021.**

4. Kontrola finančního plnění

Rozpočet byl schválen s cenou realizace díla:

Celková cena díla schválená GDO a MŽP činí:

17 232 303,76 Kč bez DPH a 20 851 087,55 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 42,3 % z cen ÚRS (23 866 352,08 Kč bez DPH a 28 878 286,02 Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)

5. Doporučení a opatření:

-

Vyjádření Zhotovitele:

Bez připomínek.

Připomínky a poznámky zástupce GDO:

Bez připomínek.


Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele:

Ing. Zdeněk Macka

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Kostinec

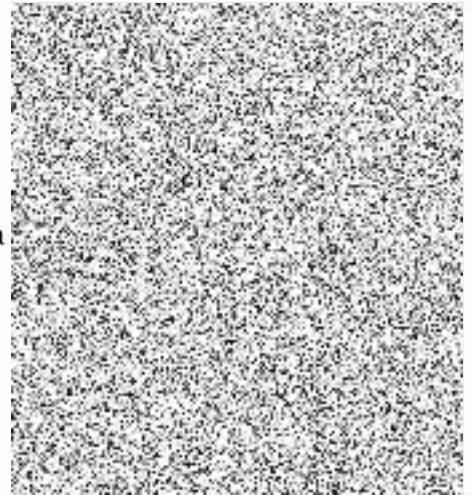

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie
a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

V Chlumci, 19. 7. 2021

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě MŽP-OG-36/20/SDD, č.j. ENV/2020/106109

Dne 24. 11. 2020 uzavřela Česká republika – Ministerstvo životního prostředí na straně jedné a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako vedoucí společník Společnosti „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“ na straně druhé na základě Rámcové dohody – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES 190 070, prováděcí smlouvu o dílo MŽP-OG-36/20/SDD, č. j. ENV/2020/106109, jejímž předmětem je Zabezpečení SDD „Souš – p. č. st. 615“ (č. o. 2774) v k. ú. Souš (dále jen Smlouva).

V článku 3, odst. 1 této Smlouvy je dohodnuta dodací lhůta (dokončení prací) nejdéle do 31. 8. 2021.

Na přelomu roku 2020 a 2021 byl PKÚ, s.p. vypracován plán zabezpečení SDD, který byl odsouhlasen ze strany GDO dne 12. 2. 2021 a následně schválen MŽP dne 11. 3. 2021. Současně byly vyřizovány souhlasy se vstupy na dotčené pozemky, povolení k provedení prací a stanoviska dotčených orgánů státní správy.

První fáze zabezpečovacích prací byla zahájena po provedení nezbytných přípravných prací dne 30. 3. 2021 a probíhala kontinuálně do 2. 5. 2021. V rámci této fáze zabezpečení byla v zájmovém prostoru důlní díla vyplněna zalitím zpevněným zásypovým materiálem. Následně byla zahájena druhá fáze zabezpečení, která má za cíl zpevnit rozvolněné horniny v zájmovém prostoru nízkotlakou injektáží prostřednictvím rastrové sítě vrtaných injektážních sond. V současnosti je připravena cca polovina plánovaných injektážních sond a vlastní zpevňovací injektáž je dokončena přibližně z 25%.

Rychlost postupu prací je výrazně zpomalena především omezenými dodávkami hutního materiálu z důvodu jeho nedostatku na trhu. Tento materiál není možné nahradit jiným. Z dosavadního průběhu prací vyplývá, že dle uzavřené Smlouvy a v ní stanoveném termínu pro dodací lhůtu, bude zbývat k dokončení cca jedna čtvrtina z celkového objemu injektážních prací.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 30. 11. 2021

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

Ing. Petr Šarboch
na základě plné moci

Stanovisko GDO: **SOUHLAS**

Za GEOTest, a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve čtyřech vyhotoveních
