

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 3014 ze dne 27. 10. 2020

**Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

**Korespondenční adresa pro daňové doklady:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-868/2021**

ISPROFOND: 500 312 0047

a

**Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881 , DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka 706 B

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva, Vladimír Jehlička, DiS, člen  
představenstva, Miroslava Bosmanová, člen představenstva, Libuše Tintěrová, člen  
představenstva, Pavel Holzknacht, člen představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují  
vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

**Korespondenční adresa:**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20248

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek**“, evid. č. **65020218** uzavřely dne 10. 03. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 16 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných níže dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je změna Postupných závazných milníků, úprava Doby pro uvedení do provozu a úprava Doby pro dokončení a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro změnu závazných milníků a úpravu Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení je zejména skutečnost potřebné koordinace prací stavby na aktualizaci adresného SW zabezpečovacího zařízení s investičními globály „Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň – Žatec“ a „Doplnění závor na přejezdu P1926 v km 206,160 trati Žatec – Obrnice“ a předpokládané termíny výluk v návrhu ROV 75019.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na následující změně termínů realizace Díla oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce:

### **8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení**

**Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle podčlánku 7.9 do 12 měsíců od Data zahájení prací.**

### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

**Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 8 měsíců od Data zahájení prací (vyjma následného propracování).**

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 **Článek 21. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací (*nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1*)
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele“

2.2 **Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve **třech** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **jedno** vyhotovení Zhotovitel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací  
(nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 12. 08. 2021

V Litoměřicích dne 05. 08. 2021

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace



.....

Zhotovitel

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**

**Harmonogram postupu prací** (nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1)

Úprava adresného softwaru v závislosti koordinace prací na SW ZZ s investičními stavbami

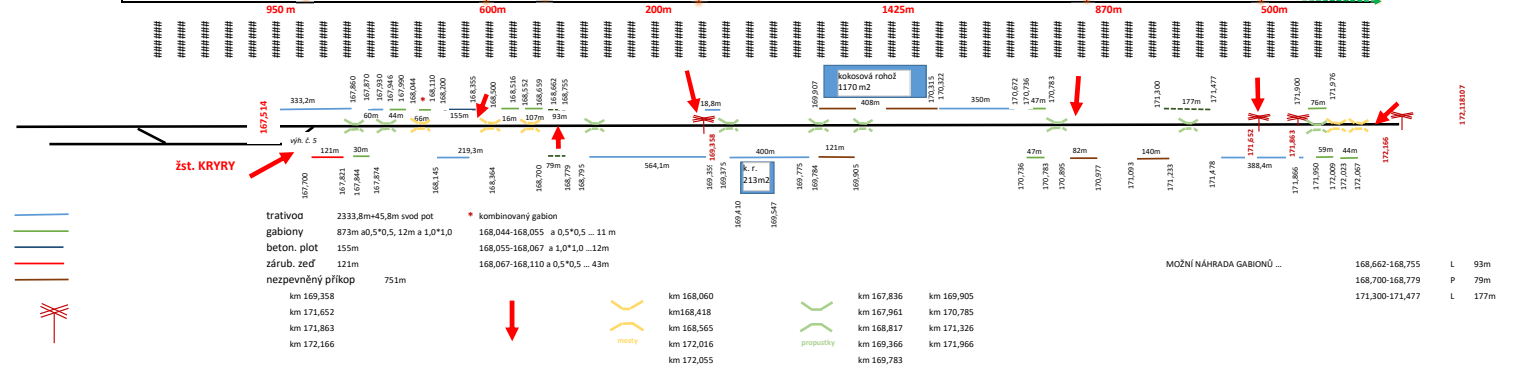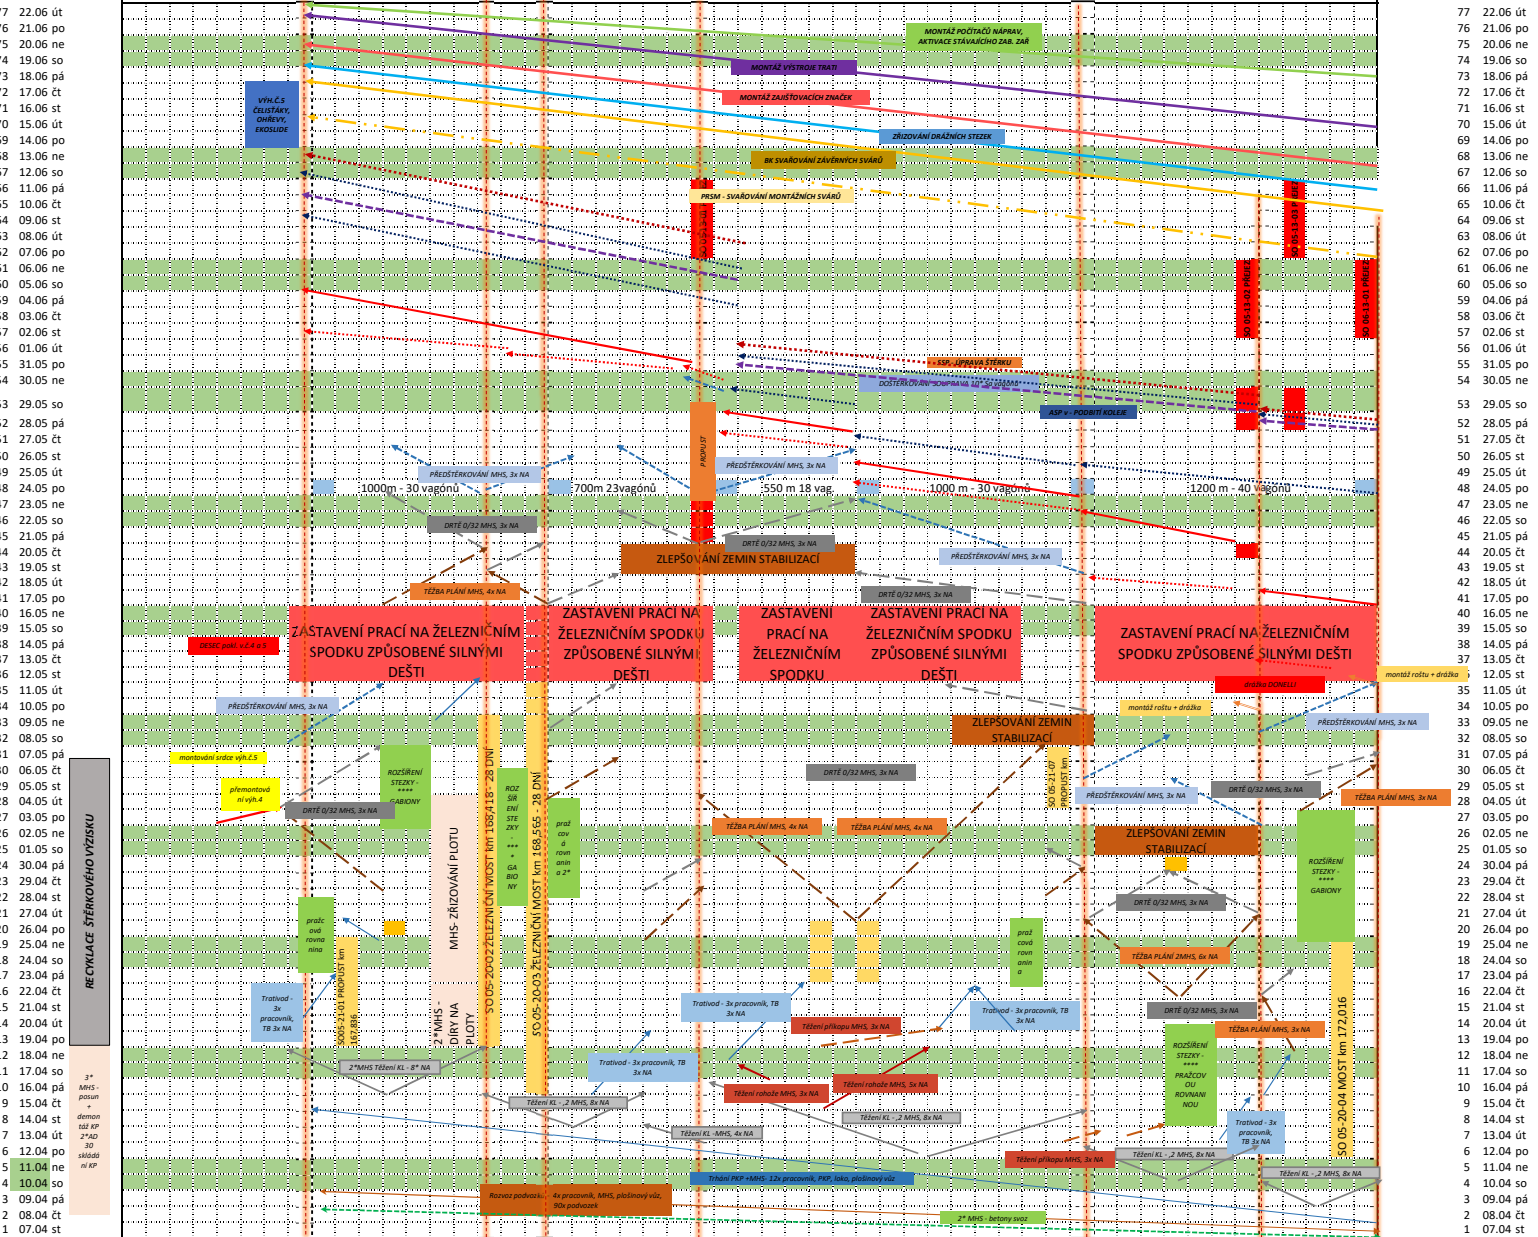

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1929030

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 552e3df4-f52a-4cb4-84eb-3d22f9752be2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.08.2021 09:57:01



a8b11487-700a-470e-8050-92f862a2fec7
