



D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1352/ORM/2020 ze dne 24. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 27. 7. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 786/21-RM ze dne 29. 7. 2021 na akci:

„Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín
Zastoupený: [redacted] ředitelem závodu a [redacted]
oblastním manažerem; PM/6995/2020
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 15904
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 24. 9. 2020 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1352/ORM/2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 27. 7. 2021, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činnostech stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 8 – 21.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 8 – Změna trvalého dopravního značení:

Z důvodu požadavku budoucího správce ŘSD ČR bylo nutné upravit trvalé dopravní značení SO 190 dle stávajících standardů ŘSD ČR.

odpočet 0,- Kč

přípočet + 66.637,50 Kč

celkem + 66.637,50 Kč

Změnový list č. 9 – Odstranění původní asfaltové komunikace:

V místě zasakovacího příkopu a komunikace byla zastižena původní konstrukce komunikace z asfaltobetonu. Tu bylo nutné odstranit pro možnost provedení projektovaných konstrukcí. Současně v tomto rozsahu odpadly plánované výkopové práce zeminy.

odpočet - 2.525,97 Kč

přípočet 0,00 Kč

celkem - 2.525,97 Kč

Změnový list č. 10 – Přetřídění těžitelnosti hornin:

V místě zasakovacího příkopu a trativodu byla zastižena třída těžitelnosti horniny III. Tu bylo nutné odstranit pro možnost provedení projektovaných konstrukcí.

odpočet - 148.101,73 Kč

přípočet + 526.957,49 Kč

celkem + 378.855,76 Kč

Změnový list č. 11 – Přetřídění těžitelnosti hornin rýh VO:

V místě rýh pro vedení a v místě základů stožárů byla zastižena třída těžitelnosti hornin II. respektive III. Tu bylo nutné odstranit pro možnost provedení projektovaných konstrukcí.

odpočet - 16.409,02 Kč

přípočet + 201.148,38 Kč

celkem + 184.739,36 Kč

Změnový list č. 12 – Doplnění svítidla v adaptační zóně přechodu pro chodce:

Jeden ze stožárů pro nasvětlení přechodu nebylo možné osadit do projektované polohy z důvodu fyzické kolize s trakčními podzemními kabely. Po úpravě stožáru do nové polohy byl proveden nový přepočít nasvětlení přechodu. Z výpočtu vyplývá nutnost doplnění svítidla v adaptační zóně přechodu.

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 62.574,99 Kč

celkem + 62.574,99 Kč

Změnový list č. 13 - 21 – Narovnáání výměr dle skutečného zaměření:

Jedná se o narovnáání výměr dle skutečného zaměření.

odpočet - 462.043,84 Kč

přípočet + 80.953,97 Kč

celkem - 381.089,87 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené

v této smlouvě:

Cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH

26.024.995,37 Kč

Dodatek č. 3

- Odpočty - 629 080,56 Kč
- Přípočty + 938 272,33 Kč

Celková cena dodatku č. 3 bez DPH

+ 309 191,77 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 bez DPH


26.334.187,14 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 3 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 3 nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne: 30.7.2021

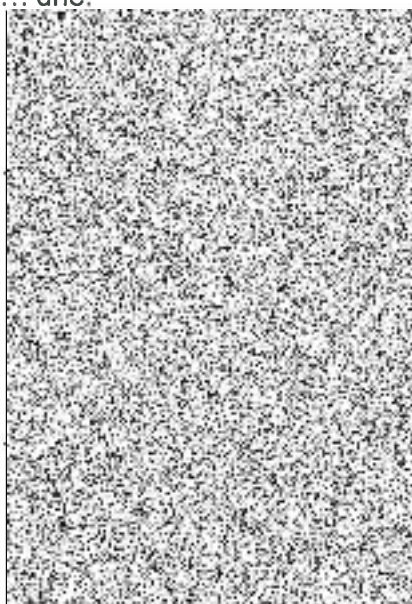

V Jihlavě dne: 30.7.2021



Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky

