

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Pozemní komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS 101/2	Číslo ZBV: 9
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5. Smíchov IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3 Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 437 92 553
--

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	44 360,80	44 360,80

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	0,00	44 360,80	44 360,80

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré 1
------------------	---------------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby III/114, Neveklov - I/3; a.č.: 22019-018243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 101 Pozemní komunikace	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS 101/2	Číslo ZBV. 9
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-6/20066001/2020 a zhotovitel č.: S 090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21. 6. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovska 811*1, 160 00 Praha 6, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, Sukova 628, 286 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:	Paro.č.	Příjmení
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prac	4	Projektant (AD)
4. Rozpis a ocenění změn položek ZBV 3	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazených změn do skupin	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Doba dokladů dle přehledu dokladů	16	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Čištění trubních propustků

Při realizaci stavby bylo provedeno sejmání dřvu na krajnicích a byly pročištěny silniční příkopy od nánosů v souladu s PDPS.

Po odstranění nánosů z příkopů byly zastiženy nepředvídatelné fyzické podmínky spočívající ve zjištění, že potrubí hospodářských sjezdů je zatrosné a brání průtoku vody v příkopech. Z důvodu funkčnosti odvodnění silničního tělesa bylo nutné potrubí hospodářských sjezdů pročištit, aby voda mohla odtékat silničními příkopy (viz. doklad č. 09 Fotodokumentace). P. uvedení čištění je zaznamenáno ve stavebním deníku (viz. doklad 06 Zápisu SO).

Dokumentace PDPS s čištěním potrubí hospodářských sjezdů nepředpokládala.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámc nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-5M-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje změnu podstatné části závažnosti dle § 73, odst. 5 a změnu nepodstatných...

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn záporných a změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot změn kladných a změn záporných
0,00	44 360,80	44 360,80	44 360,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s.r.o.	Jméno	Ing. Petr Nagy	datum	21. 06. 2021	podpis
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	Jméno	Ing. Marek Stadník	datum	28. 06. 2021	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r. o.	Jméno	Ing. Vítan Kodet	datum	25. 06. 2021	podpis
Supervize (Regionální detaš. kancelář)	Jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	Jméno	Jar. Zárostalský	datum	26-07-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ... tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zaváděny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zpětně m. dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nezměněny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné, jmen. měn. nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Ing. Jan Licháček	datum		podpis
Zhotovitel (jednatel)	Jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	21. 06. 2021	podpis

Číslo par

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby:	II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Pozemní komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
61 086 056,57

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3-4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	61 086 056,57	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	44 360,80	44 360,80	0,07%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	61 130 417,37	44 360,80	0,07%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost Neveklov - I/3	souhlasím	Ing. Petr Nagy
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	souhlasím	Ing. Marek Stádník
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o.	souhlasím	Ing. Milan Kodet
Zástupce Objednatelů:	souhlasím	Jan Zákostelský
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny.	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurka

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

SO 101

Číslo a název rozpočtu: SO 101

Skupina změn 3

Por. číslo položky	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
928	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	0,000	41,100	41,100	379,000	0,000	0,000	15 576,900	15 576,900	15 576,900	100,00%
929	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	0,000	18,700	18,700	465,000	0,000	0,000	9 069,500	9 069,500	9 069,500	100,00%
930	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	0,000	64,300	64,300	288,000	0,000	0,000	18 518,400	18 518,400	18 518,400	100,00%
931	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	0,000	6,500	6,500	184,000	0,000	0,000	1 196,000	1 196,000	1 196,000	200,00%
		Celkem							0,000	44 360,800		44 360,800	

Odpovědný zástupce Objednatelů a odpovědný zástupce Zhotovitelů dosouhlasují skladbu, měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyžadujících přeaklácanou změnu.
Povzrují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: _____ (jméno, (FOT, případně telefonik KSÚS))

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **III/14, Neveklov - II/3; o.č.: Z2019-018243**

1	Popisná částka bez rezervy a DPH	42 384 547,03
2	Průběžná změna (pauz. částky)	77 190 217,45
	Actualizovaný účetní závěr (pauz. částky) včetně DPH	94 807 430,37
3	Procedura změny Popisná a průběžná částky	187,36%
4	Šedivění vyhlášených změn (Skupina 1)	0,00%
5	Mediální záložní položky (Skupina 2)	0,00%
6	Neviditelná 10% prozatímní změna pro změny skupiny 1 a 2, odliš. k.č. plan. 01	-1,98%

1	Suma Změn skupiny 3 a Změn započtených Skupiny 3 a Skupiny 4	5 337 538,42
2	Skupinový podíl 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1 601,31%
3	Začlenění 664,36 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 724 164,11

1	Mediální účetní závěr 50 % Skupiny 3	2,60%
2	Mediální účetní závěr 50 % Skupiny 4	7,20%
3	Suma skutečných hodnot Změn Mediatních a Změn započtených pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 447 152,26
4	Začlenění 664,36 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	26 932 273,52

1	Level	13 854 082,00
2	Skupinový podíl	0,00%
3	Mediální účetní závěr	0,00%
4	Mediální účetní závěr	0,00%
5	Mediální účetní závěr	0,00%

SO	SOV 1	Název SOV 1 (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Název SOV 2	- 1 - Výzkumy změn (Doklady) (okrajní Změny)		- 2 - Základní položky (okrajní Změny)		- 3 - Změny skupiny (okrajní Změny)				- 4 - Změny skupiny (okrajní Změny)				- 5 - Změny skupiny (okrajní Změny)																																																																	
						Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)	Změny skupiny (okrajní Změny)																																																															
14	14	14	14	14	14	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Poznámky: ...

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název a evidenční číslo stavby:	II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Pozemní komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápisy SD	3	
09 Fotodokumentace	4	
10 Vyjádření AD	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Zápis z KD	6	
Počet listů celkem	18	

Rozpis účelových zmlôv pôsobiacich celkom												
ZMENA SOUPISU PRÁCI (SO/PS)												
SO 10J celkom												
Pr. číslo	Objektívne číslo	Objektívne číslo	Pr. číslo	Maximálna cena (€)	Maximálna cena (€)	Maximálna cena (€)	Maximálna cena (€)	Maximálna cena (€)	Maximálna cena (€)	Maximálna cena (€)	Maximálna cena (€)	
10	57406	57406	M2	27 410,00	262,00	1 111,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	4,1%	
<p>Objektívne číslo: 57406</p> <p>Pr. číslo: M2</p> <p>Maximálna cena (€): 27 410,00</p> <p>Maximálna cena (€): 262,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 111,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 410,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 410,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 410,00</p>		<p>Pr. číslo: M2</p> <p>Maximálna cena (€): 27 410,00</p> <p>Maximálna cena (€): 262,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 111,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 410,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 410,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 410,00</p>										
11	57407	57407	M2	2 110,00	1 172,00	0,00	415,00	4 588 412,00	0,00	0,00	4 588 412,00	2,6%
<p>Objektívne číslo: 57407</p> <p>Pr. číslo: M2</p> <p>Maximálna cena (€): 2 110,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 172,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 415,00</p> <p>Maximálna cena (€): 4 588 412,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 4 588 412,00</p>		<p>Pr. číslo: M2</p> <p>Maximálna cena (€): 2 110,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 172,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 415,00</p> <p>Maximálna cena (€): 4 588 412,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 4 588 412,00</p>										
12	57408	57408	M2	10 647,00	2 241,00	144,00	1 175,00	8 259 340,00	107 140,00	101 140,00	8 051 140,00	7,6%
<p>Objektívne číslo: 57408</p> <p>Pr. číslo: M2</p> <p>Maximálna cena (€): 10 647,00</p> <p>Maximálna cena (€): 2 241,00</p> <p>Maximálna cena (€): 144,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 175,00</p> <p>Maximálna cena (€): 8 259 340,00</p> <p>Maximálna cena (€): 107 140,00</p> <p>Maximálna cena (€): 101 140,00</p> <p>Maximálna cena (€): 8 051 140,00</p>		<p>Pr. číslo: M2</p> <p>Maximálna cena (€): 10 647,00</p> <p>Maximálna cena (€): 2 241,00</p> <p>Maximálna cena (€): 144,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 175,00</p> <p>Maximálna cena (€): 8 259 340,00</p> <p>Maximálna cena (€): 107 140,00</p> <p>Maximálna cena (€): 101 140,00</p> <p>Maximálna cena (€): 8 051 140,00</p>										
13	18281	18281	M2	28,00	4 500,00	0,00	808,490	1 310,00	0,00	0,00	13 817,990	0,0%
<p>Objektívne číslo: 18281</p> <p>Pr. číslo: M2</p> <p>Maximálna cena (€): 28,00</p> <p>Maximálna cena (€): 4 500,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 808,490</p> <p>Maximálna cena (€): 1 310,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 13 817,990</p>		<p>Pr. číslo: M2</p> <p>Maximálna cena (€): 28,00</p> <p>Maximálna cena (€): 4 500,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 808,490</p> <p>Maximálna cena (€): 1 310,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 13 817,990</p>										
14	91203	91203	M	621,00	491,00	0,00	213,00	6 175,00	10,00	0,00	6 165,00	0,0%
<p>Objektívne číslo: 91203</p> <p>Pr. číslo: M</p> <p>Maximálna cena (€): 621,00</p> <p>Maximálna cena (€): 491,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 213,00</p> <p>Maximálna cena (€): 6 175,00</p> <p>Maximálna cena (€): 10,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 6 165,00</p>		<p>Pr. číslo: M</p> <p>Maximálna cena (€): 621,00</p> <p>Maximálna cena (€): 491,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 213,00</p> <p>Maximálna cena (€): 6 175,00</p> <p>Maximálna cena (€): 10,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 6 165,00</p>										
15	91204	91204	M	67,00	510,00	0,00	107,00	803 030,00	0,00	0,00	802 923,00	0,0%
<p>Objektívne číslo: 91204</p> <p>Pr. číslo: M</p> <p>Maximálna cena (€): 67,00</p> <p>Maximálna cena (€): 510,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 107,00</p> <p>Maximálna cena (€): 803 030,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 802 923,00</p>		<p>Pr. číslo: M</p> <p>Maximálna cena (€): 67,00</p> <p>Maximálna cena (€): 510,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 107,00</p> <p>Maximálna cena (€): 803 030,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 802 923,00</p>										
16	91206	91206	MUF	2 900,00	70,00	0,00	421,00	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00	0,0%
<p>Objektívne číslo: 91206</p> <p>Pr. číslo: MUF</p> <p>Maximálna cena (€): 2 900,00</p> <p>Maximálna cena (€): 70,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 421,00</p> <p>Maximálna cena (€): 2 515,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 2 515,00</p>		<p>Pr. číslo: MUF</p> <p>Maximálna cena (€): 2 900,00</p> <p>Maximálna cena (€): 70,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 421,00</p> <p>Maximálna cena (€): 2 515,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 2 515,00</p>										
17	91281	91281	M, G	70,00	1 100,00	0,00	10,00	27 330,00	0,00	0,00	27 320,00	0,0%
<p>Objektívne číslo: 91281</p> <p>Pr. číslo: M, G</p> <p>Maximálna cena (€): 70,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 100,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 10,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 330,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 320,00</p>		<p>Pr. číslo: M, G</p> <p>Maximálna cena (€): 70,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 100,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 10,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 330,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 320,00</p>										
18	91207	91207	M, G	70,00	1 100,00	0,00	11,00	27 370,00	0,00	0,00	27 359,00	0,0%
<p>Objektívne číslo: 91207</p> <p>Pr. číslo: M, G</p> <p>Maximálna cena (€): 70,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 100,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 11,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 370,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 359,00</p>		<p>Pr. číslo: M, G</p> <p>Maximálna cena (€): 70,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 100,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 11,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 370,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 359,00</p>										
19	91213	91213	M	67,00	1 100,00	0,00	10,00	27 360,00	0,00	0,00	27 350,00	0,0%
<p>Objektívne číslo: 91213</p> <p>Pr. číslo: M</p> <p>Maximálna cena (€): 67,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 100,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 10,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 360,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 350,00</p>		<p>Pr. číslo: M</p> <p>Maximálna cena (€): 67,00</p> <p>Maximálna cena (€): 1 100,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 10,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 360,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 0,00</p> <p>Maximálna cena (€): 27 350,00</p>										

Denní záznam stavby

datum: 27. 11. 2019 úroveň: 1/3

11:15:00

(24)

Den:

čas: 10:00

Práce: 10:00 - 11:15 hod.

10:00 - 11:15 hod.

SE 1/3

Prac. úroveň: 1/3 - 15^o hod. 11:00 - 11:15 hod. prázdné

Prac. čas: 10:00 - 11:15 hod.

11:15 hod. - 11:30 hod.

11:30 hod. - 11:45 hod.

11:45 hod.

11:45 hod. - 12:00 hod.

12:00 hod. - 12:15 hod.

12:15 hod. - 12:30 hod.

Práce: 10:00 - 11:15 hod.

11:15 hod.

11:15 hod. - 11:30 hod.

11:30 hod. - 11:45 hod.

11:45 hod. - 12:00 hod.

Práce: 10:00 - 11:15 hod.

11:15 hod. - 11:30 hod.

11:30 hod. - 11:45 hod.

11:45 hod. - 12:00 hod.

12:00 hod. - 12:15 hod.

12:15 hod. - 12:30 hod.

12:30 hod. - 12:45 hod.

12:45 hod. - 13:00 hod.

13:00 hod. - 13:15 hod.

13:15 hod. - 13:30 hod.

13:30 hod. - 13:45 hod.

13:45 hod. - 14:00 hod.

14:00 hod. - 14:15 hod.

14:15 hod. - 14:30 hod.

14:30 hod. - 14:45 hod.

14:45 hod. - 15:00 hod.



15:00 hod. - 15:15 hod.


15:15 hod. - 15:30 hod.

15:30 hod. - 15:45 hod.

15:45 hod. - 16:00 hod.



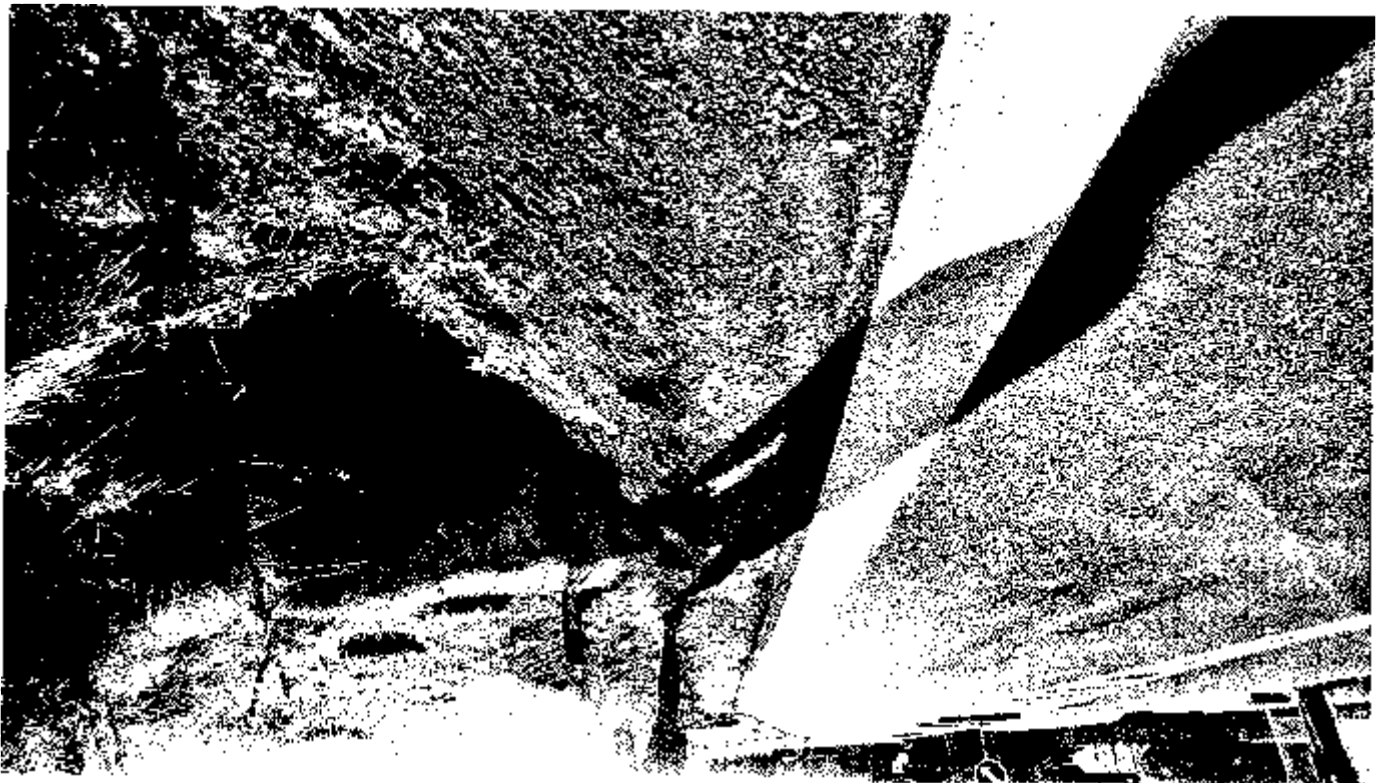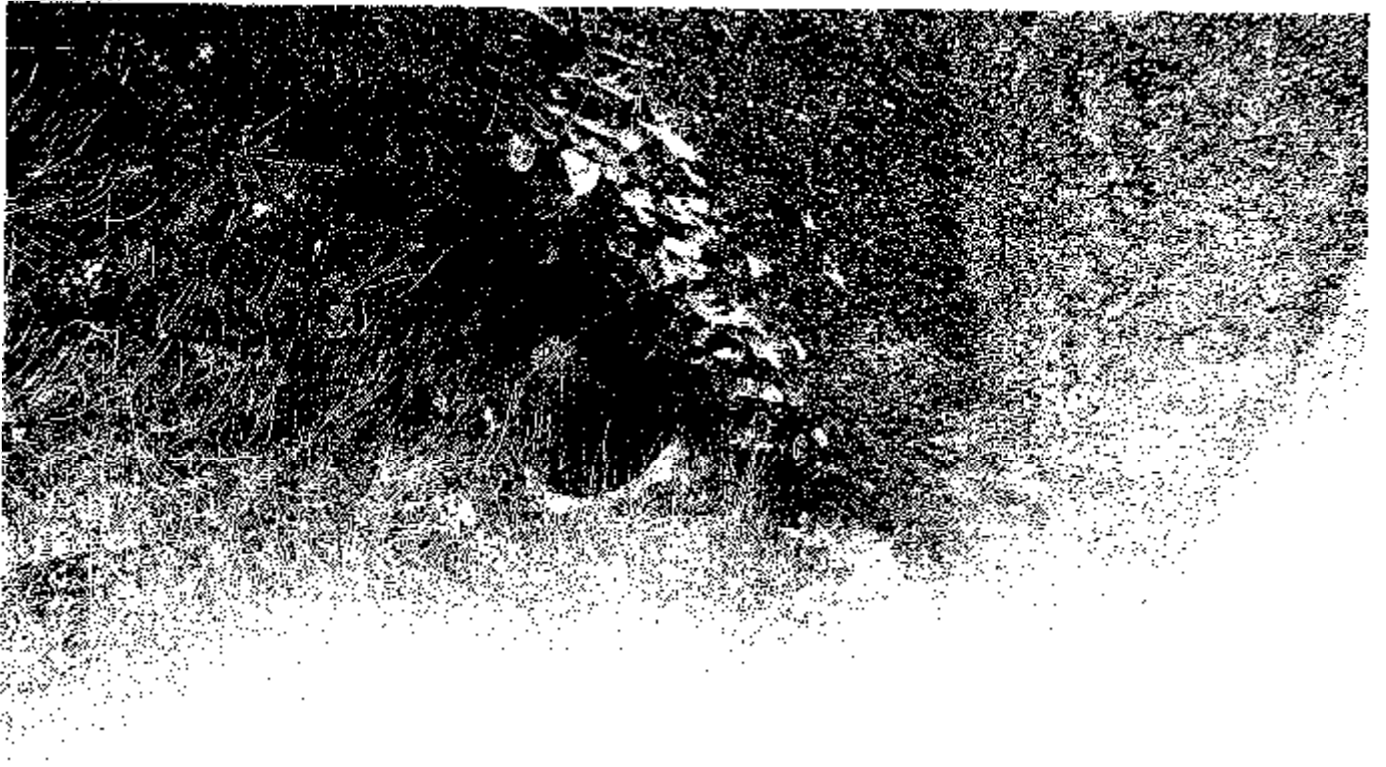

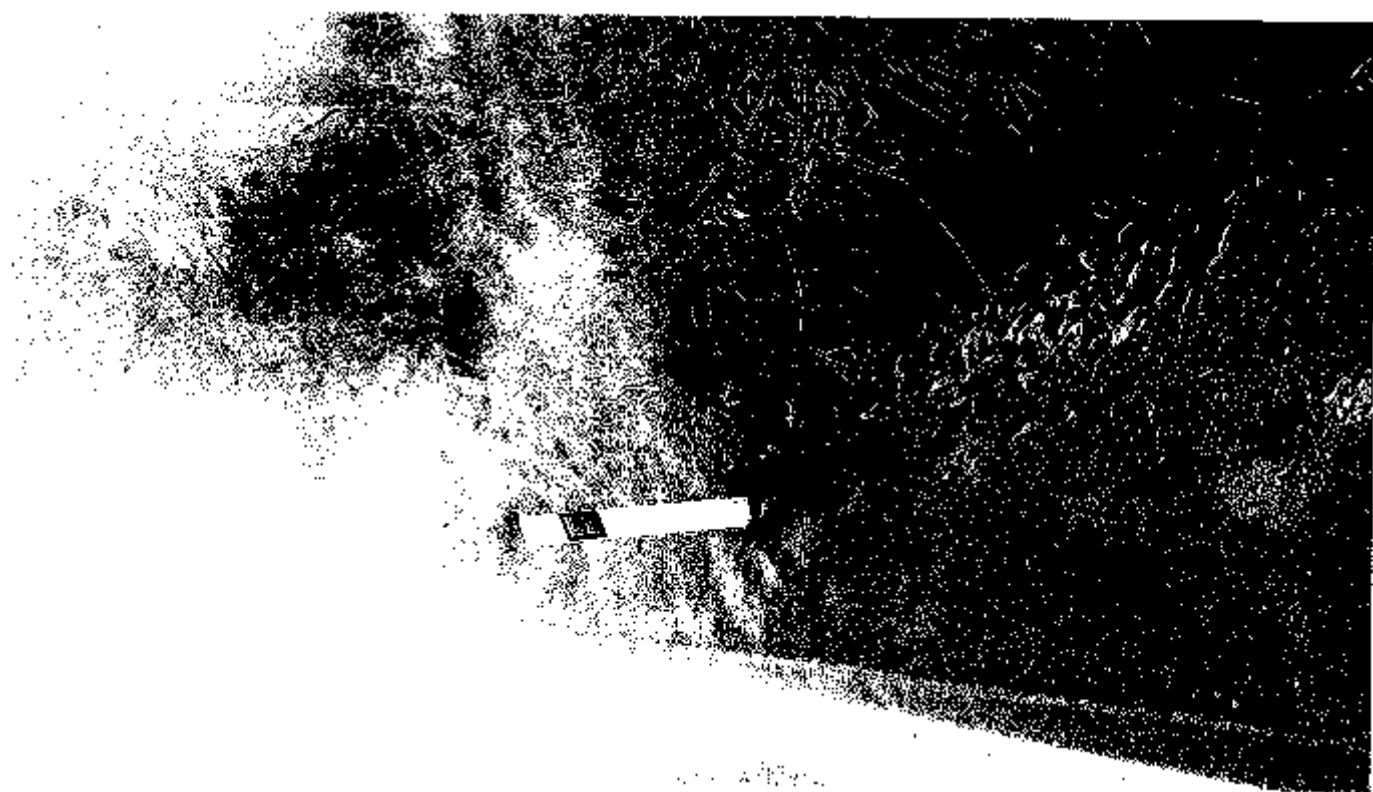



VÁŠ DOPIS ZNACKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 057 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL.

E-MAIL

IDDS:

MÍSTO / DATUM Praha / 18.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – II/3

Stanovisko AD k ZBV 9 - SO 101 – čištění zatrubnění příkopů u sjezdů

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 9, které se týká:

SO 101 Silnice II/114

ZBV 9 řeší problematiku čištění zatrubnění příkopů u hospodářských sjezdů.


Při realizaci stavby bylo, po odstranění nánosů ze silničních příkopů, zjištěno, že v místě hospodářských sjezdů se nachází zatrubnění příkopů. Objevená zatrubnění byla zcela zanesená. Z důvodu zajištění plné funkčnosti odvodnění silničními příkopy bylo nutné provést pročištění zatrubnění hospodářských sjezdů.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 9 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 10. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 9 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 9 – SO 101 Silnice II/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s čištěním potrubí hospodářských
sjezdů.

Po pročištění silničních příkopů od nánosů došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických
podmínek spočívajících v zastižení zaneseného potrubí hospodářských sjezdů. Toto potrubí
bylo vzhledem k zajištění odvodu srážkové vody silničními příkopy nutné pročistit.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 10 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet



Zápis z 7. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 14. 7. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obec Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Prézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 14.7.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je provedeno odřezování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podřídkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění, kamerové prohlídky a probíhá odláždění čel.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, násyp krajnic z R materiálu, montáž svodidel a osazení směrových sloupků.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem je položena podkladní a ložná asfaltová vrstva.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD – montáž odvodňovacích prvků, obrubníků, pokládka konstrukčních vrstev vozovky.

U propustku SO 101.9 je provedena demolice a výkop, probíhá násyp podkladního polštáře ze štěrkodrti.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem, dopravní značení, realizace nového propustku SO 101.9.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody. - *KD 14.7. byla dohodnuto, že v místě stojící vody bude zvýšeno dno příkopu dosypáním zeminou a dále bude příkop prohlouben ve směru proti staničení tak, aby došlo k odtoku vody.*

6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov. *KD 14.7. bude stanoven termín dokončení prací pro zprovoznění.*

13. Nové body

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.

Příští KD se bude konat **28. 7. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. V úseku mezi obcemi Neveklov až konec Tisem je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev, čištění příkopů a krajnic od nánosů, sanace okrajů vozovky, nové asfaltové souvrství, násyp krajnic a dopravní značení.

U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 a 101.9 byla provedena demolice, osazeno nové betonové potrubí včetně zásypu a odláždění čel. U propustků SO 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 a 101.6 bylo provedeno pročištění, sanace povrchu a odláždění čel.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem byla provedena realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

U hospodářských vjezdů bylo provedeno pročištění potrubí.

Do příštího KD bude mezi obcemi Tisem a Jirovice probíhat čištění krajnic a příkopů, práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD

- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody. – KD 14.7. bylo dohodnuto, že v místě stojící vody bude zvýšeno dno příkopu dosypáním zeminou a dále bude příkop prohlouben ve směru proti staničení tak, aby došlo k odtoku vody. – *KD 11.8. bylo provedeno, bude vypuštěno ze zápisu.*
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov. – KD 28.8. místní šetření pro předčasné užívání proběhne 11.8. od 9:00. – *KD 11.8. šetření provedeno, bude vydáno Rozhodnutí o předčasném užívání. Předčasné užívání bude zahájeno od soboty 15.8.2020. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno. – *KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.*
- 8.1 Před uvedením úseku stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem je nutné vypořádat připomínky Ing. Vyhnálka z dopravního inspektorátu Benešov - upravit čela propustku zastávky u Neštětíc, osadit odrazky na svodidla, ořezat větve ve vzdálenosti 0,5m od vozovky (ořezání větví zajistí údržba komunikace). – *KD 11.8. bylo řešeno na dnešním místním šetření s Ing. Vyhnálkem, připomínky vypořádány. Bude vypuštěno ze zápisu.*

13. Nové body

- 9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.
Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u výjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

S ohledem na aktuální postup prací bude příští KD svolaný operativně.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

