

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/úrovňovacího souboru (SO/PS): SO 101.10 Propustek km 63,266	Číslo SO/PS / / číslu Změny SO/PS 101.10/1	Číslo ZBV: 11
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11. 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001		
Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3 Sukova 626. 258 01 Benešov IČ: 437 92 553		

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	-90 739,69	378 560,71	287 821,02

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	-90 739,69	378 560,71	287 821,02

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré: 4
------------------	---------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby III/114, Neveklov - Ú3; e.č.: Z2019-018243	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS 101.10/1	Číslo ZBV 11
--	--	-----------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-6/00066001/2020 a zhotovitel č. S-090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Krajské správa a údržba silnic Středočeského kraje - příspěvková organizace se sídlem Zborovská 84/11, 160 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - Ú3, Sukova 625, 256 01 Borečňov

Přílohy Změnového listu:

1	Krycí list	1	počet listů
2	Změnový list	1	počet listů
3	Zápis o projednání ocerení so...pis...práci	1	počet listů
4	Rozpis nacenění Změn položek ZBV 11	1	počet listů
5	Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6	Přehled dalších dokladů:	1	počet listů
	Další doklady dle přehledu ocek. ad.:	24	počet listů

Paré č.

1 2

3

4

5

6

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozr

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny

Propustek km 63,266 - výměna zatrubnění

Změna vznikla na základě odlišného technického stavu konstrukce propustku oproti projektové dokumentaci.

V PDPs byla navržena sanace ochrany břeštinování stávajícího zatrubněného propustku, který byl v nevyhovujícím stavu

Po vyčištění a televizní prohlídce stávajícího propustku byly zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky spočívající v odhalení velmi špatného stavu propustku (lokální trhliny, praskliny a propady trouby), což by mohlo způsobit propadnutí vozovky. Z tohoto důvodu bylo na kontrolním dni domluveno, že bude provedena celková demolice stávajícího propustku a realizace propustku nového (viz. doklad č. 12 Zápis z KD)

Na základě této skutečnosti byla provedena demolice stávajícího propustku a realizace nového propustku (viz. doklad č. 09 Fotodokumentace) dle aktualizovaného návrhu AD. Postup a popis prací je zaznamenán ve stavebním deníku (viz. doklad č. 08 Zápis z SD)

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržba silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., n. zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3

Zároveň se jedná o práce, které nemají charakter veřejné zakázky z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-90 739,69	378 560,71	287 821,02	469 300,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s.r.o.	jméno	Ing. Peť Nagy	datum	21. 06. 2021	podpis
Projektant (autorický dozor): SUDOP PRAHA a.s.	jméno	Ing. Marek Stádník	datum	28. 06. 2021	podpis
Stavební dozr: SGS Czech Republic spol. s r.o.	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	25. 06. 2021	podpis
Supervize (Regionální dotčení kancelář):	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚ S SK	jméno	Jan Zákoselský	datum	26. 07. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou započtením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tímto Změnový list předstává dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat, jmenem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum		podpis
Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	21. 06. 2021	podpis

Číslo listu

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

Název Stavby:	11/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.10/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101.10 Propustek km 63,266

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
189 461,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	189 461,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4-9	11=10/1
stavební/montážní práce	-90 739,69	378 560,71	378 560,71	199,81%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-90 739,69	477 282,52	287 821,02	151,92%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost Neveklov - I/3	souhlasím	Ing. Petr Nagy
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	souhlasím	Ing. Marek Stádník
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o.	souhlasím	Ing. Milan Kodet
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Jan Zákostelský
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurkové

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019 018243

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101.10 Propustek km 63,266

SO 101.10

Číslo a název rozpočtu: SO 101.10

Skupina změn 3

Pos. č. pol.	kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství v podřadí	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	003002000	Práce na ježce příst. plyných m'stění	%	2 397,133	5 091,110	2693,977	1,500	3 595,70	4 040,97	0,000	7 636,67	4 040,97	112,38%
2	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	360,000	0,000	-360,000	49,70	17892,000	-17892,000	0,000	0,000	-17892,000	-100,00%
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOCHRANĚM NA DRNID	M2	360,000	0,000	-360,000	20,61	7419,500	-7419,500	0,000	0,000	-7419,500	-100,00%
10	185511	CHLMICKÝ ODPLEVELENĚLOPLOŠNĚ	M2	360,000	0,000	-360,000	3,64	1310,400	-1310,400	0,000	0,000	-1310,400	-100,00%
11	41732	ZTUŽUJÍCÍ PASY ZE ŽELEZOBETONU	M3	2 790	0,000	-2 790	6 630,19	18498,230	-18498,230	0,000	0,000	-18498,230	-100,00%
12	45*31	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1 500	3,86	2 954	2957,320	3 844,78	7 583,08	0,000	11 427,86	7 583,08	197,23%
16	62641	SJEDNOUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL.cca 2MM	M2	1 480	0,000	-1 480	300,61	444,900	-444,900	0,000	0,000	-444,900	-100,00%
17	62745	SPÁROVÁNÍ STARĚHO ŽDVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	2 600	0,000	-2 600	726,65	1889,290	-1889,290	0,000	0,000	-1889,290	-100,00%
18	898153222	Sanace potrubí - bezstlíná betonovým potrubím DN 500 vnitřní povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	M	9 500	0,000	-9 500	5 400,00	51300,000	-51300,000	0,000	0,000	-51300,000	-100,00%
19	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	9,500	0,000	-9 500	98,18	932,710	-932,710	0,000	0,000	-932,710	-100,00%
21	938447	OCISTĚNÍ ŽOIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU	M2	2,600	0,000	-2 600	338,18	879,270	-879,270	0,000	0,000	-879,270	-100,00%
22	938542	OCISTĚNÍ BETÓN KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARU	M2	1 480	0,000	-1 480	338,18	500,510	-500,510	0,000	0,000	-500,510	-100,00%
23	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdva včetně vyčištění plochy spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m	M2	2,600	0,000	-2 600	518,78	1348,830	-1348,830	0,000	0,000	-1348,830	-100,00%
Nové položky													
724	14102	POPLATKY ZA SKLADKU - zem.na z kamenivo	T	0,000	274,766	274,766	278,78	0,00	0,00	76 589,27	76 589,27	76 589,27	100,00%
725	09733	POMOČ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH ŠTĚ	KPL	0,000	1,000	1,000	24 242,30	0,00	0,00	24 242,30	24 242,30	24 242,30	100,00%
726	122837	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. II DOVŮZ DO 15KM	M3	0,000	95,386	95,386	556,00	0,00	0,00	53 034,62	53 034,62	53 034,62	100,00%
727	113136	ODŠTĚNĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM	M3	0,000	6,038	6,038	784,00	0,00	0,00	4 733,79	4 733,79	4 733,79	100,00%
728	13123	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M5	0,000	0,960	0,960	438,78	0,00	0,00	421,23	421,23	421,23	100,00%
729	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II	M3	0,000	18,000	18,000	1 121,19	0,00	0,00	20 181,42	20 181,42	20 181,42	100,00%
730	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	23 038	23 038	767,56	0,00	0,00	17 452,67	17 452,67	17 452,67	100,00%
731	1758	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	18 000	18 000	909,10	0,00	0,00	16 365,80	16 365,80	16 365,80	100,00%
732	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŠŤOVÁNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	0,000	38 500	38 500	25,45	0,00	0,00	979,83	979,83	979,83	100,00%
733	27231	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,000	3,318	3 318	3 830,24	0,00	0,00	12 705,74	12 705,74	12 705,74	100,00%
734	272313	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20	M3	0,000	4,602	4 602	2 645,66	0,00	0,00	12 175,28	12 175,28	12 175,28	100,00%
735	4521*R	PREFA PODKLADKY	KS	0,000	10 000	10 000	303,10	0,00	0,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	100,00%
736	71131*	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	0,000	15 700	15 700	141,82	0,00	0,00	2 225,57	2 225,57	2 225,57	100,00%
737	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	0,000	15 700	15 700	253,33	0,00	0,00	3 977,28	3 977,28	3 977,28	100,00%
738	82471	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM	M	0,000	10 000	10 000	7 721,10	0,00	0,00	77 211,00	77 211,00	77 211,00	100,00%
739	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	0,000	10 000	10 000	379,90	0,00	0,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,00%
740	919144	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	M	0,000	2 400	2 400	1 236,95	0,00	0,00	3 112,68	3 112,68	3 112,68	100,00%
741	98815	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,000	7,564	7 564	3 648,47	0,00	0,00	27 596,65	27 596,65	27 596,65	100,00%
1144	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	3,188	3 188	5 910,00	0,00	0,00	18 722,88	18 722,88	18 722,88	100,00%
Celkem									- 90 739,69	378 560,71	287 821,02		

Odpovědný zástupce Objednatel, odpovědný zástupce Zhotovitel odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr vyjadřujících předkládanou změnu

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: jmeno, (TDL, případně technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenčné číslo Stavby: I/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

1) Práci nastavené (časy pro režimový a DPH)	73 364 847,00
2) Práci nastavené (časová částka (suma odměn))	76 187 002,10
3) Práci nastavené (časová částka (suma stavby včetně DPH))	74 924 701,81
4) Práci nastavené (Práci nastavené (časový režim))	108,40%
5) Práci nastavené (Sladovní vyřizovaných změn (Skupina 1))	0,00%
6) Práci nastavené (Sladovní smlouvy položek (Skupina 2))	0,00%
7) Práci nastavené (Sladovní limit 31,4% pro Skupinu 3 a Skupinu 4)	-1,30%

Skupina	Suma Změn slavných a Změn smlouvy (Skupina 3 a Skupina 4)	0 002 575 13
Práci nastavené	Sladovní limit 31,4% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,30%
Práci nastavené	Sladovní limit 31,4% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 709 304 11

Práci nastavené	Sladovní limit 50 % pro Skupinu 3	2,87%
Práci nastavené	Sladovní limit 60 % pro Skupinu 4	1,69%
Práci nastavené	Suma Změn slavných a Změn smlouvy (Skupina 3 a Skupina 4)	0 004 090 29
Práci nastavené	Základní limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	24 162 213,67

Práci nastavené	Limit	13 454 882,00
Práci nastavené	Sladovní limit (31,4%)	0,00%
Práci nastavené	Hodnota skupiny 3	0,00

SO	SOV 1	Název SOV 1 (obsahuje Stavby)	Změny smlouvy (jednotlivé položky)	Změny stavby	Hodnoty (SOV)	Změny stavby (jednotlivé položky)			Změny stavby (jednotlivé položky)			Změny stavby (jednotlivé položky)			Změny stavby (jednotlivé položky)								
						23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=29+30	32	33	34=32+33	35	36	37=35+36			
		I/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243	1 348 929,41	7 042 212,11	8 391 141,52	268	636	904	1,80	5,80	7,60	0,0727936	144 214,35	13 048,91	157 263,26	28 271,62	8 886 284,88	8 318 883,34	4 014 009,29	1 029	3 382	4 411	0,08
1.1	1	Práci nastavené (časový režim)	0,00	4 912 807,91	4 912 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 807,91	4 912 807,91	4 912 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	1	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn	68 081,74	1 811,84	69 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 081,74	69 893,58	68 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	2	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	2 994,58	2 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,58	2 994,58	2 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	3	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	14 021,55	14 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 021,55	14 021,55	14 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	4	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	5	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	1 118,14	1 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,14	1 118,14	1 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6	6	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	4 912 807,91	4 912 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 807,91	4 912 807,91	4 912 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.7	7	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.8	8	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	8 391 141,52	8 391 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 141,52	8 391 141,52	8 391 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.9	9	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	4 912 807,91	4 912 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 807,91	4 912 807,91	4 912 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.10	10	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.11	11	Práci nastavené (časový režim) - suma odměn (DPH)	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář je určen k vyplnění pouze pro stavby, které jsou předmětem Změny stavby.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	II
Název a evidenční číslo stavby:	II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.10 Propustek km 63,266
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.10/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	7	
08 Zápisy SD	4	
09 Fotodokumentace	3	
10 Vyjádření AD	1	
11 Vyjádření IDI	1	
12 Zápis z KD	8	
Počet listů celkem	24	

Rekapitulácia zmien položiek - celkom

Číslo účtovníctva: názov stavby: 1/114, Nevedská / 1, e.č.: 22028-018243

Číslo a názov SÚP: SO 100.10 Prapustel' km 63255

Účtovná jednotka: SO 100.10

ZMENA SOUPISU PRÁCI (SO/PS)

SO 101 10

Název položky	Mj	Mn. časová jednotka	Množstvo	Mn. časová jednotka	Celková cena	Množstvo (zmeny)	Celková cena (zmeny)	Celkom							
								Nová cena	Nová cena (zmeny)	Nová cena (zmeny)	Nová cena (zmeny)				
práce na stavbe															
140 2120	M2	5,000	38,500	1,400	21,25	0,00	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140 2120	M2	5,000	38,500	1,400	21,25	0,00	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	-------	--------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

140 2120	M2	5,000	38,500	1,400	21,25	0,00	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	-------	--------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

140 2120	M2	5,000	38,500	1,400	21,25	0,00	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	-------	--------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

140 2120	M2	5,000	38,500	1,400	21,25	0,00	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	-------	--------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

140 2120	M2	5,000	38,500	1,400	21,25	0,00	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	-------	--------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

140 2120	M2	5,000	38,500	1,400	21,25	0,00	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	-------	--------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

140 2120	M2	5,000	38,500	1,400	21,25	0,00	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	-------	--------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

Roční plán změn položek - celkem

Leden číslo a název stavby / JI4. Revize / JI. d.č. 2019 318243		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO/PS: SO 101.10 Průhlednost 63,216		SO 101.10											
Název stavby: SO 101.10		celkem											
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
736	711211	Průhlednost 63,216	02	2,327	15 700	15 700	189,82	0,00	0,00	4 309,85	6 363,85	4 309,85	100,00%
737	711112	Průhlednost 63,216	02	2,020	15 700	15 700	222,29	0,00	0,00	4 972,98	5 375,28	4 972,98	100,00%
738	711113	Průhlednost 63,216	M	0,000	10 000	10 000	7 721,10	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
739	711114	Průhlednost 63,216	M	0,000	2 400	2 400	1 358,03	0,00	0,00	5 112,58	5 112,58	5 112,58	100,00%
740	711115	Průhlednost 63,216	M1	0,000	7 504	7 504	1 446,42	0,00	0,00	17 796,24	17 796,24	17 796,24	100,00%
741	90018	Průhlednost 63,216	M1	0,000	3 100	3 100	5 210,00	0,00	0,00	10 752,48	10 752,48	10 752,48	100,00%

Denní záznam stavby

Datum: 11.11.2014, Místo: Praha, Stavba: rekonstrukce a výstavba objektu pro účely bydlení, č. 1000/2014/001

Práce provedené: vypracování projektové dokumentace (PDP) včetně výkresů a specifikací materiálů. Zpracování podkladních dokumentů pro stavební povolení.

Práce provedené: vypracování projektové dokumentace (PDP) včetně výkresů a specifikací materiálů. Zpracování podkladních dokumentů pro stavební povolení.

Práce provedené: vypracování projektové dokumentace (PDP) včetně výkresů a specifikací materiálů. Zpracování podkladních dokumentů pro stavební povolení.

Práce provedené: vypracování projektové dokumentace (PDP) včetně výkresů a specifikací materiálů. Zpracování podkladních dokumentů pro stavební povolení.

Práce provedené: vypracování projektové dokumentace (PDP) včetně výkresů a specifikací materiálů. Zpracování podkladních dokumentů pro stavební povolení.

Práce provedené: vypracování projektové dokumentace (PDP) včetně výkresů a specifikací materiálů. Zpracování podkladních dokumentů pro stavební povolení.

Práce provedené: vypracování projektové dokumentace (PDP) včetně výkresů a specifikací materiálů. Zpracování podkladních dokumentů pro stavební povolení.

Denní záznam stavby

10. 11. 2014

10. 11. 2014

10. 11. 2014 - 10. 11. 2014

10. 11. 2014 - 10. 11. 2014

10. 11. 2014 - 10. 11. 2014

10. 11. 2014 - 10. 11. 2014

10. 11. 2014

10. 11. 2014 - 10. 11. 2014

10. 11. 2014 - 10. 11. 2014

10. 11. 2014 - 10. 11. 2014

10. 11. 2014 - 10. 11. 2014

Denní záznam stavby

Datum: 14. 11. 2011
 Místo: ...
 Projekt: ...
 Kde: ...
 Pracovníci: ...
 Předmět práce: ...
 Průběh: ...
 Výsledky: ...
 Závěr: ...
 Přílohy: ...

Denni záznam stavby

Stavba: 2/114 - Kancelář 12/13

Pracovní den: 13. 11. 2013

Číslo: 1234

Pracovní úkol: 1234

Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234

1234 1234 1234
1234 - 1234

Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234

Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234

Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234

Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234

Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234


Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234


Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234

Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234

Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234
Pracovní úkol: 1234 - 1234 - 1234



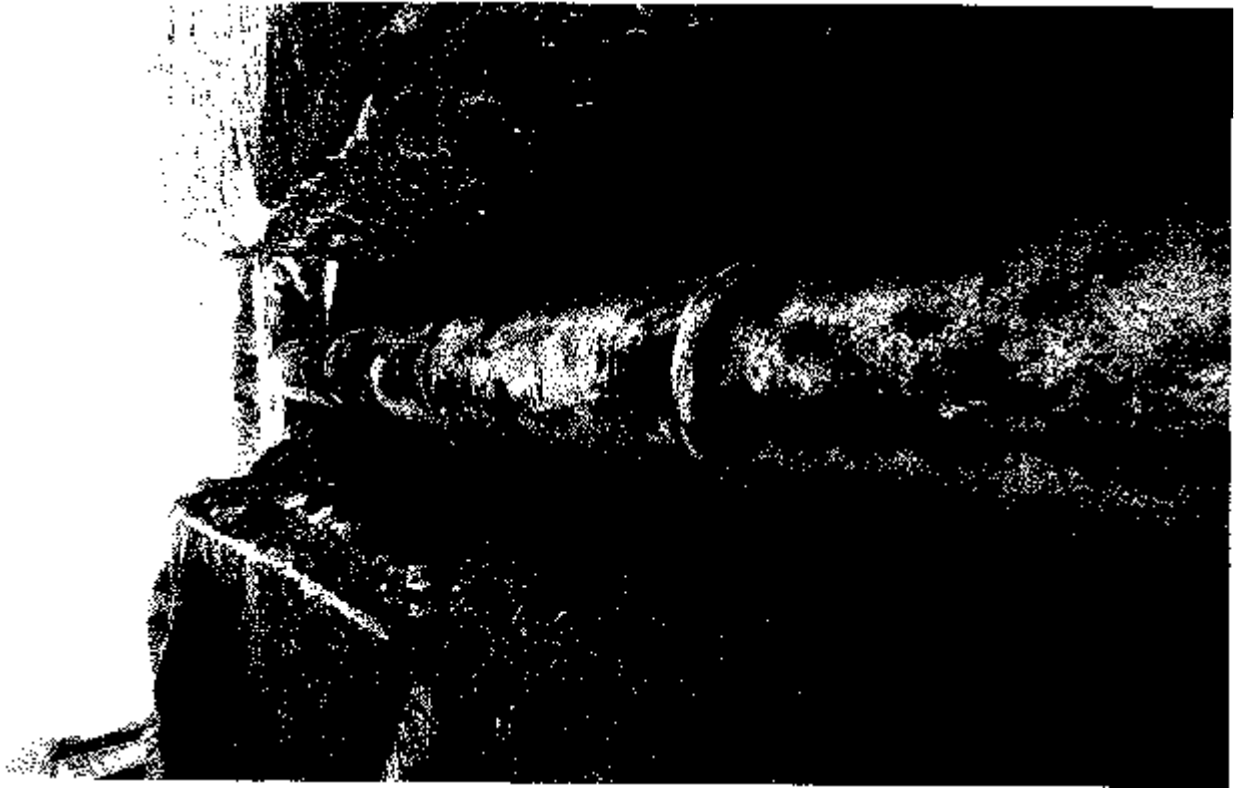

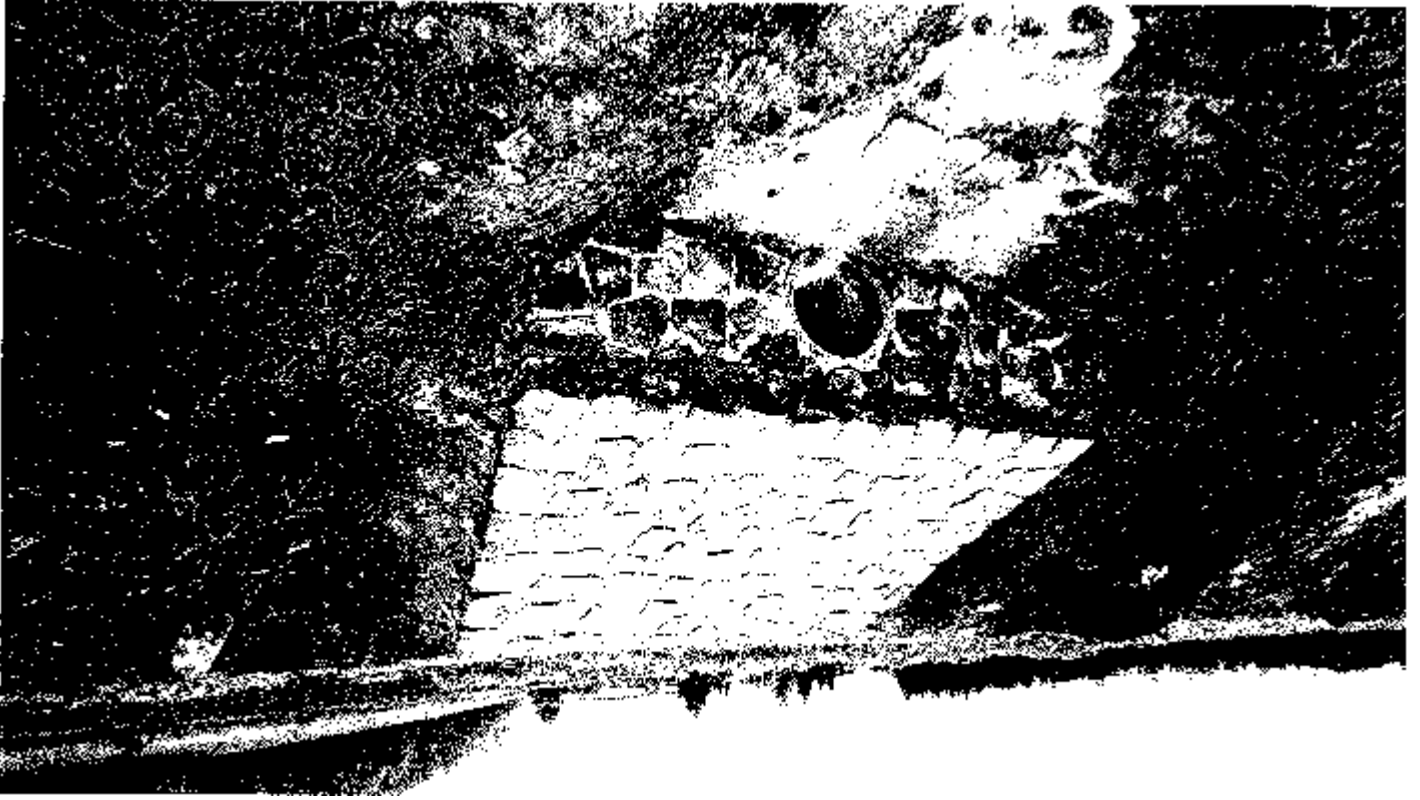

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA: 202 / 058 / 2021

VYŘIZUJE:

Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM

Praha / 18.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – I/3

Stanovisko AD k ZBV 11 - SO 101.010 – propustek

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 11, které se týká:

SO 101.10 Propustek km 63,268

ZBV 11 řeší problematiku opravy propustku SO 101.10.

Při realizaci byl kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku zjištěn nevyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala se sanaci potrubí technologií berstlining.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v jeho kompletní demolici a následné realizaci nového propustku shodného průtočného profilu včetně odláždění čel z lomového kamene.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 11 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 15. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 11 předložené v rámci realizace
stavby „H/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Háji 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 11 – SO 101.10 Propustek km 63,266.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 63,266.


Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně horšího technického stavu konstrukce propustku v km 63.266, než předpokládala dokumentace PDPS.

S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob opravy propustku, kdy místo sanace potrubí technologií berstlining byla provedena demolice stávajícího propustku a realizace propustku nového.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek uvedených v ZBV 11 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek

S pozdravem
Ing. Milan Kodet



Zápis z 11. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 6. 10. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.


KD 6.10.2020 práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Probíhá čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentínách.

Do příštího KD bude probíhat čištění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel, práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.
.. KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.


9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice - Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tísni u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami.

10.3 U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. KD 6.10. vzhledem k poškození nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna poškozeného potrubí a nové čelo propustku.



13. Nové body

11.1. Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěným po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS.

Příští **KD** se bude konat **20. 10. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Tisecm.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 11 – 6. 10. 2020

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - TDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o.			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o.			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s			
Šach Pavel	KSÚS SK			
Račan Zdeněk	BES s.r.o.			
Ing. Zdeněk Račan	SÚO P			



Zápis z 14. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 18. 11. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66.012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 18.11.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MČÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Je provedena pokládka ložné asfaltové vrstvy u odbočky na Tvoršovice. Je provedeno čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentínách – dláždění čel, odkop a zěptný zásyp u výtokového čela propustku SO 101.11 včetně prodloužení potrubí, u propustků SO 101.10 a 101.15 je provedena demolice a realizace nových propustků. Probíhá sanace okrajů vozovky v serpentínách včetně zpevnění příkopů na vnitřních okrajích oblouků serpentín z kamenné dlažby.

Do příštího KD bude probíhat sanace okrajů vozovky, dláždění zpevnění příkopů v serpentínách, demontáž svodidel, práce na opravě propustků, čištění povrchu vozovky a pokládka asfaltových vrstev.

11. Různé

-


12. Kontrola bodů z minulých KD

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. – KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. KD 20.10. bylo dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek kladených do betonu.



10.3U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. – KD 6.10. vzhledem k poškození nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna poškozeného potrubí a nové čelo propustku. – KD 3.11. je proveden odkop u výtokového čela, stávající potrubí bude prodlouženo 2ks 2,5m dlouhými betonovými trubkami s následným zásypem a odlážděním čela. KD 18.11. práce na opravě propustku ukončeny, bude vypuštěno ze zápisu.

11.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. – KD 3.11. je provedena demolice a probíhá realizace nového propustku. KD 18.11. práce na propustku dokončeny, bude vypuštěno ze zápisu.

12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD navrhne způsob řešení. KD 3.11. na dnešním KD byla provedena kontrola povrchu. Ve vyznačených místech bude provedeno odfrézování v tloušťce 50 mm s následnou kontrolou a rozhodnutím o dalším postupu sanace. KD 18.11. bylo provedeno odfrézování v tl. 50 mm, u okrajů vozovky bylo vzhledem k poruchám v podkladních vrstvách nutné provést sanaci až na úroveň zemní pláně.

13. Nové body

14.1 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že v úseku stavby mezi km 57,880 (začátek úseku stavby) a km 66,012 (křižovátka se silnicí II/11455 směr Tvorševice) proběhne dne 14.12.2020 převjímací řízení. Zástupce TDI připraví Protokol o předání a převzetí.

14.2 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že pro úsek uvedený v bodu 14.1 bude podána žádost o kolaudační řízení. Zástupce TDI podá žádost o kolaudaci.

Příští KD se bude konat 1. 12. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 14 – 18. 11. 2020

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - IDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o.			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o.			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s.			
Šach Pavel	KSÚS SK			
Račan Zdeněk	BES s.r.o.			
Stádník Marek	SUDOP			
