

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-2031110287/0100
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

se sídlem: CE - ING s.r.o.
Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
zastoupený: Janem Čejchanem, jednatelem
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 35921
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3959710399/0800

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a tzv. méněprací (prací, které nebudou provedeny), a to:
 - a) víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 4 zákona – práce podle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11; a

- b) víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle změnových listů č. 8 a 9.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1.písm b) tohoto článku po odečtení méněprací, souvisejících s vícepracemi, nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
 3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 4. Změny podle odst. 1 písm. a) tohoto článku činí:
Vícepráce: 292 408,58 Kč bez DPH
Méněpráce: 173 905,22 Kč bez DPH
 5. Změny podle odst. 1 písm. b) tohoto článku činí:
Vícepráce: 108 226,47 Kč bez DPH
 6. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
400 635,05 Kč bez DPH.
 7. Celkové práce, které nebudou provedeny – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
173 905,22 Kč bez DPH.
 8. Smluvní cena se tedy navyšuje o **226 729,83 Kč bez DPH.**
 9. V souvislosti se změnami podle Změnových listů č. 8 a 9 se posouvá i termín dokončení prací, a to o 2 týdny. Upravený harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2.Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
Celkem 6.312.137,13 Kč bez DPH
(slovy: šest milionů tři sta dvanáct tisíc jedno sto třicet sedm korun českých třináct haléřů bez DPH)
2. Článek 5 odst. 5.2 smlouvy o dílo se mění takto:

5.2.Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 18 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění a k převzetí staveniště dle bodu 5.1.

Místo plnění: Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje **RK/35/1966/2020** hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnový list č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 včetně rekapitulace ZL

Harmonogram

Změny závazků

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

V Náchodě dne

.....
Mg. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Jan Čejchan, jednatel
CE – ING s.r.o.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: 2021-05-02a

Stavba: SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		226 729,83	274 343,09
ZL 01	Příprava podkladu před pokládkou podlahové krytiny	14 149,59	17 121,00
ZL 02	Záměna podlahové krytiny a soklů	38 502,90	46 588,51
ZL 03	Změna rozsahu bouracích prací	2 692,08	3 257,42
ZL 04	Změna a doplnění ochranného madla	33 093,68	40 043,35
ZL 05	Upřesnění PVC obkladů stěn	5 385,96	6 517,01
ZL 06	Přemístění podlahové vpustě	2 725,83	3 298,25
ZL 07	Změna SDK konstrukcí, doplnění rev. dvířek	7 893,29	9 550,88
ZL 08	Výměna tlumičů hluku u stávajících VZT jednotek	52 595,20	63 640,19
ZL 09	Úprava rozvodů chlazení - doplnění armatur	55 631,27	67 313,84
ZL 10	Upřesnění silových přívodů rozvaděčů	10 631,72	12 864,38
ZL 11	Změna světel ve spojovací chodbě	3 428,31	4 148,26

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1				ZL1
Příprava podkladu před pokládkou podlahové krytiny				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt K a A			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		27.08.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
<p>V průběhu provádění díla vznikají nutné vícepráce související s přípravou podlahových konstrukcí pro řádnou pokládku povlakové krytiny. Jedná se o vyrovnání podlah ve spojovací chodbě K a sešití betonových podlah po provedených rýhách pro ležaté rozvody ZTI a UT v chodbě A.</p>				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			14 149,59 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			14 149,59 Kč	
4) Vliv na termín dostavy: NE				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 19. 8. 2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 01 - Příprava podkladu před pokládkou podlahové krytiny

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 149,59

PSV - Práce a dodávky PSV

14 149,59

776 - Podlahy povlakové

14 149,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 01 - Příprava podkladu před pokládkou podlahové krytiny

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 149,59	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 149,59	
	D	776	Podlahy povlakové				14 149,59	
80	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	30,149	238,18	7 120,59	
	W		K bez rampy					
	W		30,149		30,149			
95	K	777000001	DOD+MTZ sešívání tržlin v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami	bm	11,000	639,00	7 029,00	
	W		pro UT a ZTI					
	W		(3,5*2)*2		11,000			
	W		Součet		11,000			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2				ZL2
Záměna podlahové krytiny a soklů				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt K a A			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		27.08.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem změnového listu je :				
a) záměna PVC krytiny za krytinu z přírodního linolea ve stejném materiálovém a barevném provedení 1. NP novostavby objektu K. Tato krytina byla vybrána v rámci vzorkovacího řízení ve spolupráci s AD a uživatelem ON.				
b) záměna plastové šedé PVC soklové lišty za vytažený sokl z materiálového provedení podlahové krytiny. Sokly budou ve stejném materiálovém a barevném provedení 1. NP novostavby objektu K. Toto řešení povede k lepší údržbě podlahové krytiny včetně soklů.				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			-97 526,92 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			136 029,82 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			38 502,90 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: NE				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 1.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek
[redacted]			[redacted]	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 02 - Záměna podlahové krytiny a soklů

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 502,90

PSV - Práce a dodávky PSV

38 502,90

776 - Podlahy povlakové

38 502,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 02 - Záměna podlahové krytiny a soklů

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 502,90	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 502,90	
D	776		Podlahy povlakové				38 502,90	
81	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	-44,700	131,32	-5 870,00	
	W		-44,7		-44,700			
82	M	28411018.S	PVC heterogenní záložové akustická li 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R9, hořlavost Bfl S1	m2	-49,170	625,20	-30 741,06	
	W		44,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		49,170			
	W		Sokel		-44,700			
20	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	-65,679	131,32	-8 624,97	
21	M	28411018.S	PVC heterogenní záložové akustická li 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R9, hořlavost Bfl S1	m2	-72,247	625,20	-45 168,82	
96	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	110,379	186,90	20 629,84	CS ÚRS 2021 02
	W		Placha chodby A+K		110,379			
	W		44,7*65,679		110,379			
	W		Sokel		110,379			
98	M	RSE 002R	Farba Marmoleum - Striato +Marbled, přírodní linoleum, role šířky 2m, tloušťka 2,50mm, R9, hořlavost Cfl S1	m2	129,536	820,22	106 249,56	
	W		Placha chodby A+K		121,417			
	W		(44,7+65,679) *1,1 Přepočtené koeficientem množství		121,417			
	W		Sokl		8,120904			
	W		(23,65+37,872)*0,12*1,1		129,536			
	W		Sokel		129,536			
99	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	176,353	51,89	9 150,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"svařování marmolea"		176,353			
	W		30,67*4+30,67/2*3,5		176,353			
	W		Sokel		176,353			
17	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	-24,021	113,68	-2 730,71	
	W		23,55*1,02 Přepočtené koeficientem množství		-24,021			
23	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	-38,629	113,68	-4 391,34	
	W		37,872*1,02 Přepočtené koeficientem množství		-38,629			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3				ZL3
Změna rozsahu bouracích prací				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt A			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způs	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		27.08.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Na základě požadavku zástupce ON bude ponechána příčka v místnosti 005.</p> <p>V průběhu provádění stavebních prací byla upřesněna trasa přeložky VZT potrubí a to ze stávající chodby K do strojovny VZT (K.01.073) z důvodu zajištění maximální možné průchozí výšky a šířky spojovací chodby K (K.01.001). Tato upřesněná trasa VZT vyžaduje provedení prostupu v ŽB stěně. Viz zákres trasy Příloha č.1 tohoto ZL.</p> <p>Dále v průběhu provádění bouracích prací otvorů byly odkryty ztužující prvky v obvodových konstrukcích objektu A, které je nutné odstranit.</p>				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			-970,26 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			3 662,34 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			2 692,08 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: NE				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 1.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek
[Redacted]				[Redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 03 - Změna rozsahu bouracích prací

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 692,08
HSV - Práce a dodávky HSV	2 692,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 692,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 03 - Změna rozsahu bouracích prací

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj


Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 692,08	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 692,08	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 692,08	
6	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m2	-4,613	110,74	-510,84	
	W		1,9*3,27-0,8*2,0		4,613			
32	K	964011361	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 4 m, hmotnosti do 350 kg/m	m3	1,032	1 724,80	1 779,99	
	W		Vybourání ztužujícího prvku v úrovni 1,20m nad podlahou					
	W		4,0*0,2*0,375		0,300			
	W		2,6*0,5*0,375		0,488			
	W		1,3*0,5*0,375		0,244			
	W		Souřel		1,032			
100	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,300	6 274,50	1 882,35	CS ÚRS 2021 02
	W		pro přeložku VZT potrubí do strojovny VZT					
	W		0,3					
8	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-1,600	287,14	-459,42	
	W		0,8*2,0		0,488			

ŘEZ V-V'

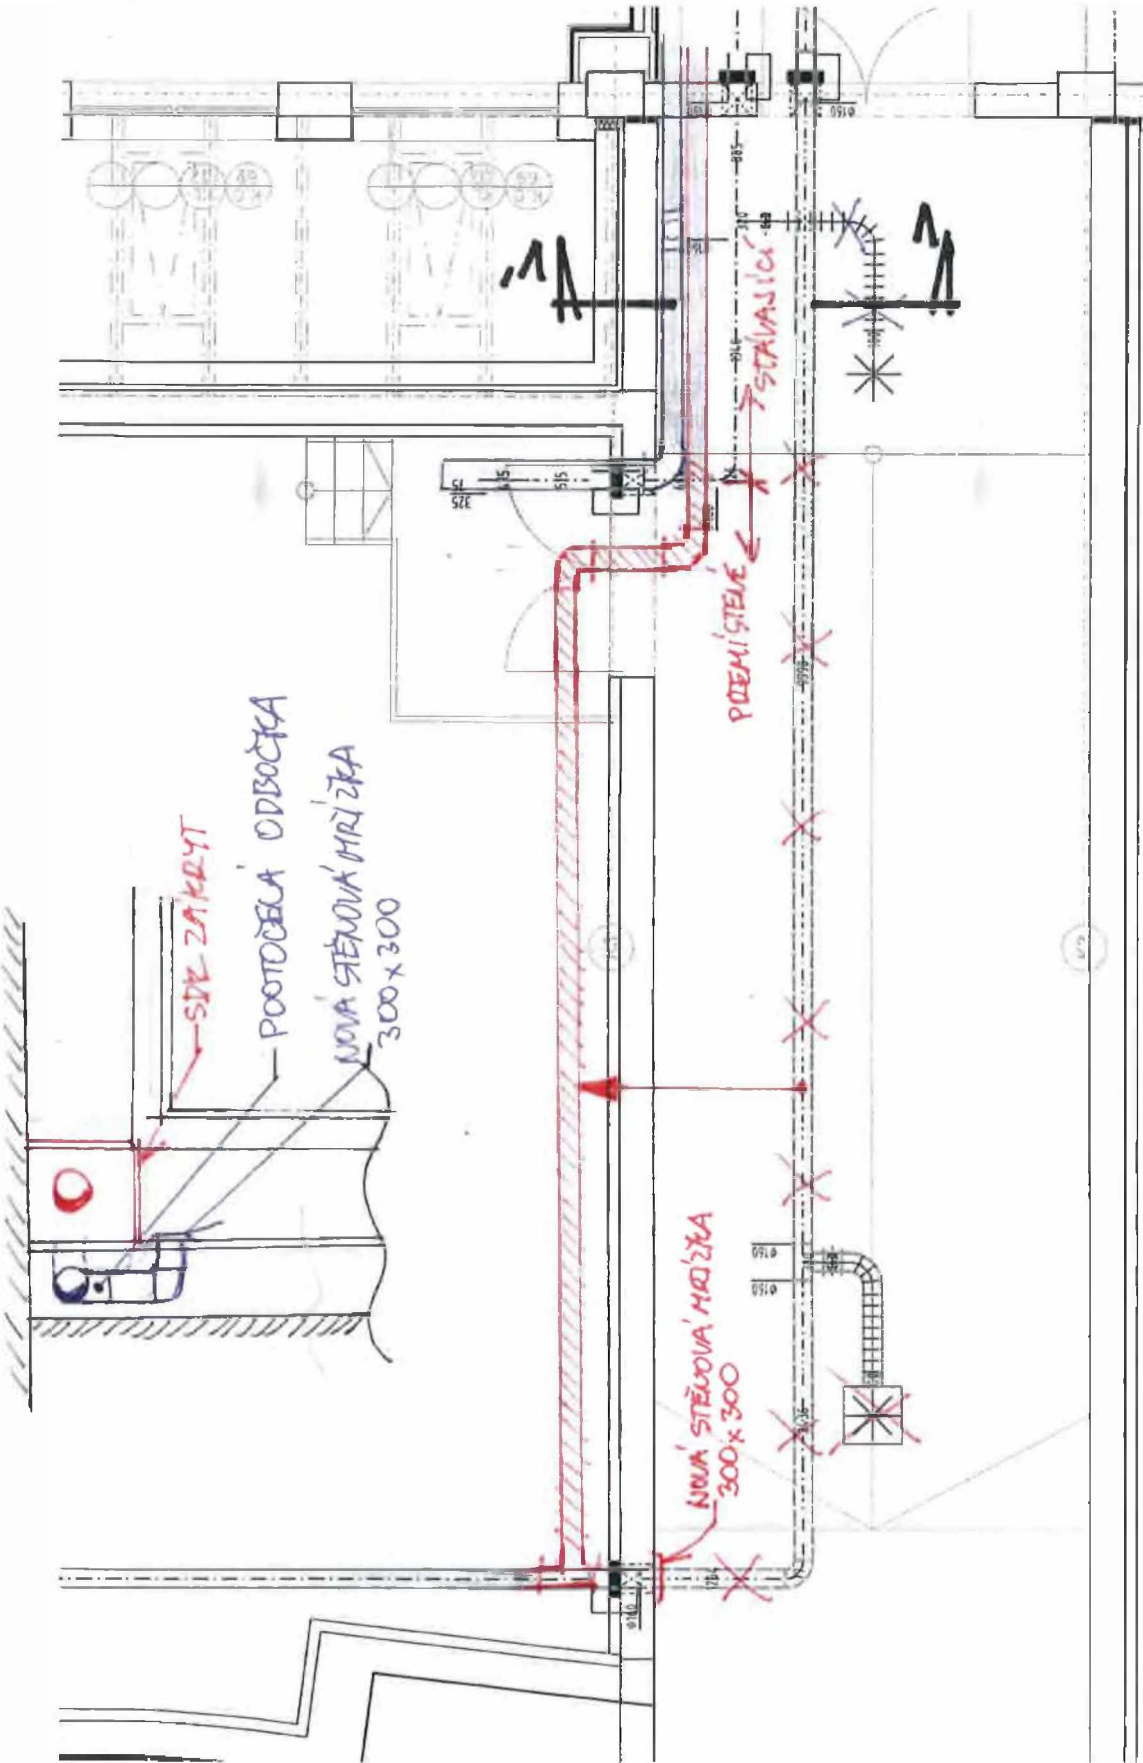

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4				ZL4
Změna a doplnění ochranného madla				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt A a K			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		27.08.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Předmětem změnového listu je upřesnění rozsahu a umístění ochranných nárazových madel včetně upřesnění provedení v rámci vzorkovacího řízení. Madla budou ve stejném materiálovém a barevném provedení 1. NP novostavby objektu K.</p>				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			-9 828,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			42 921,68 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			33 093,68 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: NE				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 1.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Vrážek

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 04 - Změna a doplnění ochranného madla

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 093,68

HSV - Práce a dodávky HSV

33 093,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 093,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 04 - Změna a doplnění ochranného madla

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 093,68	
		0	HSV				33 093,68	
		9	Ostatní konstrukce a práce bourání				33 093,68	
29	M	55343059 R	madlo ocranné na stěnu oc. konstrukce 2x 1r d 44,5x2,5 + TP 15/15/2 překližka tl. 8 mm	m	-13,000	756,00	-9 828,00	
	vv		-11,818*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-13,000			
	vv		Součet		-13,000			
28	K	953966121 S	Montáž ochranného madla na stěnu pomocí hmoždinek	m	11,650	599,76	6 987,20	
	vv		Doplnění madla 11,65		11,650			
	vv		Součet		11,650			
101	M	553 R005	madlo ocranné na stěnu PVC konstrukce (dle budovy "K") včetně rohů	m	25,815	1 392,00	35 934,48	
	vv		Původní 11,818*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,000			
	vv		Doplnění 11,65*1,1		12,815			
	vv		Součet		25,815			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5				ZL5
Upřesnění PVC obkladů stěn				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt A a K			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		27.08.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem změnového listu je upřesnění rozsahu a umístění PVC obkladů stěn včetně upřesnění provedení v rámci vzorkovacího řízení. Obklady stěn budou ve stejném materiálovém a barevném provedení 1. NP novostavby objektu K.				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			-22 284,21 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			27 670,17 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			5 385,96 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: NE				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 1.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 05 -Upřesnění PVC obkladů stěn

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 385,96

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 928,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-9 928,50

PSV - Práce a dodávky PSV

15 314,46

776 - Podlahy povlakové

1 954,46

767 - Konstrukce zámečnické.

13 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 05 - Upřesnění PVC obkladů stěn

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							5 385,96	
n	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 928,50	
n	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 928,50	
5	K	953941516	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové držáky apod.	kus	-10,000	20,29	-202,90	
6	M	48441500	ocel.konzola trojúhelníkového tvaru pro vynesení nerez.madla, materiál TP 30x30x2mm, rozměr odvěsen 40x40cm, povrch.úprava 1x zákl.nátěr+2x vrchní syntet.nátěr (barva tm.šedá), konzolu upravit pro přichycení na stěnu a přichycení madla	kus	-10,000	217,56	-2 175,60	
7	K	953961111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	-20,000	45,00	-900,00	
8	K	953966121.S	Montáž ochranného madla na ocelovou konstrukci	m	-9,500	500,00	-4 750,00	
9	K	976081111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí pozdního madla zaccéného ve zdivu	m	-9,500	200,00	-1 900,00	
n	PSV		Práce a dodávky PSV				13 360,00	
n	776		Podlahy povlakové				1 954,46	
87	K	776521111	Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m	m2	-14,940	245,98	-3 674,94	
	vv		(2,7+0,7+5,1+4,6+0,25)*1,2			16,020		
	vv		-0,9*1,2			-1,080		
	vv		Součet			14,940		
88	M	28412110	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,20mm, nášlapná vrstva 0,50mm	m2	-16,434	528,22	-8 680,77	
	vv		14,94*1,1 Přepracované koeficientem množství			16,434		
102	K	776551111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) na stěnu výšky do 2,0 m	m2	12,304	260,77	3 208,62	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pás chodba A + K					
	VV		(23,65+37,872)*0,2		12,304			
	VV		(23,65+37,872)*0,2		12,304			
98	M	BSE.002R	λίνολεομ ρόλε σίρξυ 2m, ήουστύκα 2,50mm, R9, Καθαρό Ρ# C1	m2	13,535	820,22	11 101,55	
	VV		Pás chodba A + K					
	VV		12,3044*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,53484			
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 360,00	
102	K	767001R	Demontáž záhradlí madel nerezových rovného rozebirateľného hmotnosti 1 m záhradlí do 20 kg a jejich zpětná montáž	m	16,700	800,00	13 360,00	
	VV		5,35*2-2		16,700			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6				ZL6
Přemístění podlahové vpustě				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt A			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		27.08.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
Přemístění podlahové vpustě nutné pro vypuštění topné vody ve strojovně UT místnosti. Č. 007				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			2 725,83 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			2 725,83 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: NE				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 1.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek
[Redacted]			[Redacted]	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 06 - Přemístění podlahové vpustě

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 725,83
HSV - Práce a dodávky HSV	1 040,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	264,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	776,16
PSV - Práce a dodávky PSV	1 685,66
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 685,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 06 - Přemístění podlahové vpustě

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021


Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 725,83	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 040,17	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				264,01	
20	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,060	4 400,20	264,01	
	W		"pro zti - přemístění vtoků"					
	W		2*0,2*0,15		0,060			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				776,16	
37	K	974042565	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	2,000	388,08	776,16	
	W		"pro přemístění vtoků"					
	W		2		2,000			
	W		Scučení		2,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 685,66	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 685,66	
103	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	428,09	856,18	CS ÚRS 2021 02
104	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	829,48	829,48	CS ÚRS 2021 02

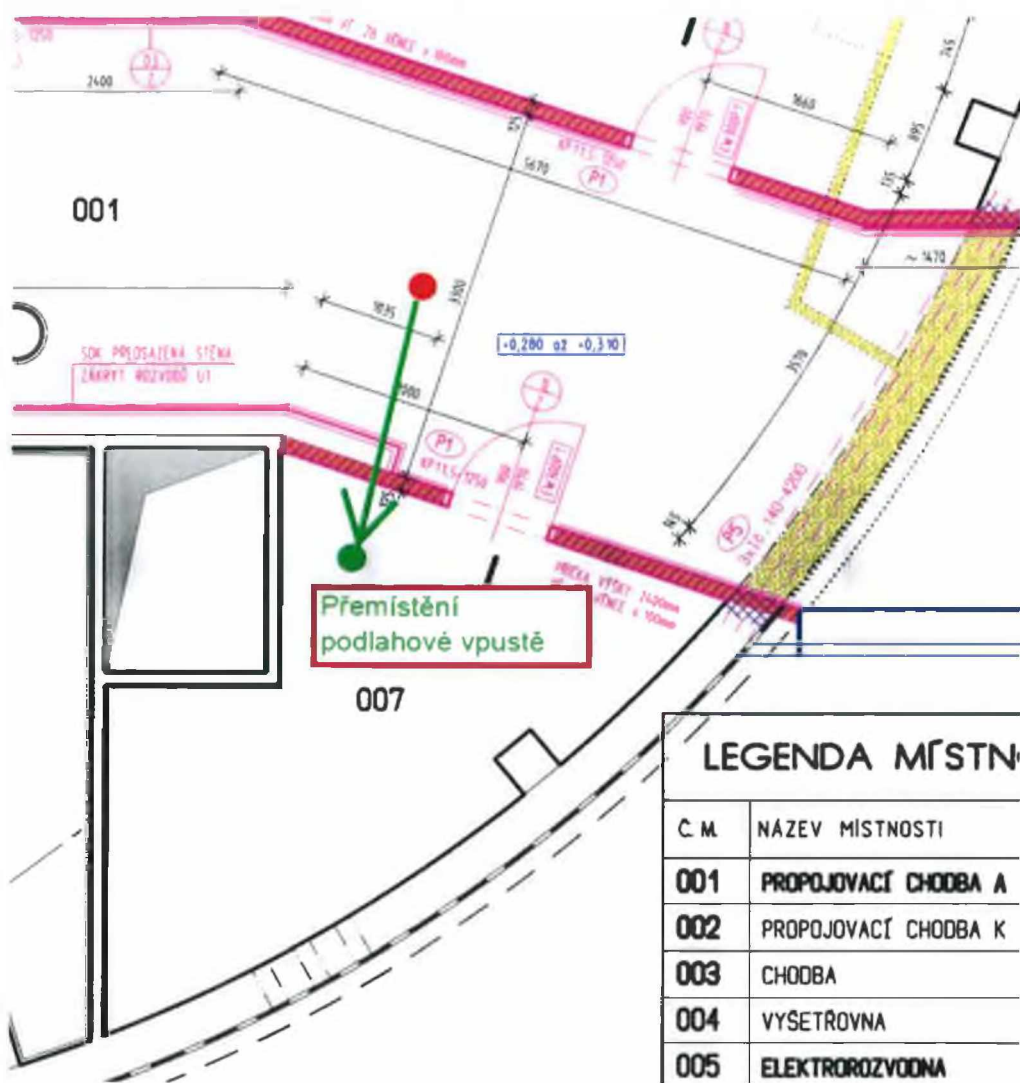

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7				ZL7
Změna SDK konstrukcí, doplnění rev. dvířek				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt A			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		27.08.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Změna v technologii provádění rastrového podhledu ve spojovací chodbě K s ozn. K.01.001 spočívající v realizaci zavěšeného rastrového podhledu na místo lepeného. Součástí ZL je dále doplnění 1 ks revizního otvoru do podhledu v chodbě K za účelem zajištění provádění periodických revizí požárních klapkek v objektu A. Dále obsahem ZL je nerealizace instalační SDK předstěny ve spojovací chodbě K s ozn. K.01.001, která s ohledem na stávající trubní vedení, nebylo potřeba realizovat.</p>				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			-21 698,84 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			29 592,13 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			7 893,29 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: NE				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 1.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 07 - Změna provedení SDK v K, doplnění rev. dvířek

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 893,29

PSV - Práce a dodávky PSV

7 893,29

763 - Konstrukce suché výstavby

7 893,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt:

ZL 07 - Změna SDK konstrukcí, doplnění rev dvířek

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
Náklady soupisu celkem							7 893,29	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 893,29	
D	763		Konstrukce suché výstavby				7 893,29	
16	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-5,400	26,40	-142,56	
17	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Připlatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	-5,400	48,00	-259,20	
18	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Připlatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	-5,400	70,20	-379,08	
19	K	763122401	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	-5,400	650,00	-3 510,00	
105	K	763172395	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	1,000	606,98	606,98	CS ÚRS 2021 02
106	M	59030763	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm</i>	kus	1,000	6 114,30	6 114,30	CS ÚRS 2021 02
24	K	763431101	Montáž podhledu minerálního lepením samonosného šířky do 2500 mm (chochobový systém), velikosti panelů do 0,96 m2	m2	-54,400	320,00	-17 408,00	
	W		17,0*3,2*-1		54,400			
	W		Scučel		54,400			
68	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	54,400	420,42	22 870,85	
	W		17,0*3,2*-1		54,400			
	W		Scučel		54,400			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8				ZL8
Výměna tlumičů hluku u stávajících VZT jednotek				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt K a A			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		30.08.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě prohlídky stávajících 3 ks VZT jednotek při dopojování na nové VZT rozvody , byly zjištěny dožití VZT tlumiče hluku, které je nutné vyměnit pro zajištění řádné funkčnosti technologie VZT v pavilonu A. Jejich výměnou dojde ke snížení hlukových dopadů z provozu stávajících jednotek.				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			52 595,20 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			52 595,20 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: ANO , posun konečného termínu o dva týdny viz . Příložený HMG				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 1.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka	<i>[Signature]</i>	František Mrázek

VZDUCHOTECHNIKA		Vyr. příkaz číslo		Varianta		
SPOJOVACÍ LOGISTICKÉ A PROPOJOVACÍ KORIDORY , Oblastní nemocnice Náchod				Datum		
Pozice	Zařízení - činnost	Vým. bce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena
Zařízení č.5: Instalace nového tlumiče VZT 1 (ARO)						
1	Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1000x600, L=1 m		sada	2	9 318,00	18 636,00
2	Demontáž a likvidace stávající VZT instalace (Tlumič hluku)		soubor	1	3 396,40	3 396,40
3	Uklid pracoviště odvoz a ekologická likvidace odpadu		soubor	1	1 800,00	1 800,00
Zařízení č.6: Instalace nového tlumiče VZT 6 (chodby , čekárny)						
4	Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1000x500, L=1 m		sada	1	7 660,00	7 660,00
5	Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1000x500, L=0,5 m		sada	1	4 390,00	4 390,00
6	Demontáž a likvidace stávající VZT instalace (Tlumič hluku)		soubor	1	3 396,40	3 396,40
7	Uklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu		soubor	1	1 700,00	1 700,00
Zařízení č.7: Instalace nového tlumiče VZT 2 (Ortopedie)						
8	Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 800x500, L=1 m		sada	1	6 720,00	6 720,00
9	Demontáž a likvidace stávající VZT instalace (Tlumič hluku)		soubor	1	3 396,40	3 396,40
10	Uklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu		soubor	1	1 500,00	1 500,00
Celkem část VZT ZL. Č. 8 (bez DPH)						52 595,20 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9				ZL9
Úprava rozvodů chlazení - doplnění armatur				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt K a A			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		01.09.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Po odborné prohlídce stávajících rozvodů a armatur chlazení po odkrytí izolací byl zjištěn nevyhovující a havarijní stav. Na základě doporučení specialisty AD bude provedena výměna dožitých armatur a potrubí ve strojovně chlazení (viz příloha č. 1 ZL), výměna uzavíracích armatur rozvodů chlazení u stávajících jednotek VZT a dále osazení nových směšovacích armatur u nových VZT jednotek, které se měly dle PD přemístit z demontovaných VZT jednotek. Práce je nutné provést z důvodu zajištění řádného provozu systému VZT a chlazení</p>				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			55 631,27 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			55 631,27 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: Ano, posun konečné termínu o dva týdny viz Příloha ZL_HMG				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 6.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek
[Redacted]			[Redacted]	

VZDUCHOTECHNIKA SPOJOVACÍ LOGISTICKÉ A PROPOJOVACÍ KORIDORY . Oblastní nemocnice Náchod		Vyr. příkaz číslo			Varianta	
					Datum	
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena
Zařízení č.8: Úprava napojení rozvody chladicí vody - strojovna chlazení						
2	Nezbytná demontáž stávajících rozvodů chlazení (DN25-65) včetně armatur		bm	4	292,05	1 168,20
4	Potrubi ocelové rozvody vč. Ivarovek, nátěry potrubí DN50		bm	4	586,08	2 344,32
8	Kaučuková izolace návleková tl.19 mm pro potrubí DN50		bm	4	404,80	1 619,20
26	Pomocné konzole a závěsy		sada	1	390,00	390,00
33	Odborná demontáž a následná montáž ručního reg. ventilu		ks	2	1 663,20	3 326,40
34	Dodávka regulačního ventilu DN 50		ks	2	4 300,00	8 600,00
17	Kontrolní teploměr		ks	2	356,40	712,80
24	Drobné a pomocné armatury a šroubení		sada	1	1 390,00	1 390,00
Zařízení č.9: Úprava napojení rozvody chladicí vody - doplnění uzavíracích armatur u stávajících VZT jednotek						
1	Nezbytná úprava stávajících rozvodů chlazení (DN25-65) včetně armatur		bm	1,5	554,40	831,60
37	kulový kohout s pákou SUPERFILTER BALL, s filtrem 1 1/2"		ks	3	2 219,25	6 657,75
24	Drobné a pomocné armatury a šroubení		sada	1	890,00	890,00
Zařízení č. 10: Dodávka nových armatur pro nové VZT jednotky						
34	Dodávka ručního reg. ventilu DN 40		ks	1	2 500,00	2 500,00
35	Dodávka ručního reg. ventilu DN 25		ks	1	2 000,00	2 000,00
36	Dodávka 3-cestného ventil vč. servopohonu (DN 32)		ks	1	8 550,00	8 550,00
37	Dodávka 3-cestného ventil vč. servopohonu (DN 50)		ks	1	13 200,00	13 200,00
24	Drobné a pomocné armatury a šroubení		sada	1	1 451,00	1 451,00
Celkem část VZT (chlazení) ZL. Č. 9 (bez DPH)						55 631,27 Kč



24 08 2021

VZI
ZPATED

TA
ISO 9001
ISO 14001

HARMONOGRAM PRACÍ -ZL 9

"Oblastní nemocnice Náchod – Spojovací logistické a provozní koridory"
vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace

	září 2021																						
	07.IX	08.IX	09.IX	10.IX	11.IX	12.IX	13.IX	14.IX	15.IX	16.IX	17.IX	18.IX	19.IX	20.IX	21.IX	22.IX	23.IX	24.IX	25.IX	26.IX	27.IX	28.IX	
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení																							
Dokončení prací chlazení v rozsahu dle SOD																							
Dokončení prací VZT v rozsahu dle SOD																							
Dodací lhůta tlumičů																							
Dodací lhůta armatur chlazení																							
Demontáž a montáž armatur chlazení strojovna chlazení, strojovna VZT																							
Tlakové zkoušky chlazení, kontrola svárů a napouštění																							
Dopojení a zprovoznění MAR																							
Demontáž stávajících tlumičů VZT																							
Montáž nových tlumičů VZT																							
Zprovoznění VZT jednotek včetně normičů, zaregulování, odzkoušení, zkoušky měření regulace.																							
Předání a převzetí díla																							



ZMĚNOVÝ LIST Č. 10				ZL10
Upřesnění silových přívodů rozvaděčů				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt K a A			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		01.09.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě koordinace prefese MAR a SIL jsou upřesněny napájecí silové kabely rozvaděčů MR1- MR3.				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			-7 883,74 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			18 515,46 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			10 631,72 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: Ano, posun konečné termínu o dva týdny viz Příloha ZL _ HMG				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 6.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek
[Redacted]			[Redacted]	

dově	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena	Cena celkem
Upřesnění silových přívodů rozvaděčů							
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>							
49	CYKY 3x35+1x25	m	23,00	270,00	52,00	322,00	7 406,00
50	CYKY 5x6	m	50,00	76,80	43,20	120,00	6 000,00
51	CYKY 5x4	m	22,00	52,80	43,20	96,00	2 112,00
5	CYKY 3Cx2,5 PU	m	-23,00	21,53	33,84	55,37	-1 273,52
7	CYKY 19Cx1,5 PU	m	-46,00	96,14	37,09	133,23	-6 128,57
<i>SVÍTIDLA</i>							
<i>ZAPOJENÍ KABELU</i>							
25	Ukončení Cu vodiče v rozvaděči, do 2,5 mm ²	ks	-22,00	2,84	50,85	21,89	-481,64
47	Ukončení Cu vodiče v rozvaděči, do 35 mm ²	ks	4,00	14,21	87,80	102,01	408,06
26	Ukončení Cu kabelu, do 5x4 mm ²	ks	5,00	14,21	129,92	144,13	720,66
48	Ukončení Cu kabelu, do 5x6 mm ²	ks	5,00	14,22	129,92	144,14	720,70
<i>HODINOVÉ ZŮŤOVACÍ SAZBY</i>							
39	Dokončovací práce, práce mimo ceník	hod	2,00		372,77	372,77	745,54
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500</i>							
46	Revizní technik	hod	1,00		402,50	402,50	402,50
Celkem bez DPH							10 631,72

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11				ZL11
Změna světel ve spojovací chodbě				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“			
Objekt:	Objekt K a A			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (kom)	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způs)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		02.09.2021
Přílohy / počet listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
<p>V souvislosti se změnou technologie provádění rastrového pohledu ve spojovací chodbě spočívající v realizaci zavěšeného rastrového pohledu na místo lepeného pohledu a dále z důvodu dosažení maximální průchozí výšky byly upřesněny zhotovitelem pozice svítidel včetně typu s dopadem do navýšení počtu svítidel o 2 ks. Čtvercová led svítidla jsou zvoleny s minimální konstrukční výškou zasahující do průchozí výšky chodby. Tímto řešením dojde i k dosažení lepší prostorové rovnoměrnosti osvětlení chodby podzemním koridoru A-K.</p>				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			-13 713,25 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			17 141,56 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			3 428,31 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: Ano, posun konečné termínu o dva týdny viz Příloha ZL_HMG				
5) Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum: 6.9.2021
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek

dově	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena	Cena celkem
Montažní materiál a práce							
<i>SVÍTIDLA</i>							
19	C - stropní LED svítidlo 5300-4K, IP40, 33W	ks	-3,00	1 373,41	340,74	1 714,16	-5 142,47
10	C - stropní LED svítidlo 5300-4K, IP40, 33W	ks	-5,00	1 373,41	340,74	1 714,16	-8 570,78
19a	C - stropní LED svítidlo 595x595x10 mm	ks	10,00	1 373,41	340,74	1 714,16	17 141,56

Celkem bez DPH							3 428,31
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

026.02 - Vytápění

V - Práce a dodávky PSV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

30 - Vytápění

SO 026.03 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

21-M - Elektromontáže

SO 026.04 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

21-M - Elektromontáže

SO 026.05 - Vzduchotechnika a chlazení

M - Práce a dodávky M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení

SO 026.07 - Měření a regulace

M - Práce a dodávky M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

SO 026.08 - Potrubní pošta

M - Práce a dodávky M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

23-M - Montáže potrubí

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	6 085 407,30 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 292 408,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 173 905,22 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 292 408,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 173 905,22 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	466 313,80 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	466 314 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	7,66 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	6 085 407,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	6 085 407,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 108 226,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 108 226,47 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	108 226,47 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	1,78 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		6 085 407,30 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 108 226,47 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		108 226,47 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,78 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 400 635,05 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 173 905,22 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	226 729,83 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	6 085 407,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	6 312 137,13 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	6 312 137,13 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:
