



SD / 2021 / 0003 / 2



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S21-034-0217

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obce pro Baťův kanál

sídlo Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

IČ: 75068478

Zastoupen: Pavlem Boudou, místopředsedou svazku

(dále jen **Objednatel**)

#### 1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 48035599

Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín

a Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel oba na základě plné moci

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 23.2.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem Cyklotrasa Strážnice – Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu).

Dílo mělo být dle Smlouvy prováděno v těchto termínech:

Etapa I. - Přístav Strážnice (mezi mostem a Průžkovým mlýnem) - staničení km 0,690 00 - km 1,065 00, v situaci označeno jako 1. část 2. úseku - provést nejdříve, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa II. - Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) - staničení km 0,000 00 (ZÚ) - km 0,690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa III. - Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 - km 1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2.úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1,675 00 - km 2,250 00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

*Etapa II. - Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) - staničení km 0,000 00 (ZÚ) - km 0,690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,*

*Etapa III. - Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 - km 1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2.úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,*

*Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1,675 00 - km 2,250 00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,*

*Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KÚ), v situaci označeno jako 4.úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 15.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,*

*Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00, v situaci označeno jako 3b + 3c úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 15.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.*

*Splnění termínů dodání díla je podmíněno zejména:*

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby*
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby*

*4.4. Změna termínů dodání díla bude provedena v těchto případech:*

- pozdější řádné předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.*
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně*
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek*

*Ve všech těchto případech se termín dodání posunuje o počet dnů zdržení dle čl. 4.4 smlouvy a úměrně důsledkům z toho vyplývajícím.*

*4.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.*

*4.6. Termín předání zhotoveného díla je totožný s termínem ukončení prací na díle.*

*Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.*



*Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.*

*V Hodoníně dne ...26.4.2021*

*V Hodoníně dne ...26.4.2021*

*Objednatel*

*Zhotovitel*






# PŘÍSTAV STRÁŽNICE

8,00  
dlažba  
19,24 m<sup>2</sup>

49,15  
kamenivo  
122,40 m<sup>2</sup>

22,20  
asfalt  
54,65 m<sup>2</sup>

přístav střešen  
výhledová plošina

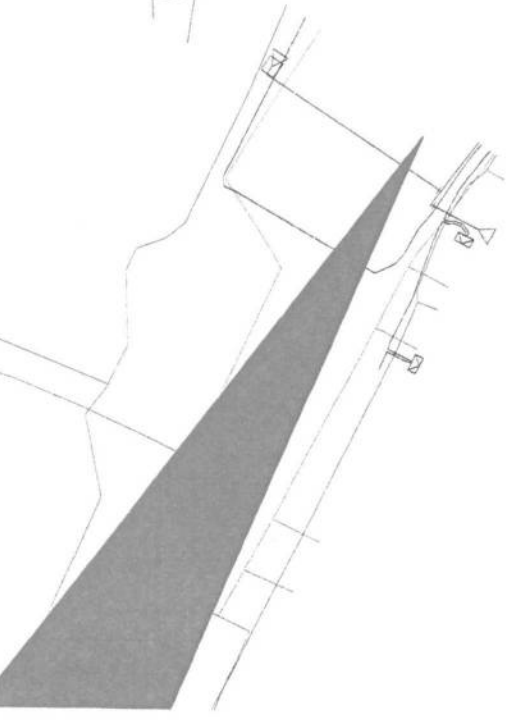

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/06\_v2

**Stavba:** CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-81 488,20</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-81 488,20	-17 112,52
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-98 600,72</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/06\_v2

Stavba: CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavb; Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-81 488,20</b>	<b>-98 600,72</b>
2020/06_v 2	CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)	-81 488,20	-98 600,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu) -  
MÉNĚPRÁCE**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-81 488,20**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-81 488,20	21,00%	-17 112,52
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-98 600,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu) -  
MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>-81 488,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-81 488,20
1 - Zemní práce	-17 652,31
5 - Komunikace pozemní	-56 314,54
998 - Přesun hmot	-7 521,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu) - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena á sousta
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-81 488,20</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-81 488,20</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>					
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	-277,725			
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				15 043,000	
	VV		79,35*3,5					
3	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	-245,360			
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním				12 839,375	
	VV		196,29*1,25 *Přepočtené koeficientem množství					
8	K	182251101	Svahování násypů vč. zatravnění	m2	-119,025			
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv homině vč. založení trávníku na půdě výsevem včetně utažení				6 447,000	
	VV		2*79,35*0,75					
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>					
6	K	564811111	Podklad z drti fr. 0/4 tl 50 mm	m2	-225,730			
	PP		Podklad z drti fr. 0/4 s rozprostřením, zhuťněním a zakropením, po zhuťnění tl. 50 mm				11 812,225	
	VV		196,29*1,15					
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-245,360			
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm				12 839,375	
	VV		196,29*1,25					
17	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zemínou tl 100 mm	m2	-39,675			
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění prohozenou zemínou tl. 100 mm				2 149,000	
	VV		2*(79,35*0,25)					
D	998		<b>Přesun hmot</b>					
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-110,608			
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
