



S00JP019HMFU

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1800210062
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/20/V00031910

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

jehož jménem jedná:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Odpovědný útvar:

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

Tel.:

e-mail:

dále jen **objednatel****a****FITNEMA s.r.o.**

se sídlem U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč

jejímž jménem jedná:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

03554104

DIČ:

CZ03554104

Bankovní spojení:

Tel:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

uzavřeli dne 10.2.2021 smlouvu o dílo č. 1800210062 na realizaci stavebních prací „Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX.“ (dále jen smlouva o dílo). Původní cena díla dle smlouvy o dílo již byla zvýšena o cenu nezbytných dodatečných stavebních prací dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2.

Původně sjednaný termín dokončení díla do 30.6.2021 není možno dodržet z několika důvodů. Jedním z důvodů je chyba na straně poddodavatele, který zhotoviteli dodal nesprávný typ sítě z ocelových lanek. Uvedená chyba na straně poddodavatele byla prokazatelně doložena doklady, které zhotovitel

objednateli předložil (objednávka, faktura a dodací list). Dále bylo zhotovitelem předloženo čestné prohlášení o tom, že dva zaměstnanci v letošním roce prodělali onemocnění COVID-19, čímž došlo k pozdnímu odhalení naskladnění nesprávného typu sítě a ke zdržení výroby oplocení o cca 6 týdnů. Dle zhotovitele se realizace prodloužila rovněž z důvodu navýšení objemu stavebních prací na základě dodatku č. 1 (nová dopadová plocha z lité pryže pod dětskými hracími prvky). Zdržení bylo způsobeno také přívalovými dešti, které v průběhu měsíce června bránily např. v betonování sloupků oplocení. K prodloužení termínů v letošním roce dochází ve stavebnictví obecně, ať už se jedná o výrobu nebo poddodavatelské práce.

Z objektivních důvodů, nezaviněných zhotovitelem, přistoupily shora uvedené smluvní strany k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, jak je dále uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je:
- Změna článku IV. - Doba a místo plnění, kde se odst. 1 ruší a nahrazuje tímto zněním:

Doba plnění:

Zahájení provádění díla: 1.4.2021 (do 5 dnů od předání staveniště)

K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, a to na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol) podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 15.9.2021.

Článek III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 3 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení dodatku č. 3 smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích



Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 26.7.2021, č.j. 72/14R/2021

Ve Zlíně dne:

16. 08. 2021

objednatel

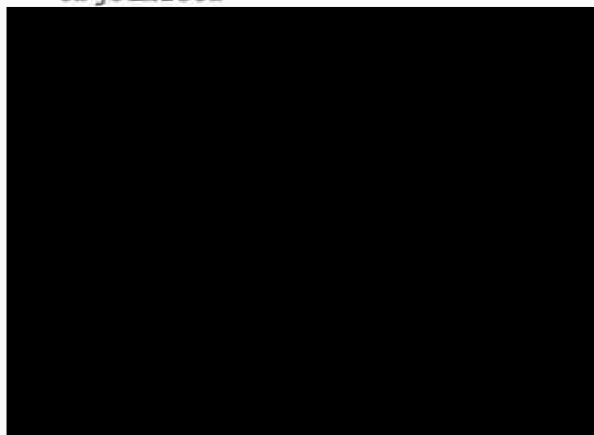

V Třebíči dne:

12/08/2021

zhotovitel

