



## DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2019

„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod“  
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** **Město Kutná Hora**  
**Havlíčkovo náměstí 552**  
**284 01 Kutná Hora**

zastoupen: [redacted], starostou města  
IČ: 00236195  
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora  
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

[redacted] vedoucí odboru investic MÚ, tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]

**II. Zhotovitel:** **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**  
**U Lazara 22**  
**284 01 Kutná Hora – Karlov**

zastoupen: panem Ing. Jiřím Chramostou, jednatelem společnosti  
IČ: 49 54 95 11  
DIČ: CZ49 54 95 11  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném pod spisovým číslem C 23126 u Městského soudu v Praze

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

[redacted] vedoucí úseku komunikací,  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:



**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod“**  
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 8. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 1.9.2021.
- 1.2** Tímto Dodatkem č. 3 se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla sjednané v čl. 3 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a 2 takto:

Cena za dílo se navyšuje o částku 470.760,25 Kč bez DPH v důsledku víceprací uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a činí:

Cena díla bez DPH	:	8 323 418,69 Kč
Celkem DPH	:	1 747 917,92 Kč
Cena díla včetně DPH	:	10 071 336,61 Kč

(DesetmilionůsedmdesátjednatisíctřistatřicetšestKč 61/100 včetně DPH)

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

### **2. Ostatní ustanovení**

- 2.1** Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 2.2** Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 675/21 ze dne 18.8.2021.

### **3. Závěrečná ujednání**

- 3.1** Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. smluvními stranami.
- 3.2** Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.3** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 3 s rozpočtem víceprací



- 3.4** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy
- 3.5** Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zhotovitel:

V Kutné Hoře dne 21.9.2021

jednatel  
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Obchodatel:

ve dne 21.9.2021

starosta  
města Kutná Hora



**Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod**

**Identifikační číslo:** CZ.05.1.24/0.0/0.0/18\_113/0009036  
**Objednatel:** Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora  
**Zhotovitel:** Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora  
**Změnový list:** č.3

**Zdůvodnění změny:**

1. Výskyt nadměrného množství kořenových systémů od vzrostlých stromů v trasách systému odvodnění
2. Výskyt skalního podloží v trasách systému odvodnění

**Zjištění:**

ad 1. Při výkopových pracích došlo ke kontaktu s kořenovým systémem  
ad 2. Při výkopových pracích bylo zasaženo skalní podloží

**Návrh řešení:**

1. Bylo nutno provádět ruční hloubení rýh v hornině č. 4 a dále bylo nutno průběžně provádět ošetřování a zabezpečování kořenového systému
2. Bylo prováděno ruční dolamováno rýh v hornině 6 a 6c

VIZ. PŘÍLOHA

Odpočet „méněprací“:	72 192,45 Kč
Připočet „víceprací“:	542 952,70 Kč
<b>Dopad na cenu (bez DPH):</b>	<b>470 760,25 Kč</b>

**Přílohy: 1**


Rozpočet vyvolaných víceprací.

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal:

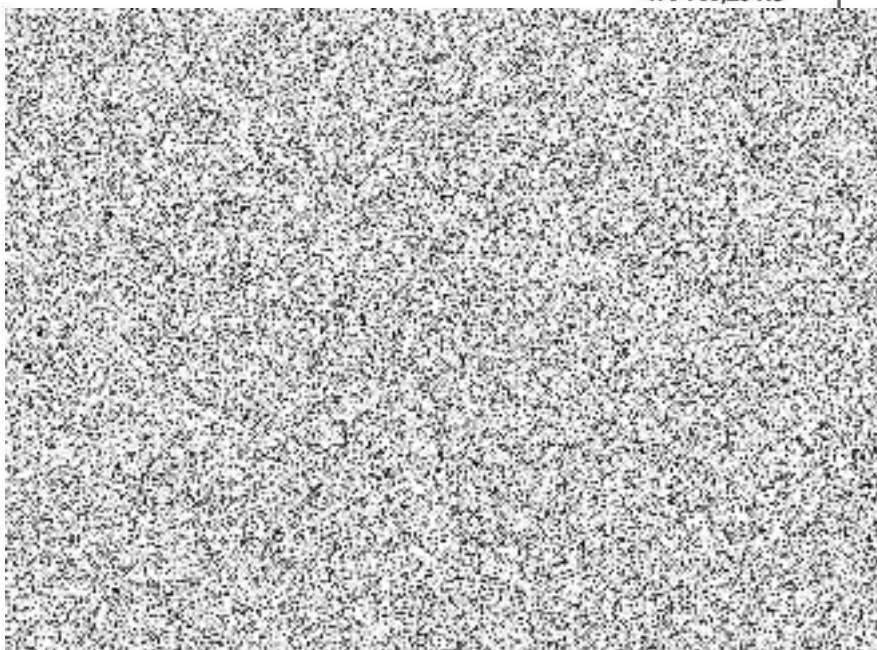

<b>Akce</b>	<b>Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod</b>
Investor	Město Kutná Hora
Dodavatel	Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

### ZL č. 3

p.č.	číslo položky	název položky	MJ	množství	cena za MJ	celkem	cenová úroveň
1	138611201	DOLAMOVÁNÍ RÝH VE VRSTVĚ TL DO 500 V HOR. TŘÍDY TĚŽ. III, SKUPINY 7 K5 - 13,5 bm - 6,48 m3 K6 - 9,6 bm - 4,61 m3 K7 - 9,5 bm - 4,56 m3	m3	15,65			
2	132312111	HLOUBENÍ RÝH Š DO 800 V SOUDR. HOR. TŘÍDY TĚŽ. II SKUPINY 4 RUČNĚ K1 - 100,0 bm - 48,00 m3 K2 - 55,0 bm - 26,40 m3 K3 - 115,0 bm - 55,20 m3 K4 - 105,0 bm - 50,40 m3 K5 - 80,0 bm - 38,4 m3 K6 - 39,3 bm - 18,86 m3 (dokončení) K7 - 29,1 bm - 13,97 m3 K9 - 24,6 bm - 11,81 m3	m3	263,04			
3	129001101	PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ ODKOPÁVKY NEBO PROKOPÁVKY V BLÍZKOSTI INŽ. SÍTÍ (KOŘENY) K1 - 100,0 bm - 48,00 m3 K2 - 55,0 bm - 26,40 m3 K3 - 115,0 bm - 55,20 m3 K4 - 105,0 bm - 50,40 m3 K5 - 80,0 bm - 38,4 m3 K6 - 39,3bm - 18,86 m3 K7 - 29,1 bm -13,97 m3 K9 - 24,6 bm - 11,81 m3	m3	263,04			
<b>CELKEM</b>							

p.č.	číslo položky	název položky	MJ	množství	cena za MJ	celkem	cenová úroveň
2	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v horn.3, hloubení strojně	m3	-278,69			SoD
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hl. do 2m	m2	-52,16			SoD
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hl. do 2m	m2	-52,16			SoD
<b>CELKEM</b>							

<b>ZL č. 3 CELKEM</b>							
<b>DPH 21%</b>							
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>							
