

**DODATEK č. 2  
ke smlouvě o dílo**

„B 062 – Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15“

číslo smlouvy objednatele: 312016000/025/2  
číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2020-015

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
Právní osoba: akciová společnost  
Zápis v OR: OR vedená Městským soudem v Praze, spis zn. B 20059  
Bankovní spojení: PPF banka a.s  
Číslo účtu: ██████████  
zastoupena: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.  
  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Milan Zach, ředitel investičního úseku  
Ing. Tomáš Tomáš – pověřený vedením oddělením přípravy a realizace oprav  
Nina Hrubá – technik přípravy a realizace oprav

(dále také jako „objednatel“)

**2. Zhotovitel:** **M – SILNICE a.s.**  
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
Právní forma: akciová společnost  
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. B 430  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: ██████████  
Zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva  
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obch. technického oddělení  
ve věcech technických: Ing. Tomáš Kučera, výrobní náměstek  
Luděk Zemen, hlavní stavbyvedoucí  
e-mail pro účely fakturace: monika.tomanova@msilnice.cz

(dále také jako „zhotovitel“)

**II.  
Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 06. 2020 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, specifikovaná níže. Jedná se o nezbytné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

#### Vícepráce

##### SO 451

Odůvodnění víceprací v souvislosti s přeložkou trasy optických kabelů (SO 451):

V rámci SO 451 byla navržena přeložka dálkového optického kabelu vysoké priority (ribbonová konstrukce) ve vlastnictví společnosti Telia Carrier Czech Republic a.s. Na základě projednání RDS, které je podmínkou správce IS ve vyjádření, bylo správcem konstatováno, že na uvedeném kabelu nejsou dostatečné délkové rezervy, které by umožňovaly jeho stranové vymístění jak pro provizorní, tak pro finální řešení. Každým dalším zásahem na kabelu (vložením nové spojky) by došlo k zhoršení přenosových vlastností kabelu a ohrožení tak živých datových toků mezinárodního charakteru. Z tohoto důvodu vlastník kabelu, společnost Telia Carrier Czech Republic a.s. připouští jako jediné možné nezbytné řešení oproti předpokladům zadávací dokumentace výměnu celé kabelové délky, která prochází objektem B 062.

### III.

#### Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se v části vyčíslení ceny mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	29 890 098,89 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 904,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	962 475,29 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	1 481 677,50 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>32 333 347,68 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatků č. 1 a 2 dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zároveň celkový cenový nárůst související se změnami dle Dodatků č. 1 a č. 2 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

o Dodatku je  
n zadávání  
y práce,  
šním

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- a) Příloha č. 1 – soupis víceprací
- b) Příloha č. 2 – ZBV č. 3

V Praze dne 23. 9. 2021

za Objednatele:  
Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.



Ing. Josef Richtř



Filip Hájek




V Hradci Králové dne

za Zhotovitele:  
M – SILNICE a.s.




Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva



Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697  
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868  
ředitelství  
Besslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 18



# ZMĚNA CENY STAVBY

## Č. 3

**Stavba**

**B 062 Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022,  
Praha 15**

**SO 451 Přeložka trasy optických kabelů**

**Objednatel stavby:**



**Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.  
Řásnovka 770/8  
110 00 Praha 1**

**Zhotovitel Stavby:**



**M - SILNICE a. s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice**

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo Stavby:	B062 – Švehlova, oprava mostu č. akce 1022, Praha 15
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Přeložka trasy optických kabelů</b>
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	451/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/2	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	2/6	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/7	
Změnový list (Skupina 4)	1/8	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1/9	
Zápis ze stavebního deníku VCP/MNP	1/10	
Vyjádření Telia Carrier	1/11	
Porovnání cenových nabídek	1/12	
Fotodokumentace	4/16	

**Průvodní list zařazení změny do skupiny  
pro ZBV číslo: 3**

Věcně příslušný útvar: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Název stavby: B 062 - Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15  
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 451/1  
Název SO/PS: Přeložka trasy optických kabelů

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):  
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:  
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných  
Orientační cena navrhovaných Změn kladných  
Aktuální orientační smluvní částka:

V rámci SO 451 byla navržena přeložka dálkového optického kabelu vysoké priority (ribbonová konstrukce) ve vlastnictví společnosti Telia Carrier Czech Republic a.s. Na základě projednání RDS, které je podmínkou správce IS ve vyjádření, bylo správcem konstatováno, že na uvedeném kabelu nejsou dostatečné délkové rezervy, které by umožňovaly jeho stranové vymístění jak pro provizorní, tak pro finální řešení. Každým dalším zásahem na kabelu (vložením nové spojky) by došlo k zhoršení přenosových vlastností kabelu a ohrožení tak živých datových toků mezinárodního charakteru. Z tohoto důvodu vlastník kabelu, společnost Telia Carrier Czech Republic a.s. připouští jako jediné možné nezbytné řešení oproti předpokladům zadávací dokumentace výměnu celé kabelové délky, která prochází objektem B 062.

Tento návrh byl odsouhlasen v rámci Pokynu pověřené osoby objednatele k provedení Variace. Toto ZBV nevzniklo řetězením z jiného ZBV, ani vznik dalšího ZBV nezpůsobuje a zároveň nezpůsobuje vznik Smluvních kompenzačních nároků, které by Zhotovitel uplatňoval na Objednateli.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU PODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ)**

**ZPRACOVATEL (za TSK):**

Jméno: Nina Hrubá  
funkce Správce stavby

Podpis: ..... datum: 18. 8. 2021

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL INVESTIČNÍHO ÚSEKU:**

Jméno: Milan Zach

Podpis: ..... datum: 18. 8. 2021

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>B 062 - Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>451/1</b>	Číslo ZBV:  <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložka trasy optických kabelů</b>			
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 IČ: 03447286			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868			
<b>Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6</b>			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	1 481 677,50	1 481 677,50
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00
<b>Suma ZBV č.</b>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 677,50</b>	<b>1 481 677,50</b>
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: B 062 - Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	451/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka trasy optických kabelů	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)  
Luděk Zemen

29.7.2021

Projektant (AD):  
Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:  
Ing. Jakub Růžička

29.7.2021


Správce stavby:  
Nina Hrubá

Zaměstnanec TSK odpovědný za cenové projednání Změny:  
Markéta Habelová

E  
C  
C  
P  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32





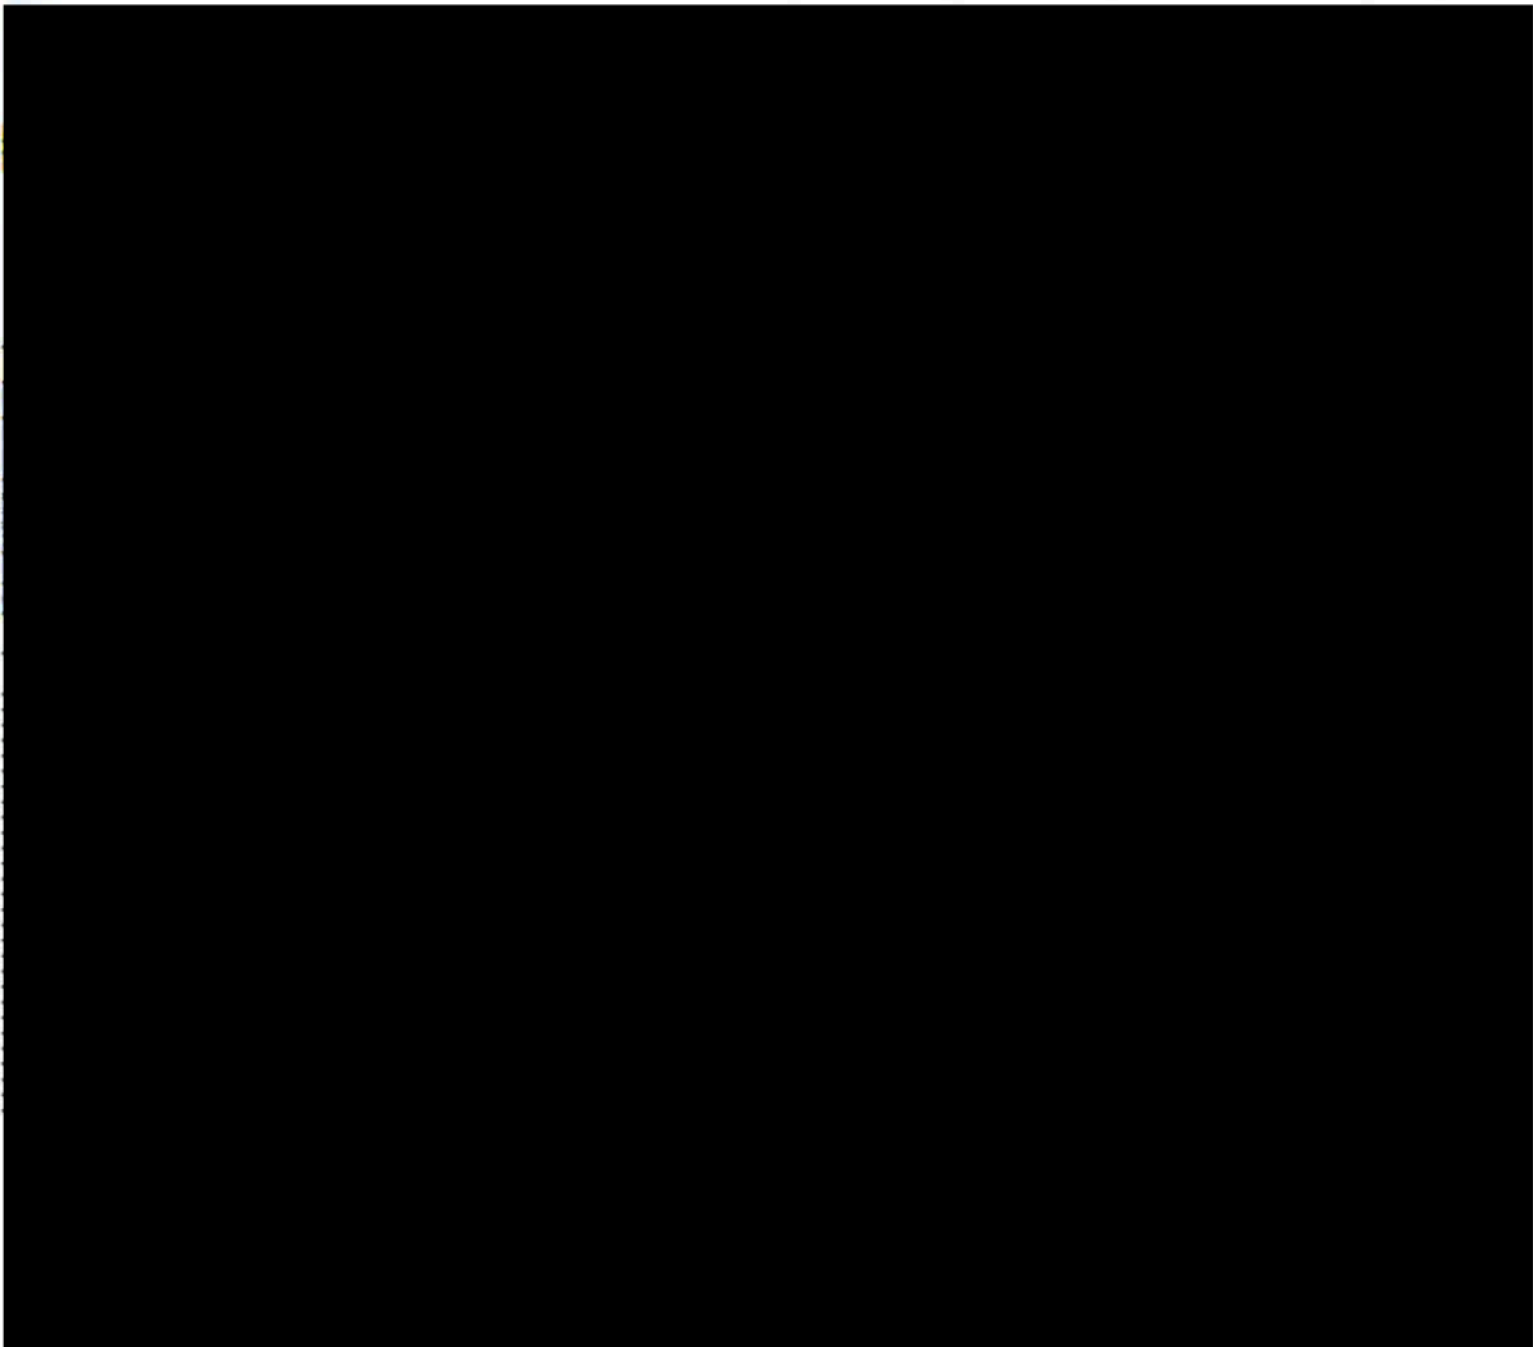

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>B 062 - Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložka trasy optických kabelů</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>451/1</b>	Číslo ZBV: <b>3.4</b>
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.6.2020 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1  
Zhotovitel: M - SILNICE, a. s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2, 3	Zhotovitel 2x
4	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci SO 451 byla navržena přeložka dálkového optického kabelu vysoké priority (ribbonová konstrukce) ve vlastnictví společnosti Telia Carrier Czech Republic a.s. Na základě projednání RDS, které je podmínkou správce IS ve vyjádření, bylo správcem konstatováno, že na uvedeném kabelu nejsou dostatečné délkové rezervy, které by umožňovaly jeho stranové vymístění jak pro provizorní, tak pro finální řešení. Každým dalším zásahem na kabelu (vložením nové spojky) by došlo k zhoršení přenosových vlastností kabelu a ohrožení tak živých datových toků mezinárodního charakteru. Z tohoto důvodu vlastník kabelu, společnost Telia Carrier Czech Republic a.s. připouští jako jediné možné nezbytné řešení oproti předpokladům zadávací dokumentace výměnu celé kabelové délky, která prochází objektem B 062.



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. David Dvořák	datum	
Supervize	jméno	TDS		
Správce stavby	jméno			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Nina Hrubá	datum	
Zhotovitel	jméno	Mgr. Michal Kropáč M - SILNICE a.s. Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum	

Ev. č.
Číslo
Číslo
Po
p
19
26
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59



V rámci SO 451 byla navržena přeložka  
dálkového optického kabelu vysoké  
prioritě (ribbonová konstrukce) ve  
vlastnictví společnosti TELIA CARRIER  
CZECH REPUBLIC a.s.

Na základě projednání RDS, které je  
podmínkou správce IS ve vyjádření, bylo  
správcem konstatováno, že na uvedeném  
kabelu však nejsou dostatečně velké  
rezervy, které by umožňovaly jeho stranové  
vymístění, jak pro provizorní, tak pro  
finální řešení. Každým dalším zásahem  
na kabelu (vložením nové spojky) by došlo  
k zhoršení přenosových vlastností kabelu  
a ohrožení tak živých datových toků  
mezinárodního charakteru. Z tohoto  
důvodu vlastník kabelu společnost  
TELIA CARRIER Czech republic a.s.


připouští jako jediné možné nezbytné  
řešení oproti předpokladům zadávací  
dokumentace výměnu celé kabelové  
délky, která prochází objektem B062


Odhad ceny: VCP :  
MNP :

zhotovitel





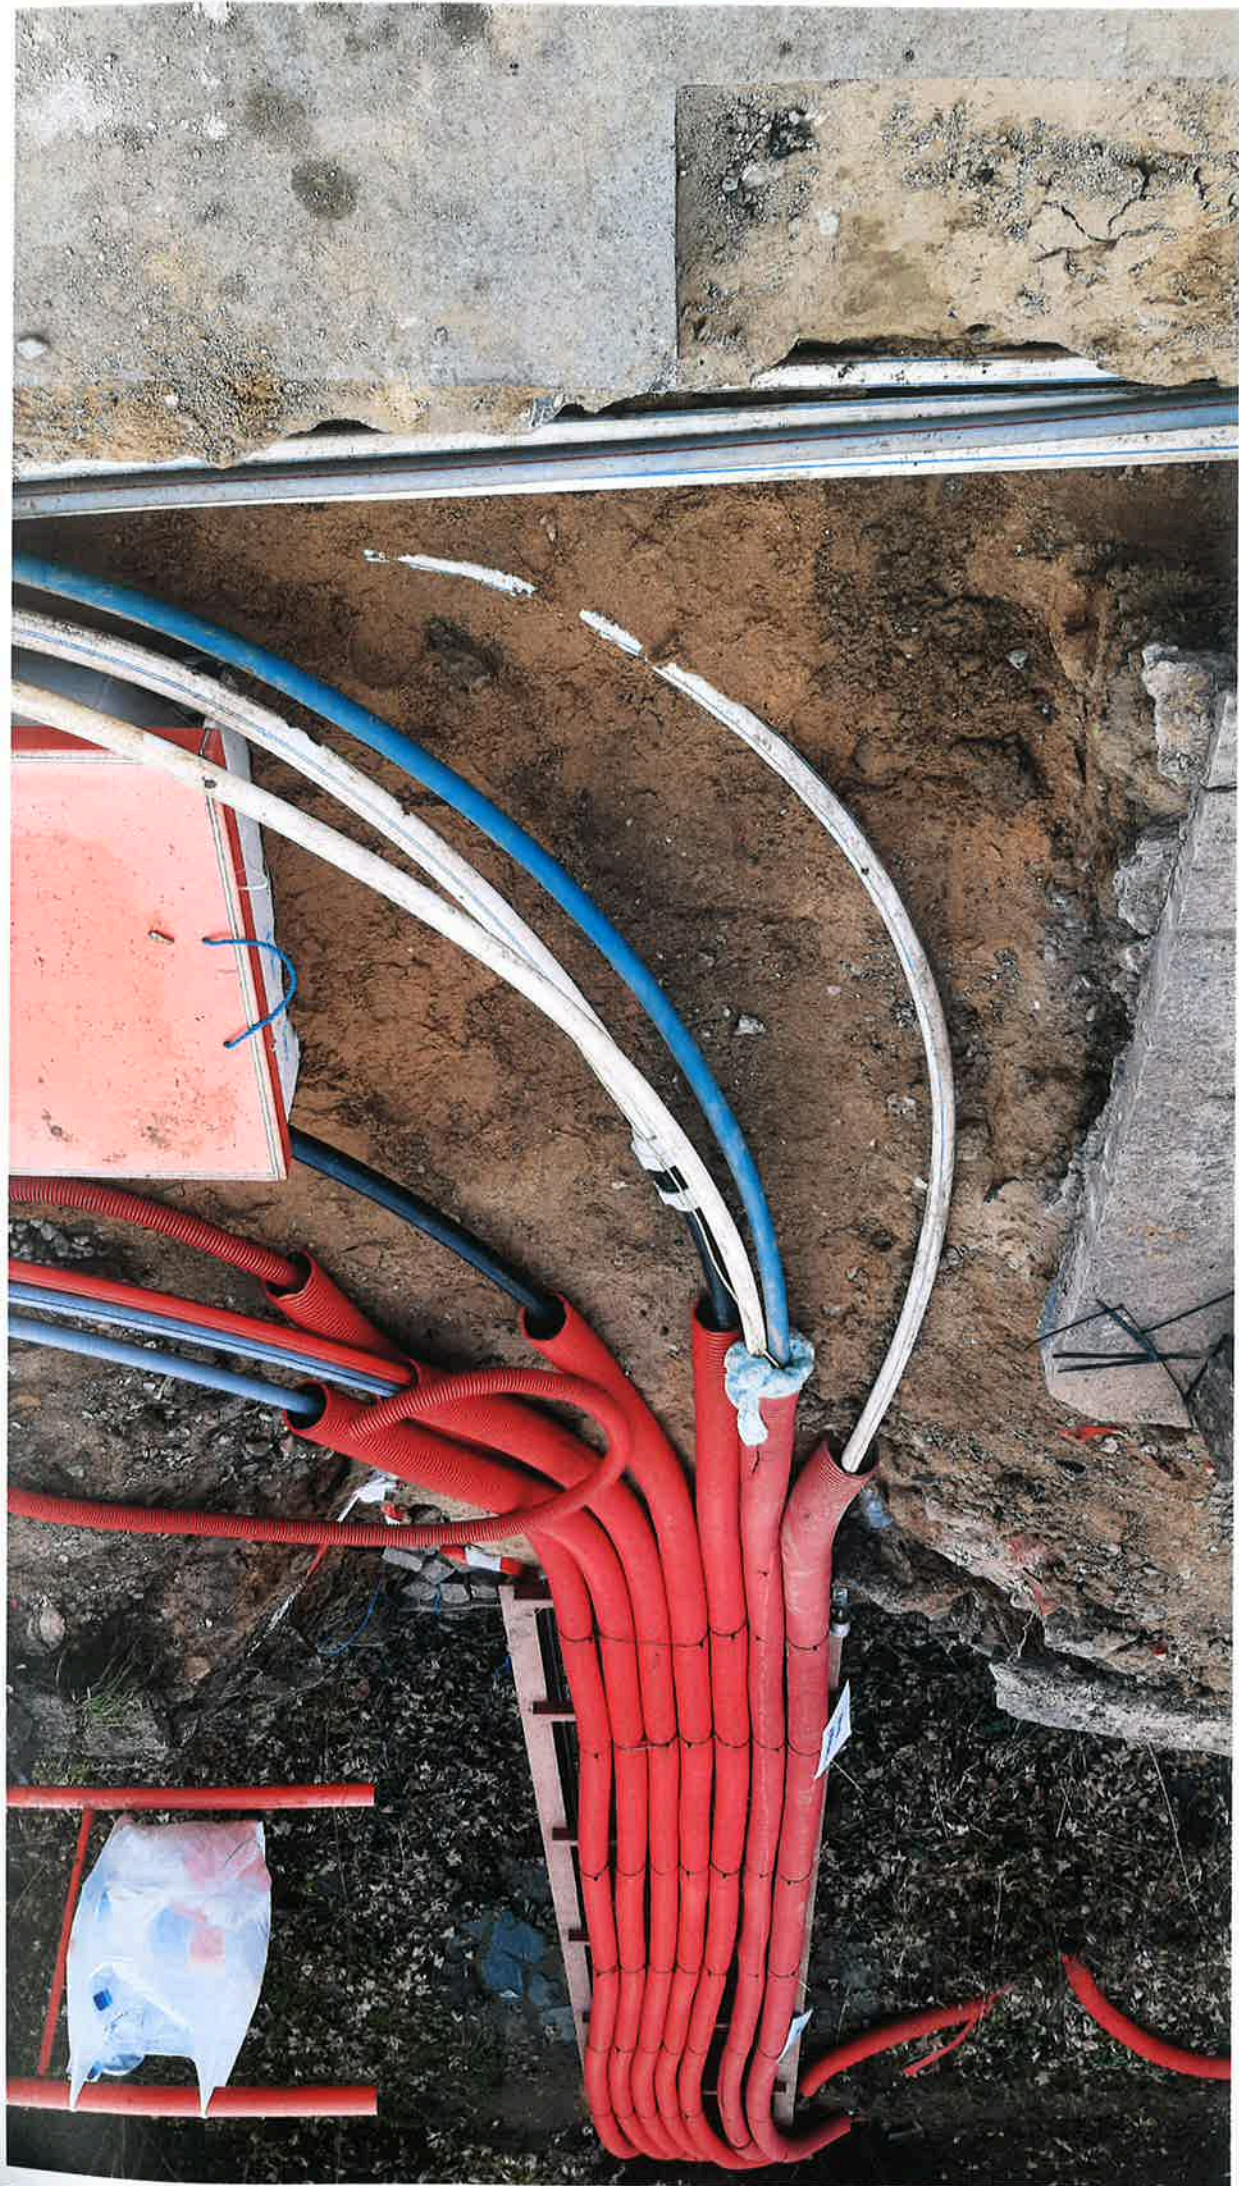

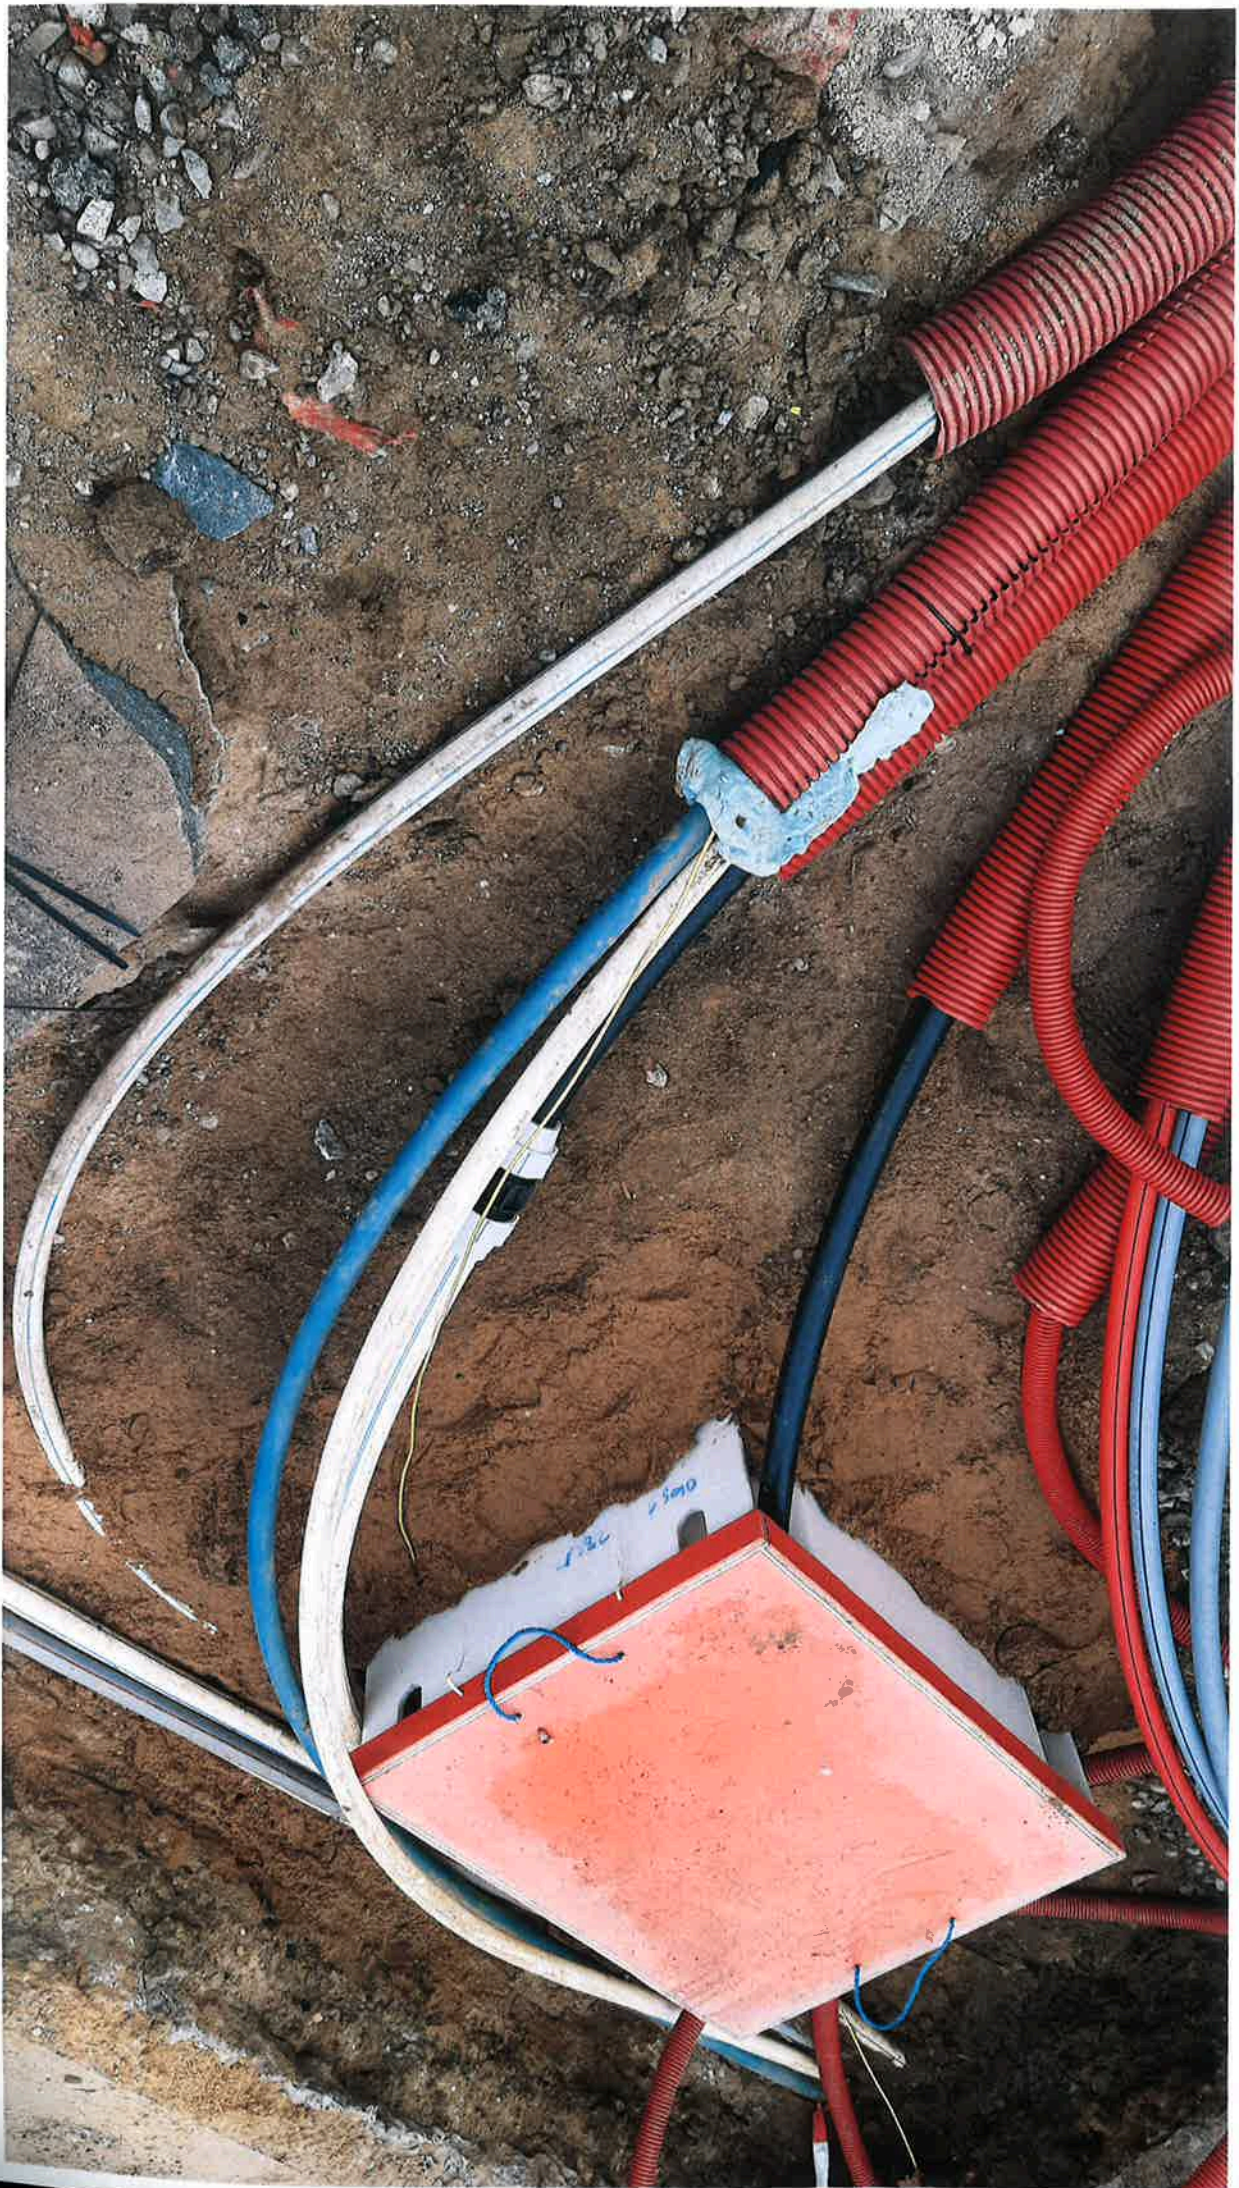





**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)**

Název a evidenční číslo Stavby:

**B 062 - Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	29 890 098,89
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	32 333 347,68
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,17%
4=(24/1)*100	Šledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Šledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		4 483 514,83 Kč

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 443 248,79	bez ABS
7=(6/1)*100	Šledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	8,17%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 987 829,67 Kč	

9=(31/1)*100	Šledování limitu 50 % Skupina 3	0,68%	ABS
10=(35/1)*100	Šledování limitu 50 % Skupina 4	7,30%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 945 049,45 Kč	

Šledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

12=(39/1)*100	Šledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky	0,00%	ABS	
13=39	Šledování čerpání limitu	4 483 515 Kč	0 Kč	ABS
14=1 492 240 000/39	Zbývá do vyčerpání limitu	4 483 515 Kč	4 483 515 Kč	

OK v limitu

**Skupiny Změn**

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost			- 4 - Nezbytnost			- 5 - Změny de minimis			- 6 - Smluvní kompenzační nároky			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+4	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40
		B 062 - Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15	- 904,00	2 444 152,79	2 443 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 483,48	264 483,48	264 483,48	- 904,00	2 178 669,31	2 178 765,31	2 180 673,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
411	1	Přeložka VN a sdělovacího kabelu PRE/navyšení počtu přechodových spojů	- 904,00	697 991,81	697 087,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 904,00	697 991,81	697 087,81	698 995,81			0,00%	0,00	
433	2	Přeložka NN DPP - dráhový kabel/nhledání trasy spojů/čl	0,00	264 483,48	264 483,48			0,00			0,00		264 483,48	264 483,48	264 483,48			0,00	0,00			0,00%	0,00	
451	3	Provozovní a definitivní přeložka kabelů Telsa	0,00	1 481 677,50	1 481 677,50			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		1 481 677,50	1 481 677,50	1 481 677,50			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00																
