

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

CE - ING s.r.o.
se sídlem: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
zastoupený: Janem Čejchanem, jednatelem
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 35921
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a tzv. méněprací (prací, které nebudou provedeny), a to víceprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je společně se změnami podle Dodatku č.1 nižší než 15% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 4 zákona – práce podle změnových listů č. 12 a 13, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

Vícepráce: 32 762,84 Kč bez DPH

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2.Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 6.344 899,97 Kč bez DPH

(slovy: šest milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set devadesát devět korun českých devadesát sedm haléřů bez DPH)

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje **RK/35/1966/2020** hejtman Královéhradeckého kraje.


Přílohy:

Změnový list č. 12 a č. 13 včetně rekapitulace ZL

Změny závazků

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mg. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Náchodě dne



Jan Čejchan, jednatel
CE – ING s.r.o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-05-02a

Stavba: SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 17.09.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel: CE-ING s.r.o.,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 762,84	39 643,03
ZL 12	Doplnění revizních dvířek do podhledu	12 495,92	15 120,06
ZL 13	Dopojení stávajícího VZT potrubí	20 266,92	24 522,97

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

Výsledná změna ceny bez DPH:

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválili:

za zhotovitele:

za TDS:

za GP:

za uživatele:

datum:

datum:

datum:

datum:

Jan Čepchar

Ing. Tomáš Pazdera

Ing. René Hubka

11

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

Doplnění revizních dvířek do podhledu

Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemní pavilónem „A“		
Objekt:	Objekt A a K		
Vydal:	CE-ING s.r.o.		Jan Č
Odesláno / předáno (kom	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Ing. T
Odesláno / předáno (způs	poštou	e-mailem	os
Přílohy / počet listů	X		

1) Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem ZL je dále doplnění 2 ks protipožárních revizních dvířek do podh zajištění provádění periodických revizí požárních klapkek v objektu A a dále tech

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 026 - Propojení podzemního pavilonu A a K

Objekt: ZL 12 - Doplnění revizních dvířek do podhledu

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 17.09.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Poiská 375, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 495,92

PSV - Práce a dodávky PSV

12 495,92

763 - Konstrukce suché výstavby

12 495,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ON Náchod - Koridor

Objekt: ZL 12 - Doplnění revizních dvířek do podhledu

Místo: Datum: 17.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 495,92	
D	763		Konstrukce suché výstavby				12 495,92	
16	K	763172393	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kei vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	1 000	334,64	334,64	CS ÚRS 2021 02
16	K	763172395	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kei vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	1 000	606,98	606,98	CS ÚRS 2021 02
17	M	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI/60 600x600 mm	kus	1 000	6 114,30	6 114,30	CS ÚRS 2021 02
18	M	59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI/60 400x400 mm	kus	1 000	5 440,00	5 440,00	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

ZL13

Dopojení stávajícího VZT potrubí

Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“				
Objekt:	Objekt A				
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan			
Odesláno / předáno (kom)	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera			
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:	
		X			17.09.2021
Přílohy / počet listů					

1) Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu nemožnosti napojení VZT potrubí v chobě A s ohledem na skutečné prostorové možnosti je nutné propojit stávající potrubí s novým v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto změnového listu.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	20 266,92 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	20 266,92 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schváili:

za zhotovitele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za objednatele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
Jan Čejchan	Ing. Tomáš Pazdera	Ing. René Hubka		František Mrázek

VZDUCHOTECHNIKA
SPOJOVACÍ LOGISTICKÉ A PROPOJOVACÍ KORIDORY , Ohlasní nemocnice Náchod


Pozice	Zařízení - činnost
20	Zařízení č.1: Instalace nových VZT jednotek
20	Tepelná izolace kačukukova plošná samolepicí tl. 19 mm s AL polepem
23	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek
24	Popis a označení potrubních rozvodů dle funkce a směru proudění vzduchu (pro stávající a nové instalace ve střešních prostorech)
1	Zařízení č.3: Oslavní počítky společně pro jednotlivé zařízení
1	Drobný a pomocný materiál, ztužující rozpěry VZT rozvodů
3	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT
4	Gumové těsnění a těsnící materiály do spoju VZT rozvodů
6	Průsuv těmni
	Provedení dezinfekce stávajícího potrubí
	Celkem část VZT Zl. č. 13 (bez DPH)

3x STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKA
PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ A KONTROLA
SERVIS A VÝMĚNA FILTRŮ
KONTROLA FUNKČNOSTI ARMATUR CHLAZENÍ

STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKA

„C„

REVIZNÍ ZÁSLEPKA
300x300

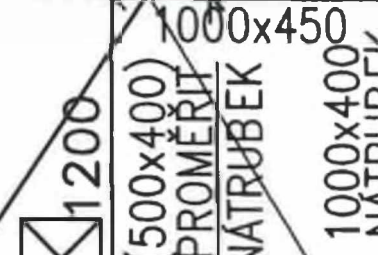


STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKA

„B„

ODSKOK
POTRUBÍ


ROZVOD CHLAZENÍ
POD VZT ROZVODEM
DN65+IZOL.



REVIZNÍ ZÁSLEPKA
300x300

STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKA

„H„



UPAČKA
ERIT
KA
OLACE
IATRUBEK

STÁVAJÍCÍ VENTILÁTOR
PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ A KONTROLA
NOVÉ MANŽETY

NOVÉ FLEXO POTRUBÍ
SERVISNÍ POKLOP V PODHLEDU
(300x300)

250x250

250x250

KLAPKA

ROZVOD CHLAZENÍ
VEDEN POD STROPFM
DN65+IZOL.



„A„

1000x630

FLEXO

1000x315


300

1000x315

1000x315

2000

1000



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	6 085 407,30 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 292 408,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 173 905,22 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 32 762,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 325 171,42 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 173 905,22 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	499 076,64 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	499 077 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	8,20 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	6 085 407,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	6 085 407,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 108 226,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 108 226,47 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	108 226,47 Kč bez DPH	Nevjedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,78 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	6 085 407,30 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		- 0,00 Kč bez DPH
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 108 226,47 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	108 226,47 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,78 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 32 762,84 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	32 762,84 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	6 085 407,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	6 312 137,13 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	6 344 899,97 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	6 344 899,97 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení
