



## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt“ ze dne 18. 2. 2020

Objednatel:

**Správa služeb hlavního města Prahy**

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

**DC ENGINEERING spol. s r.o.**

se sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

zastoupená Ing. Vítem Dobner, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219173

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 čl. 5) odst. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém dokumentu „Ohlášení změn stavby 3“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

### II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Ohlášení změn stavby 4) a přílohy č. 2 (Rozpočet) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Ohlášení změn stavby 4). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla včetně dodatků číslo 1, 2, 3 a 4 (36 183 856,57 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (414 734,06 Kč bez DPH) a činí 36 598 590,63 Kč bez DPH.
- 3) Časový harmonogram stavby se mění podle přílohy číslo 3 – Časový harmonogram. Lhůta uvedená v ustanovení čl. III odst. 1 smlouvy se mění z 360 dnů na 750 dnů. Ke změně lhůty dochází v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nezpůsobily a

nemohly předvídat, tj. vzhledem k rozšíření rozsahu stavby o dodatečně požadované práce a opakovaná přerušení stavebních prací.

III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne .....21.9...... 2021

V Praze dne .....9.9...... 2021

Přílohy :

1. Ohlášení změn stavby 4
2. Rozpočet
3. Harmonogram

## OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 4

„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt“

ZBV 4

(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace  
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: SoD ze dne 18. 02. 2020

Termín plnění	: 27. 09. 2021
Cena díla dle základní SOD	: 32 534 517,80 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 34 410 702,18 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV2	: 35 827 852,56 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV3	: 36 183 856,57 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV4	: 414 734,06 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně ZBV1, ZBV2, ZBV3 a ZBV4	: 36 598 590,63 Kč bez DPH

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ: 02414864

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení: 7

**Popis předmětu změny:**

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na stavbě **Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt**. Práce jsou prováděny podle projektové dokumentace stavby zpracované společností AND spol. s r.o. a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zjištění:

1. Zvýšený objem vybouraných asfaltů ZL5 – 219 547,55 Kč
2. Zimní opatření – přísada do betonové směsi ZL6 – 27 755,00 Kč
3. Navýšení spádu střechy ZL7 – 33 460,37 Kč
4. Parotěsná izolace střech – vyšší výměra ZL8 – 28 074,64 Kč

5. Nový statický výpočet - posílení výztuže ZL9 – 13 268,50 Kč
6. Přerušení provádění díla ZL10 – 92 628,00 Kč
7. Celkem 414 734,06 Kč

ZL5 – V průběhu bourání původních asfaltových ploch, byl zjištěn značný rozptyl tloušťky vrstev bouraných asfaltů a to od 260 po 610 mm. Mocnost vrstev byla fotograficky zadokumentována a zaznamenána do situace bouraných ploch. Fotografie a situace je součástí tohoto ZBV. Předmětem ZL 5 je doúčtování nákladů spojených s vybouráním a likvidací skutečně zjištěného množství bouraného asfaltu.

ZL6 – Vzhledem k posunu provádění základových konstrukcí do období, kdy jsou výrobci betonových směsí povinni používat zimní přísady, došlo ke zdražení betonu pro základové konstrukce. Zhotovitel neměl příplatek za zimní přísady ve své nabídce, neboť základové konstrukce měli být realizovány v jarních měsících. K posunu realizace došlo vlivem dodatečné požadovaných prací viz předchozí ZBV 1 - 3. Zhotovitel předložil dodací listy s uvedením příplatku za zimní opatření jejichž soupis je uveden v seznamu dodacích listů, který je součástí tohoto ZBV.

ZL7 – Z důvodu zlepšení odtokových poměrů střešního pláště, byl na návrh zhotovitele navýšen spád střechy z 1,8 na 3% doplněním odpovídajících polystyrenových klínů.

ZL8 – Ve výkazu výměr byla zjištěna nižší výměra asfaltové izolace střech než je skutečná potřeba pro bezvadnou realizaci díla.

ZL9 – V průběhu realizace zjistil zhotovitel potřebu upravit statické řešení stavby. Nový statický přepoččet upravil příztužení věnců ve střední zdi a průvlastu P5, doplnění třmíneků na jižní stěně a navrhl náhradu některých keramických překladů za ocelové válcované nosníky.

ZL10 – provádění díla, bylo pozastaveno ze strany zhotovitele a následně TDS do doby přepracování statického řešení stavby. ZL 10 reflektuje náklady na výrobní zařízení umístěné na staveništi po dobu 36 dní.

**Žádost:**

**Popis problému:**

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddelitelné práce potřebné pro provedení tohoto díla.

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

**se zhotovitel domáhá:**


změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV4.

Zhotovitel zároveň žádá o prodloužení termínu provádění díla dle aktualizovaného harmonogramu do 4.4.2022. Požadavek na prodloužení termínu zdůvodňuje tím, že došlo opakovaně k úplnému zastavení provádění prací a to z důvodu nezávislých na vůli zhotovitele. Zároveň se termín plnění posouvá nejen o dny vlastního přerušení, ale i o prodlení, které vzniklo v důsledku vyčerpání výrobních kapacit dodavatelů technologických celků nutných k realizaci díla, se kterými měl zhotovitel dohodnuty konkrétní termíny, které nebylo možné z důvodu opakovaného posunutí termínu plnění dodržet.

**Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele**

**Datum a potvrzení**

**Objednatel:**

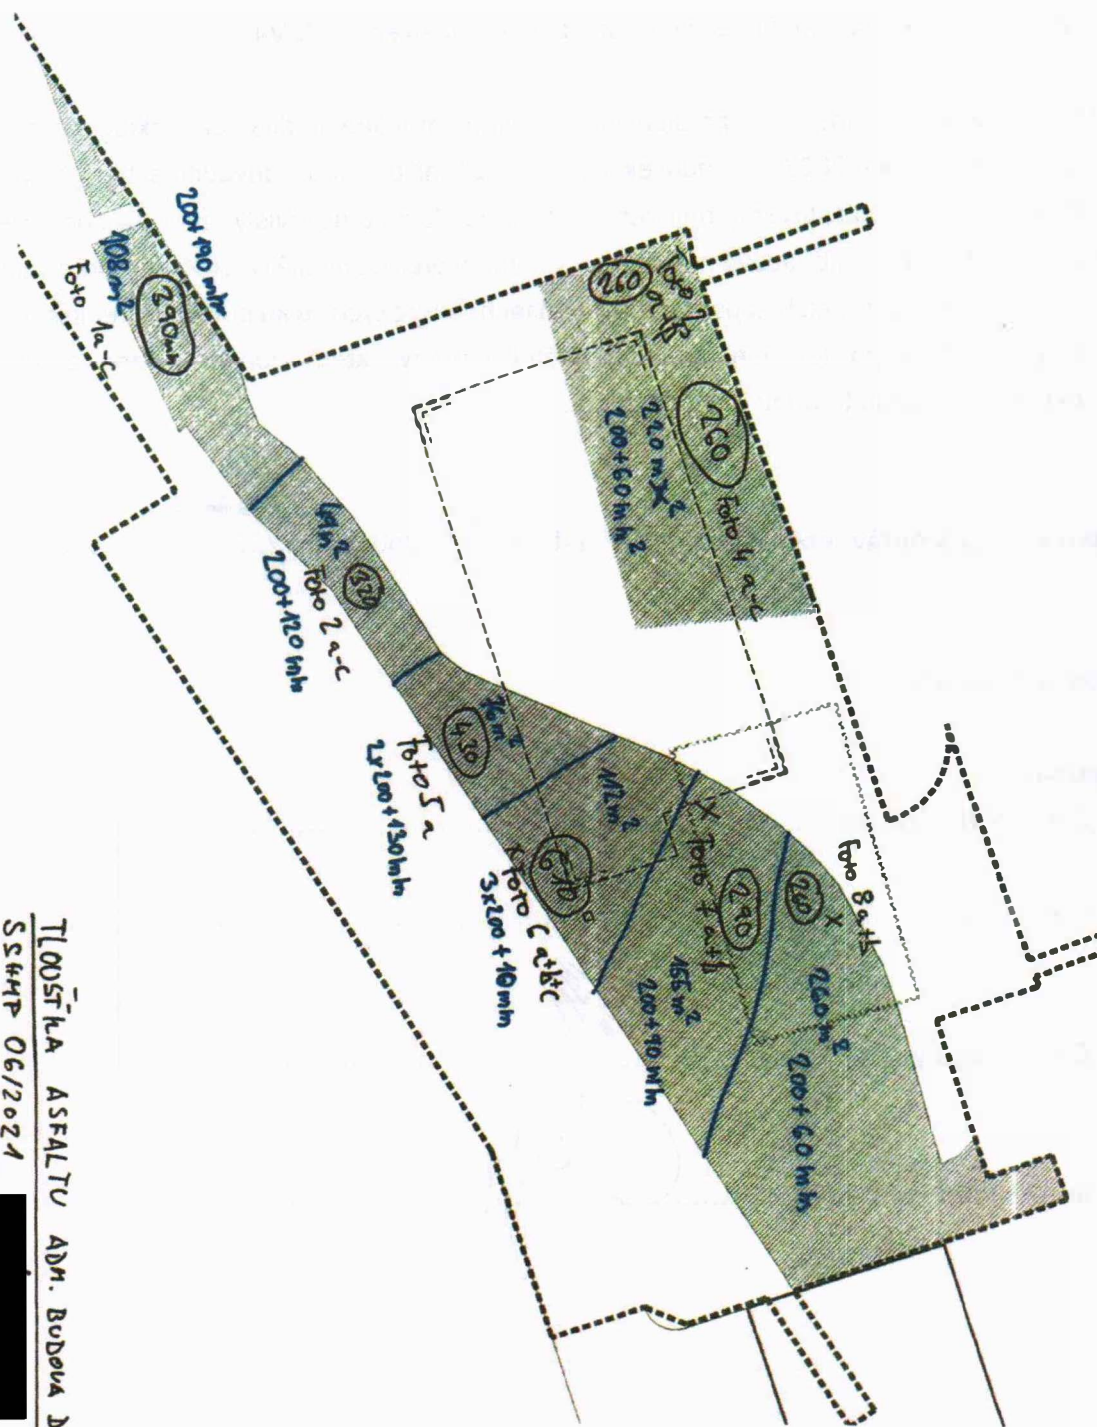

TĽOŠŤKA ASFALTV ADN. BUDOVA DOBEČ  
SS44P 06/2024



Plodna 1a-c

Priloha č.1



15.04.2021 12:23



Plocha 2a-c

Priloha č.1



11.03.2021 12:59



Ploda 00-e


Ploda 00-e.1





Plocha 4a-C


Plocha e.1

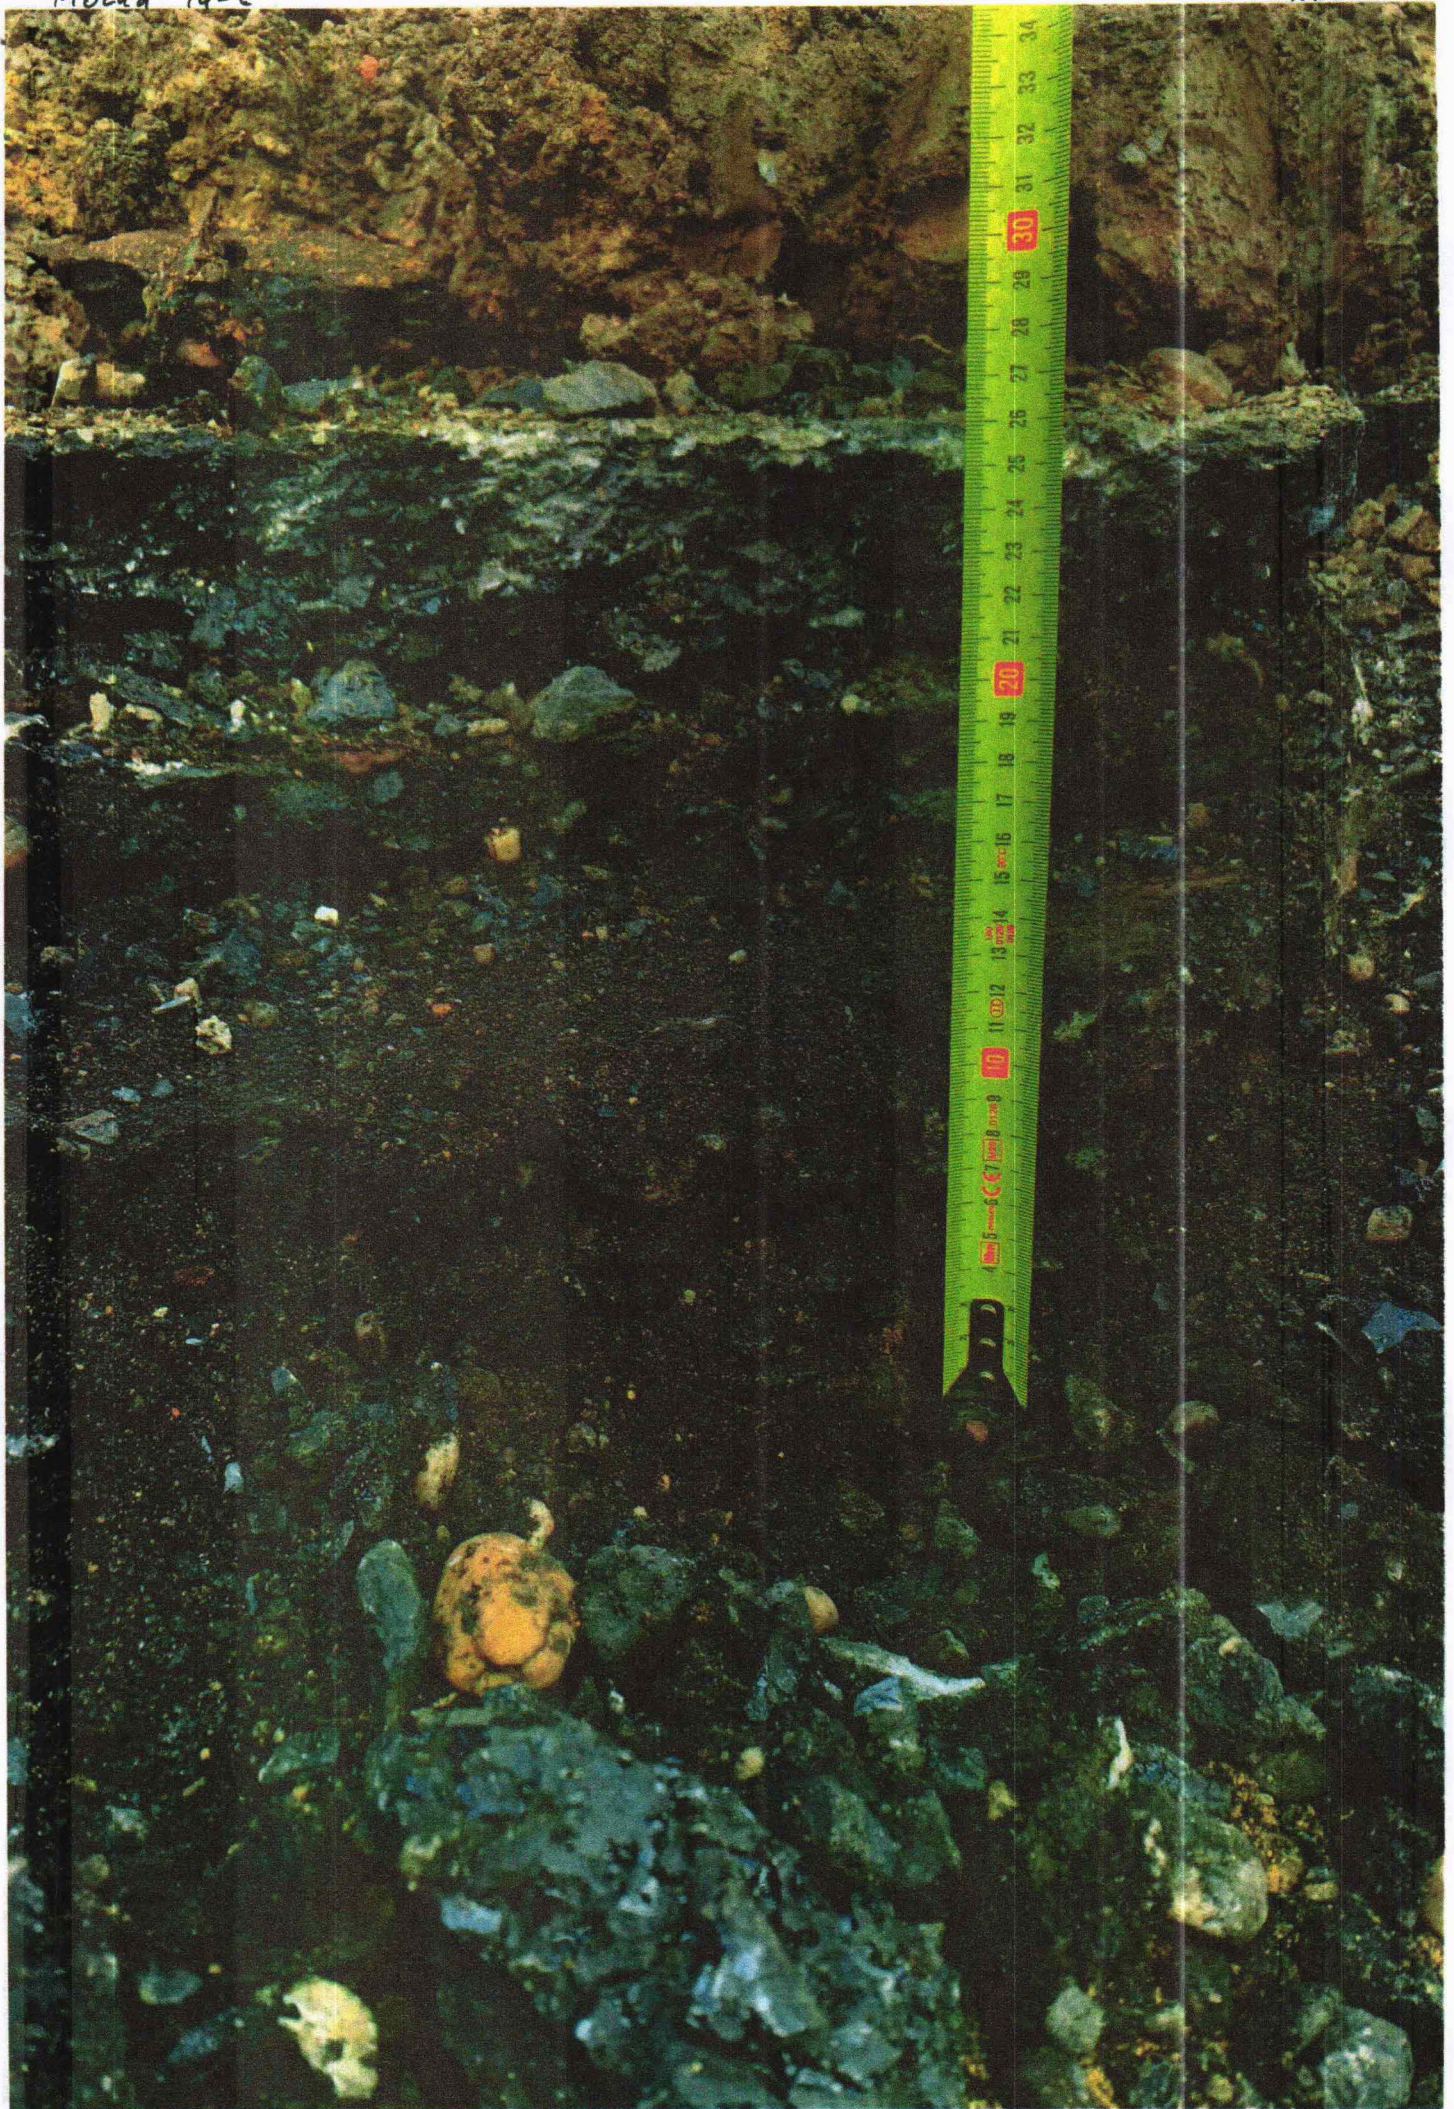



Plocha 5a

Priloha č. 1

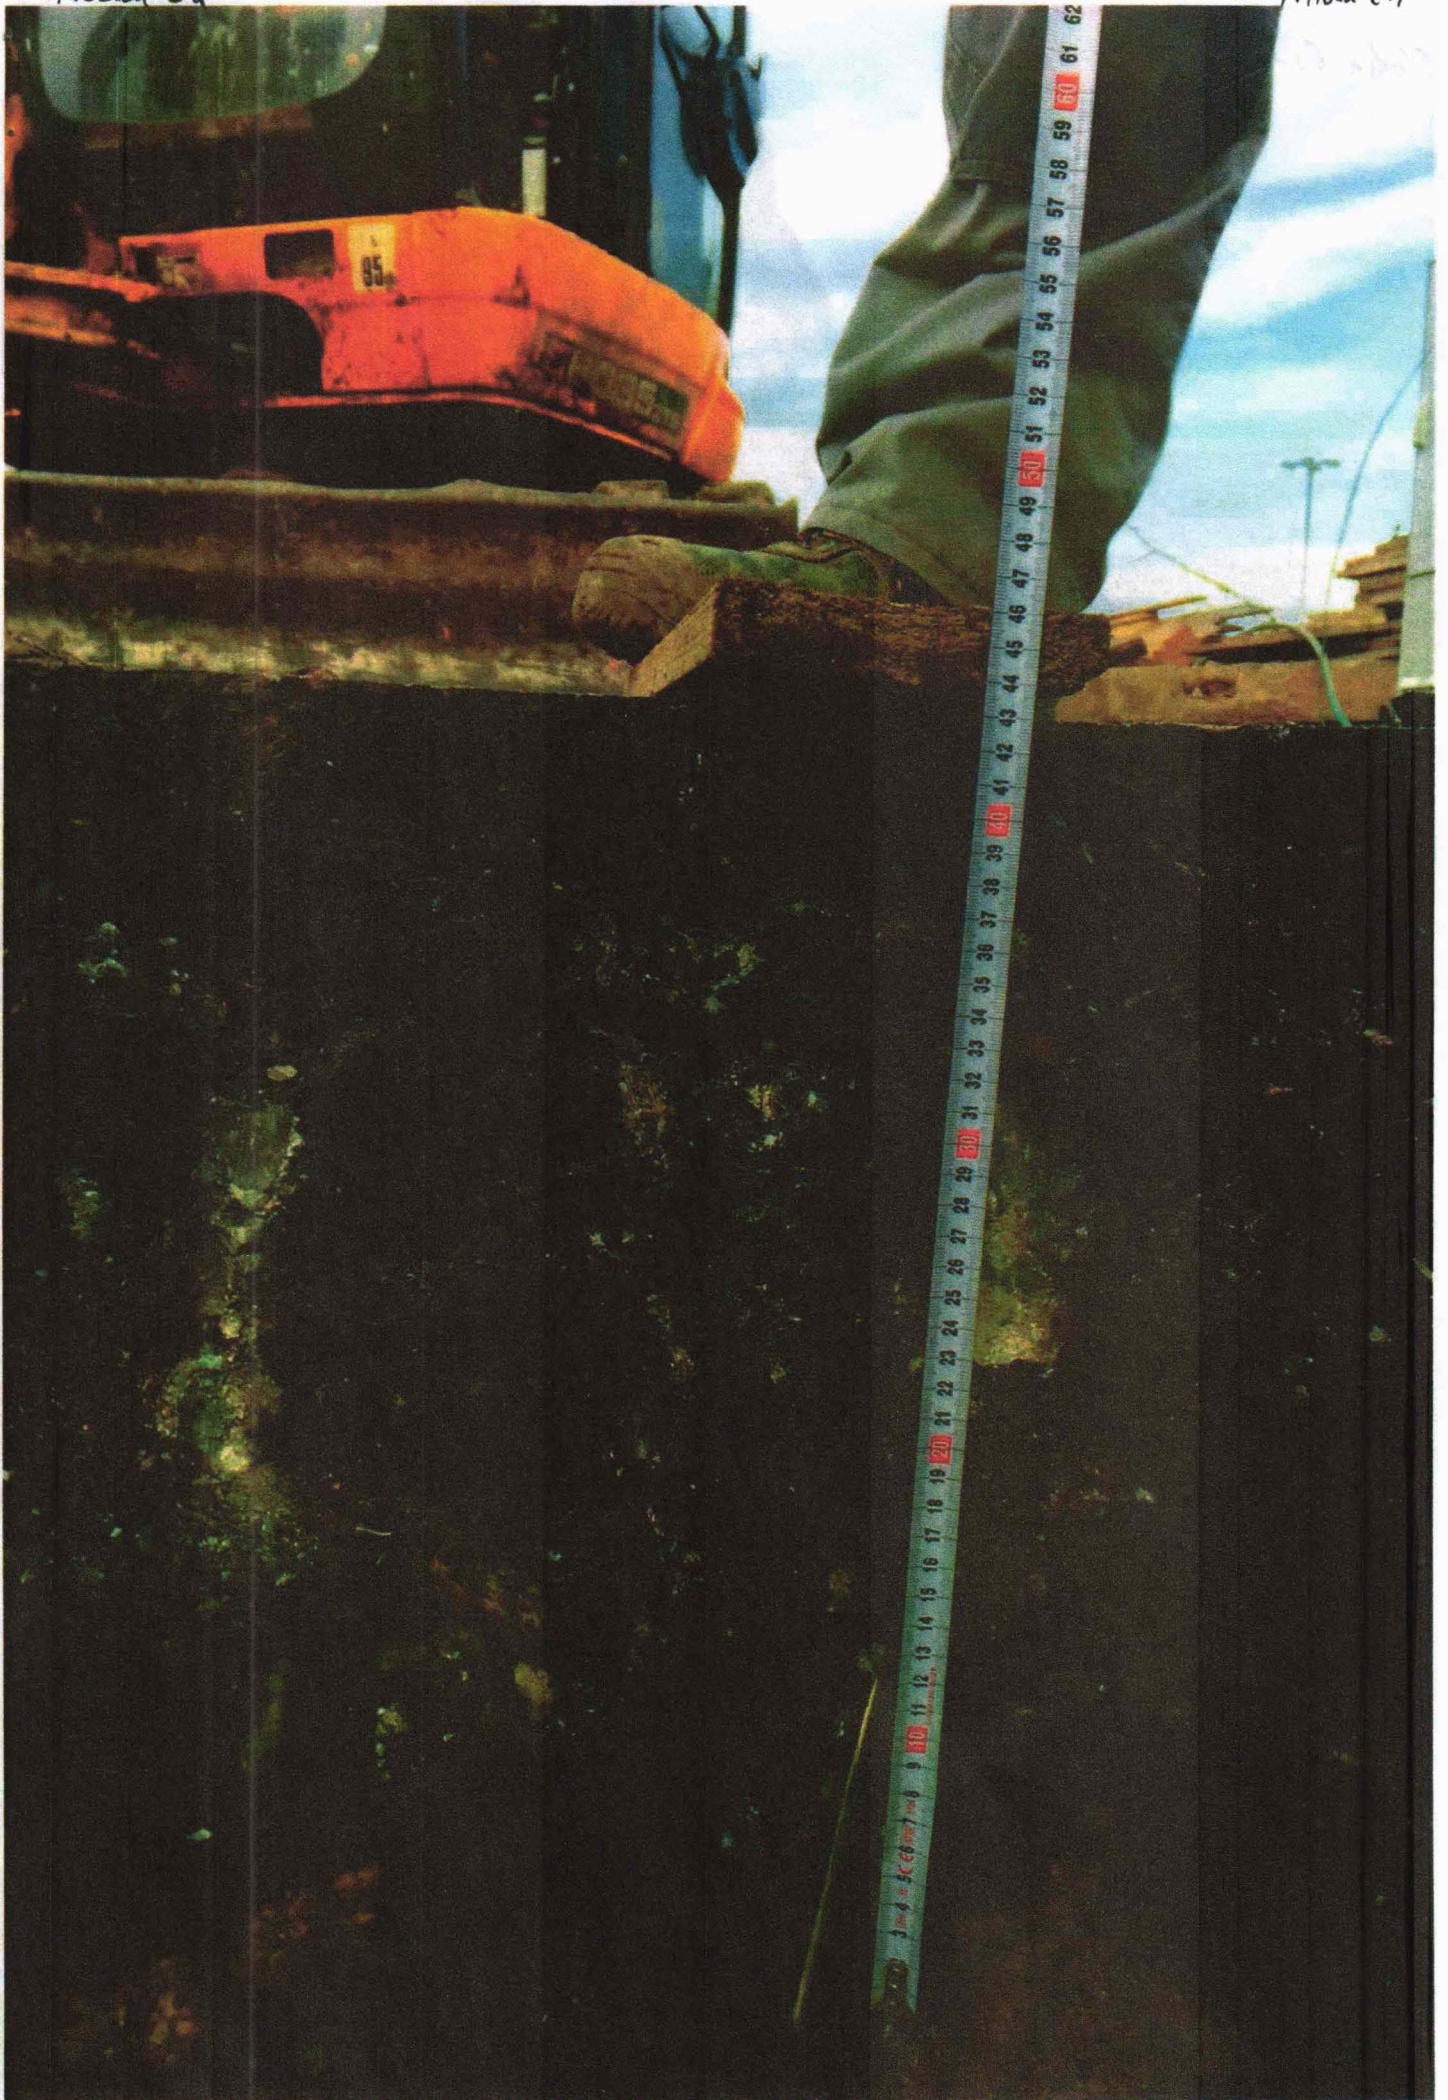



Plodna ba-e

Priloga 2:1





Placka 79-6


Placka 2.1





Plotka 86

Plotka č.1

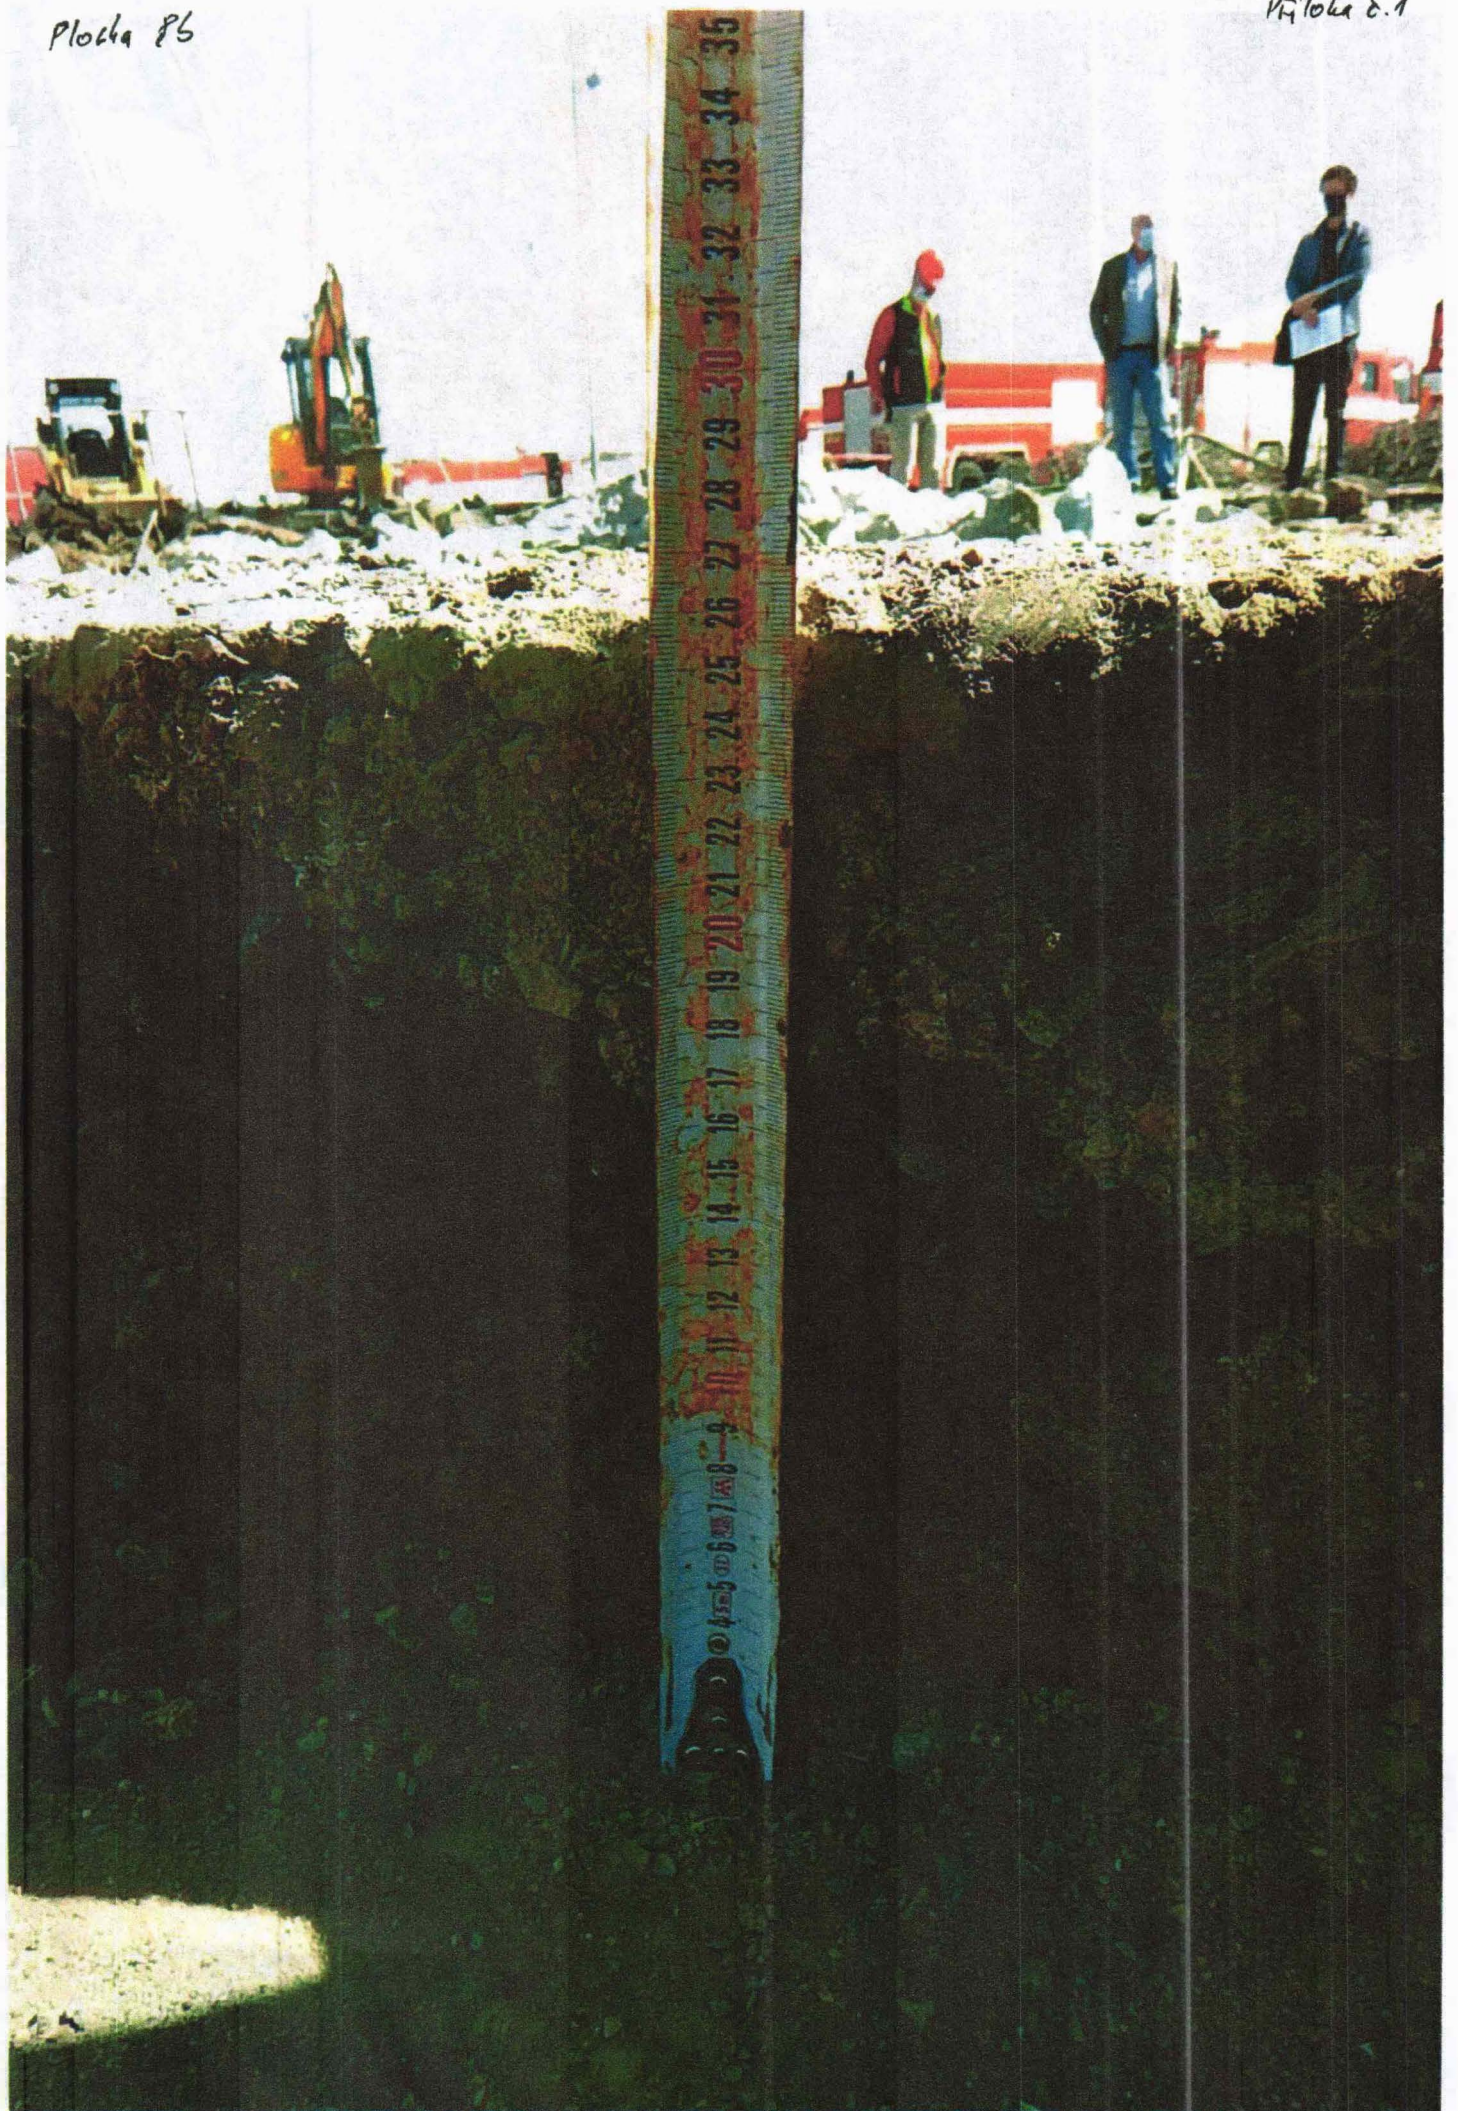



Akce: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha - Dubeč, IV. etapa administrativní objekt

Zimní opatření - příměs do betonu

Dodavatel: CEMEX Malešice s.r.o.

Číslo dodacího listu	množství	
087258	8	m3
086800	1,5	m3
086863	1,5	m3
086847	3,5	m3
086837	8	m3
086838	8	m3
089548	4,75	m3
089543	8	m3
089422	8	m3
087610	8	m3
087257	8	m3
087246	8	m3
086856	1,5	m3
086840	8	m3
086296	8	m3
086106	8	m3
085888	6	m3
085708	6	m3
089436	2,5	m3
089419	8	m3
089418	8	m3
089431	6,5	m3
089417	8	m3
086305	5	m3
087522	1,5	m3
086299	8	m3
085885	7	m3
085894	3,5	m3
085713	3	m3
087599	8	m3
089018	0,5	m3
087614	2	m3
087597	8	m3
087995	1,25	m3
086795	1,5	m3
086772	1,5	m3
087238	4	m3
089166	1,5	m3
087260	3	m3
089521	1,5	m3
086663	1,5	m3
086686	1,5	m3
086673	1,5	m3
086784	1,5	m3
4238 -ZAPA beton	1	m3
<b>Celkem</b>	<b>213,5</b>	<b>m3</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Architekto...	EČO	
Název části	Bourání asfaltu	Místo	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	DC ENGINEERING spol. s r.o.	02414864	CZ02414864
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
ZL 5	13.05.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	219 547,55		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-8)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	219 547,55				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 219 547,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	219 547,55	46 104,99

Cena s DPH 265 652,54

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Bourání asfaltu

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	219 547,55	219 547,55	0,000	173,608
1	Zemní práce	0,00	129 403,31	129 403,31	0,000	173,608
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	28 056,71	28 056,71	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	90 144,24	90 144,24	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>219 547,55</b>	<b>219 547,55</b>	<b>0,000</b>	<b>173,608</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt  
 Objekt: SO 02.1 Architekto...  
 Část: Bourání asfaltu

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy  
 Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>219 547,55</b>	<b>219 547,55</b>		<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>129 403,31</b>	<b>129 403,31</b>		<b>0,000</b>
N13	Z21	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojní pl přes 50 do 200 m2	m2	188,000	40,30	0,00	7 578,40	7 578,40	0,000	0,000
			76		76,000						
			112		112,000						
			Součet		188,000						
N14	Z21	113107182	Odstánění podkladu živičného tl 100 mm strojní pl přes 50 do 200 m2	m2	835,000	57,80	0,00	38 578,30	38 578,00	0,000	0,000
			220		220,000						
			155		155,000						
			200		260,000						
			Součet		835,000						
N15	Z21	113107183	Odstánění podkladu živičného tl 150 mm strojní pl přes 50 do 200 m2	m2	49,000	95,80	0,00	4 694,20	4 694,20	0,000	0,000
			49		49,000						
			Součet		49,000						
2	R	113107184tt	Odstánění podkladu živičného tl 200 mm strojní pl přes 50 do 200 m2	m2	300,000	175,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,000	0,000
			Původní výměra								
			"zpevněné plochy - asfaltové" -880		-980,000						
			Skutečná výměra								
			108		108,000						
			49		49,000						
			220		220,000						
			2*76		152,000						
			3*112		336,000						
			155		155,000						
			280		280,000						
			Součet		300,000						



9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>	<b>28 056,71</b>	<b>28 056,71</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
N16	R	99700800900	Drcení stavebního odpadu z demolic železce	t	181,011	153,00	0,00	28 056,71	28 056,71	0,000	0,000
			Původní výměra "zastat" -441		-441,000						
			Nová výměra: (0,39*108+0,32*49+0,26*220+0,43*78+0,81*112+0,29*1,55+0,28*260)		639,111						
			*2,25		-17,100						
			*odvezeno na skládku-17,1		181,011						
			Součet								
997		<b>Přesun sutě</b>					<b>0,00</b>	<b>90 144,24</b>	<b>90 144,24</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
34	R	997013501	Dřívoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	362,022	220,00	0,00	79 844,84	79 844,84	0,000	0,000
			Na mezískládku k drcení:								
			181 011		181,011						
			Nadrcený materiál k zabudování								
			181 011		181,011						
			Součet		362,022						
39	R	997221561	Vodorovné doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	17,100	40,00	0,00	684,00	684,00	0,000	0,000
40	R	997221569	Připletak ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	153,900	16,00	0,00	2 482,40	2 482,40	0,000	0,000
			17,1*9 "Připčetané koeficientem množství"		153,900						
			Součet		153,900						
44	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu ostatního bez drcení kód odpadu 170 302	t	17,100	430,00	0,00	7 353,00	7 353,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>219 547,55</b>	<b>219 547,55</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Architekto...	EČO	
Název části	Zimní opatření betonová směs	Místo	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	DC ENGINEERING spol. s r.o.	02414864	CZ02414864
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
ZL 6	13.05.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	27 755,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	27 755,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 27 755,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	27 755,00	5 828,55

Cena s DPH 33 583,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Zimní opatření betonová směs

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	27 755,00	27 755,00	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	27 755,00	27 755,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	27 755,00	27 755,00	0,000	0,000



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Zimní opatření betonová směs

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Množství dle ZL 1	Rozdíl v množství	Cena jednotková	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle ZL 1	Rozdíl v ceně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b> <b>2 Zakládání</b>											<b>27 755,000</b>
1	R	2733R001	Zimní opatření betonu	m3	0,000	213,50	213,50	130,00	0,00	27 755,000	27 755,000
<b>Celkem</b>											



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR ZBV4

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Bourání asfaltu

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r. o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Množství dle ZL 5	Rozdíl v množství	Cena jednotková	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle ZL 1	Rozdíl v ceně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											<b>219 547,55</b>
<b>1 Zemní práce</b>											<b>129 403,31</b>
N13	Z21	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	188,00	188,00	40,30	0,00	7 578,400	7 578,40
			76		78 000						
			112		112 000						
			Součet		188 000						
N14	Z21	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	635,00	635,00	57,60	0,00	36 576,000	36 576,00
			220		220 000						
			155		155 000						
			260		260 000						
			Součet		635 000						
N15	Z21	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	49,000	49,00	95,80	0,00	4 694,200	4 694,20
			49		49 000						
			Součet		49 000						
Z	R	113107184tt	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	980,000	1 280,000	300,00	175,00	171 500,00	224 000,000	52 500,00
			Původní výměra								
			"zpevněné plochy - asfaltové" -980		-980 000						
			Skutečná výměra								
			108		108 000						
			49		49 000						
			220		220 000						
			2*78		152 000						
			3*112		336 000						
			155		155 000						

		260		290,000							
		Součet		300,000							
	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
N16	R	99700800R00	Drcení stavebního odpadu z demolic živec	t	441,000	822,011	181,01	155,00	68,356,00	96,411,705	28,058,71
			Původní výměra "asfalt"-441		-441,000						
			Nová výměra (0,39*108+0,32*49+0,26*22)+0,43*76+0,61*112+0,29*1,55+0,26*260								
			*2,25		639,111						
			*odvezeno na skládku*-17,1		-17,100						
			Součet		181,011						
		997	<b>Přesun sutě</b>								<b>90 144,24</b>
34	R	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	362,022	362,02	220,00	0,00	79,644,840	79,644,84
			Na meziskládku k drcení								
			181,011		181,011						
			Nadržený materiál k zabudování.								
			181,011		181,011						
			Součet		362,022						
39	R	997221561	Vodoravná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	17,100	17,10	40,00	0,00	684,000	684,00
40	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodoravné dopravy sutě z kusových materiálů	t	0,000	153,900	153,90	18,00	0,00	2,482,400	2,482,40
			17,1*9 *Přepočtené koeficientem množství		153,900						
			Součet		153,900						
44	R	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dlehu kód odpadu 170 302	t	0,000	17,100	17,10	430,00	0,00	7,353,000	7,353,00
			<b>Celkem</b>								



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Architekto...	EČO	
Název části	Navýšení spádu střechy	Místo	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		02414864	CZ02414864
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
ZL 7	21.06.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	33 288,99	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	171,38	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		33 460,37	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 33 460,37**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	33 460,37	7 026,68

**Cena s DPH 40 487,05**
**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

**Objekt:** SO 02.1 Architekto...

**Část:** Navýšení spádu střechy

**Objednatel:** Správa služeb hlavního města Prahy

**Zhotovitel:** DC ENGINEERING spol. s r.o

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 21. 6. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	33 288,99	171,38	33 460,37	0,000	0,000
712	Povlakové krytiny	0,00	-1 380,43	-1 380,43	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	33 288,99	1 551,81	34 840,80	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>33 288,99</b>	<b>171,38</b>	<b>33 460,37</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Navýšení spádu střechy

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>33 288,99</b>	<b>171,38</b>	<b>33 460,37</b>		<b>0,000</b>	
<b>712 Paviakové krytiny</b>							<b>0,00</b>	<b>-1 380,43</b>	<b>-1 380,43</b>			<b>0,000</b>
133	R	71299OV09	Hřtaně chrtilé s PVC manžetou 50x100 mm dl. 600 mm - dodávka a montáž	kus	-1,000	1 341,78	0,00	-1 341,78	-1 341,78	0,000	0,000	
134	R	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny paviakové v objektech v do 12 m	%	-13,417	2,88	0,00	-38,65	-38,65	0,000	0,000	
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>33 288,99</b>	<b>1 551,81</b>	<b>34 840,80</b>		<b>0,000</b>	
183	283	28378143	Isln izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	8,304	4 008,79	33 288,99	0,00	33 288,99	0,000	0,000	
			30,5*5,95*(0,03-0,018)*5,95*0,5*0,5			3,239						
			27,75*7,8*(0,03-0,018)*7,8*0,5*0,5			5,065						
			Součet			8,304						
186	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	620,723	2,50	0,00	1 551,81	1 551,81	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>33 288,99</b>	<b>171,38</b>	<b>33 460,37</b>		<b>0,000</b>	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR ZBV4

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Navýšení spádu střechy

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracoval:

Datum: 21.6.2021

Místo:

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Množství dle ZL 1	Rozdíl v množství	Cena jednotková	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle ZL 1	Rozdíl v ceně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>33 288,99</b>	<b>171,38</b>	<b>33 460,37</b>	<b>0,00</b>
<b>712 Povlakové krytiny</b>								<b>0,00</b>	<b>-1 380,43</b>	<b>-1 380,43</b>	<b>0,00</b>
133	R	71299OV09	Hranaly chříč s PVC manžetou 50x100 mm dl. 600 mm - dodávka a montáž	kus	8 000	7 00	-1,00	1 341,78	10 734,24	9 392,46	-1 341,78
134	R	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1 758 990	1 743,57	-13,42	2,98	5 090,13	5 021,49	-68,64
<b>713 Izolace tepelné</b>								<b>33 288,99</b>	<b>1 551,81</b>	<b>34 840,80</b>	<b>0,00</b>
163	283	28378143	křín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	61,389	69,69	8,30	4 008,79	246 035,31	279 384,90	33 288,99
166	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	11 513 350	12 134,07	620,72	2,50	28 783,38	30 335,18	1 551,81
<b>Celkem</b>											<b>33 460,37</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Architekto...	EČO	
Název části	Parotěsná izolace střech	Místo	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		02414864	CZ02414864
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
ZL8	21.06.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	16 103,12	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11 971,52	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 074,64	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 28 074,64**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	28 074,64	5 895,67

**Cena s DPH 33 970,31**
**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

**Objekt:** SO 02.1 Architekto...

**Část:** Parotěsná izolace střech

**Objednatel:** Správa služeb hlavního města Prahy

**Zhotovitel:** DC ENGINEERING spol. s r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 21. 6. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	16 103,12	11 971,52	28 074,64	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 103,12	11 971,52	28 074,64	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>16 103,12</b>	<b>11 971,52</b>	<b>28 074,64</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Parotěsná izolace střeš

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>16 103,12</b>	<b>11 971,52</b>	<b>28 074,64</b>		<b>0,000</b>
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>16 103,12</b>	<b>11 971,52</b>	<b>28 074,64</b>		<b>0,000</b>
124	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	84,750	19,00	0,00	1 510,25	1 510,25	0,000	0,000
			Původní výměra								
			"střecha střechy" - 1*12,4+5,55+31,3+14,0+28,55+8,2+27,8)*0,75		-89,100						
			"1NP" - ((31,3+14,8)*2)*0,5)		-46,100						
			Skutečná výměra								
			"střecha střechy" ((30,5+5,95)*2+(7,8+27,75)*2)*1		144,000						
			"1NP" (31,3+14,8)*2*0,75+17,2*0,25+10*0,25		75,950						
			Součet		84,750						
123	111	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,030	50 949,69	1 528,49	0,00	1 528,49	0,000	0,000
			84 75*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,030						
			Součet		0,030						
128	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	84,750	103,16	0,00	8 742,81	8 742,81	0,000	0,000
			84,75		84,750						
129	628	62853004R1	pás hydroizolační asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	101,700	143,31	14 574,63	0,00	14 574,63	0,000	0,000
			84 75*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		101,700						
			Součet		101,700						
130	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	385,347	4,20	0,00	1 518,46	1 518,46	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>16 103,12</b>	<b>11 971,52</b>	<b>28 074,64</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR ZBV4

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Parotěsná izolace střech

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracoval:

Datum: 21.6.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Množství dle ZL 1	Rozdíl v množství	Cena jednotková	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle ZL 1	Rozdíl v ceně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**28 074,64**

124	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	151,170	235,92	84,75	19,00	2 872,23	4 482,480	1 610,25
123	111	11183150	lak penetrační asfaltový	l	0,255	0,29	0,03	50 949,89	12 992,17	14 520,652	1 528,49
128	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	168,990	253,74	84,75	103,16	17 433,01	26 175,818	8 742,81
129	628	62853004R1	pás hydroizolační asfaltový modifikovaný SBS II 4.0mm	m2	202,788	304,49	101,70	143,31	29 061,55	43 636,175	14 574,63
130	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2 875,840	3 261,19	385,35	4,20	12 078,53	13 698,985	1 618,46

**Celkem**

**28 074,64**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Architekto...	EČO	
Název části	Nový statický výpočet	Místo	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		02414864	CZ02414864
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
ZL - 9	22.06.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	1 126,96	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 796,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	187,75	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	157,01	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	5 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 268,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	5 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


**D Celkem bez DPH 13 268,50**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 268,50	2 786,39

**Cena s DPH 16 054,89**
**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Nový statický výpočet

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 126,96	6 796,78	7 923,74	0,044	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 088,54	371,31	1 459,85	0,044	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	6 227,01	6 227,01	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	38,42	91,96	130,38	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	106,50	106,50	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	187,75	157,01	344,76	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	132,36	0,00	132,36	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	55,39	157,01	212,40	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
VRN4	Inženýrská činnost	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>1 314,71</b>	<b>11 953,79</b>	<b>13 268,50</b>	<b>0,044</b>	<b>0,000</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Nový statický výpočet

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 126,96</b>	<b>6 796,78</b>	<b>7 923,74</b>		<b>0,044</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>1 088,54</b>	<b>371,31</b>	<b>1 459,85</b>		<b>0,044</b>
011	317941123		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I IE U, UE nebo L do č 22	t	0,043	8 650,00	0,54	371,31	371,95	0,017	0,001
			14 3*1,5*2/1000		0,043						
130	13010718		ocel profilová IPN 140 jednot 11 375	t	0,043	25 300,00	1 087,90	0,00	1 087,90	1,000	0,043
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>6 227,01</b>	<b>6 227,01</b>		<b>0,000</b>
76	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců "P5" 2*0 5*3,5	m2	3,500	280,21	0,00	980,74	980,74	0,000	0,000
			Součet		3,500						
78	R	417361821	Výztuž ztužujících oáseu a věnců betonátskou ocelí 10 505	t	0,142	38 945,57	0,00	5 246,27	5 246,27	0,000	0,000
			Průvlak P5								
			4 2*1 58*1,05/1000		0,049						
			(34-22)*1,5*0 4*1,05/1000		0,008						
			Přizluzení věncu ve střední zdi								
			0,89*20*1,05/1000		0,019						
			(20/0 15-20/0,25+6)*0 4*1,1*1,05/1000		0,027						
			Doplnění třmínku jižní stěna (podélhá výztuž se neúčtuje)								
			(31,5/0 15-31,5/0 25)*0 4*1,1*1,05/1000		0,039						
			Součet		0,142						
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>38,42</b>	<b>91,96</b>	<b>130,38</b>		<b>0,000</b>
011	615142002		Potažení vnitřních nosníků sklováknitým pletvem 1,25*0,25*3	m2	0,938	139,00	38,42	91,96	130,38	0,000	0,000

		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
121	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,142	750,00	0,00	106,50	106,50	0,000	0,000
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>187,75</b>	<b>157,01</b>	<b>344,76</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>132,38</b>	<b>0,00</b>	<b>132,38</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
152	283	283763BR	deska z polystyrénu XPS tl 50mm	m2	-3,413	378,74	-1 285,81	0,00	-1 285,81	0,000	0,000
			"Odpočet úprava detailu roletový box ŽB překlád" -0,25*(6,45+7,2)		-3,413						
			Součet		-3,413						
153	283	28378527R	deska izolační PIR 80mm	m2	3,413	415,52	1 418,17	0,00	1 418,17	0,000	0,000
		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>55,39</b>	<b>157,01</b>	<b>212,40</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
783		783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozátadující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,800	118,00	55,39	157,01	212,40	0,000	0,000
			1,5*(0,14*2+0,08*4)*2		1,800						
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
000		042002000	Posudky		1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
			"Expertní posudek statika" 1		1,000						
			Součet		1,000						
		<b>Celkem</b>					<b>1 314,71</b>	<b>11 953,79</b>	<b>13 268,50</b>	<b>0,044</b>	<b>0,044</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Nový statický výpočet

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2021

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Množství dle ZL 1	Rozdíl v množství	Cena jednotková	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle ZL 1	Rozdíl v ceně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											<b>7 923,74</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>											<b>1 459,85</b>
N16	011	317941123	Osazování ocelových vřícovaných nosníků na zdivu I. IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,000	0,043	0,043	8 650,00	0,00	371,950	371,95
N17	130	1301071B	ocel profilové IPN 140, jakost 11 375	t	0,000	0,043	0,043	25 300,00	0,00	1 087,900	1 087,90
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>											<b>8 227,01</b>
76	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	135,685	139,19	3,500	280,21	38 020,29	39 001,029	980,74
78	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,073	2,22	0,142	36 945,57	76 588,17	81 834,438	5 246,27
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											<b>38,42 91,96 130,38 130,38</b>
N18	011	815142002	Potažení vnitřních nosníků sivovákněným pleťvem	m2	0,000	0,94	0,938	139,00	0,00	130,382	130,38
<b>998 Přesun hmot</b>											<b>0,00 106,50 106,50 106,50</b>
121	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1 820,678	1 820,82	0,142	750,00	1 365 508,50	1 365 615,000	106,50
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>											<b>344,76</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>											<b>132,36</b>
152	283	2837638R	deska z polystyrénu XPS II 60mm	m2	15,750	12,34	-3,413	376,74	5 933,88	4 647,841	-1 285,81
153	283	2837852R	deska izolční PIR 80mm	m2	130,725	134,14	3,413	41552	54 318,85	55 737,022	1 418,17
<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>											<b>212,40</b>
N19	783	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zamešnických konstrukcí	m2	0,000	1,80	1,800	118,00	0,00	212,400	212,40

**VRN**      **Vedlejší rozpočtové náklady**      **5 000,00**

**VRN4**      **Inženýrská činnost**      **5 000,00**

N20	000	042002000	Posudky	0,000	1,00	1,000	5 000,00	0,00	5 000,000	5 000,00
-----	-----	-----------	---------	-------	------	-------	----------	------	-----------	----------

**Celkem**      **13 268,50**



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Architekto...	EČO	
Název části	Přeušení provedení díla	Misto	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	DC ENGINEERING spol. s r.o.	02414864	CZ02414864
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
ZL 10	10.07.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 92 628,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 92 628,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 92 628,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	92 628,00	19 451,88

Cena s DPH 112 079,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Přerušení provádění díla

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	92 628,00	92 628,00	0,000	0,000
VRN9	Ostatní náklady	0,00	92 628,00	92 628,00	0,000	0,000
96X	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	92 628,00	92 628,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>92 628,00</b>	<b>92 628,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Přerušení provádění díla

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				0,00	92 628,00	92 628,00		0,000
		VRN9	<b>Ostatní náklady</b>				0,00	92 628,00	92 628,00		0,000
		96X	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				0,00	92 628,00	92 628,00		0,000
1	R	10001 R00	Náklady na přerušení stavby	den	36 000	2 573 00	0,00	92 628,00	92 628,00	0,000	0,000
			*Pronájem stavebních buněk - 120 Kč/den - 4x = 480*								
			*Pronájem stavebního buňk základ - 60Kč/den - 1x = 60 *								
			*pronájem mobilní toalety - 85 Kč/den - 1x = 85*								
			*Pronájem vázového jeřábu 50m, 2.5t - 1100 Kč/den - 1x = 1100*								
			*kontrola staveniště denní - 2h/200 Kč vč. dopravy = 400*								
			*pronájem oplocení 130m/3 Kč + brána 38 Kč = 428*								
			*Celkový denní náklad = 2573 Kč*								
			*Přerušení stavby z důvodu starověké kvádce lehu k 3.7.2020* 36		36 000						
			Součet		36 000						
			<b>Celkem</b>				0,00	92 628,00	92 628,00		0,000



### ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR ZBV4

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: SO 02.1 Architekto...

Část: Přerušení provádění díla

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.



Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Množství dle ZL 10	Rozdíl v množství	Cena jednotková	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle ZL 1	Rozdíl v ceně
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>								<b>92 628,000</b>
		<b>VRN9</b>	<b>Ostatní náklady</b>								<b>92 628,000</b>
		<b>96X</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>								<b>92 628,000</b>
1	R	10001R00	Náklady na přerušení stavby	den	0,000	36,00	36,00	2 573,00	0,00	92 628,000	92 628,000



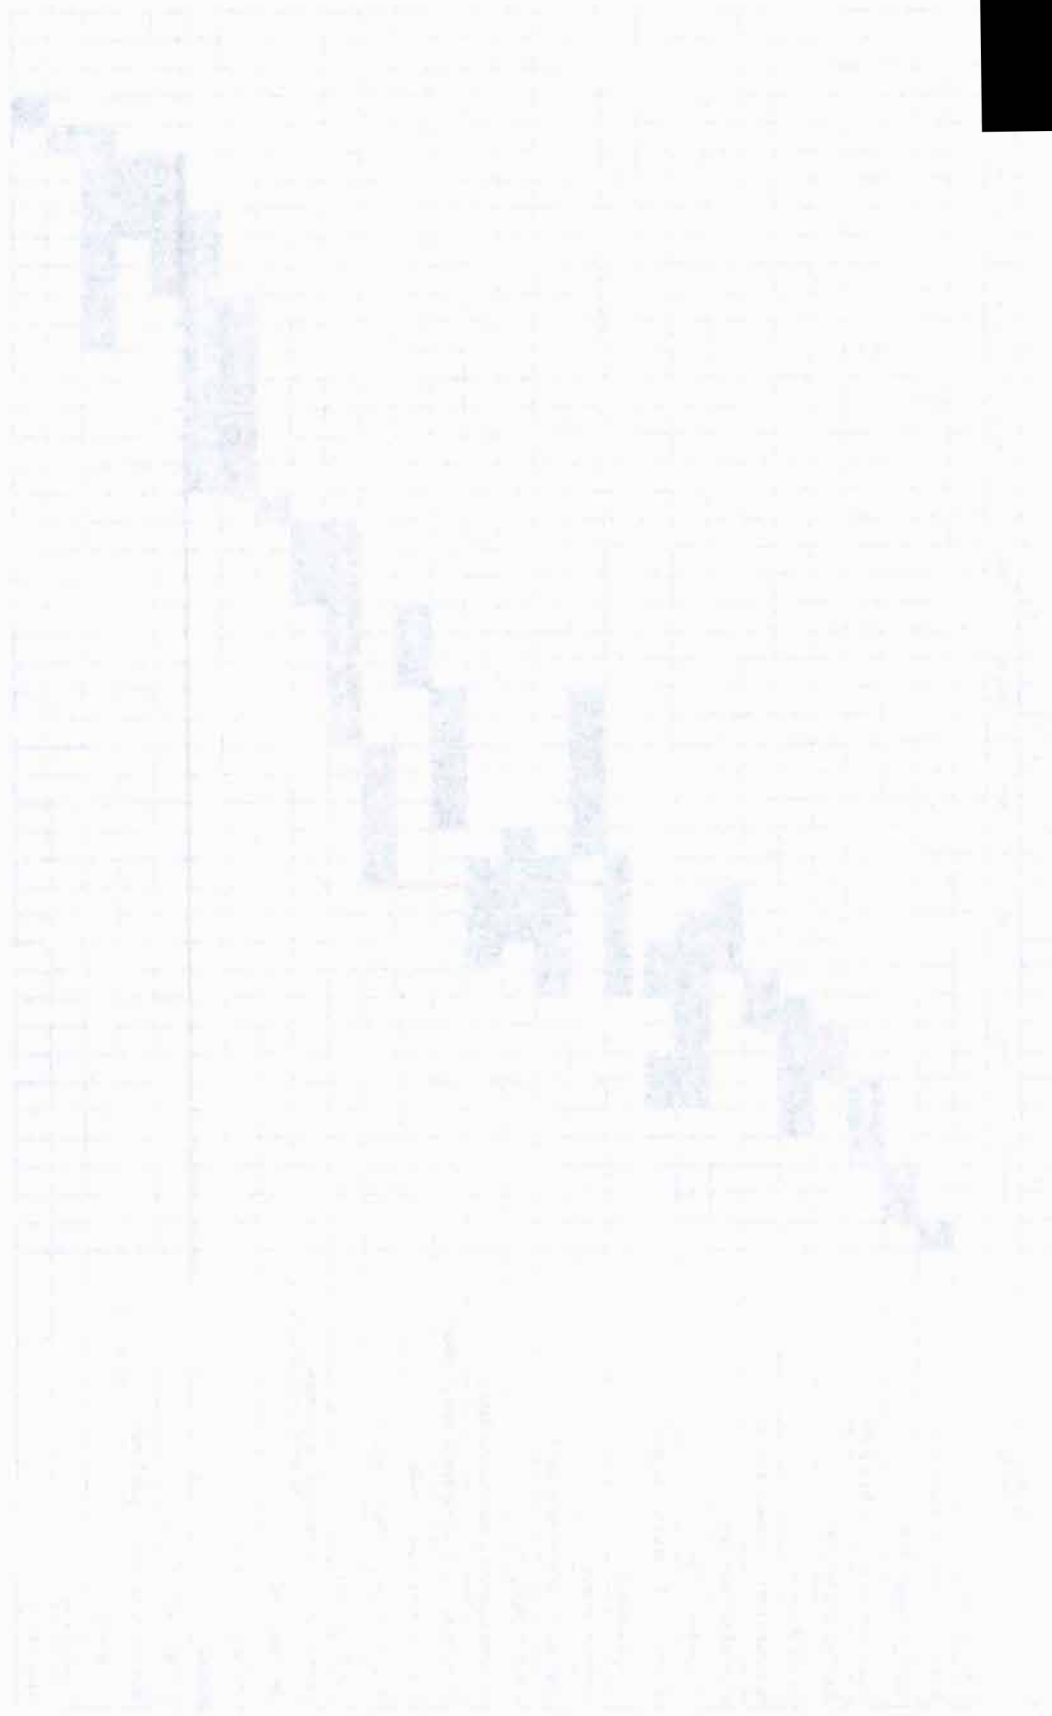

Handwritten text, likely a title or description, is present at the top of the page, partially obscured by the redaction mark. The text is written in blue ink and appears to be a title for the graph, possibly related to 'Distance vs. Time' or 'Step Function'.
