

DODATEK SMLOUVY č. 3




č. KRPE-23736/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)





VZ „Stavební úprava hřišť ÚZ Trpišov“

I. Smluvní strany

1) Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel., e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Název: pm trávníky s.r.o.
Sídlo: Senecká 33, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Zastoupený: 
IČ: 291 13 954
DIČ: CZ29113954
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25776

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-23736/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění část 3.)

Doplnění Dodatku č. 1 za větu: „Zhotovitel souhlasí, že tyto chybějící položky dokončí po skončení rekreace.“

Text:

Důvodem prodloužení termínu plnění částí SO-01.1, SO-02, SO-03, SO-04, SO-05 a SO-06 dle Přílohy č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je částečná změna projektové dokumentace, nepříznivých klimatických a zpoždění dodávek materiálu vlivem pandemie COVID – 19. Termín plnění výše uvedených částí je **do 30. září 2021**.

Zadavatel požaduje, aby všechny probíhající práce byly prováděny dle dohody s odbornou službou. Zadavatel dále požaduje neprovádění jakýchkoliv prací **v termínech 04.07. - 25.07. a 09.08. – 29.08. 2021**.

Zhotovitel souhlasí se změnami smlouvy o dílo.

(nové znění část 3.)

Text:

Termín plnění včetně výše uvedených částí je **do 30. listopadu 2021**.

Důvodem prodloužení je nemožnost úplného dokončení díla z důvodu nedodání kompletního přístřešku od dodavatelské firmy.


Zhotovitel souhlasí se změnami smlouvy o dílo.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 24-09-2021

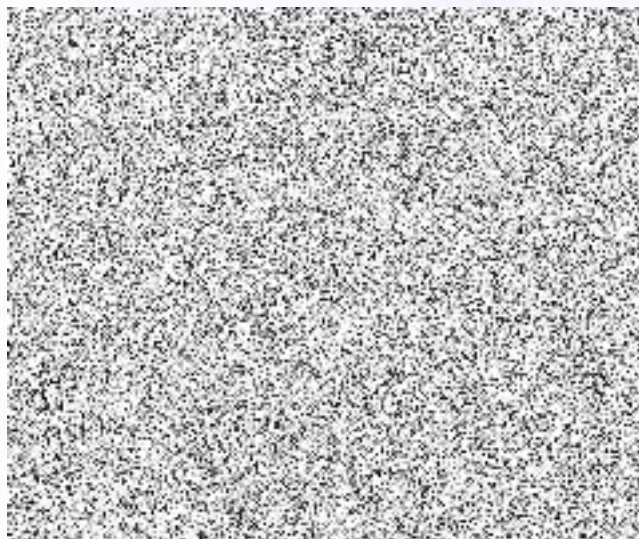

Ve Zruči-Senci dne 30-09-2021

