

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-3823/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO: 104 42 481

DIČ: CZ10442481

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

zastoupená Ing. Jiřím Bendou, jednatelem, a Ing. Janem Egermayerem, jednatelem

č. smlouvy: 2100132

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 20. 1. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/00724 Slaný-průtah**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XIV. odst. 14.14 Smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo takto:

Původní Cena Díla bez DPH	6.384.900,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	6.664.517,98 Kč
DPH 21%	1.399.548,78 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	8.064.066,76 Kč

2. Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.
3. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasený Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Lounech dne _____

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer, jednatelé

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00724 Slaný-průtah, S-3823/00066001/2020

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace Pražská

SO 02 / 01

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČO: 00066001

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČ: 10442481

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	279 617,98	279 617,98

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	279 617,98	279 617,98

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00724 Slaný-průtah, S-3823/00066001/2020

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 02

Číslo ZBV:

1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace Pražská

Strany smlouvy o dílo č. S-3823/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.01.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	8	počet listů

Paré č.

Příjemce

2

Objednatel

1

Zhotovitel

1

Projektant

1

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu díla z důvodu navýšení opravovaného úseku:

Předmětem změny jsou úpravy množství jednotlivých položek (viz. příloha) v důsledku navýšení rozsahu oprav nově poškozeného, nevyhovujícího úseku komunikace navazujícího na dotčenou stavbu, zjištěného a určeného při pochůzce stavby dne 14.4.2021 viz. pokyn k provedení variace ze dne 15.4.2021.

- 1) V původním návrhu PD nebyl řešený úsek opravy uvažován, neboť nebyl v havarijním stavu.
- 2) Přílehlou komunikaci bylo nutné opravit, neboť byla v havarijním stavu (vyjeté koleje) viz. fotodokumentace
- 3) V daném případě dochází k navýšení asfaltové plochy (obrus, ložná vrstva) viz. geodetické zaměření (569 m²).
- 4) Změna rozsahu oprav byla iniciována objednatel na základě podnětu od zhotovitele o nevyhovujícím stavu komunikace plynule navazující na rekonstruovaný úsek dle SoD.
- 5) Navýšení celkové ceny, se promítlo do stávajícího soupisu prací prostřednictvím pěti položek rozpočtu použitých z SoD, a to položek: č.2, č.3, č.5, č.31, č.32

Uvedené měněné položky jsou zařazeny do Skupiny 3, protože důvod těchto změn naplňuje § 7 odst. 2, písm. b) Směrnice upřesňující provádění změn dle zákona č.135/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Tato změna („ZBV“) proběhla na základě oznámení o vzniku variace zhotovitele (příloha číslo 10). S navrhovanými změnami souhlasil stavební dozor (příloha číslo 9).

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že tuto změnu nemohl objednatel jednat s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	279 617,98	279 617,98	279 617,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

jméno

p. Miroslav Pokorný

datum

30-07-2021

podpis
Zapsu

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. Sobol

datum

podpis

Stavební dozor	jmeno		datum	podpis
Zástupce Objednatele	jmeno		datum	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jmeno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jmeno	Ing. Jiří Benda	datum	30-07-2021 podpis
				Číslo par

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/00724 Slaný-průtah, S-3823/00066001/2020	1.3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 02/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace Pražská	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 621 800,53

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 621 800,53	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	279 617,98	279 617,98	4,97%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	5 901 418,51	279 617,98	4,97%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: S-3823/00066001/2020, III/00724 Slaný-průtah									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 02 Komunikace Pražská									SO 02/1				
Číslo a název rozpočtu: SO 02 Komunikace Pražská									Skupina změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny zaporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	113154264	Frézování živичného krytu tl 90 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	10 050	10 619	569	52,78	530 439,00	0,00	30 031,82	560 470,82	30 031,82	5,66%
2	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	10 050	10 619	569	12,81	128 740,50	0,00	7 288,89	136 029,39	7 288,89	5,66%
3	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10 050	10 619	569	11,63	116 881,50	0,00	6 617,47	123 498,97	6 617,47	5,66%
32	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050	10 619	569	192,42	1 933 821,00	0,00	109 486,98	2 043 307,98	109 486,98	5,66%
5	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050	10 619	569	221,78	2 228 889,00	0,00	126 192,82	2 355 081,82	126 192,82	5,66%
Celkem								4 938 771,00	0,00	279 617,98	5 218 388,98	279 617,98	5,66%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: p. Miroslav Pokorný

Za Objednatele: pí. Šárka Balážová

Datum:

Datum:

30-07-2021

PREHLED ZARAZENI ZMEN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: S-3823/00086001/2020, III/00724 Slaný-průtah

1	Příjatek ušetření částka bez rezervy a DPH	4 384 908,00
2+1+19+18	Akumulace ušetření (záporné číslo)	-6 044 517,00
20+21+22	Akumulace ušetření částka (pro stavbu) od DPH	6 044 908,70
3+12+17+10	Pozitivní změny Přijaté ušetření částky	164,38%
4+20+17+19	Skutečné vyhraněných změn (Skupina 1)	4,00%
5+20+17	Skutečné celkové změny (Skupina 2)	2,00%
6+20+17+18	Změny ušetření 10 % pro skupinu 1 a skupinu 2 (Hodnota celkové záruky 10 % ušetření, 10 % ušetření 10 %)	2,00%

0-17+20	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	279 617,00
10+19+17+18	Skutečné ušetření 10 % ušetření Skupiny 3 a Skupiny 4	4,00%
0+17+20	Změny ušetření 10 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 816 470,00

0+20+17+18	Skutečné ušetření 10 % Skupina 4	4,00%
10+19+17+18	Skutečné ušetření 10 % Skupina 4	4,00%
10+19+17+18	Suma skutečných ušetření celkové kladných a Změn záporných (pro Skupinu 3 a Skupinu 4)	279 617,00
10+19+18	Změny ušetření 10 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 816 470,00

0+20+17+18	Skutečné ušetření 10 %	4,00%
10+19	Skutečné ušetření 10 % (142 944 999 Kč)	0,01%
1+21+17+20+18+17	Změny do celku	1 817 086,00

Skupiny změn

SO	ZEV č.	Název SO/PS / předání Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZEV	1			2			3			4			5							
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma skutečných hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma skutečných hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do celkové (10% nebo 142 944 999 Kč)	Změny kladné	Suma 10 %	Suma hodnot Změn záporných a Změn kladných
10	17	10	10-23+26+20+23	20+34+27+30+34+27+29	21+19+20	23	34	25=23+24	35	27	26=26+27	30	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(32)+30	33	34	36=(34/1)*100	36=23+34	36A=ABS(33)+34	37	36	38=(37/1)*100	38A=ABS(37)+36
		Komunikace Pražaka	0,00	279 617,00	279 617,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	279 617,00	4,00%	279 617,00	279 617,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1	0,00	279 617,00	279 617,00										279 617,00	4,00%	279 617,00	279 617,00							

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předání Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Císlo ZBV:	1.3
Název a evidenční číslo stavby:	III/00724 Slaný-prutah, S-3823/00066001/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02 Komunikace Pražská
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 02/1


Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací	1	
08 - Geodetické zaměření	1	
09 - Vyjádření TDS k výměrám provedených prací	1	
10 - Oznámení o vzniku variace	1	
11 - Souhlas KSUS s ZBV	1	
12 - fotodokumentace	3	
Počet listů celkem:	8	

III/00724 Slaný-průtah													
Evidenční číslo a název stavby: S-3823/00066001/2020, III/00724 Slaný-průtah										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název SO/PS: SO 02 Komunikace Praha3										000/1			
Číslo a název rozpočtu: SO 02 Komunikace Praha3										Skupina Změn: 3			
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky dle SO													
31	113154264	Frezování živičného krytu tl 90 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	52,78	530 439,00	0,00	30 031,82	560 470,82	30 031,82	5,66%
2	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	12,81	128 740,50	0,00	7 288,89	136 029,39	7 288,89	5,66%
3	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	11,63	116 881,50	0,00	6 617,47	123 498,97	6 617,47	5,66%
32	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	192,42	1 933 821,00	0,00	109 486,98	2 043 307,98	109 486,98	5,66%
5	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní AQL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050,000	10 619,000	569,000	221,78	2 228 889,00	0,00	126 192,82	2 355 081,82	126 192,82	5,66%
6	R-001	Sanace širokých trhlin dle TP115	m	100,000	100,000	0,000	75,28	7 528,00	0,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00%
7	R-002	Sanace úzkých trhlin dle TP115	m	100,000	100,000	0,000	75,28	7 528,00	0,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00%
8	R-003	Sanace úzkých trhlin s překrytím geo. dle TP115	m	100,000	100,000	0,000	188,19	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00%
30	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	ks	1,000	1,000	0,000	3 505,02	3 505,02	0,00	0,00	3 505,02	0,00	0,00%
23	BTL0006310.URS	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	ks	1,000	1,000	0,000	219,65	219,65	0,00	0,00	219,65	0,00	0,00%
24	BTL0006303.URS	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	ks	1,000	1,000	0,000	324,70	324,70	0,00	0,00	324,70	0,00	0,00%
25	BTL0006306.URS	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/5c 45x19,5x5 cm	ks	1,000	1,000	0,000	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00%
26	BTL0006307.URS	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b 45x29,5x5 cm	ks	1,000	1,000	0,000	219,65	219,65	0,00	0,00	219,65	0,00	0,00%
27	BTL0006311.URS	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39x6x13 cm	ks	1,000	1,000	0,000	200,55	200,55	0,00	0,00	200,55	0,00	0,00%
28	BTL0019427.URS	koč pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro ram 500/500	ks	1,000	1,000	0,000	503,33	503,33	0,00	0,00	503,33	0,00	0,00%
29	55242320	mříž vtoková litinová plocha 500x500mm	ks	1,000	1,000	0,000	2 202,09	2 202,09	0,00	0,00	2 202,09	0,00	0,00%
9	899231111/1	Výšková úprava horní části vpustí / poklopu a do hl. cca 0,5 m vč. dodávky	ks	54,000	54,000	0,000	3 718,84	200 817,36	0,00	0,00	200 817,36	0,00	0,00%
10	899431111	Výšková úprava krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu do 200 mm	ks	40,000	40,000	0,000	952,74	38 109,60	0,00	0,00	38 109,60	0,00	0,00%
11	91522110a	Obnova VDZ ve strukturálním plástu s předznačením v rozsahu obnovy stávajícího VDZ	m2	300,000	300,000	0,000	202,23	60 669,00	0,00	0,00	60 669,00	0,00	0,00%
33	91522100a	Výměna stávajícího SDZ	ks	5,000	5,000	0,000	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
12	919112212	Úprava styčných a pracovních spár obrusné vrstvy - Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	100,000	100,000	0,000	30,11	3 011,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00%
13	919122111	Úprava styčných a pracovních spár obrusné vrstvy - Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	100,000	100,000	0,000	37,64	3 764,00	0,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00%
14	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu	m	100,000	100,000	0,000	50,96	5 096,00	0,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00%
15	919735112-1	Úprava styčných a pracovních spár ložní vrstvy - Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	100,000	100,000	0,000	68,16	6 816,00	0,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00%
16	988908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlaždeného vodou	m2	10 050,000	10 050,000	0,000	4,49	45 124,50	0,00	0,00	45 124,50	0,00	0,00%
18	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2 773,800	2 773,800	0,000	35,55	98 608,59	0,00	0,00	98 608,59	0,00	0,00%
19	997211519	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti	t	52 702,200	52 702,200	0,000	2,88	151 782,34	0,00	0,00	151 782,34	0,00	0,00%
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,612	37,612	0,000	65,20	2 452,30	0,00	0,00	2 452,30	0,00	0,00%
21	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	37,612	37,612	0,000	14,30	537,85	0,00	0,00	537,85	0,00	0,00%
Cena celkem:								5 621 800,53	0,00	279 617,98	5 901 418,51	279 617,98	4,97%

Slaný, Pražská ul.

Zaměření výměr opravy vozovky

výměra: 569 m²

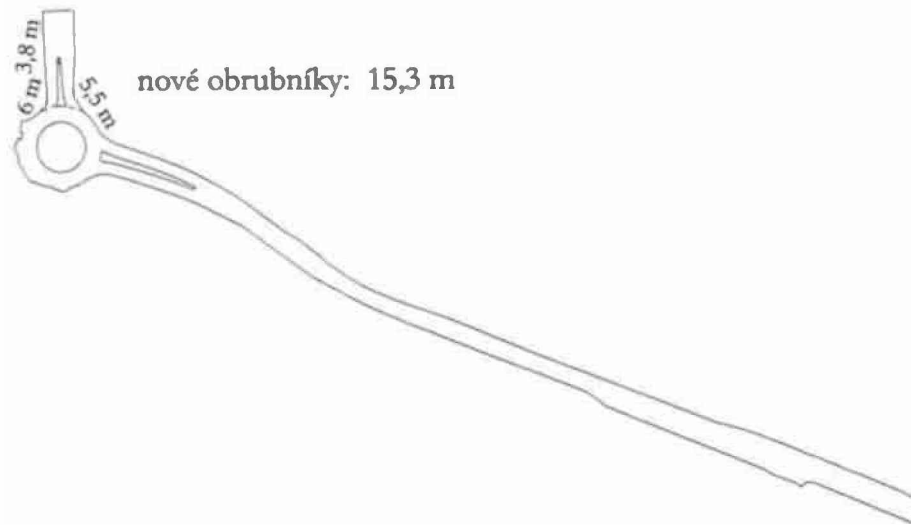



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: S-3823/00066001/2020, III/00724 Slaný-průtah								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 02 Komunikace Pražská								SO 02/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 02 Komunikace Pražská								Skupina Změn: 3					
Pol. č. poř.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	113154264	Frézování živičného ložtu tl 90 mm pruh š 2 m př. do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	573191111	Postřik infiltrační kationtové emulze v množství 1 kg/m2	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	573731108	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16 (ABM) tl 50 mm š do 3 m z mod. asfaltu	m2	10 050	10 619	569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Odpovědný zástupce Objednatel: p. Miroslav Polcarný
 Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: p. Miroslav Polcarný

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573
440 01 Louny

Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Vedoucí Kladno: Karel Motál

Váš dopis zn./ze dne	naše zn.	vyřizuje/tel.	Louny dne:
	2100132-1	Miroslav Pokorný	14.04.2021

(S-3823/00066001/2020) III/00724 Planý-průtah – Oznámení o vzniku variace

Vážený pane Motale,

dovoluji si Vás oslovit z důvodu vzniku variace na výše zmíněné stavbě.

POPIS VARIACE: Při kontrolním dnu a pochůzce stavby dne 14.4.2021, byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího povrchu komunikace v ulici U Brodu ve výměře cca 650m², plynule navazující na prováděnou stavbu, jejíž součástí je ostrůvek přechodu pro chodce kde jsou nevyhovující a provozem značně poškozené silniční betonové obruby cca 12kusů. Při úkonech KD byla navržena oprava toho úseku stejnou formou oprav živičného krytu jako na naší stavbě.

Žádám o schválení této změny a pokynu k provedení variace.

Miroslav Pokorný
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573
440 01 Louny

*Vás dopis značky ze dne
14.4.2021*

*Naše značka
č.j. 2911/21/KSUS/KLT/MOT
ev.č. 19970/2021-KSÚS*

*Vyřizuje telefon
Motal /*

*Praha
15.4.2021*

Věc: Vyjádření ke změnám stavby „III/00724 Slaný-průtah“

Dle oznámení zhotovitele ze dne 14.4.2021 se jedná o následující změny u realizované stavby „III/00724 Slaný – průtah“ :

Byl zjištěn nevyhovující stav živičného povrchu komunikace „U Brodu“, silnice II/118 bezprostředně navazující na rekonstruovanou kruhovou křižovatku, jedná se o nevyhovující úsek komunikace o výměře cca 650m². Dále byly zjištěny poškozené silniční betonové obruby v počtu cca 12 kusů.

Zhotovitel stavby, společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. navrhuje rozšířit stavbu o opravu předmětného úseku silnice II/118 a dále vyměnit nevyhovující silniční betonové obruby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace jako správce silnic II. a III. třídy a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/00724 ve Slaném a jako zadavatel opravy tímto **souhlasí** s navrženým řešením a vydává pokyn k realizaci díla dle navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno





