



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ, SLOVANSKÁ ALEJ 35“ (dále jen „Dodatek“)

KTERÝ UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

- (1) **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**, IČO: 25220683, se sídlem Denisovo nábreží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 710

(dále jen „**Objednatel**“);

a

- (2) **Metrostav a.s.**, IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. Zastoupená Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 Metrostav a.s, zmocněným zástupcem,

jednající jako vedoucí společník **Společnosti Vozovna Slovany**, tvořené dalšími společníky

BERGER BOHEMIA a.s. IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217. Zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

a

TSS GRADE, a.s., IČ: 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, společnost zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a Ing. Markem Chomou, členem představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, IČ: 02765055, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26126

(dále jen „**Zhotovitel**“).

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“ a samostatně také jako „**Smluvní strana**“).



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel se Zhotovitelem spolu dne 18. 09. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň Slovanská alej 35“, evidenční číslo Z2020-010217 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal řádně a včas zhotovit pro Objednatele Dílo definované v čl. 2.2 Smlouvy a splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit a splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě;
- (B) Dle odst. 2.8.1 Smlouvy platí, že Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části Díla, přičemž jakákoliv takováto nebo jiná změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen Objednatelem a Zhotovitelem ve formě Změnového listu a potvrzen v dodatku k této Smlouvě;
- (C) Z důvodů výše uvedených byl dne 6. 8. 2021 již uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, který již některé vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce v celkové hodnotě změny Smlouvy ve výši 0,84% reflektoval a narovnával vzájemné vztahy mezi smluvními stranami.
- (D) V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba určitých dalších změn Díla, které byly mezi Objednatelem a Zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny;
- (E) Ve smyslu odst. 2.8.4 Smlouvy nemá jakékoliv Změna nařízená Objednatelem jakýkoliv vliv na Časový harmonogram výstavby, celkový termín dokončení Díla a/nebo kterékoliv Stavebního celku, Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě do okamžiku, než bude oběma Smluvními stranami podepsán dodatek ke Smlouvě, potvrzující příslušný Změnový list;
- (F) Objednatel a Zhotovitel se postupem dle čl. 2.8 Smlouvy dohodli na úpravě rozsahu Díla a Smluvní ceny a mají zájem na tom, aby tato jejich dohoda nabyla účinnosti;
- (G) Uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy definované ve Smlouvě.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce, které jsou v podrobnostech popsány ve Změnových listech č. ZL 012, ZL 013, ZL 015, ZL 016, ZL 019, ZL 022 a ZL 025, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnové listy“).
- 1.2. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 26 168 641,82 Kč bez DPH.
- 1.3. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku 7 582 717,13 Kč bez DPH.
- 1.4. Celková hodnota změny Smlouvy dle tohoto Dodatku činí částku 33 751 358,95 Kč bez DPH, což představuje 1,99% původní hodnoty závazku.



- 1.5. Celkový nárůst Smluvní ceny související se změnami Díla dle tohoto Dodatku činí částku **18.585.924,69 Kč bez DPH**.
- 1.6. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v článku 2. tohoto Dodatku specifikováno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Text odst. 3.1.1 až 3.1.3 Smlouvy bude nově znít:

- 3.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu za zhotovení Díla ve výši **1 728 681 847,54 Kč bez DPH** (slovy: jedna miliarda sedm set dvacet osm milionů šest set osmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet sedm celých a padesát čtyři haléřů korun českých) (dále jen „**Smluvní cena**“). Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze jí překročit jinak, než na základě Příkazu ke změně.
- 3.1.2. Ze Smluvní ceny za zhotovení Díla dle čl. 3.1.1 bude DPH činit **363 023 187,98 Kč** (slovy: tři šedesát tři milionů dvacet tři tisíc jedno sto osmdesát sedm celých a devadesát osm haléřů korun českých) v souladu se Zákonem o DPH. V případě, že dojde ke změně příslušných právních předpisů, bude DPH účtována ve výši dle Zákonu o DPH ve znění účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu s čl. 3.4.1 níže.
- 3.1.3. Smluvní cena za zhotovení díla činí s DPH **2 091 705 035,52 Kč** (slovy: dvě miliardy devadesát jedna milionů sedm set pět tisíc třicet pět celých a padesát dva haléřů korun českých).

- 2.2. Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen a Časový harmonogram zůstává beze změny.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že nárůst Smluvní ceny dle odst. 1.5 tohoto Dodatku je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyfakturovat po uzavření tohoto Dodatku; Všechny položky ve Změnových listech, které obsahuje tento Dodatek, budou zaneseny do stávajících fakturačních tabulek (zjišťovacích protokolů a souhrnného zjišťovacího protokolu) a tím dojde k vytvoření nového rozpočtu, ze kterého bude čerpáno dle fakturačních a obchodních podmínek, které se budou řídit čl. 3.2. Smlouvy.

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku zvýšení celkové Smluvní ceny nemusí Zhotovitel přistoupit k navýšení Zajištění za plnění, tak jak je definováno v čl. 8.1.1. Smlouvy, ani k navýšení Zajištění za záruční plnění uvedené v čl. 8.2.1. Smlouvy, když výše těchto obou zajištění bude vycházet ze Smluvní ceny za příslušný Stavební celek sjednané k datu uzavření Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 3.3 Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany shodně potvrzují, že tento Dodatek neobsahuje



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




obchodní tajemství.

Přílohy:

č. 1 – Změnové listy č. 012, 013, 015, 016, 019, 022 a 025

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.




jméno: Mgr. Roman Zarzycký
funkce: předseda představenstva

Metrostav a.s.


vedoucí společník

„Společnost Vozovna Slovany“




jméno: Ing. Václav Apolín
funkce: ředitel divize 1 Metrostav a.s.

BERGER BOHEMIA a.s.




jméno: Ing. Zdeněk Pilík
funkce: předseda představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.




jméno: Ing. Ladislav Provod
funkce: člen představenstva



jméno: Ing. Dušan Chovanec
funkce: předseda představenstva
zastoupený Ing. Markem Chomou
na základě plné moci

TSS GRADE a.s.



jméno: Ing. Marek Choma
funkce: člen představenstva

Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt:	E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 00-00 Demolice
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábreží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany – TDS, [redacted]
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s., [redacted]

Popis změny	Během demoličních prací byly zjištěny základové konstrukce ve větším rozsahu než byly uvažovány v rozpočtu DPS. Navýšily se tím náklady na bourání základů, zásypu, odvozu a poplatků za uložení odpadu.				
	změnu vyvolal:		objednatel		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.012 bez DPH		
	cena SO dle SoD (bez DPH):		4 645 370,15 Kč		
	náklady na změnu bez DPH:		4 187 416,91 Kč		
	cena SO po ZL č.012 (bez DPH):		8 832 787,06 Kč		
	cena díla bez DPH (dle SoD):		1 697 894 702,32 Kč		
	cena díla po ZL č.012 bez DPH:		1 702 082 119,23 Kč		
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	547 132,33 Kč	5 281 681,57 Kč	celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH:	4 734 549,24 Kč			
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		změna nemá vliv na dokončení díla		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum		
	Zhotovitel:		29.6.2021		
	Věcně za TDS:		29.6.2021		
	Technicky za AD:		29.6.2021		
	Objednatel:		29.6.2021		
přílohy	č. 1 - rozpočet ke změnovému listu č. 012 č. 2 - výpočet včetně výkresů č. 3 - vážní listky ŽB č. 4 - vážní listky Plast č. 5 - vážní listky Izolace č. 6 - vážní listky Směs č. 7 - vážní listky Cihly č. 8 - fotodokumentace č. 9 - vyjádření AD č. 10 - vážní listky Prostý beton				

PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:

012

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdlí množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdlí celk. ceny [Kč]
5	K	9890R-01	Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 01 - "administrativní budova", včetně provedení ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování	kpl	1,000	0,00	1,00	24 856,00	24 856,00 Kč	0,00 Kč	24 856,00 Kč
	VV		"dle stavebního technického průkazu" střešní krytina a pásy s podložním na výšky odevlávaných pásů s výškou azbestu"								
	VV		komplet 1		1,000						
6	K	9890R-07	Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 05 - "hala průjezdná", včetně provedení ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování	kpl	1,000	0,23	0,77	372 737,76	372 737,76 Kč	85 729,68 Kč	287 008,08 Kč
	VV		"dle stavebního technického průkazu"								
	VV		"troubový lešení provazce, podložky střešní krytiny půlové střechy s podložním na výšky odevlávaných pásů s výškou azbestu"								
	VV		komplet 1		1,000						
13	K	997013807	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	27,400	0,00	27,40	310,70	8 513,18 Kč	0,00 Kč	8 513,18 Kč
			01 - admin. budova" 0,4		0,400						
			05 - hala průjezdná" 27,0		27,000						
			Součet		27,400						
14	K	997013811	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	81,400	26,79	54,61	1 118,52	91 047,53 Kč	29 965,15 Kč	61 082,38 Kč
			01 - admin. budova" 0,4		0,400						
			05 - hala průjezdná" 81,0		81,000						
			Součet		81,400						
17	K	997013821	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 170 805	t	34,500	7,96	26,54	3 604,12	124 342,14 Kč	28 688,80 Kč	95 653,34 Kč
			01 - admin. budova: střešní krytina a v případě výskytu odevlávaných pásů s obsahem azbestových vláken" 1,5+3,0		4,500						
			05 - hala p. traukový, lešení provazce, střešní krytina půlové střechy s podložním na výšky odevlávaných pásů s výškou azbestu" 30,0		30,000						
			Součet		34,500						
19	K	997223845	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	62,600	0,00	62,60	1 118,52	70 019,35 Kč	0,00 Kč	70 019,35 Kč
			01 - admin. budova" 6,0		6,000						
			05 - hala průjezdná" 56,6		56,600						
			Součet		62,600						
			CELKEM:						0,00 Kč	0,00 Kč	547 132,33 Kč

VÍCEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdlí množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdlí celk. ceny [Kč]
1	K	961065111	Bourání základů z betonu železového	m3	796,000	2 829,820	2 033,820	1 491,36	1 187 122,56	4 220 280,36	3 033 157,80
	VV	změna	"01 - admin. budova 154,00" "03 - velkovýklad 89,00" "05 - hala průjezdná 2586,82 - čerpaných 553,00 = 2033,82 - viz Příloha č.2"			154,00 89,00 2586,82					
7	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	4 220,400	6 589,530	2 369,130	37,28	157 336,51	245 657,68	88 321,17
	VV	změna	"navýšení dle položky č. 9"			1 355,550					
			"navýšení dle položky č. 10"			2 700,940					

			"navýšení díle položky č. 15"						43,480					
			"navýšení díle položky č. 16"						35,400					
			"navýšení díle položky č. 18"						106,800					
			"nedoděpaní položky - viz FA 11/21, 02/21, 03/21, 04/21, 05/21"						517,480					
B	K	997006519	Vodorovná doprava suli na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	63 306,000				81 198,450		4,97	314 630,82	718 187,12	403 556,30
	WV	Změna	"vicepráce pol. Č. 9° 27'00,94''15						20 333,400					
			"vicepráce pol. Č. 10° 27'00,94''15						40 514,100					
			"vicepráce pol. Č. 11° 17'36,42''15						26 046,300					
			"vicepráce pol. Č. 15° 0,1''15						1,500					
			"vicepráce pol. Č. 16° 35,4''15						531,000					
			"vicepráce pol. Č. 18° 102,3''15						1 534 500					
			"nedoděpaní položky - viz FA 11/21, 02/21, 03/21, 04/21, 05/21"						7 762,350					
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 101 - admin. budova; tvárnice" 550 Q	t	590,000				1 764,020		111,85	65 991,50	197 305,64	131 314,14
	WV	Změna	"vicepráce viz Příloha č. 10"						9910 030					
			"nedoděpaní položky - viz FA 11/21, 02/21, 03/21, 04/21, 05/21"						1 365,550					
									181,540					
10	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1 908,000				4 608,940		124,28	237 126,24	572 799,06	335 672,82
	WV	Změna	"vicepráce viz Příloha č. 3"						2 700,940					
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	1 121,000				2 857,420		310,7	348 294,70	887 800,39	539 505,69
	WV	Změna	"vicepráce viz Příloha č. 7"						1 736,420					
15	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,900				44,380		1367,08	1 230,37	60 671,01	59 440,64
	WV	Změna	"vicepráce viz Příloha č. 4"						43,480					
16	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	36 000				71,400		1056,38	38 029,68	75 425,53	37 395,85
	WV	Změna	"vicepráce viz Příloha č. 5"						36,400					
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	113,300				220,100		994,24	112 647,39	218 832,22	106 184,83
	WV	Změna	"vicepráce viz Příloha č. 6"						106,800					4 734 549,24 Kč
											CELKEM:			

NAKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH [VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE] [KČ]: 4 187 416,91 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCI A VÍCEPRÁCI OPROTI ŠOD CELKEM [KČ]: 5 281 681,57 Kč

medic

vypracoval:

za zhotoviteľ:

.....za TDS:

29.6.1021

29.6.2027

PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

ODT SO 00-00 demolice

1	Bourání základů z betonu železového
---	-------------------------------------

"05 - hala průjezdná"

Betony ŽB

Přístavky haly

	a	b	c	m3
	56,56	0,60	0,70	23,76
	56,56	0,70	2,50	98,98
	56,56	8,78	0,20	99,32
				222,05
	Podzemní přístavek			
OB zdi	7,30	0,70	3,80	19,43
OB zdi	7,30	0,45	3,80	12,49
OB zdi	12,62	0,60	3,80	28,77
OB zdi	12,62	0,70	3,80	33,57
strop	8,60	11,47	0,20	19,74
podlaha	7,30	11,47	0,40	33,51
				147,51
		celkem přístavky		369,56

Hala vlastní - kanály

	a	b	c	m3
1.	66,61	0,70	2,55	118,90
	66,61	0,45	2,55	76,43
strop	66,61	2,30	0,40	61,28
dno	66,61	2,30	0,40	61,28
				317,90
2.	66,61	0,45	2,95	88,42
	66,61	0,45	2,95	88,42
strop	66,61	3,00	0,50	99,92
dno	66,61	3,00	0,50	99,92
				376,68
3.	66,61	0,30	2,70	53,95
	66,61	0,30	2,70	53,95
strop	66,61	2,30	0,30	45,96
dno	66,61	2,30	0,50	76,60
				230,47
4.	15,70	0,40	2,55	16,01
	15,70	0,40	2,55	16,01
strop	15,70	1,40	0,40	8,79
dno	15,70	1,40	0,40	8,79
				49,61
5.	16,60	0,40	1,40	9,30
	16,60	0,40	1,40	9,30
strop	16,60	1,40	0,40	9,30
dno	16,60	1,40	0,40	9,30
				37,18
6.	15,70	0,45	2,65	18,72
	15,70	0,45	2,65	18,72

strop	15,70	1,85	0,50	14,52
dno	15,70	1,85	0,40	11,62
				63,59
7.	16,60	0,45	2,65	19,80
	16,60	0,45	2,65	19,80
strop	16,60	1,85	0,50	15,36
dno	16,60	1,85	0,40	12,28
				67,23
2 x kanál	15,70	0,30	0,90	4,24
	15,70	0,30	0,90	4,24
	0,60	0,30	0,90	0,16
	0,60	0,30	0,90	0,16
dno	15,70	1,00	0,40	6,28
				30,16
Podlaha 1	62,00	15,70	0,40	389,36
	15,70	1,00	0,40	6,28
	15,70	1,00	0,40	6,28
				376,80
Podlaha 2	62,00	16,60	0,40	411,68
	62,00	0,30	0,35	6,51
	62,00	0,30	0,35	6,51
				424,70
8. - výškově pod kanálem 2., délka přes halu	42,55	0,50	0,80	17,02
	42,55	0,50	0,80	17,02
dno	42,55	3,55	0,50	75,53
				109,57

mínus kanál

mínus kanál

Patka 1	2,80
Patka 2	2,80
Patka 3	4,00
Patka 4	4,00
Točna 1	10,00
Točna 2	10,00
Základ sloupů 1	8,00
Základ sloupů 2	8,00
Základ sloupů 3	8,00

Jímka	5,00	0,45	1,25	2,81
	5,00	0,45	1,25	2,81
	4,10	0,45	1,25	2,31
	4,10	0,45	1,25	2,31
dno	5,00	5,00	0,25	6,25
				16,49

celkem hala 2 157,98

celkem přístavky + hala 2 527,54 m3

LAPOL

	a	b	c	m3
	10,20	0,25	4,50	11,48
	10,20	0,25	4,50	11,48

	3,30	0,25	4,50	3,71
	3,30	0,25	4,50	3,71
	3,30	0,25	4,50	3,71
strop	10,20	3,80	0,25	9,69
dno	10,20	3,80	0,40	15,50
				59,28 m3

celkem přístavky + hala + lapol **2 586,82** m3

Bilance

celkem čerpáno - "05 - hala průjezdná" 553,00 m3

celkem dle skutečnosti - "05 - hala průjezdná" 2 586,82 m3

Vícepráce celkem **2 033,82** m3



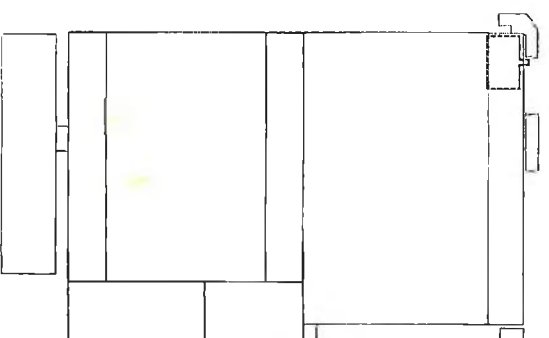


schéma objektu

INVESTOR: Plzeňské městské dopravní podniky 	OBJEDMATEL: Společnost Vozovna Slovany Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
ZHOTOVITEL: METROPROJEKT Praha a.s. AOB, Argentinská 36 170 00 Praha 7 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz	Název a účel díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY Plzeň, Slovanská alej

HLAVNÍ PROJEKTANT: [Redacted] tel.: [Redacted]	PROJEKTANT: [Redacted]
Stupeň: RDS	Název části díla: E. Stavební část - stavební součást SOD II Objekty odstavu tramvaj E.1 Objekty pozemních staveb

Zpracovatelství úřad: [Redacted]	Název přílohy: SO ODT 00 00 Domovní
--	---

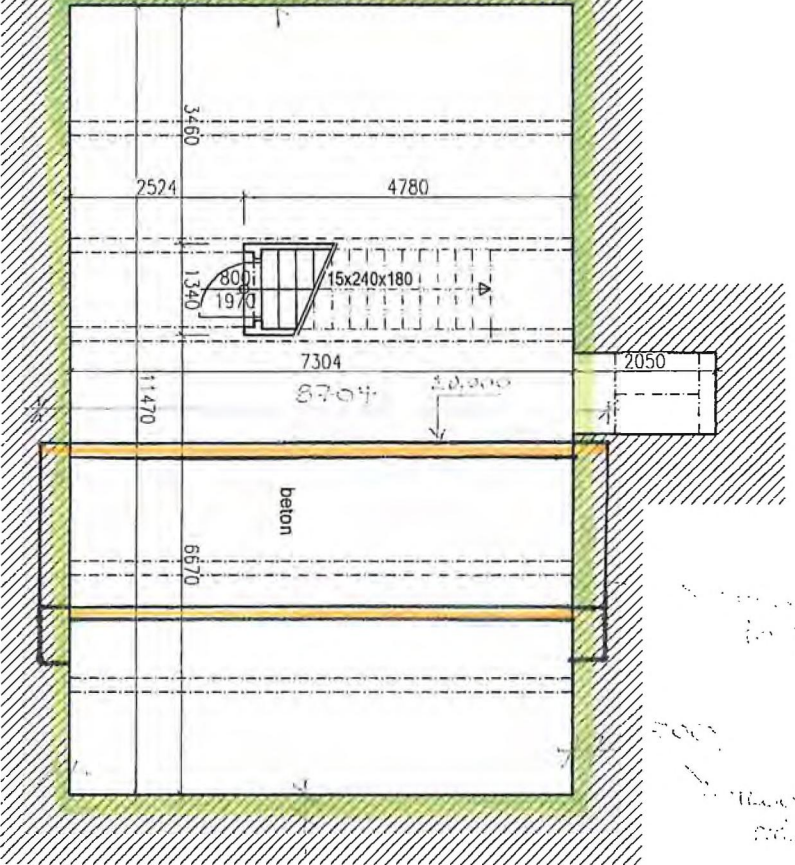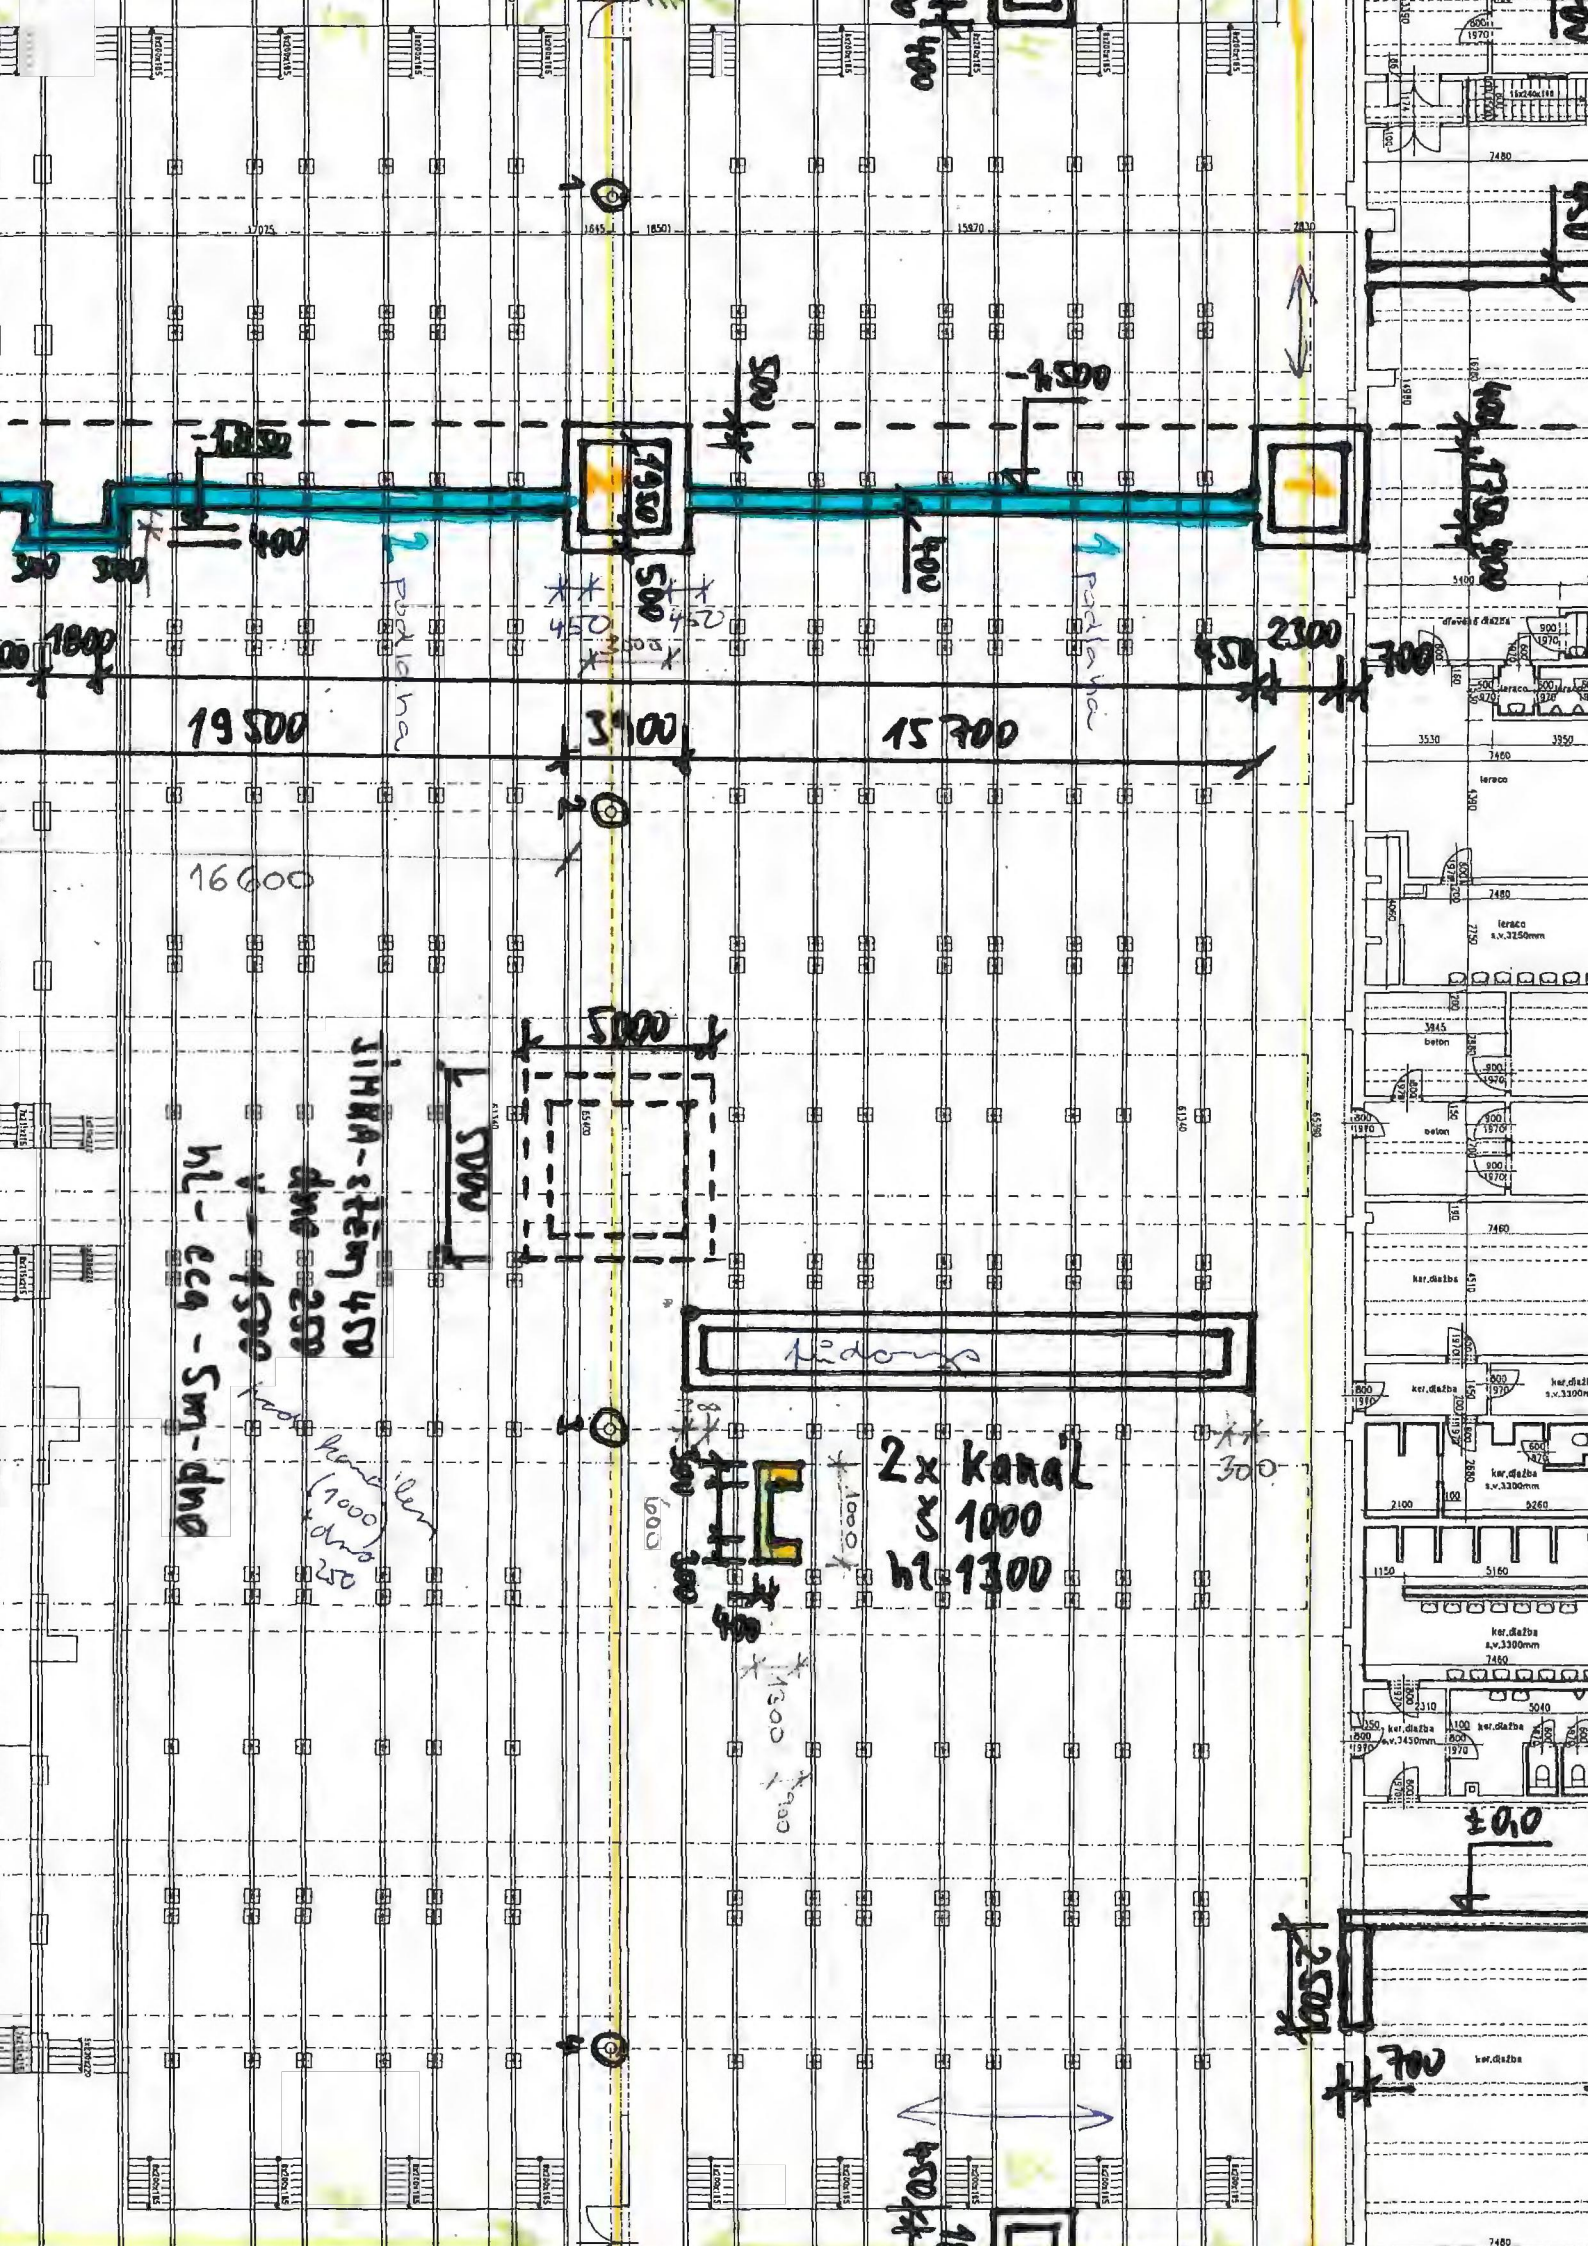

19500

16600

3100

15700


hl-eca-sm-dno
dne 250
kanal (1000)
dne 250


hidroizol

2x kanal
8 1000
hl 1300

2500

700

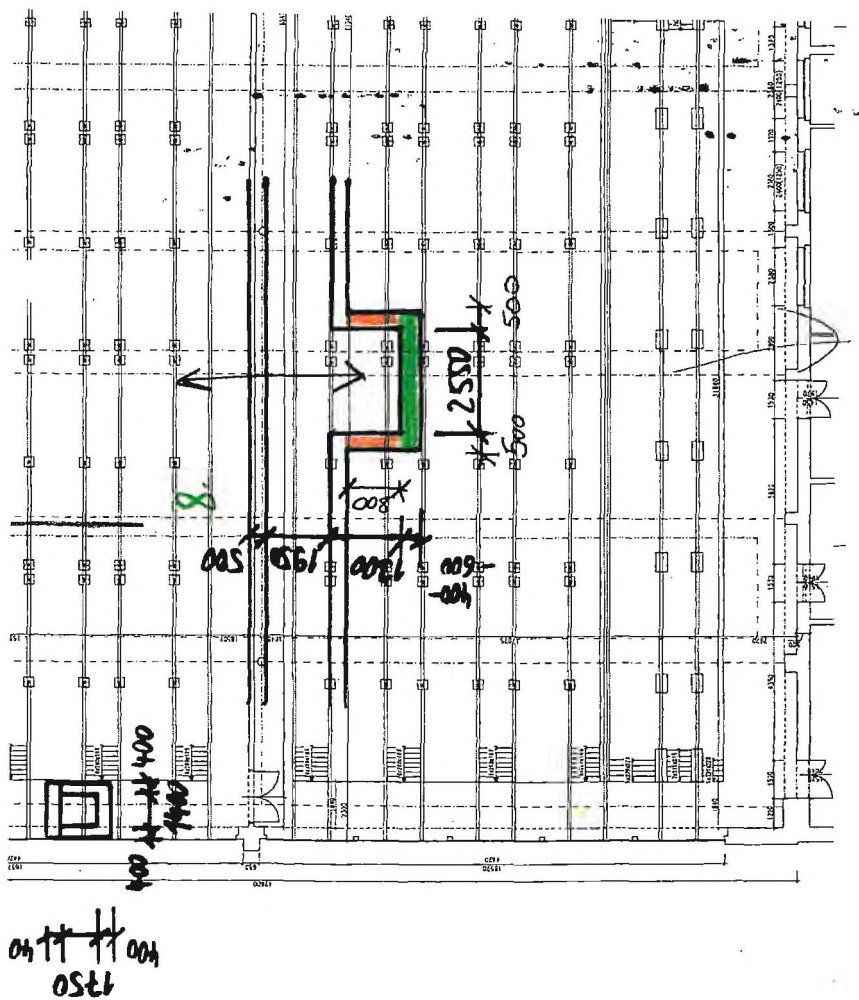

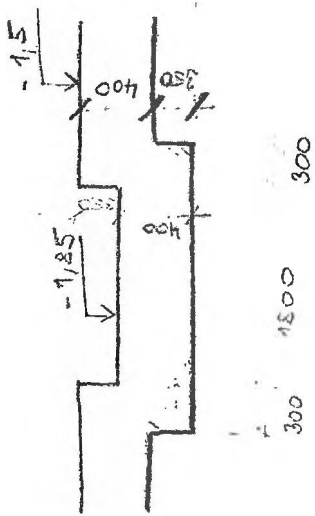

PODLAHA č. 2 - upřesnění

PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

ODT SO 00-00 demolice

10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 99
----	---

Vážní listky03/2021

Železobeton (t)
2013,10

Součet 2013,10 (t)

Již provedeno 442,66 (t)

Vícepráce 03/21 1570,44 (t)04/2021

Železobeton (t)
1119,90
380,60
1500,50

Součet 1500,50 (t)

Již provedeno 370,00 (t)

Vícepráce 04/21 1130,50 (t)**Vícepráce celkem 2700,94 (t)**

03/21

OOT 00-00

Zakázka: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Původce odpadu/Plátce: BIGGESI construct s.r.o.
Uložení odpadu: RECYKLAČ, Zeyerova ulice, 337 01 Rokycany

Zakázka	Číslo vážního listku	Datum a čas	RZ	Kód	Hmotnost [t]	kg.	Odpad	Uložení	Součty	Objekt
0049/2020	21PA1114	23.2.2021 8:06	4K5 9350	pl170101	27,8	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1117	23.2.2021 9:22	4K5 9350	pl170101	29,3	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1125	23.2.2021 12:28	4K5 9350	pl170101	26,46	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1135	23.2.2021 16:03	4K5 9350	pl170101	28,04	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1136	23.2.2021 16:26	7P0 4980	pl170101	17,68	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1141	24.2.2021 8:33	4K5 9350	pl170101	31,18	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1149	24.2.2021 15:00	7P4 5596	pl170101	20,48	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1167	25.2.2021 13:28	7P3 8073	pl170101	19,54	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1168	25.2.2021 13:35	6P7 5032	pl170101	22,44	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1170	25.2.2021 13:49	7P7 3740	pl170101	22,96	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1171	25.2.2021 13:50	6P8 4638	pl170101	23,1	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1306	2.3.2021 7:42	8AE 4467	pl170101	21,58	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1549	9.3.2021 12:02	6P7 5032	pl170101	17,14	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1550	9.3.2021 12:05	6P8 5110	pl170101	19,34	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1551	9.3.2021 12:06	2P3 3874	pl170101	15,98	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1561	9.3.2021 13:54	6P7 5032	pl170101	19,4	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1562	9.3.2021 13:59	2P3 3874	pl170101	16,18	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1568	9.3.2021 15:26	6P8 5110	pl170101	20,44	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1571	9.3.2021 15:36	6P7 5032	pl170101	20,42	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1573	9.3.2021 15:42	2P3 3874	pl170101	16,6	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1583	10.3.2021 7:05	2P3 3874	pl170101	16,82	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1784	15.3.2021 8:29	2P3 3874	pl170101	15,3	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1822	15.3.2021 10:39	2P3 3874	pl170101	15,2	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1841	15.3.2021 12:38	2P3 3874	pl170101	14,8	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1854	15.3.2021 13:34	2P3 3874	pl170101	15,66	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1864	15.3.2021 14:27	7P4 5597	pl170101	14,2	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1876	15.3.2021 15:08	2P3 3874	pl170101	15,44	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1877	15.3.2021 15:09	6P7 5032	pl170101	16,18	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1890	15.3.2021 15:58	7P3 8073	pl170101	15,98	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1893	15.3.2021 16:13	2P3 3874	pl170101	15,74	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1894	15.3.2021 16:15	6P7 5032	pl170101	15,94	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1895	15.3.2021 16:16	7P1 2650	pl170101	16,64	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1897	15.3.2021 16:23	7AR 9042	pl170101	15,34	0	Beton - prostý	Rokycany		

0049/2020	21PA1898	15.3.2021 16:24	4K3 5042	p170101	18,82	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1900	16.3.2021 7:15	2P3 3874	p170101	15,52	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1908	16.3.2021 7:32	7P1 2650	p170101	13,34	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1904	16.3.2021 7:34	4K3 5042	p170101	16,44	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1908	16.3.2021 7:42	7P3 8073	p170101	13,72	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1910	16.3.2021 7:51	6P7 5032	p170101	15,56	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1912	16.3.2021 7:59	7P4 5597	p170101	17,78	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1913	16.3.2021 8:10	7AR 9042	p170101	17	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1914	16.3.2021 8:16	2P3 3874	p170101	15,8	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1916	16.3.2021 8:24	5AR 0448	p170101	18,24	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1919	16.3.2021 8:42	7P1 2650	p170101	15,68	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1923	16.3.2021 8:52	4K3 5042	p170101	17,28	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1924	16.3.2021 9:00	7AR 9042	p170101	16,82	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1926	16.3.2021 9:10	5AR 0448	p170101	16,26	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1928	16.3.2021 9:20	6P3 2858	p170101	18,62	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1929	16.3.2021 9:27	2P3 3874	p170101	15,9	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1931	16.3.2021 9:39	7P1 2650	p170101	16,12	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1934	16.3.2021 9:47	7P4 5596	p170101	19,56	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1938	16.3.2021 9:56	7AR 9042	p170101	15,7	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1939	16.3.2021 10:06	6P7 5032	p170101	9,4	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1942	16.3.2021 10:44	7P4 5596	p170101	19,64	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1943	16.3.2021 10:46	2P3 3874	p170101	15,96	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1944	16.3.2021 10:59	7P4 5597	p170101	17,78	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1949	16.3.2021 12:25	6P3 2858	p170101	12,54	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1952	16.3.2021 12:36	7AR 9042	p170101	12,94	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1953	16.3.2021 12:43	7P4 5597	p170101	13,58	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1956	16.3.2021 12:58	7P3 8073	p170101	13,02	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1959	16.3.2021 13:06	2P3 3874	p170101	14,78	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1960	16.3.2021 13:08	8AE 4467	p170101	13,3	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1962	16.3.2021 13:16	4K3 5042	p170101	15,04	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1963	16.3.2021 13:24	7AR 9042	p170101	16,1	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1965	16.3.2021 13:31	7P4 5596	p170101	16,02	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1966	16.3.2021 13:50	8AE 4467	p170101	15,5	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1969	16.3.2021 14:13	7AR 9042	p170101	16,86	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1971	16.3.2021 14:15	2P3 3874	p170101	14,8	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1972	16.3.2021 14:18	6P7 5032	p170101	15,18	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1973	16.3.2021 14:27	7P4 5596	p170101	17,66	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1976	16.3.2021 14:56	8AE 4467	p170101	16,9	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1979	16.3.2021 15:25	6P7 5032	p170101	14,88	0	Beton - prostý	Rokycany
0049/2020	21PA1982	16.3.2021 15:29	2P3 3874	p170101	16,76	0	Beton - prostý	Rokycany

0049/2020	21PA1984	16.3.2021 15:35	5AR 0448	p170101	14,8
0049/2020	21PA1986	16.3.2021 15:50	8AE 4467	p170101	14,36
0049/2020	21PA1987	16.3.2021 15:57	6P3 2858	p170101	15,42
0049/2020	21PA1988	16.3.2021 16:04	4K3 5042	p170101	16,36
0049/2020	21PA1989	16.3.2021 16:06	7P3 8073	p170101	11,2
0049/2020	21PA1991	16.3.2021 16:17	6P7 5032	p170101	14,96
0049/2020	21PA1993	16.3.2021 16:28	2P3 3874	p170101	16,08
0049/2020	21PA1996	16.3.2021 16:37	8AE 4467	p170101	18,5
0049/2020	21PA2001	17.3.2021 8:09	2P3 3874	p170101	14,92
0049/2020	21PA2007	17.3.2021 9:18	2P3 3874	p170101	16,54
0049/2020	21PA2014	17.3.2021 10:38	2P3 3874	p170101	17,02
0049/2020	21PA2029	17.3.2021 13:21	2P3 3874	p170101	17,16
0049/2020	21PA2036	17.3.2021 14:48	2P3 3874	p170101	16,54
0049/2020	21PA2044	17.3.2021 16:32	2P3 3874	p170101	14,86
0049/2020	21PA2046	18.3.2021 7:20	2P3 3874	p170101	15,82
0049/2020	21PA2047	18.3.2021 7:26	7P1 2650	p170101	14,42
0049/2020	21PA2049	18.3.2021 7:32	6P3 2858	p170101	17,02
0049/2020	21PA2051	18.3.2021 7:45	6P7 5032	p170101	18,14
0049/2020	21PA2053	18.3.2021 7:47	7P4 5596	p170101	20,5
0049/2020	21PA2058	18.3.2021 8:45	6P7 5032	p170101	17,48
0049/2020	21PA2059	18.3.2021 8:46	7P4 5596	p170101	21,9
0049/2020	21PA2060	18.3.2021 8:50	7P1 2650	p170101	19,38
0049/2020	21PA2062	18.3.2021 8:56	6P3 2858	p170101	19,82
0049/2020	21PA2064	18.3.2021 9:33	6P7 5032	p170101	15,94
0049/2020	21PA2066	18.3.2021 9:38	7P1 2650	p170101	17,8
0049/2020	21PA2068	18.3.2021 9:56	6P3 2858	p170101	19,14
0049/2020	21PA2072	18.3.2021 10:21	6P7 5032	p170101	17,5
0049/2020	21PA2073	18.3.2021 10:29	7P1 2650	p170101	17,62
0049/2020	21PA2075	18.3.2021 10:43	6P3 2858	p170101	20,72

[illegible]

0049/2020	21PA1344	3.3.2021 8:44	7P3 8073	pl170102	23,3	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1346	3.3.2021 9:03	7P4 5596	pl170102	22,64	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1347	3.3.2021 9:14	8AE 4467	pl170102	16,72	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1390	4.3.2021 10:01	SAR 0448	pl170102	12,78	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1470	5.3.2021 15:51	7P3 8073	pl170102	14,78	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1472	5.3.2021 16:12	7P0 4980	pl170102	14,02	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1545	9.3.2021 10:38	7P0 4980	pl170102	24,88	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1581	9.3.2021 16:36	7P4 5596	pl170102	26	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1636	10.3.2021 15:13	7P3 8073	pl170102	18,36	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1658	11.3.2021 9:26	7P4 5596	pl170102	21,74	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1660	11.3.2021 9:35	7P4 5597	pl170102	19,68	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1665	11.3.2021 10:04	SAR 0448	pl170102	19,06	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1666	11.3.2021 10:11	7P4 5596	pl170102	20,36	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1725	12.3.2021 10:07	7P3 8073	pl170102	21,6	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1726	12.3.2021 10:13	SAR 0448	pl170102	22,42	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1727	12.3.2021 10:17	7P4 5596	pl170102	23,94	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1728	12.3.2021 10:23	6P7 5032	pl170102	22,22	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1729	12.3.2021 10:26	8AE 4467	pl170102	26,24	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1730	12.3.2021 10:31	7P0 4980	pl170102	22,72	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1731	12.3.2021 10:36	7P1 2650	pl170102	21,44	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1733	12.3.2021 10:54	6P7 5032	pl170102	21,66	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1736	12.3.2021 12:12	8AE 4467	pl170102	27,3	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1737	12.3.2021 12:18	7P1 2650	pl170102	22,64	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1738	12.3.2021 12:20	7P0 4980	pl170102	20,78	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1739	12.3.2021 12:42	SAR 0448	pl170102	22	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1740	12.3.2021 12:45	6P7 5032	pl170102	21,68	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1741	12.3.2021 12:54	8AE 4467	pl170102	21,06	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1742	12.3.2021 12:57	7P0 4980	pl170102	20,98	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1743	12.3.2021 13:02	7P1 2650	pl170102	20,42	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1755	12.3.2021 15:11	7P0 4980	pl170102	18,52	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1756	12.3.2021 15:23	7P4 5596	pl170102	19,1	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1760	12.3.2021 15:46	8AE 4467	pl170102	21,78	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1762	12.3.2021 16:14	7P0 4980	pl170102	18,48	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1763	12.3.2021 16:15	7P3 8073	pl170102	18,5	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1764	12.3.2021 16:24	SAR 0448	pl170102	19,24	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1765	12.3.2021 16:32	8AE 4467	pl170102	22,26	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1768	15.3.2021 7:29	SAR 0448	pl170102	19,54	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1769	15.3.2021 7:35	7AR 9042	pl170102	19,48	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1770	15.3.2021 7:41	8AE 4467	pl170102	22,26	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1771	15.3.2021 7:49	6P7 5032	pl170102	19,26	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1773	15.3.2021 7:53	7P1 2650	pl170102	21,5	O	Cihly	Rokycany	

0049/2020	21PA1775	15.3.2021 7:58	7P3 8073	pl170102	19,5	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1776	15.3.2021 8:02	7P2 8115	pl170102	22,46	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1778	15.3.2021 8:09	4K3 5042	pl170102	20,56	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1779	15.3.2021 8:14	5AR 0448	pl170102	20,46	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1782	15.3.2021 8:20	7AR 9042	pl170102	20,12	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1785	15.3.2021 8:30	6P7 5032	pl170102	20,82	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1786	15.3.2021 8:34	7P1 2650	pl170102	21,82	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1789	15.3.2021 8:44	7P2 8115	pl170102	21,36	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1791	15.3.2021 8:54	8AE 4467	pl170102	28,52	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1793	15.3.2021 9:00	4K3 5042	pl170102	23,98	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1795	15.3.2021 9:07	7P1 2650	pl170102	23,8	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1798	15.3.2021 9:20	7P2 8115	pl170102	25,28	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1800	15.3.2021 9:30	5AR 0448	pl170102	22,78	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1804	15.3.2021 9:37	8AE 4467	pl170102	25,74	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1805	15.3.2021 9:38	7AR 9042	pl170102	22,14	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1808	15.3.2021 9:52	7P1 2650	pl170102	24,1	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1812	15.3.2021 10:07	7P2 8115	pl170102	25,7	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1817	15.3.2021 10:17	8AE 4467	pl170102	26,2	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1820	15.3.2021 10:26	7P1 2650	pl170102	25	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1821	15.3.2021 10:37	6P7 5032	pl170102	22,16	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1824	15.3.2021 10:41	7P4 5597	pl170102	20,46	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1828	15.3.2021 10:54	8AE 4467	pl170102	26,44	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1836	15.3.2021 12:20	4K3 5042	pl170102	23,92	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1848	15.3.2021 13:13	4K3 5042	pl170102	21,1	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1852	15.3.2021 13:26	5AR 0448	pl170102	22,48	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1853	15.3.2021 13:31	7P4 5597	pl170102	20,08	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1855	15.3.2021 13:37	7P2 8115	pl170102	21,32	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1856	15.3.2021 13:40	8AE 4467	pl170102	23,42	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1859	15.3.2021 14:06	4K3 5042	pl170102	19,9	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1860	15.3.2021 14:09	7AR 9042	pl170102	19,96	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1861	15.3.2021 14:11	7P1 2650	pl170102	20,52	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1862	15.3.2021 14:12	7P3 8073	pl170102	20,7	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1863	15.3.2021 14:16	5AR 0448	pl170102	19,34	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1866	15.3.2021 14:38	7P2 8115	pl170102	21,28	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1867	15.3.2021 14:45	7AR 9042	pl170102	22,44	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1869	15.3.2021 14:48	8AE 4467	pl170102	19,98	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1871	15.3.2021 14:53	4K3 5042	pl170102	24,46	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1873	15.3.2021 15:01	7P3 8073	pl170102	20,94	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1879	15.3.2021 15:13	7P1 2650	pl170102	22,44	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1880	15.3.2021 15:14	5AR 0448	pl170102	23,44	0	Chly	Rokycany
0049/2020	21PA1882	15.3.2021 15:20	7P4 5597	pl170102	22,36	0	Chly	Rokycany



0049/2020	21PA1884	15.3.2021 15:32	4K3 5042	p170102	23,52	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1885	15.3.2021 15:38	7P2 8115	p170102	24,56	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1886	15.3.2021 15:39	7AR 9042	p170102	21,64	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1889	15.3.2021 15:57	8AE 4467	p170102	22,9	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1995	16.3.2021 16:36	7P4 5596	p170102	24,52	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2022	17.3.2021 12:42	7P4 5596	p170102	23,82	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2023	17.3.2021 12:42	7P3 8073	p170102	19,94	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2030	17.3.2021 13:33	7P4 5596	p170102	21,58	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2031	17.3.2021 13:39	7P3 8073	p170102	19,28	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2043	17.3.2021 16:29	7P4 5596	p170102	25,82	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2087	18.3.2021 14:14	6P7 5032	p170102	20,62	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2089	18.3.2021 14:23	6P3 2858	p170102	24,02	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2090	18.3.2021 14:35	7P4 5596	p170102	25,12	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2091	18.3.2021 14:45	7P1 2650	p170102	25,1	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2092	18.3.2021 15:06	6P7 5032	p170102	21,58	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2093	18.3.2021 15:21	6P3 2858	p170102	22	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2095	18.3.2021 15:36	7P4 5596	p170102	22,82	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2131	19.3.2021 13:22	7P4 5596	p170102	25,02	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2137	19.3.2021 13:44	7P3 8073	p170102	22,46	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2138	19.3.2021 14:02	7P4 5596	p170102	26,18	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2142	19.3.2021 14:59	7P3 8073	p170102	22,46	0	Cihly	Rokycany	
					2511,1				2511,1
0049/2020	21PA1112	23.2.2021 7:58	4AB 0595	p1701zb	26,12	0	Železobeton	Rokycany	ODT 00-00
0049/2020	21PA1115	23.2.2021 8:57	4AB 0595	p1701zb	25,64	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1118	23.2.2021 10:01	4AB 0595	p1701zb	28,1	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1120	23.2.2021 10:20	4K5 9350	p1701zb	18,1	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1124	23.2.2021 12:24	4AB 0595	p1701zb	17,48	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1126	23.2.2021 13:26	4AB 0595	p1701zb	17,32	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1132	23.2.2021 14:26	4AB 0595	p1701zb	29,2	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1133	23.2.2021 14:53	4K5 9350	p1701zb	26,9	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1134	23.2.2021 15:47	4AB 0595	p1701zb	27,16	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1137	23.2.2021 16:41	7P4 5596	p1701zb	18,54	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1138	23.2.2021 16:49	7P3 8073	p1701zb	15,26	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1142	24.2.2021 8:34	4AB 0595	p1701zb	24,1	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1148	24.2.2021 17:46	7P4 5596	p1701zb	20,32	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1156	24.2.2021 16:56	7P3 8073	p1701zb	21,76	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1157	24.2.2021 16:58	7P0 4980	p1701zb	23,62	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1162	25.2.2021 13:02	7P7 3740	p1701zb	17	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1163	25.2.2021 13:07	8AE 4467	p1701zb	20,6	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1164	25.2.2021 13:10	3P4 2151	p1701zb	19,86	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1165	25.2.2021 13:18	7P1 2650	p1701zb	17,7	0	Železobeton	Rokycany	

0049/2020	21PA1169	25.2.2021 13:41	7P0 4980	pl1701zb	23,74	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1174	25.2.2021 14:03	3P4 2151	pl1701zb	23,42	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1320	2.3.2021 10:54	3P4 2151	pl1701zb	17,32	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1325	2.3.2021 12:29	7P4 5596	pl1701zb	14,36	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1328	2.3.2021 12:48	3P4 2151	pl1701zb	17,52	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1329	2.3.2021 13:21	7P3 8073	pl1701zb	14,06	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1368	3.3.2021 12:55	7P4 5596	pl1701zb	20,28	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1369	3.3.2021 13:10	7P7 3740	pl1701zb	18,64	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1535	9.3.2021 9:48	6P3 2858	pl1701zb	15,6	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1538	9.3.2021 10:19	7P3 8073	pl1701zb	17,04	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1540	9.3.2021 10:22	7P4 5596	pl1701zb	21,7	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1574	9.3.2021 15:53	7P4 5596	pl1701zb	19,48	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1577	9.3.2021 16:22	7P3 8073	pl1701zb	15,12	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1578	9.3.2021 16:24	7P0 4980	pl1701zb	19,2	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1651	11.3.2021 8:40	7P4 5596	pl1701zb	21,72	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1652	11.3.2021 8:44	7P4 5597	pl1701zb	19,52	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1654	11.3.2021 9:08	7P0 4980	pl1701zb	13,22	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1657	11.3.2021 9:24	5AR 0448	pl1701zb	16,02	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1667	11.3.2021 10:15	7P4 5597	pl1701zb	15,22	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1669	11.3.2021 10:47	5AR 0448	pl1701zb	14,1	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1671	11.3.2021 10:56	7P4 5596	pl1701zb	17,98	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1672	11.3.2021 11:07	7P4 5597	pl1701zb	15,48	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1677	11.3.2021 12:27	5AR 0448	pl1701zb	13,7	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1679	11.3.2021 12:56	7P4 5596	pl1701zb	13,7	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1680	11.3.2021 13:11	5AR 0448	pl1701zb	13,18	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1685	11.3.2021 13:56	7P4 5596	pl1701zb	14,1	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1686	11.3.2021 14:18	5AR 0448	pl1701zb	13,98	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1689	11.3.2021 14:57	7P4 5597	pl1701zb	13,7	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1690	11.3.2021 15:14	5AR 0448	pl1701zb	15,4	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1691	11.3.2021 15:35	7P4 5597	pl1701zb	13,62	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1692	11.3.2021 15:48	7P4 5596	pl1701zb	15,28	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1693	11.3.2021 16:06	5AR 0448	pl1701zb	16,42	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1694	11.3.2021 16:19	7P0 4980	pl1701zb	14,54	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1695	11.3.2021 16:30	7P4 5596	pl1701zb	17,48	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1703	12.3.2021 7:44	5AR 0448	pl1701zb	14,08	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1788	15.3.2021 8:36	7P3 8073	pl1701zb	19,32	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1790	15.3.2021 8:52	5AR 0448	pl1701zb	21,22	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1794	15.3.2021 9:01	7AR 9042	pl1701zb	19,54	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1797	15.3.2021 9:16	7P3 8073	pl1701zb	21,08	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1802	15.3.2021 9:35	2P3 3874	pl1701zb	15,24	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1803	15.3.2021 9:36	7P4 5597	pl1701zb	15,94	0	Železobeton	Rokycany	

0049/2020	21PA1806	15.3.2021 9:45	4K3 5042	pl1701zb	18,92	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1809	15.3.2021 9:53	7P3 8073	pl1701zb	17,36	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1814	15.3.2021 10:10	5AR 0448	pl1701zb	19,78	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1815	15.3.2021 10:12	7P4 5597	pl1701zb	18,48	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1818	15.3.2021 10:18	7AR 9042	pl1701zb	19,6	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1819	15.3.2021 10:20	4K3 5042	pl1701zb	22,3	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1823	15.3.2021 10:40	7P3 8073	pl1701zb	18,76	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1825	15.3.2021 10:48	5AR 0448	pl1701zb	21,3	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1829	15.3.2021 10:56	7AR 9042	pl1701zb	19,92	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1832	15.3.2021 12:03	7P1 2650	pl1701zb	23,2	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1835	15.3.2021 12:19	7P3 8073	pl1701zb	21,18	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1838	15.3.2021 12:26	7AR 9042	pl1701zb	19,66	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1839	15.3.2021 12:30	7P4 5597	pl1701zb	19,88	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1840	15.3.2021 12:36	7P2 8115	pl1701zb	19,02	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1842	15.3.2021 12:40	5AR 0448	pl1701zb	20,28	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1843	15.3.2021 12:46	6P7 5032	pl1701zb	20,38	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1845	15.3.2021 13:00	8AE 4467	pl1701zb	23,86	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1847	15.3.2021 13:07	7P1 2650	pl1701zb	19,9	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1850	15.3.2021 13:20	7AR 9042	pl1701zb	19,86	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1896	15.3.2021 16:21	5AH 0448	pl1701zb	17,32	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1981	16.3.2021 15:27	7AR 9042	pl1701zb	16,66	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1992	16.3.2021 16:19	5AR 0448	pl1701zb	15,32	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2035	17.3.2021 14:38	7P4 5596	pl1701zb	23,7	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2038	17.3.2021 14:58	7P3 8073	pl1701zb	18,54	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2039	17.3.2021 15:40	7P4 5596	pl1701zb	21,3	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2042	17.3.2021 16:28	7P3 8073	pl1701zb	19,74	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2055	18.3.2021 8:08	7P1 2650	pl1701zb	16,4	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2056	18.3.2021 8:11	6P3 2858	pl1701zb	18,42	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2081	18.3.2021 12:42	7P1 2650	pl1701zb	19,52	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2082	18.3.2021 12:50	6P3 2858	pl1701zb	19,86	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2083	18.3.2021 13:00	6P7 5032	pl1701zb	20,38	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2086	18.3.2021 13:46	7P1 2650	pl1701zb	19,28	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2110	19.3.2021 9:44	7P4 5596	pl1701zb	20,68	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2112	19.3.2021 9:58	7P3 8073	pl1701zb	18,28	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2113	19.3.2021 9:59	5AE 9013	pl1701zb	19,38	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2116	19.3.2021 10:46	7P3 8073	pl1701zb	20,04	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2117	19.3.2021 10:51	5AE 9013	pl1701zb	19	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2119	19.3.2021 10:59	7P4 5596	pl1701zb	23,66	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2124	19.3.2021 12:25	7P1 2650	pl1701zb	22,38	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2126	19.3.2021 12:39	6P3 2858	pl1701zb	21,14	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2127	19.3.2021 12:42	7P3 8073	pl1701zb	21,18	0	Železobeton	Rokycany	

0049/2020	21PA2154	22.3.2021 7:32	7P7 3740	pl1701zb	17,14	0	Železobetón	Rokycany	
0049/2020	21PA2155	22.3.2021 7:44	7P4 5596	pl1701zb	18,7	0	Železobetón	Rokycany	
0049/2020	21PA2157	22.3.2021 7:54	6P3 2858	pl1701zb	18,46	0	Železobetón	Rokycany	
0049/2020	21PA2162	22.3.2021 8:21	7P7 3740	pl1701zb	17,18	0	Železobetón	Rokycany	
0049/2020	21PA2165	22.3.2021 8:36	7P1 2650	pl1701zb	18,76	0	Železobetón	Rokycany	
					2013,1				OD 00-00



04 / 21

Zakázka: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Původce odpadu/Plátce: BIGGEST construct s.r.o.


Uložení odpadu: RECYKLAČ, Zeyerova ulice, 337 01 Rokycany

ODI 00-00

Zakázka	Číslo vázního listku	Datum a čas	RZ	Kód	Hmotnost [t]	kg	Odpad	Jložení	Sorty	Objekt
0049/2020	Z1PA2307	23.3.2021 15:34	6P3 2858	pl1701zb	19,76	0	Železobeton	Rokycany	19,76	
0049/2020	Z1PA2308	23.3.2021 15:46	7P4 5596	pl1701zb	21,02	0	Železobeton	Rokycany	21,02	
0049/2020	Z1PA2312	23.3.2021 16:23	4K3 5042	pl1701zb	19,76	0	Železobeton	Rokycany	19,76	
0049/2020	Z1PA2313	23.3.2021 16:24	8P1 9881	pl1701zb	21,54	0	Železobeton	Rokycany	21,54	
0049/2020	Z1PA2314	23.3.2021 16:35	7P4 5596	pl1701zb	19,82	0	Železobeton	Rokycany	19,82	
0049/2020	Z1PA2316	24.3.2021 8:29	7P3 8073	pl1701zb	18,22	0	Železobeton	Rokycany	18,22	
0049/2020	Z1PA2320	24.3.2021 9:22	7P3 8073	pl1701zb	20,14	0	Železobeton	Rokycany	20,14	
0049/2020	Z1PA2321	24.3.2021 9:48	7P5 4066	pl1701zb	20,46	0	Železobeton	Rokycany	20,46	
0049/2020	Z1PA2323	24.3.2021 10:22	7P3 8073	pl1701zb	20,26	0	Železobeton	Rokycany	20,26	
0049/2020	Z1PA2324	24.3.2021 10:43	7P5 4066	pl1701zb	24,28	0	Železobeton	Rokycany	24,28	
0049/2020	Z1PA2326	24.3.2021 10:49	5AE 9013	pl1701zb	17,94	0	Železobeton	Rokycany	17,94	
0049/2020	Z1PA2327	24.3.2021 10:56	5AR 0448	pl1701zb	19,92	0	Železobeton	Rokycany	19,92	
0049/2020	Z1PA2328	24.3.2021 10:58	7P1 2650	pl1701zb	24,02	0	Železobeton	Rokycany	24,02	
0049/2020	Z1PA2331	24.3.2021 12:22	7P5 4066	pl1701zb	21,9	0	Železobeton	Rokycany	21,9	
0049/2020	Z1PA2332	24.3.2021 12:27	7P1 2650	pl1701zb	22,3	0	Železobeton	Rokycany	22,3	
0049/2020	Z1PA2333	24.3.2021 12:37	7P0 1350	pl1701zb	19,88	0	Železobeton	Rokycany	19,88	
0049/2020	Z1PA2334	24.3.2021 12:40	5AR 0448	pl1701zb	21,08	0	Železobeton	Rokycany	21,08	
0049/2020	Z1PA2337	24.3.2021 13:06	7P5 4066	pl1701zb	20,9	0	Železobeton	Rokycany	20,9	
0049/2020	Z1PA2340	24.3.2021 13:13	7P1 2650	pl1701zb	23,72	0	Železobeton	Rokycany	23,72	
0049/2020	Z1PA2342	24.3.2021 13:17	7P0 1350	pl1701zb	24,82	0	Železobeton	Rokycany	24,82	
0049/2020	Z1PA2343	24.3.2021 13:27	5AR 0448	pl1701zb	23,28	0	Železobeton	Rokycany	23,28	
0049/2020	Z1PA2413	25.3.2021 14:32	7P6 1213	pl1701zb	22	0	Železobeton	Rokycany	22	
0049/2020	Z1PA2434	26.3.2021 7:34	7P6 1213	pl1701zb	13,8	0	Železobeton	Rokycany	13,8	
0049/2020	Z1PA2435	26.3.2021 7:52	6P7 5032	pl1701zb	16,94	0	Železobeton	Rokycany	16,94	
0049/2020	Z1PA2438	26.3.2021 8:17	7P6 1213	pl1701zb	17,62	0	Železobeton	Rokycany	17,62	
0049/2020	Z1PA2444	26.3.2021 8:38	6P7 5032	pl1701zb	15,7	0	Železobeton	Rokycany	15,7	
0049/2020	Z1PA2448	26.3.2021 8:55	7P6 1213	pl1701zb	19,32	0	Železobeton	Rokycany	19,32	
0049/2020	Z1PA2456	26.3.2021 10:02	6P7 5032	pl1701zb	17,52	0	Železobeton	Rokycany	17,52	
0049/2020	Z1PA2462	26.3.2021 10:43	6P7 5032	pl1701zb	20,7	0	Železobeton	Rokycany	20,7	
0049/2020	Z1PA2465	26.3.2021 12:17	7P1 2650	pl1701zb	16,4	0	Železobeton	Rokycany	16,4	
0049/2020	Z1PA2468	26.3.2021 12:40	7P6 1213	pl1701zb	19,14	0	Železobeton	Rokycany	19,14	
0049/2020	Z1PA2469	26.3.2021 12:44	6P7 5032	pl1701zb	20,04	0	Železobeton	Rokycany	20,04	
0049/2020	Z1PA2475	26.3.2021 13:36	7P6 1213	pl1701zb	26,78	0	Železobeton	Rokycany	26,78	

0049/2020	21PA2477	26.3.2021 13:46	6P7 5032	p117012b	19,42	O	Železobetón	Rokycany	19,42
0049/2020	21PA2492	29.3.2021 7:43	7AR 9042	p117012b	18,12	O	Železobetón	Rokycany	18,12
0049/2020	21PA2493	29.3.2021 7:46	6P3 2858	p117012b	20,32	O	Železobetón	Rokycany	20,32
0049/2020	21PA2494	29.3.2021 7:56	5AE 9478	p117012b	18,52	O	Železobetón	Rokycany	18,52
0049/2020	21PA2495	29.3.2021 7:59	7P1 2650	p117012b	19,52	O	Železobetón	Rokycany	19,52
0049/2020	21PA2496	29.3.2021 8:01	3P4 2151	p117012b	22,38	O	Železobetón	Rokycany	22,38
0049/2020	21PA2498	29.3.2021 8:04	6P1 6216	p117012b	20,32	O	Železobetón	Rokycany	20,32
0049/2020	21PA2500	29.3.2021 8:08	6P7 5032	p117012b	17,18	O	Železobetón	Rokycany	17,18
0049/2020	21PA2501	29.3.2021 8:11	8P1 9881	p117012b	19,18	O	Železobetón	Rokycany	19,18
0049/2020	21PA2502	29.3.2021 8:31	6P3 2858	p117012b	17,62	O	Železobetón	Rokycany	17,62
0049/2020	21PA2503	29.3.2021 8:38	7AR 9042	p117012b	17,68	O	Železobetón	Rokycany	17,68
0049/2020	21PA2506	29.3.2021 8:45	7P1 2650	p117012b	18,98	O	Železobetón	Rokycany	18,98
0049/2020	21PA2508	29.3.2021 8:49	5AE 9478	p117012b	15,12	O	Železobetón	Rokycany	15,12
0049/2020	21PA2510	29.3.2021 8:53	3P4 2151	p117012b	21,82	O	Železobetón	Rokycany	21,82
0049/2020	21PA2511	29.3.2021 9:02	6P1 6216	p117012b	21,36	O	Železobetón	Rokycany	21,36
0049/2020	21PA2512	29.3.2021 9:09	6P7 5032	p117012b	15,52	O	Železobetón	Rokycany	15,52
0049/2020	21PA2515	29.3.2021 9:20	6P3 2858	p117012b	16,26	O	Železobetón	Rokycany	16,26
0049/2020	21PA2517	29.3.2021 9:27	7AR 9042	p117012b	14,52	O	Železobetón	Rokycany	14,52
0049/2020	21PA2518	29.3.2021 9:32	7P1 2650	p117012b	18,2	O	Železobetón	Rokycany	18,2
0049/2020	21PA2521	29.3.2021 9:45	8P1 9881	p117012b	19,54	O	Železobetón	Rokycany	19,54
0049/2020	21PA2522	29.3.2021 9:49	3P4 2151	p117012b	21,46	O	Železobetón	Rokycany	21,46
0049/2020	21PA2523	29.3.2021 9:51	5AE 9478	p117012b	18,44	O	Železobetón	Rokycany	18,44
0049/2020	21PA2524	29.3.2021 9:57	6P1 6216	p117012b	23,98	O	Železobetón	Rokycany	23,98
0049/2020	21PA2526	29.3.2021 10:12	7AR 9042	p117012b	13,46	O	Železobetón	Rokycany	13,46
					1 119,90				
0049/2020	21PA2555	30.3.2021 7:24	7P1 2650	p117012b	19,64	O	Železobetón	Rokycany	19,64
0049/2020	21PA2556	30.3.2021 7:36	6P7 5032	p117012b	18,84	O	Železobetón	Rokycany	18,84
0049/2020	21PA2562	30.3.2021 8:28	5AE 9013	p117012b	16,94	O	Železobetón	Rokycany	16,94
0049/2020	21PA2564	30.3.2021 8:48	7P1 2650	p117012b	20,86	O	Železobetón	Rokycany	20,86
0049/2020	21PA2565	30.3.2021 8:50	6P7 5032	p117012b	18,42	O	Železobetón	Rokycany	18,42
0049/2020	21PA2566	30.3.2021 8:57	7P3 8073	p117012b	16,58	O	Železobetón	Rokycany	16,58
0049/2020	21PA2567	30.3.2021 9:25	5AE 9013	p117012b	15,78	O	Železobetón	Rokycany	15,78
0049/2020	21PA2568	30.3.2021 9:43	6P7 5032	p117012b	18,08	O	Železobetón	Rokycany	18,08
0049/2020	21PA2571	30.3.2021 10:16	7P1 2650	p117012b	17,12	O	Železobetón	Rokycany	17,12
0049/2020	21PA2572	30.3.2021 10:18	7P3 8073	p117012b	21,9	O	Železobetón	Rokycany	21,9
0049/2020	21PA2573	30.3.2021 10:26	5AE 9013	p117012b	17,52	O	Železobetón	Rokycany	17,52
0049/2020	21PA2578	30.3.2021 12:30	7P3 8073	p117012b	19,18	O	Železobetón	Rokycany	19,18
0049/2020	21PA2579	30.3.2021 12:43	6P7 5032	p117012b	19,5	O	Železobetón	Rokycany	19,5
0049/2020	21PA2580	30.3.2021 12:44	7P1 2650	p117012b	20,8	O	Železobetón	Rokycany	20,8
0049/2020	21PA2589	30.3.2021 13:42	7P3 8073	p117012b	15,94	O	Železobetón	Rokycany	15,94
0049/2020	21PA2595	30.3.2021 14:16	7P1 2650	p117012b	18,64	O	Železobetón	Rokycany	18,64

0049/2020	21PA2596	30.3.2021 14:35	5AE 9013	pl1701zb	20,44	O	Železobeton	Rokycany	20,44	
0049/2020	21PA2597	30.3.2021 15:08	7P3 8073	pl1701zb	22,84	O	Železobeton	Rokycany	22,84	
0049/2020	21PA2685	1.4.2021 12:47	7P4 5596	pl1701zb	19,92	O	Železobeton	Rokycany	19,92	
0049/2020	21PA2686	1.4.2021 12:54	7P1 2650	pl1701zb	21,66	O	Železobeton	Rokycany	21,66	
					380,6					
0049/2020	21PA2282	23.3.2021 13:35	7P3 8073	pl170102	21,82	O	Cihly	Rokycany	21,82	
0049/2020	21PA2283	23.3.2021 13:43	7P4 5596	pl170102	25,88	O	Cihly	Rokycany	25,88	
0049/2020	21PA2505	29.3.2021 8:43	7P3 8073	pl170102	16,42	O	Cihly	Rokycany	16,42	
0049/2020	21PA2746	2.4.2021 13:35	4AT 3262	pl170102	23,38	O	Cihly	Rokycany	23,38	
0049/2020	21PA2748	2.4.2021 13:43	7P3 8073	pl170102	21,16	O	Cihly	Rokycany	21,16	
0049/2020	21PA2945	9.4.2021 16:01	7AR 9042	pl170102	10,56	O	Cihly	Rokycany	10,56	
0049/2020	21PA2976	12.4.2021 10:10	4AT 3262	pl170102	12,9	O	Cihly	Rokycany	12,9	
0049/2020	21PA3005	12.4.2021 14:10	4AT 3262	pl170102	11,02	O	Cihly	Rokycany	11,02	
0049/2020	21PA3012	12.4.2021 15:24	4AT 3262	pl170102	11,52	O	Cihly	Rokycany	11,52	
0049/2020	21PA3018	12.4.2021 16:30	4AT 3262	pl170102	9,22	O	Cihly	Rokycany	9,22	
0049/2020	21PA3030	13.4.2021 8:52	7P1 2650	pl170102	10,12	O	Cihly	Rokycany	10,12	
0049/2020	21PA3036	13.4.2021 9:36	7P1 2650	pl170102	10,68	O	Cihly	Rokycany	10,68	
0049/2020	21PA3042	13.4.2021 10:36	7P1 2650	pl170102	13,7	O	Cihly	Rokycany	13,7	
0049/2020	21PA3055	13.4.2021 13:18	7P1 2650	pl170102	12,02	O	Cihly	Rokycany	12,02	
0049/2020	21PA3074	13.4.2021 16:41	5AE 9013	pl170102	10,36	O	Cihly	Rokycany	10,36	
0049/2020	21PA3090	14.4.2021 8:49	7P1 2650	pl170102	14,7	O	Cihly	Rokycany	14,7	
0049/2020	21PA3098	14.4.2021 10:02	7P1 2650	pl170102	12,02	O	Cihly	Rokycany	12,02	
0049/2020	21PA3111	14.4.2021 13:27	7P1 2650	pl170102	12,86	O	Cihly	Rokycany	12,86	
0049/2020	21PA3123	15.4.2021 7:46	7P1 2650	pl170102	12,54	O	Cihly	Rokycany	12,54	
0049/2020	21PA3127	15.4.2021 8:45	7P1 2650	pl170102	11,36	O	Cihly	Rokycany	11,36	
0049/2020	21PA3136	15.4.2021 12:12	7P1 2650	pl170102	13,52	O	Cihly	Rokycany	13,52	
0049/2020	21PA3238	19.4.2021 14:26	5AE 9013	pl170102	14,12	O	Cihly	Rokycany	14,12	
					311,88					



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

ODT SO 00-00 demolice

15	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
----	--

Vážní listky03/2021

Plast (t)
9,18
5,98
7,50
7,70
6,78
6,24
43,38

Již provedeno 0,00 (t)

Vícepráce 03/21 43,38 (t)04/2021

Plast (t)
0,50 (t)

Již provedeno 0,40 (t)

Vícepráce 04/21 0,10 (t)

Vícepráce celkem	43,48 (t)
-------------------------	------------------

03/21

ODT - 00 - 00 PLAST

ODT

Západočeské komunální služby a.s.

Západočeské komunální služby
Město Písek Group

Vážný listek / Dodací list

Č. smlouvy:	3591005105	Vlastní číslo:	3591005105	Č. zakázky:	35219300037520	Č. vážení:	35219602001041-01
Datum:	2.2.2021	Čas příjezdu:	11:52	Čas odjezdu:	11:53		
Brutto (t):	27,580	Tárá/Výstupní vážení (t):	18,400	Netto (t):	9,180		
Katalog. číslo:	200307	Objemný odpad		Kategorie:	O		
Specifikace:	bez specifikace						
KN celn. saz.:							
Poznámka:	iVětrání - PŘEPO SLONOVY						
Zákazník dodavatele:				ZKS-SM-Vysoká			
Dopravce:	MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191		Dodavatel: RECYKLÁČ s.r.o. recyklace Borská 301 00 Pízeň IČ: 24293563 IČZ: CZP01177		Odběratel: Západočeské komunální služby a.s. areál sklárky Vysoká 334 41 Dobřany IČ: 25217348 IČZ: CZP00956 Jméno: [REDACTED]		
Jméno:	RZ: 5P01093		Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:				
Jméno, podpis:	[REDACTED]						

PLAST

007 00-00

Západočeské komunální služby a.s.

Západočeské komunální služby
Krajské podzemní skupina

Vážený lístek / Dodací list

Č. smlouvy:	3591005105	Vlastní číslo:	3591005105	Č. zakázky:	352193000041810	Č. vážení:	35219602001176-01
Datum:	5.2.2021	Čas příjezdu:	10:19	Čas odjezdu:	10:19		
Brutto (t):	24,380	Táara/Výstupní vážení (t):	18,400	Netto (t):	5,980		
Katalog. číslo:	200307	Objemný odpad		Kategorie:	O		
Specifikace:	bez specifikace						
KN celn. saz.:							
Poznámka:	VÝZVĚNA - DĚDO SLOVANY						
Zákazník dodavatele:				ZKS-SM-Vysoká			
Dopravce:	MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191		Dodavatel:		RECYKLÁČ s.r.o. recyklace Borská 301 00 Plzeň IČ: 24293563 IČZ: CZP01177		Odběratel:
Jméno:	RZ: 5P01093				Západočeské komunální služby a.s. areál skládky Vysoká 334 41 Dobřany IČ: 25217348 IČZ: CZP00956		
Čestně prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							

00-000000

Západočeské komunální služby
Marlux Pederson Group

Č. smlouvy: 3591005105		Vlastní číslo: 3591005105		Č. zakázky: 35219300035940		Č. vážení: 35219602000981-01	
Datum:	1.2.2021	Čas příjezdu:	10:31	Čas odjezdu:	10:31		
Brutto (t):	25,900	Tárá/Výstupní vážení (t):	18,400	Netto (t):	7,500		
Katalog, číslo:	200307	Objemný odpad					
Specifikace:	bez specifikace						
KN celn. saz.:							
Poznámka:	DODAVATEL - DOPROSTAVY						
Zákazník			ZKS-SM-Vysoká				
dodavatele:							
Dopravce:	MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191		Dodavatel: RECYKLÁČ s.r.o. recyklace Borská 301 00 Plzeň IČ: 24293563 IČZ: CZP01177		Odběratel: Západočeské komunální služby a.s. areál skládky Vysoká 334 41 Dobřany IČ: 25217348 IČZ: CZP00956		
Jméno:	RZ: 5P01093						
Čestně prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							

PLAST

001 00-00

Váží lístek / Dodací list

Západočeské komunální služby
Moravia Region Group

Č. smlouvy: 3591005105		Vlastní číslo: 3591005105		Č. zakázky: 35219300037365		Č. vážení: 35219602001007-01	
Datum:	1.2.2021	Čas příjezdu:	14:05	Čas odjezdu:	14:05		
Brutto (t):	26,100	Tára/Výstupní vážení (t):	18,400	Netto (t):	7,700		
Katalog. číslo:	200307	Objemný odpad		Kategorie:	O		
Specifikace:	bez specifikace						
KN celn. saz.:							
Poznámka:	VÝROČNÍ - DEPLOVANY						
Zákazník dodavatele:				ZKS-SM-Vysoká			
Dodavce: MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191		Dodavatel: RECYKLÁČ s.r.o. recyklace Borská 301 00 Plzeň IČ: 24293563 IČZ: CZP01177		Odběratel: Západočeské komunální služby a.s. areál skládky Vysoká 334 41 Dobřany IČ: 25217348 IČZ: CZP00956			
Jméno: RZ: 5P01093							
Česné prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							

PLAST

00 - 00

Váží listek / Dodací list

Západočeské komunální služby
Moravia Federation Group

Č. smlouvy: 3591005105		Vlastní číslo: 3591005105		Č. zakázky: 35219300035995		Č. vážení: 35219602000995-01	
Datum: 1.2.2021		Čas příjezdu: 12:20		Čas odjezdu: 12:20			
Brutto (t): 25,180		Táara/Výstupní vážení (t): 18,400		Netto (t): 6,780			
Katalog. číslo: 200307	Objemný odpad			Kategorie: O			
Specifikace: bez specifikace							
KN celn. saz.:							
Poznámka: <i>WZORKA - DEPOTOVNA</i>							
Zákazník dodavatele:		ZKS-SM-Vysoká					
Dopravce: MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191		Dodavatel: RECYKLÁČ s.r.o.recyklace Borská 301 00 Plzeň IČ: 24293563 IČZ: CZP01177		Odběratel: Západočeské komunální služby a.s. areál sklárky Vysoká 334 41 Dobřany IČ: 25217348 IČZ: CZP00956			
Jméno: RZ: 5P01093							
Čestně prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							

PLAST

047 00-00

Západočeské komunální služby a.s.

Západočeské komunální služby
Marketing & Distribution Group

Vážený listek / Dodací list

Č. smlouvy: 3591005105		Vlastní číslo: 3591005105		Č. zakázky: 35219300037401		Č. vážení: 35219602001021-01	
Datum: 1.2.2021		Čas příjezdu: 15:48		Čas odjezdu: 15:48			
Brutto (t): 24,640		Tárá/Výstupní vážení (t): 18,400		Netto (t): 6,240			
Katalog. číslo: 200307	Objemný odpad			Kategorie: O			
Specifikace: bez specifikace							
KN celn. saz.:							
Poznámka: <i>10201111 - Písek - Sčítání</i>							
Zákazník dodavatele:		ZKS-SM-Vysoká					
Dodavce: MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191		Dodavatel: RECYKLÁČ s.r.o. recyklace Borská 301 00 Plzeň IČ: 24293563 IČZ: CZP01177		Odběratel: Západočeské komunální služby a.s. areál skládky Vysoká 334 41 Dobřany IČ: 25217348 IČZ: CZP00956			
Jméno: RZ: 5P01093							
Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							

ODT 00-00

PAST

04/24

Váží listek / Dodací list

Marius Pedersen

Č. smlouvy: 1091048942 Vlastní číslo: 57 FL35910046 Č. zakázky: 10219302046936 Č. vážení: 10219618010484-01

Datum: 12.3.2021 Čas příjezdu: 14:27 Čas odjezdu: 14:28

Brutto (t): 8,740 Tara/Výstupní vážení (t): 8,240 Netto (t): 0,500

Katalog. číslo: 200307 Objemný odpad Kategorie: O

Specifikace: podnikatelské

KN celh. saz.:

Poznámka:

Zákazník dodavatele: MPVY-SOO3-Vysoká

Dopravce:

BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40A
30100 Plzeň
IČ: 05278627

Jméno: RZ: 3AP9245

Čestně prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:

Jméno, podpis:

Dodavatel:

BIGGEST construct s.r.o.činnosti v
ORP 3209 Plzeň
Plzeň
301 00 Plzeň
IČ: 05278627
IČP: 3209

Odběratel:

Marius Pedersen a.s.
Dobřany
334 41 Dobřany
IČ: 42194920
IČZ: CZP00655

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.	
IČ: 000 14 915	
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Vedoucí společník	
BERGER BOHEMIA a.s.	
TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika	
IČ: 027 65 055	
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice	
Třetí společník	
Druhý společník	
IČ:453 57 269	
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň	

16	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 602
----	--

Vážní listky

04/2021

Izolace (t)	9,70
	8,22
	9,30
	9,58
	36,80

Součet 36,80 (t)

Již provedeno 1,40 (t)

Vicepráce 04/21 35,40 (t)

Vicepráce celkem 35,40 (t)

04/21

047 00-00 61-00-00

Vážení listek / Dodací list

Č. smlouvy: 1091048942		Vlastní číslo: FL35910046		Č. zakázky: 10219301383055		Č. vážení: 10219618006272-01	
Datum: 12.3.2021		Čas příjezdu: 7:20		Čas odjezdu: 0:00			
Brutto (t): 27,800		Táha/Výstupní vážení (t): 13,040		Netto (t): 9,760			
Katalog. číslo: 200307		Objemný odpad		Kategorie: 0			
Specifikace: podnikatelé							
KN celn. saz.:							
Poznámka:							
Zákazník dodavatele:		MPVY-SOO3-Vysoká					
Dodavatel: MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191		Dodavatel: BIGGEST construct s.r.o. činnosti v ORP 3209 Pízeň Pízeň 301 00 Pízeň IČ: 05278627 IČP: 3209		Odběratel: Marius Pedersen a.s. Dobřany 334 41 Dobřany IČ: 42194929 IČZ: CZP00655 Jméno:			
Jméno: RZ: 5P01093							
Čestně prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							

007 00-00 1200405

1200405 1200405

Vážený kštek / Dodací list

Č. smlouvy: 1091048942		Vlastní číslo: 57		FL35910046		Č. zakázky: 10219301385427		Č. vážení: 10219301006241-01	
Datum: 12.3.2021		Čas příjezdu: 8:36		Čas odjezdu: 11:00					
Brutto (t): 26,260		Táza/Výstupní vážení (t): 18,040		Netto (t): 8,220					
Katalog. číslo: 200307		Objemný odpad		Kategorie: 0					
Specifikace: podnikatelé									
KN celn. saz.:									
Poznámka:									
Zákazník dodavatele:		MPVY-S003-Vysoká							
Dopravce: MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191		Dodavatel: BIGGEST construct s.r.o.činnosti v ORP 3209 Pízeň Pízeň 301 00 Pízeň IČ: 05278627 IČP: 3209		Odběratel: Marius Pedersen a.s. Dobřany 334 41 Dobřany IČ: 42194920 IČZ: CZP00655					
Jméno: RZ: 5P01093									
Čestné prohlášení původce (přivážené osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:									
Jméno, podpis:									

Vážní listek / Dodací list

Č. smlouvy: 1091048942		Vlastní číslo: FL35910046		Č. zakázky: 10219301410238		Č. vážení: 10219618006528-01	
Datum: 15.3.2021		Čas příjezdu: 16:05		Čas odjezdu: 0:00			
Brutto (t): 27,340		Tárá/Výstupní vážení (t): 18,040		Netto (t):			
Katalog. číslo: 200307	Objemný odpad			Kategorie: 0			
Specifikace:	podnikatelé						
KN celn. saz.:							
Poznámka:							
Zákazník dodavatele:	MPVY-SOO3-Vysoká						
<u>Dopravce:</u> MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191		<u>Dodavatel:</u> BIGGEST construct s.r.o.činnosti v ORP 3209 Plzeň Plzeň 301 00 Plzeň IČ: 05278627 IČP: 3209		<u>Oděratel:</u> Marius Pedersen a.s. Dobřany 334 41 Dobřany IČ: 42194920 IČZ: CZP00655			
Jméno: RZ: 5P01093							
Čestně prohlášení původce (opravné oslby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							

017 00-00 Rozloze

Vážený listek / Dodací list

Č. smlouvy:	1091048942	Vlastní číslo:	FL35910046	Č. zakázky:	10219301375601	Č. vážení:	102190618006199-01
Datum:	11.3.2021	Čas příjezdu:	16:37	Čas odjezdu:	0:00		
Brutto (t):	27,620	Táta/Výstupní vážení (t):	13,040	Netto (t):	14,580		
Katalog. číslo:	200307	Objemný odpad					
Specifikace:	podnikatelé						
KN celn. saz.:							
Poznámka:							
Zákazník dodavatele:		MPVY-S003-Vysoká					
Dopravce:	MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33214 Hradec IČ: 02459191	Dodavatel:	BIGGEST construct s.r.o.činnosti v ORP 3209 Pízeň Pízeň 301 00 Pízeň IČ: 05278627 IČP: 3209				
Jméno:	RZ: 5P01093	Odběratel:	Marius Pedersen a.s. Dobřany 334 41 Dobřany IČ: 42194928 IČZ: CZP00655				
Čestně prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							

PŘÍLOHA Č. 6

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

ODT SO 00-00 demolice

18	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 902
----	---

Vážní listky03/2021

Směsný (t)
6,94
9,68
8,00
7,92
6,84
8,70
7,04
12,14
11,70
12,02
11,44
4,38
106,80 (t)

Součet 106,80 (t)

Již provedeno 0,00 (t)

Vícepráce 03/21 106,80 (t)

Vícepráce celkem 106,80 (t)

015

Č. 170 1004 657 Vlastní číslo: 57

Vážení lístek / Dodací líst

Č. smlouvy: 3591004657 Vlastní číslo: 57

Č. zakázky: 35219300055958 Č. vážení: 35219602001555-01

Datum: 18.2.2021 Čas příjezdu: 15:40 Čas odjezdu: 15:40

Brutto (t): 25,340 Tara/Výstupní vážení (t): 18,400 Netto (t): 6,940

Katalog. číslo: 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č Kategorie: O

Specifikace: bez specifikace

KN celn. saz.: 170904 - ER - Slučka

Poznámka: ZKS-SM-Vysoká

Zákazník dodavatele:

Dopravce: MTM Recycling s.r.o. Hradec 193 33211 Hradec IČ: 02459191

Jméno: IRZ 5P01093

Dodavatel: BIGGEST construct s.r.o. činnosti v ORP 3209 Plzeň Plzeň 301 00 Plzeň IČ: 05278627 IČP: 3209

Odběratel: Západočeské komunální služby a.s. areál skládky Vysoká 334 41 Dobruška IČ: 25217348 IČZ: CZP00956

Časné prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:

Jméno, podpis:

001

zápis z jednání
zápis z jednání
zápis z jednání

Váží listek / Dodací list

Č. smlouvy:	3591004657	Vlastní číslo:	FL35910046	Č. zakázky:	352193000065913	Č. vážení:	35219602001860-01
Datum:	26.2.2021	Čas příjezdu:	13:32	Čas odjezdu:	13:32		
Brutto (t):	28,080	Táha/Výstupní vážení (t):	18,400	Netto (t):	9,680		
Katalog. číslo:	170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č				Kategorie:	O
Specifikace:	bez specifikace						
KN celn. saz.:							
Poznámka:	VED - 001						
Zákazník							
dodavatele:	ZKS-SM-Vysoká						
Dopravce:							
MTM Recycling s.r.o.	Dodavatel:			Odběratel:			
Hradec 193	BIGGEST construct s.r.o. činnosti v			Západočeské komunální služby			
33211 Hradec	Plzeň			a.s.			
IČ: 02459191	301 00 Plzeň			areál skládky Vysoká			
	IČ: 05278627			334 41 Dobřany			
	IČP: 3209			IČ: 25217348			
				IČZ: CZP00956			
Jméno:							
RZ: 5P01093							
Cestně prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							
