



JÍMKA



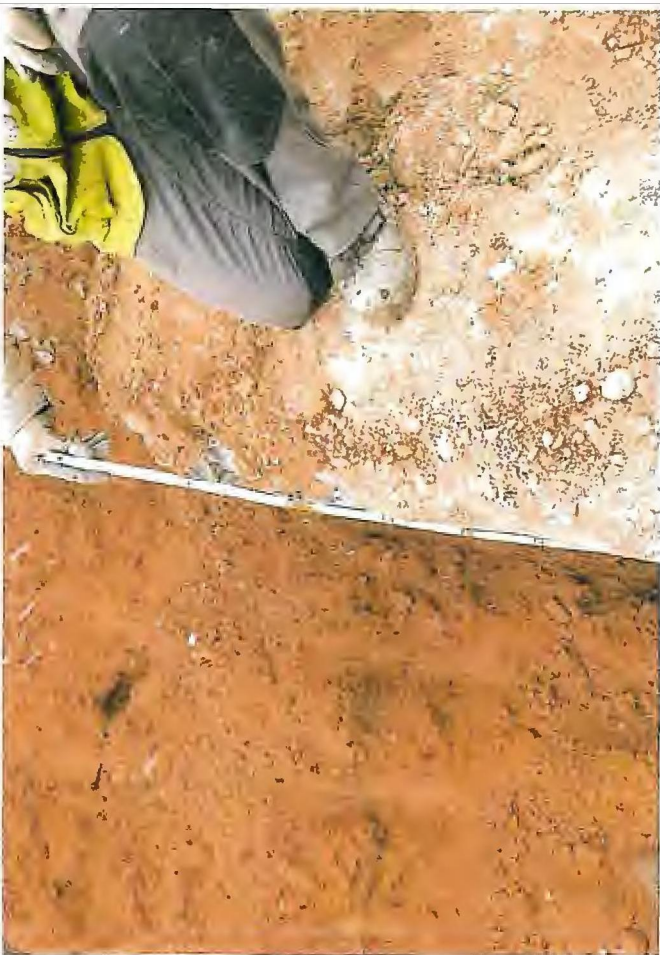

PODL.

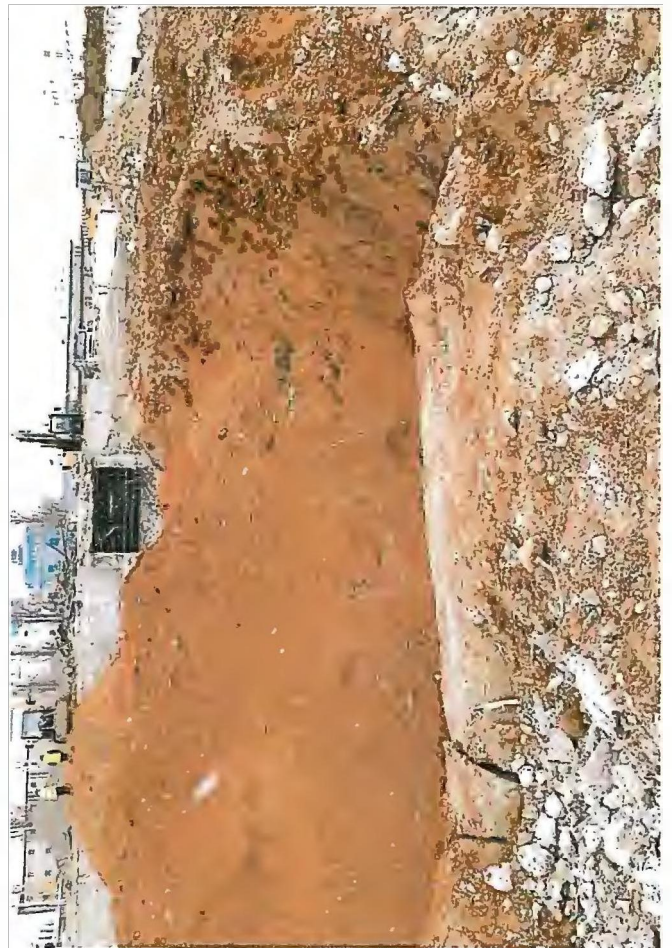

PŘÍLOHA Č. 9

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055


Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Vyjádření AD k změnovému listu č.012 navýšení odpadu ODT 00-00

AD souhlasí s navýšením víceprací dle předloženého změnového listu, protože předmětné navýšení objemu demolic nebylo možné predikovat na základě z podkladů poskytnutých Objednavatelem (Vozovna PMDP Slovanská alej 35 v Plzni - dokumentace současného stavu objektů, 2014), ani z průzkumu firmy Habena, s.r.o. provedeného pro Objednavatele (Stavebně technický průzkum, 2016) a ani z vlastního průzkumu provedeného na místě při zpracování projektu demolic.



PŘÍLOHA Č. 10

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

ODT SO 00-00 demolice

9	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
---	---

Váží lístky03/2021

Beton prostý (t)
1764,02

Součet 1764,02 (t)

Již provedeno 408,46 (t)

Vícepráce 03/21 1355,56 (t)

Vícepráce celkem	1355,56 (t)
-------------------------	--------------------

03/21

Zakázka: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Původce odpadu/Plátce: BIGGEST construct s.r.o.

Uložení odpadu: RECYKLAČ, Zeyerova ulice, 337 01 Rokycany

ODT 00-00

Zakázka	Číslo vázného listku	Datum a čas	RZ	Kód	Hmotnost [t]	kg.	Odpad	Uložení	Součty	Objekt
0049/2020	21PA1114	23.2.2021 8:06	4K5 9350	pl170101	27,8	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1117	23.2.2021 9:22	4K5 9350	pl170101	29,3	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1125	23.2.2021 12:28	4K5 9350	pl170101	26,46	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1135	23.2.2021 16:03	4K5 9350	pl170101	28,04	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1136	23.2.2021 16:26	7P0 4980	pl170101	17,68	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1141	24.2.2021 8:33	4K5 9350	pl170101	31,18	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1149	24.2.2021 15:00	7P4 5596	pl170101	20,48	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1167	25.2.2021 13:28	7P3 8073	pl170101	19,54	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1168	25.2.2021 13:35	6P7 5032	pl170101	22,44	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1170	25.2.2021 13:49	7P7 3740	pl170101	22,96	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1171	25.2.2021 13:50	6P8 4638	pl170101	23,1	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1306	2.3.2021 7:42	8AE 4467	pl170101	21,58	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1549	9.3.2021 12:02	6P7 5032	pl170101	17,14	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1550	9.3.2021 12:05	6P8 5110	pl170101	19,34	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1551	9.3.2021 12:06	2P3 3874	pl170101	15,98	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1561	9.3.2021 13:54	6P7 5032	pl170101	19,4	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1562	9.3.2021 13:59	2P3 3874	pl170101	16,18	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1568	9.3.2021 15:26	6P8 5110	pl170101	20,44	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1571	9.3.2021 15:36	6P7 5032	pl170101	20,42	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1573	9.3.2021 15:42	2P3 3874	pl170101	16,6	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1583	10.3.2021 7:05	2P3 3874	pl170101	16,82	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1784	15.3.2021 8:29	2P3 3874	pl170101	15,3	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1822	15.3.2021 10:39	2P3 3874	pl170101	15,2	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1841	15.3.2021 12:38	2P3 3874	pl170101	14,8	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1854	15.3.2021 13:34	2P3 3874	pl170101	15,66	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1864	15.3.2021 14:27	7P4 5597	pl170101	14,2	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1876	15.3.2021 15:08	2P3 3874	pl170101	15,44	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1877	15.3.2021 15:09	6P7 5032	pl170101	16,18	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1890	15.3.2021 15:58	7P3 8073	pl170101	15,98	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1893	15.3.2021 16:13	2P3 3874	pl170101	15,74	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1894	15.3.2021 16:15	6P7 5032	pl170101	15,94	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1895	15.3.2021 16:16	7P1 2650	pl170101	16,64	0	Beton - prostý	Rokycany		
0049/2020	21PA1897	15.3.2021 16:23	7AR 9042	pl170101	15,34	0	Beton - prostý	Rokycany		

0049/2020	21PA1898	15.3.2021 16:24	4K3 5042	pl170101	18,82	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1900	16.3.2021 7:15	2P3 3874	pl170101	15,52	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1903	16.3.2021 7:32	7P1 2650	pl170101	13,34	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1904	16.3.2021 7:34	4K3 5042	pl170101	16,44	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1908	16.3.2021 7:42	7P3 8073	pl170101	13,72	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1910	16.3.2021 7:51	6P7 5032	pl170101	15,56	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1912	16.3.2021 7:59	7P4 5597	pl170101	17,78	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1913	16.3.2021 8:10	7AR 9042	pl170101	17	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1914	16.3.2021 8:16	2P3 3874	pl170101	15,8	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1916	16.3.2021 8:24	5AR 0448	pl170101	18,24	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1919	16.3.2021 8:42	7P1 2650	pl170101	15,68	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1923	16.3.2021 8:52	4K3 5042	pl170101	17,28	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1924	16.3.2021 9:00	7AR 9042	pl170101	16,82	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1926	16.3.2021 9:10	5AR 0448	pl170101	16,26	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1928	16.3.2021 9:20	6P3 2858	pl170101	18,62	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1929	16.3.2021 9:27	2P3 3874	pl170101	15,9	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1931	16.3.2021 9:39	7P1 2650	pl170101	16,12	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1934	16.3.2021 9:47	7P4 5596	pl170101	19,56	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1938	16.3.2021 9:56	7AR 9042	pl170101	15,7	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1939	16.3.2021 10:06	6P7 5032	pl170101	9,4	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1942	16.3.2021 10:44	7P4 5596	pl170101	19,64	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1943	16.3.2021 10:46	2P3 3874	pl170101	15,96	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1944	16.3.2021 10:59	7P4 5597	pl170101	17,78	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1949	16.3.2021 12:25	6P3 2858	pl170101	12,54	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1952	16.3.2021 12:36	7AR 9042	pl170101	12,94	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1953	16.3.2021 12:43	7P4 5597	pl170101	13,58	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1956	16.3.2021 12:58	7P3 8073	pl170101	13,02	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1959	16.3.2021 13:06	2P3 3874	pl170101	14,78	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1960	16.3.2021 13:08	8AE 4467	pl170101	13,3	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1962	16.3.2021 13:16	4K3 5042	pl170101	15,04	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1963	16.3.2021 13:24	7AR 9042	pl170101	16,1	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1965	16.3.2021 13:31	7P4 5596	pl170101	16,02	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1966	16.3.2021 13:50	8AE 4467	pl170101	15,5	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1969	16.3.2021 14:13	7AR 9042	pl170101	16,86	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1971	16.3.2021 14:15	2P3 3874	pl170101	14,8	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1972	16.3.2021 14:18	6P7 5032	pl170101	15,18	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1973	16.3.2021 14:27	7P4 5596	pl170101	17,66	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1976	16.3.2021 14:56	8AE 4467	pl170101	16,9	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1979	16.3.2021 15:25	6P7 5032	pl170101	14,88	O	Beton - prostý	Rokycany	
0049/2020	21PA1982	16.3.2021 15:29	2P3 3874	pl170101	16,76	O	Beton - prostý	Rokycany	



0049/2020	21PA1984	16.3.2021 15:35	SAR 0448	p1170101	14,8
0049/2020	21PA1986	16.3.2021 15:50	8AE 4467	p1170101	14,36
0049/2020	21PA1987	16.3.2021 15:57	6P3 2858	p1170101	15,42
0049/2020	21PA1988	16.3.2021 16:04	4K3 5042	p1170101	16,36
0049/2020	21PA1989	16.3.2021 16:06	7P3 8073	p1170101	11,2
0049/2020	21PA1991	16.3.2021 16:17	6P7 5032	p1170101	14,96
0049/2020	21PA1993	16.3.2021 16:28	2P3 3874	p1170101	16,08
0049/2020	21PA1996	16.3.2021 16:37	8AE 4467	p1170101	18,5
0049/2020	21PA2001	17.3.2021 8:09	2P3 3874	p1170101	14,92
0049/2020	21PA2007	17.3.2021 9:18	2P3 3874	p1170101	16,54
0049/2020	21PA2014	17.3.2021 10:38	2P3 3874	p1170101	17,02
0049/2020	21PA2029	17.3.2021 13:21	2P3 3874	p1170101	17,16
0049/2020	21PA2036	17.3.2021 14:48	2P3 3874	p1170101	16,54
0049/2020	21PA2044	17.3.2021 16:32	2P3 3874	p1170101	14,86
0049/2020	21PA2046	18.3.2021 7:20	2P3 3874	p1170101	15,82
0049/2020	21PA2047	18.3.2021 7:26	7P1 2650	p1170101	14,42
0049/2020	21PA2049	18.3.2021 7:32	6P3 2858	p1170101	17,02
0049/2020	21PA2051	18.3.2021 7:45	6P7 5032	p1170101	18,14
0049/2020	21PA2053	18.3.2021 7:47	7P4 5596	p1170101	20,5
0049/2020	21PA2058	18.3.2021 8:45	6P7 5032	p1170101	17,48
0049/2020	21PA2059	18.3.2021 8:46	7P4 5596	p1170101	21,9
0049/2020	21PA2060	18.3.2021 8:50	7P1 2650	p1170101	19,38
0049/2020	21PA2062	18.3.2021 8:56	6P3 2858	p1170101	19,82
0049/2020	21PA2064	18.3.2021 9:33	6P7 5032	p1170101	15,94
0049/2020	21PA2066	18.3.2021 9:38	7P1 2650	p1170101	17,8
0049/2020	21PA2068	18.3.2021 9:56	6P3 2858	p1170101	19,14
0049/2020	21PA2072	18.3.2021 10:21	6P7 5032	p1170101	17,5
0049/2020	21PA2073	18.3.2021 10:29	7P1 2650	p1170101	17,62
0049/2020	21PA2075	18.3.2021 10:43	6P3 2858	p1170101	20,72
					1764,02

[illegible]

0049/2020	21PA1344	3.3.2021 8:44	7P3 8073	p170102	23,3	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1346	3.3.2021 9:03	7P4 5596	p170102	22,64	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1347	3.3.2021 9:14	8AE 4467	p170102	16,72	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1390	4.3.2021 10:01	5AR 0448	p170102	12,78	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1470	5.3.2021 15:51	7P3 8073	p170102	14,78	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1472	5.3.2021 16:12	7P0 4980	p170102	14,02	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1545	9.3.2021 10:38	7P0 4980	p170102	24,88	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1581	9.3.2021 16:36	7P4 5596	p170102	26	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1636	10.3.2021 15:13	7P3 8073	p170102	18,36	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1658	11.3.2021 9:26	7P4 5596	p170102	21,74	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1660	11.3.2021 9:35	7P4 5597	p170102	19,68	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1665	11.3.2021 10:04	5AR 0448	p170102	19,06	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1666	11.3.2021 10:11	7P4 5596	p170102	20,36	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1725	12.3.2021 10:07	7P3 8073	p170102	21,6	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1726	12.3.2021 10:13	5AR 0448	p170102	22,42	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1727	12.3.2021 10:17	7P4 5596	p170102	23,94	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1728	12.3.2021 10:23	6P7 5032	p170102	22,22	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1729	12.3.2021 10:26	8AE 4467	p170102	26,24	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1730	12.3.2021 10:31	7P0 4980	p170102	22,72	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1731	12.3.2021 10:36	7P1 2650	p170102	21,44	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1733	12.3.2021 10:54	6P7 5032	p170102	21,66	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1736	12.3.2021 12:12	8AE 4467	p170102	27,3	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1737	12.3.2021 12:18	7P1 2650	p170102	22,64	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1738	12.3.2021 12:20	7P0 4980	p170102	20,78	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1739	12.3.2021 12:42	5AR 0448	p170102	22	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1740	12.3.2021 12:45	6P7 5032	p170102	21,68	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1741	12.3.2021 12:54	8AE 4467	p170102	21,06	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1742	12.3.2021 12:57	7P0 4980	p170102	20,98	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1743	12.3.2021 13:02	7P1 2650	p170102	20,42	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1755	12.3.2021 15:11	7P0 4980	p170102	18,52	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1756	12.3.2021 15:23	7P4 5596	p170102	19,1	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1760	12.3.2021 15:46	8AE 4467	p170102	21,78	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1762	12.3.2021 16:14	7P0 4980	p170102	18,48	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1763	12.3.2021 16:15	7P3 8073	p170102	18,5	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1764	12.3.2021 16:24	5AR 0448	p170102	19,24	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1765	12.3.2021 16:32	8AE 4467	p170102	22,26	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1768	15.3.2021 7:29	5AR 0448	p170102	19,54	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1769	15.3.2021 7:35	7AR 9042	p170102	19,48	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1770	15.3.2021 7:41	8AE 4467	p170102	22,26	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1771	15.3.2021 7:49	6P7 5032	p170102	19,26	O	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1773	15.3.2021 7:53	7P1 2650	p170102	21,5	O	Cihly	Rokycany	

0049/2020	21PA1775	15.3.2021 7:58	7P3 8073	pl170102	19,5	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1776	15.3.2021 8:02	7P2 8115	pl170102	22,46	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1778	15.3.2021 8:09	4K3 5042	pl170102	20,56	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1779	15.3.2021 8:14	5AR 0448	pl170102	20,46	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1782	15.3.2021 8:20	7AR 9042	pl170102	20,12	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1785	15.3.2021 8:30	6P7 5032	pl170102	20,82	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1786	15.3.2021 8:34	7P1 2650	pl170102	21,82	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1789	15.3.2021 8:44	7P2 8115	pl170102	21,36	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1791	15.3.2021 8:54	8AE 4467	pl170102	28,52	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1793	15.3.2021 9:00	4K3 5042	pl170102	23,98	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1795	15.3.2021 9:07	7P1 2650	pl170102	23,8	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1798	15.3.2021 9:20	7P2 8115	pl170102	25,28	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1800	15.3.2021 9:30	5AR 0448	pl170102	22,78	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1804	15.3.2021 9:37	8AE 4467	pl170102	25,74	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1805	15.3.2021 9:38	7AR 9042	pl170102	22,14	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1808	15.3.2021 9:52	7P1 2650	pl170102	24,1	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1812	15.3.2021 10:07	7P2 8115	pl170102	25,7	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1817	15.3.2021 10:17	8AE 4467	pl170102	26,2	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1820	15.3.2021 10:26	7P1 2650	pl170102	25	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1821	15.3.2021 10:37	6P7 5032	pl170102	22,16	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1824	15.3.2021 10:41	7P4 5597	pl170102	20,46	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1828	15.3.2021 10:54	8AE 4467	pl170102	26,44	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1836	15.3.2021 12:20	4K3 5042	pl170102	23,92	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1848	15.3.2021 13:13	4K3 5042	pl170102	21,1	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1852	15.3.2021 13:26	5AR 0448	pl170102	22,48	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1853	15.3.2021 13:31	7P4 5597	pl170102	20,08	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1855	15.3.2021 13:37	7P2 8115	pl170102	21,32	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1856	15.3.2021 13:40	8AE 4467	pl170102	23,42	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1859	15.3.2021 14:06	4K3 5042	pl170102	19,9	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1860	15.3.2021 14:09	7AR 9042	pl170102	19,96	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1861	15.3.2021 14:11	7P1 2650	pl170102	20,52	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1862	15.3.2021 14:12	7P3 8073	pl170102	20,7	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1863	15.3.2021 14:16	5AR 0448	pl170102	19,34	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1866	15.3.2021 14:38	7P2 8115	pl170102	21,28	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1867	15.3.2021 14:45	7AR 9042	pl170102	22,44	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1869	15.3.2021 14:48	8AE 4467	pl170102	19,98	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1871	15.3.2021 14:53	4K3 5042	pl170102	24,46	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1873	15.3.2021 15:01	7P3 8073	pl170102	20,94	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1879	15.3.2021 15:13	7P1 2650	pl170102	22,44	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1880	15.3.2021 15:14	5AR 0448	pl170102	23,44	O	Cihly	Rokycany
0049/2020	21PA1882	15.3.2021 15:20	7P4 5597	pl170102	22,36	O	Cihly	Rokycany

0049/2020	21PA1884	15.3.2021 15:32	4K3 5042	pl170102	23,52	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1885	15.3.2021 15:38	7P2 8115	pl170102	24,56	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1886	15.3.2021 15:39	7AR 9042	pl170102	21,64	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1889	15.3.2021 15:57	8AE 4467	pl170102	22,9	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA1995	16.3.2021 16:36	7P4 5596	pl170102	24,52	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2022	17.3.2021 12:42	7P4 5596	pl170102	23,82	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2023	17.3.2021 12:42	7P3 8073	pl170102	19,94	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2030	17.3.2021 13:33	7P4 5596	pl170102	21,58	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2031	17.3.2021 13:39	7P3 8073	pl170102	19,28	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2043	17.3.2021 16:29	7P4 5596	pl170102	25,82	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2087	18.3.2021 14:14	6P7 5032	pl170102	20,62	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2089	18.3.2021 14:23	6P3 2858	pl170102	24,02	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2090	18.3.2021 14:35	7P4 5596	pl170102	25,12	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2091	18.3.2021 14:45	7P1 2650	pl170102	25,1	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2092	18.3.2021 15:06	6P7 5032	pl170102	21,58	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2093	18.3.2021 15:21	6P3 2858	pl170102	22	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2095	18.3.2021 15:36	7P4 5596	pl170102	22,82	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2131	19.3.2021 13:22	7P4 5596	pl170102	25,62	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2137	19.3.2021 13:44	7P3 8073	pl170102	22,46	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2138	19.3.2021 14:02	7P4 5596	pl170102	26,18	0	Cihly	Rokycany	
0049/2020	21PA2142	19.3.2021 14:59	7P3 8073	pl170102	22,46	0	Cihly	Rokycany	
					2511,1			2511,1	ODT 00-00
0049/2020	21PA1112	23.2.2021 7:58	4AB 0595	pl1701zb	26,12	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1115	23.2.2021 8:57	4AB 0595	pl1701zb	25,64	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1118	23.2.2021 10:01	4AB 0595	pl1701zb	28,1	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1120	23.2.2021 10:20	4K5 9350	pl1701zb	18,1	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1124	23.2.2021 12:24	4AB 0595	pl1701zb	17,48	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1126	23.2.2021 13:26	4AB 0595	pl1701zb	17,32	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1132	23.2.2021 14:26	4AB 0595	pl1701zb	29,2	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1133	23.2.2021 14:53	4K5 9350	pl1701zb	26,9	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1134	23.2.2021 15:47	4AB 0595	pl1701zb	27,16	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1137	23.2.2021 16:41	7P4 5596	pl1701zb	18,54	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1138	23.2.2021 16:49	7P3 8073	pl1701zb	15,26	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1142	24.2.2021 8:34	4AB 0595	pl1701zb	24,1	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1148	24.2.2021 12:46	7P4 5596	pl1701zb	20,32	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1156	24.2.2021 16:56	7P3 8073	pl1701zb	21,76	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1157	24.2.2021 16:58	7P0 9580	pl1701zb	23,62	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1162	25.2.2021 13:02	7P7 3740	pl1701zb	17	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1163	25.2.2021 13:07	8AE 4467	pl1701zb	20,6	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1164	25.2.2021 13:10	3P4 2151	pl1701zb	19,86	0	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1165	25.2.2021 13:18	7P1 2650	pl1701zb	17,7	0	Železobeton	Rokycany	

0049/2020	21PA1169	25.2.2021 13:41	7P0 4980	p11701zb	23,74	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1174	25.2.2021 14:03	3P4 2151	p11701zb	23,42	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1320	2.3.2021 10:54	3P4 2151	p11701zb	17,32	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1325	2.3.2021 12:29	7P4 5596	p11701zb	14,36	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1328	2.3.2021 12:48	3P4 2151	p11701zb	17,52	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1329	2.3.2021 13:21	7P3 8073	p11701zb	14,06	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1368	3.3.2021 12:55	7P4 5596	p11701zb	20,28	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1369	3.3.2021 13:10	7P7 3740	p11701zb	18,64	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1535	9.3.2021 9:48	6P3 2858	p11701zb	15,6	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1538	9.3.2021 10:19	7P3 8073	p11701zb	17,04	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1540	9.3.2021 10:22	7P4 5596	p11701zb	21,7	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1574	9.3.2021 15:53	7P4 5596	p11701zb	19,48	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1577	9.3.2021 16:22	7P3 8073	p11701zb	15,12	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1578	9.3.2021 16:24	7P0 4980	p11701zb	19,2	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1651	11.3.2021 8:40	7P4 5596	p11701zb	21,72	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1652	11.3.2021 8:44	7P4 5597	p11701zb	19,52	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1654	11.3.2021 9:08	7P0 4980	p11701zb	13,22	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1657	11.3.2021 9:24	5AR 0448	p11701zb	16,02	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1667	11.3.2021 10:15	7P4 5597	p11701zb	15,22	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1669	11.3.2021 10:47	5AR 0448	p11701zb	14,1	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1671	11.3.2021 10:56	7P4 5596	p11701zb	17,98	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1672	11.3.2021 11:07	7P4 5597	p11701zb	15,48	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1677	11.3.2021 12:27	5AR 0448	p11701zb	13,7	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1679	11.3.2021 12:56	7P4 5596	p11701zb	13,7	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1680	11.3.2021 13:11	5AR 0448	p11701zb	13,18	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1685	11.3.2021 13:56	7P4 5596	p11701zb	14,1	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1686	11.3.2021 14:18	5AR 0448	p11701zb	13,98	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1689	11.3.2021 14:57	7P4 5597	p11701zb	13,7	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1690	11.3.2021 15:14	5AR 0448	p11701zb	15,4	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1691	11.3.2021 15:35	7P4 5597	p11701zb	13,62	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1692	11.3.2021 15:48	7P4 5596	p11701zb	15,28	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1693	11.3.2021 16:06	5AR 0448	p11701zb	16,42	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1694	11.3.2021 16:19	7P0 4980	p11701zb	14,54	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1695	11.3.2021 16:30	7P4 5596	p11701zb	17,48	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1703	12.3.2021 7:44	5AR 0448	p11701zb	14,08	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1788	15.3.2021 8:36	7P3 8073	p11701zb	19,32	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1790	15.3.2021 8:52	5AR 0448	p11701zb	21,22	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1794	15.3.2021 9:01	7AR 9042	p11701zb	19,54	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1797	15.3.2021 9:16	7P3 8073	p11701zb	21,08	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1802	15.3.2021 9:35	2P3 3874	p11701zb	15,24	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1803	15.3.2021 9:36	7P4 5597	p11701zb	15,94	O	Železobeton	Rokycany	

0049/2020	21PA1806	15.3.2021 9:45	4K3 5042	pl1701zb	18,92	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1809	15.3.2021 9:53	7P3 8073	pl1701zb	17,36	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1814	15.3.2021 10:10	5AR 0448	pl1701zb	19,78	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1815	15.3.2021 10:12	7P4 5597	pl1701zb	18,48	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1818	15.3.2021 10:18	7AR 9042	pl1701zb	19,6	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1819	15.3.2021 10:20	4K3 5042	pl1701zb	22,3	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1823	15.3.2021 10:40	7P3 8073	pl1701zb	18,76	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1825	15.3.2021 10:48	5AR 0448	pl1701zb	21,3	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1829	15.3.2021 10:56	7AR 9042	pl1701zb	19,92	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1832	15.3.2021 12:03	7P1 2650	pl1701zb	23,2	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1835	15.3.2021 12:19	7P3 8073	pl1701zb	21,18	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1838	15.3.2021 12:26	7AR 9042	pl1701zb	19,66	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1839	15.3.2021 12:30	7P4 5597	pl1701zb	19,88	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1840	15.3.2021 12:36	7P2 8115	pl1701zb	19,02	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1842	15.3.2021 12:40	5AR 0448	pl1701zb	20,28	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1843	15.3.2021 12:46	6P7 5032	pl1701zb	20,38	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1845	15.3.2021 13:00	8AE 4467	pl1701zb	23,86	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1847	15.3.2021 13:07	7P1 2650	pl1701zb	19,9	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1850	15.3.2021 13:20	7AR 9042	pl1701zb	19,86	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1896	15.3.2021 16:21	5AR 0448	pl1701zb	17,32	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1981	16.3.2021 15:27	7AR 9042	pl1701zb	16,66	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA1992	16.3.2021 16:19	5AR 0448	pl1701zb	15,32	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2035	17.3.2021 14:38	7P4 5596	pl1701zb	23,7	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2038	17.3.2021 14:58	7P3 8073	pl1701zb	18,54	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2039	17.3.2021 15:40	7P4 5596	pl1701zb	21,3	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2042	17.3.2021 16:28	7P3 8073	pl1701zb	19,74	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2055	18.3.2021 8:08	7P1 2650	pl1701zb	16,4	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2056	18.3.2021 8:11	6P3 2858	pl1701zb	18,42	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2081	18.3.2021 12:42	7P1 2650	pl1701zb	19,52	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2082	18.3.2021 12:50	6P3 2858	pl1701zb	19,86	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2083	18.3.2021 13:00	6P7 5032	pl1701zb	20,38	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2086	18.3.2021 13:46	7P1 2650	pl1701zb	19,28	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2110	19.3.2021 9:44	7P4 5596	pl1701zb	20,68	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2112	19.3.2021 9:58	7P3 8073	pl1701zb	18,28	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2113	19.3.2021 9:59	5AE 9013	pl1701zb	19,38	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2116	19.3.2021 10:46	7P3 8073	pl1701zb	20,04	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2117	19.3.2021 10:51	5AE 9013	pl1701zb	19	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2119	19.3.2021 10:59	7P4 5596	pl1701zb	23,66	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2124	19.3.2021 12:25	7P1 2650	pl1701zb	22,38	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2126	19.3.2021 12:39	6P3 2858	pl1701zb	21,14	O	Železobeton	Rokycany	
0049/2020	21PA2127	19.3.2021 12:42	7P3 8073	pl1701zb	21,18	O	Železobeton	Rokycany	



0049/2020	21PA2154	22.3.2021 7:32	7P7 3740	pl1701zb	17,14	O	Železobetón	Rokycany	
0049/2020	21PA2155	22.3.2021 7:44	7P4 5596	pl1701zb	18,7	O	Železobetón	Rokycany	
0049/2020	21PA2157	22.3.2021 7:54	6P3 2858	pl1701zb	18,46	O	Železobetón	Rokycany	
0049/2020	21PA2162	22.3.2021 8:21	7P7 3740	pl1701zb	17,18	O	Železobetón	Rokycany	
0049/2020	21PA2165	22.3.2021 8:36	7P1 2650	pl1701zb	18,76	O	Železobetón	Rokycany	
					2013,1				OD 00-00



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35	
Objekt:	E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje	SLA - SO 11 - Tramvajová trať
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)	
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany – TDS, [redacted]	

Popis změny	Po provedení výkopových prací objektu SLA SO 16, byl zjištěn nevhodný materiál pro zpětný zásyp vodovodu. (viz ZL č.008 příloha č.2 - vyjádření geotechnika TDS ke zpětným zásypům). Na základě těchto skutečností, bylo rozhodnuto o provedení zkoušek stáv.materiálu v úrovni aktivní zóny pro objekt SLA SO 11 a SO 13. Následně byla navržena sanace nevhodného podloží aktivní zóny.				
	změnu vyvolal:		objednatel		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č. 013 bez DPH		
	cena SO bez DPH (dle SoD)		64 150 975,10 Kč		
	náklady na změnu bez DPH:		2 296 400,70 Kč		
	cena SO bez DPH po ZL č.013		66 447 375,80 Kč		
	cena díla bez DPH (dle SoD):		1 697 894 702,32 Kč		
	cena díla po ZL č.013 bez DPH:		1 700 191 103,02 Kč		
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:		464 869,07 Kč	3 226 138,84 Kč	celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:		2 761 269,77 Kč		
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		Změna má vliv na termín dokončení stavebního objektu SLA SO 11 Tramvajová trať . Realizace stavebního objektu bude prodloužena o 35 dní. Změna má vliv na termín dokončení stavebního celku - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA). Realizace stavebního celku bude prodloužena 35 dní. Změna má vliv na termín dokončení celého díla. Realizace celého díla může být prodloužena až o 35 dní.		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum		
	Zhotovitel:		19.8.21		
	Věcně za TDS:		20.8.21		
	Technicky za AD:		20.8.21		
	Objednatel:		24.8.21		
přílohy	č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 013 č.2 - Vyjádření geotechnika TDI (4x - 2a,2b,2c,2d,) č.3 - Příčné řezy - vyznačení sanace (3a, 3b) č.4 - Cenotvorba položek ZL č.5 - vyjádření projektanta k navržené sanaci podloží č.6 - HMG prací SLA - etapizace				

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.: 013

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozílí množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozílí celk. ceny [Kč]
14	K	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	655,010	0	655,010	37,16 Kč	24 340,17 Kč	0,00 Kč	24 340,17 Kč
	VV	změna	do délky tratě v pol. 212635* 385,31*1,7		655,010	0,000					
15	K	212635	TRATVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	385,300	0	385,300	1 143,34 Kč	440 528,90 Kč	0,00 Kč	440 528,90 Kč
	VV	změna	odměřeno ze situace SLA11-002 a schémat bahnic v technické zprávě* 385,3		385,300	0,000					
CELKEM:									464 869,07 Kč	0,00 Kč	464 869,07 Kč

CELKEM:

464 869,07 Kč

0,00 Kč

464 869,07 Kč

VÍCEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozílí množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdlíl celk. ceny [Kč]
48	K	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 1KM	m3	0,000	1 616,500	1 616,500	267,39 Kč	0,00 Kč	432 235,94 Kč	432 235,94 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převážalo z SO 13 > pol.č. 16								
			SO 11 TT -			1 616,50					
49	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	1 616,500	1 616,500	313,19 Kč	0,00 Kč	506 271,64 Kč	506 271,64 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převážalo z SO 16 > pol.č.34								
			odkop pro spodní stavbu SO 11 -			1 616,50					
50	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přibližně k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	0,000	9 689,000	9 689,000	24,23 Kč	0,00 Kč	235 006,77 Kč	235 006,77 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převážalo z SO 16 > pol.č.35								
			Připravené koeficientem množství			9 689,00					
51	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	1 616,500	1 616,500	56,99 Kč	0,00 Kč	108 289,34 Kč	108 289,34 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převážalo z SO 16 > pol.č.36								
			odkop pro spodní stavbu SO 11 -			1 616,50					
52	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	1 616,500	1 616,500	20,01 Kč	0,00 Kč	32 346,17 Kč	32 346,17 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převážalo z SO 16 > pol.č.37								
			odkop pro spodní stavbu SO 11 -			1 616,50					
53	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenná zařízeníého do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	l	0,000	2 909,700	2 909,700	136,71 Kč	0,00 Kč	397 785,09 Kč	397 785,09 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převážalo z SO 18 > pol.č.38								
			de skutečnosti SO 11 -			2 909,70					
54	K	56330	Dodávka drážního šláku	M3	0,000	1 616,500	1 616,500	452,53 Kč	0,00 Kč	731 514,75 Kč	731 514,75 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	JC - viz příloha č.5 - cenotvorba položek ZL + CN								
			SO 11 TT -			1 616,50					



55	K	18110	ÚPRAVA PARA-PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M2	0,000	3 233,000	3 233,000	24,86 Kč	0,00 Kč	80 372,38 Kč	80 372,38 Kč
			NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO 13 >pol.č.19								
				SO 11:			3 233,00					
				3233m2								
56	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM		M3	0,000	1 616,500	1 616,500	146,89 Kč	0,00 Kč	237 447,69 Kč	237 447,69 Kč
			NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO 13 >pol.č.18								
				SO 11 TT -			1 616,50					
				3233m2*0,5								
CELKEM:										0,00 Kč	2 761 269,74 Kč	2 761 269,77 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [KČ]:	2 296 400,70 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE OPROTI SOD CELKEM [KČ]:	3 226 138,84 Kč

vypracoval:		datum	19. 8. 21
za zhotovitele:			19. 8. 21
za TDS:			20. 8. 21
