

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

4

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Elektroinstalace - osvětlení; projektové práce	Číslo objektu: SO 02; VON	Název: Úprava osvětlení ve vestibulu
Popis změny: <p>V průběhu realizace "Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí" byl ze strany architektky metra sdělen/prezentován požadavek na doplnění stropních svítidel v úrovni vestibulu.</p> <p>Záměr je iniciován s cílem dosáhnout ucelené linie osvětlení vázaný na hlavní směr pohybu cestujících. Jedná o inovativní přístup v architektonickém sjednocení charakteru osvětlení veřejných prostor metra.</p> <p>Na základě místního šetření za přítomnosti TR-M a náměstka primátora bylo rozhodnuto o úpravě realizační dokumentace a zajištění následné realizace.</p>		
Zdůvodnění změny: <p>Rozpočet ceny těchto změn (Příloha č. 1) byl sestaven v souladu s podmínkami smlouvy o dílo - pro ocenění změn byly využity výhradně jednotkové ceny položek, které již jsou součástí smluvního rozpočtu.</p> <p>Doplnění svítidel a všech přidružených stavebně montážních činností bylo předmětem jednání kontrolních dnů stavby č. 8 - č. 9 (zápis z KD v příloze č. 2), kde byl požadavek ze strany objednatele potvrzen s žádostí o ocenění víceprací ze strany zhotovitele včetně stanovení dopadů do projektové dokumentace a průběhu výstavby.</p> <p>Popis požadované změny v počtu svítidel oproti předchozímu stupni dokumentace jsou popsány a zobrazeny v příslušné části RDS pro SO 02 (Příloha č. 5). Pro srovnání je přiloženo analogické zobrazení ve výřátku ze zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS) (Příloha č. 4).</p>		
Posouzení změny - autors METROPROJEKT Praha a vedoucí útvaru		
Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.		

Stavba: Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí	Číslo smlouvy:	SO	SO 02; VON	Změnový list č:	4
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY					
DOPADY ZMĚNY:					
Do projektové dokumentace:	ano				
Do časového plánu stavby:	ano	prodloužení termínu dokončení o 27 dní (celkový termín dokončení stavby včetně dopadu ZL č. 1 je 11. 10. 2021)			
Do ceny stavby:	ano	zvýšení o:		2 271 084,53 Kč	
NAVRHOVATEL ZMĚNY:					
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby			SYNER, s.r.o.		
vedoucí projektového			příprava výroby		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:					
Zhotovitel:	Souhlasí	Příkazník:			
	Podpis:		Podpis:		
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby		Inženýring dopravních staveb a.s.			
vedoucí projektového týmu		technický dozor objednatele			
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:					
Zhotovitel:	Souhlasí	Příkazník:	Sou		
	Podpis:		Podpis:		
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby		Inženýring dopravních staveb a.s.			
vedoucí projektového týmu		technický dozor objednatele			
Zhotovitel:	Souhlasím				
	Podpis:				
SYNER, s.r.o.					
příprava výroby					
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:					
		Podpis:			
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby					
ředitel divize					
		Podpis:			
SYNER, s.r.o.					
technický ředitel					
CELEKOVÉ DOPORUČENÍ: Dop					
Za Příkazníka:			Za Objednatele:		
Inženýring dopravních staveb a.s.			Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		
technický dozor objednatele			vedoucí odboru Investice - METRO		
Za Objednatele:			Za Objednatele:		
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	projektový manažer		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		
			technický ředitel		

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet změnového listu	4x A4
Příloha č. 2 - a	Zápis z 8. kontrolního dne stavby ze dne 17. 2. 2021	8x A4
Příloha č. 2 - b	Zápis z 9. kontrolního dne stavby ze dne 3. 3. 2021	9x A4
Příloha č. 3 - a	Výňatek z DPS - SO 02 Elektroinstalace, osvětlení - 002 Situační schéma rozvodu ÚV+ÚP	1x A3
Příloha č. 4 - a	Výňatek z RDS - SO 02 Elektroinstalace, osvětlení - 001 Technická zpráva (výňatek)	2x A4
Příloha č. 4 - b	Výňatek z RDS - SO 02 Elektroinstalace, osvětlení - 002 Situační schéma rozvodu ÚV+ÚP	1x A3
Příloha č. 5	Cenová nabídka poddodavatele na dopracování dokumentace pro provádění stavby (METROPROJEKT Praha a.s.)	1x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	2x A3 24x A4

Příloha č. 1 k Změnovému Listu č. 4	
Modernizace pohyblivých schodů	
ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace	
vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí	
	CPV: 45234125-8
	JKSO: 825 82
Celková rekapitulace nákladů - změna osvětlení ve vestibulu	
Druh nákladů	Náklad v Kč
E - Stavební část	
SO 02 Elektroinstalace, osvětlení	2 080 114,53
Stavební část celkem	2 080 114,53
Vedlejší a ostatní náklady	
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	190 970,00
Vedlejší a ostatní náklady celkem	190 970,00
Cena stavby bez DPH v Kč	2 271 084,53
Poznámka:	
Vedlejší a ostatní náklady (zařízení staveniště) budou vyčísleny samostatně v Změnovém Listu na základě skutečného termínu dokončení díla jako celku.	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížeci

Část: E - Stavební část

Objekt: SO 02 Elektroinstalace, osvětlení

JKSO: 825 82

Objednatel: DPP a.s.

Zhotovitel:

Datum: 22.06.2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem DVZ	Množství celkem RDS	Množství celkem RDS-DVZ	Cena jednotková dle DVZ	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	7	7	7	8		
CELKEM SO:									
2 Ocelová konstrukce pro uchycení svítidel, prvků elektro atd..									
8	748002	Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocel(provedení pro metro) pro přístroje do 5 kg	ks						zobovane upevneni kabelových zebriků 2xZ přichyška, nástěnný, horní upevňovací úhelník včetně izolačních podložek. Dodávka a montáž, kotvení.
3 Kabelové konstrukce									
10	745024	Kabelový žebřík šíře 400mm + protipožární přepážka v celé délce, včetně příslušenství - spojky, rohové profily vnitřní a vnější atd. - komplet - prov.pro metro + uchycení kabelů pomocí třmenových přichytek vícenásobných(jednoduchá, dvojnásobná, trojnásobná) po 0,3m - započítáno v této položce	m						kabelová trasa v úrovni UV
4 Kabely									
27	743017-1	kabel "R" O 3x1,5 Cu-M	m						č. 002-009 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky rohového instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, pod.
30	743048	Kabel Cu "R" M 5 x 2,5 mm2	m						č. 002-009 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky rohového instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, pod.
5 Svítidla									
56	748122	LED svítidlo normální, pomocné s difuzorem normální osvětlení 16W HF DIM	ks						typ svítidla: LED svítidlo normální, pomocné osvětlení BR-S V3 LED 20W 60 DIM
57	748123	LED svítidlo nouzové s difuzorem normální osvětlení 16W HF DIM	ks						typ svítidla: LED svítidlo normální, pomocné osvětlení BR-S V3 LED 33W 120 DIM
58	748124	LED svítidlo normální, pomocné s difuzorem normální osvětlení 30W HF DIM	ks						typ svítidla: LED svítidlo normální, pomocné osvětlení BR-S V3 LED 33W 150 DIM
59	748125	LED svítidlo nouzové s difuzorem normální osvětlení 30W HF DIM	ks						typ svítidla: LED svítidlo nouzové osvětlení BR-S V3 LED 33W N 120 DIM
60	748126	LED svítidlo normální, pomocné s difuzorem normální osvětlení 9W HF DIM	ks						ED svítidlo nouzové osvětlení BR-S V3 LED 33W N 150 DIM

Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem DVZ	Množství celkem RDS	Množství celkem RDS-DVZ	Cena jednotková dle DVZ	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4					7	8
7 Ostatní									
74	749982	Výchozí revize, revizní zpráva - revize pro část doplněné osvětlení	hod						kompletní revize na celé dílo elektroinstalace osvětlení
77	749988	Montážní mechanismy	kpl						
81	988722104	Přesun hmot vodoravný k ohlubni, svislý do hlubiny, vodoravný v hloubině	kpl						řešení pro instalaci a úpravu svítidel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

Část: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: DPP a.s.

Zhotovitel:

Datum: 19.08.2020

JKSO: 825 82

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
CELKEM:							
1-ZS Zařízení staveniště							
1	ZS-001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kus				
2-PP Projektové práce							
2	PP-001	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	kus				1) Zpracování podkladů pro odborný odhad
3	PP-002	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus				2) Dopracování RDS

Inženýring dopravních staveb a.s.
Branická 514/140 147 00 Praha 4

Zápis z 8. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“

Stavba	Zapsal	Revize zápisu
Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí		00

Předmět	Pořadové číslo KD
Zápis z KD stavby	08

Datum konání KD	Místo jednání
17.2.2021	vestibul stanice metra Anděl/Na Knížecí


Prezence – viz. příloha č.1

Datum konání příštího KD

3.3.2021 od 13,00 hod

Přílohy zápisu

Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 – Doplnění vodovodní výtokové armatury v podchodu

Císlo	Předmět	Odpovědný	Termín
1	ADMINISTRACE PROJEKTU		
08/1/1	Zhotovitel připravil vzorové kotvení kabelových tras k nosným táhlům podhledu svěšených z konstrukce stropu podchodu (Ševčíků) – na KD odsouhlaseno a bude zahájena realizace tras	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info
08/1/2	Zhotovitel k datu konání KD stavby předložil cenový návrh na doplnění osvětlení ve vestibulu dle požadavku 	Zhotovitel DPP	info
08/1/3	Metroprojekt připravuje změnu vyztužení stropu v úrovni vestibulu – jedná se o řešení stavu po odbourání trámů pro uložení stropních desek, kdy vyztuž trámů není zrealizována dle archivní dokumentace	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info

Zápis z 8. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“

2 HARMONOGRAM			
08/2/1	Stavební práce probíhají dle harmonogramu stavby a schválené etapizace. Probíhají práce: <ul style="list-style-type: none">• Sanační práce v kabelovém prostoru a v klenbě ET• Zpětná montáž nových zontů• Montáž kabelových tras ve vestibulu• Montáž VZT klapek a stěnových uzávěrů• Montáž suchovodu v ET		
08/2/2	Práce plánované na budoucí období: <ul style="list-style-type: none">• Montáže kabelových tras v podchodu• Sanace v kabelovém prostoru a v klenbě ET• Zpětná montáž nových zontů• Betonáž nosných konstrukcí v ET• Nosné konstrukce v Hygi buňce• Osazování prvků VZT• Montáž suchovodu v ET		
3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
	<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel informoval o nutné změně trasy kabelových konstrukcí v kabelovém kanále v ET. RDS předložena a odsouhlasena č. v . 537• Byla odsouhlasena změna vyztužení a tvaru konzol v napínací komoře SO 01 č.v. 604• Byla odsouhlasena PS 91-1 č.v 23 a 24 – napájení VZT jednotek• Byla schválena VD rozebiratelného stropu ve strojovně		
4 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI			
5 koordinátor BOZP			
08/5/1	Koordinátor BOZP konstatoval, že při pravidelných kontrolách prováděných sanačních prací v ET nebylo zjištěno porušení předpisů a požadavků spojených s BOZP a jsou dodržovány zásady BOZP pro tyto práce, které jsou uvedeny v plánu BOZP a pracovníci používají OOPP.	Zhotovitel KooBOZP	info

Zápis z 8. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“

04/5/2	Koordinátor BOZP upozorňuje jednotlivé zhotovitele na nutnost dodržovat opatření vlády ČR ohledně koronavirové krize (používání roušek, zvýšená hygiena, atd.).	Zhotovitel KooBOZP	Trvale
04/5/3	Koordinátor BOZP upozorňuje jednotlivé zhotovitele na nutnost vyvěšovat prodlužovací elektro kabely, které jsou používány na jednotlivých pracovištích.	Zhotovitel KooBOZP	Trvale
07/5/2	Koordinátor BOZP upozorňuje zhotovitele na nutnost udržovat podlahy na pracovištích bez zbytků vybouraného materiálu a konstrukcí.	Zhotovitel KooBOZP	Trvale
6 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI			
7 OTEVŘENÉ ZÁLEŽITOSTI Z PŘEDEŠLÝCH KD včetně aktuálního KD Stavby			
01/1/1	Zhotovitel provedl demontáž reklamních panelů z eskalátorového tunelu ze smaltovaných plechů – typ B1. Zástupce DPP [redacted] prověří komu se tyto reklamní panely protokolárně předají. KD č. 4 ze dne 17.12.2020 – reklamní panely typ B1 budou dle informace pí. Humlové zlikvidovány na skládce. [redacted] запише tuto informaci do stavebního deníku.	Zhotovitel DPP	Info
01/1/5	Investor upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.8 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)	Zhotovitel DPP	Trvale
02/1/3	Zástupce 850 120 [redacted] zašle Interní sdělení na zástupce odboru Investic se specifikací aktuálních potřeb místnosti 6/442. Po doprojektování a fin. vyčíslení bude rozhodnuto o případné realizaci v rámci této IA KD č. 6 ze dne 20.1.2021 - Zástupce investora informuje, že již obdržel zmíněné IS - požadavek byl obratem předán dodavateli stavby s dotazem na fin. vyčíslení (vč. dopadu do termínu). Zhotovitel v součinnosti s projektantem dopřesňuje technické řešení, po dopřesnění následně bude předložen odborný cenový odhad KD č. 8 ze dne 17.2.2021 – zhotovitel k datu konání KD stavby předložil odborný cenový odhad	DPP Zhotovitel Metroprojekt Zhotovitel	Do příštího KD
05/1/3	Zhotovitel informoval o jednání ve věci vzorkování podhledů a dalších prvků. Zhotovitel připraví plán vzorkování, kde bude uvedený termín a předmět vzorkování. KD č. 7 ze dne 3. 2. 2021 – dnešního dne proběhlo vzorkování prvků – viz příloha č. 2 (vzorkovací listy č. 2- 5). Investor připomíná zhotoviteli požadavek zástupce 811120 ohledně dodání seznamu náhradních dílů ke schváleným (na stavbě montovaným) svítidlům vč. ukázky jejich výměny.	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info

Zápis z 8. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“

06/1/1	Zhotovitel požaduje potvrzení možnosti kompletního odpojení pultu PM – výstup Na Knížecí Aktuální stav – k datu konání KD není kompletně odpojeno	Zhotovitel DPP	info
06/1/2	Bylo dohodnuto, že bude prověřena možnost obnovení přívodu vody pro údržbu odvodňovacích kanálků u pevných schodišť v podchodu, není součástí odsouhlasené RDS. DPP – JPM prověří potřebu obnovy, aktuálně není používáno KD č. 7 ze dne 3.2.2021 – dle informace od [redacted] – DPP – JPM – nebude obnoven přívod vody pro údržbu odvodňovacích kanálků u pevných schodišť v podchodu. Zachovají se pouze stávající nerezová dvířka kryjící vodovodní kohouty. Dále bylo dohodnuto, že v místě oblouku u nově budovaného hydrantu umístěného u vstupu do hygi buněk bude nově zřízen výtok vody v nice ve stěně + nerezová dvířka. Projektant zpracuje návrh. KD č. 8 ze dne 17.2.2021 – Projektant zpracoval návrh doplnění vodovodní výtokové armatury v podchodu (viz příloha č. 2). [redacted] – DPP – JPM doplnění projektu odsouhlasil.	DPP Metroprojekt	Info Do 28.2.2021
06/1/4	Zhotovitel informoval o větším rozsahu demolovaných konstrukcí nabetonávky v šikmé části ET, zkontrolováno AD, TDI a zapsáno v SD. Bude sledován skutečný stav v dalších částech ET. Kontroly probíhají průběžně pro ověření skutečně zastíženého stavu	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info
07/1/1	Dle požadavku zástupce investora při dopracování RDS (po dnešním upřesnění [redacted] budou doplněny do výkladců el. rozvody: velký uprostřed – vývod světelný + 2 x zásuvka, malý – vývod + 1xzásuvka	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info
07/1/2	Měsíc před dokončením stavby, na základě výzvy zhotovitele, zprovozní jednotku EKV AN-ESK-302 včetně připojení na EPS firma Analogia zastoupená [redacted]	Zhotovitel DPP	Trvale
07/1/3	Zástupce investora důrazně upozorňuje zhotovitele na zákaz parkování vozidel v terminálu bus. V případě opakovaných/přetrvávajících porušení bude napříště přizvána Policie ČR.	Zhotovitel DPP Metroprojekt	Trvale

Příští KD se bude konat ve středu 3.3.2021 od 13:00 hod – sraz účastníků - vestibul stanice Anděl/Na Knížecí

Zapsal: [redacted] TDS a koordinátor BOZP

Zápis z 8. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“

Verifikace:

Tento zápis z kontrolního dne platí jako písemnost a termíny v něm uvedené jsou závazné. Zápis z kontrolního dne je zaslán na uvedené e-mailové adresy uvedené v rozdělovníku. Námitky proti uvedeným ustanovením musí být sděleny písemně formou revizí patrných přímo v předmětném zápisu z kontrolního dne, nejpozději však do 48 hod. od odeslání definitivní podoby, jinak se má zápis za schválený a platný. Vyskytnou-li se sporné připomínky, schvaluje se zápis po projednání připomínek na následujícím kontrolním dni nebo jednání.


Vysvětlivky pojmů pro zápis:

DPP	Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. - investor
IDS	Inženýring dopravních staveb a.s. - Příkazník, TDS, koordinátor BOZP
Zhotovitel	Společnost Eskalátory Anděl/Na Knížecí – HOCHTIEF - SYNER - zhotovitel
Metroprojekt	METROPROJEKT Praha a.s. - projektant
KD	kontrolní den
TDS	technický dozor stavebníka
ZS	zařízení staveniště
SoD	smlouva o dílo
HMG	harmonogram
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
KooBOZP	koordinátor BOZP
TP	technologický postup
ŽB	železobeton
SP	stavební povolení
SÚ	stavební úřad
PBŘ	požárně-bezpečnostní řešení stavby
CHÚC	chráněná úniková cesta
DOSS	dotčený orgán státní správy nebo samosprávy
OIP	Oblastní inspektorát práce
SD	stavební deník
CN	cenová nabídka

Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 140, 147 00 Praha 4

Prezenční listina účastníků KD č. 8


akce: Modernizace PS č. 274 až 276 a revitalizace vestibulu Anděl/Na Knížecí
místo jednání : vestibul Na Knížecí
datum : 17. 2. 2021

<u>JMÉNO</u>	<u>ORGANIZACE</u>	<u>TELEFON</u>	<u>E-MAIL</u>	<u>PODPIS</u>
				


Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 140, 147 00 Praha 4

Prezenční listina účastníků KD č. 8

akce: Modernizace PS č. 274 až 276 a revitalizace vestibulu Anděl/Na Knížecí
místo jednání : vestibul Na Knížecí
datum : 17. 2. 2021

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
				

Zápis z 9. kontrolního dne stavby**„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“**

Stavba	Zapsal	Revize zápisu
Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí		00

Předmět	Pořadové číslo KD
Zápis z KD stavby	09

Datum konání KD	Místo jednání
3.3.2021	vestibul stanice metra Anděl/Na Knížecí

Prezence – viz. příloha č.1

Datum konání příštího KD
17.3.2021 od 13,00 hod

Přílohy zápisu
Příloha č. 1 - Prezenční listina

Číslo	Předmět	Odpovědný	Termín
1	ADMINISTRACE PROJEKTU		
09/1/1	Po prohlídce stávajícího stavu bylo dohodnuto, že ve strojvnách VZT v UP a UPV ve vazbě na jednotky umístěné na podlaze bude původní betonová podlaha zbroušena a natřena z důvodu zajištění bezprašného povrchu ve strojvnách - zástupce investora upozorňuje na bod 01/1/5 zápisu - před zahájením předložit finanční vyčíslení k odsouhlasení.	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info
09/1/2	Při sanačních pracích v ET dochází s ohledem na značné průsaky k nutnosti dodatečných injektáží (reinjektování) a následné nadspotřebě injektážního materiálu (aktuálně cca 30%). Spotřeby materiálu jsou evidovány v injektážních protokolech a bude vyhodnoceno po dokončení prací.	Zhotovitel TDS DPP	Info
09/1/3	Zhotovitel informoval, že po zaměření desky eskalátorového tunelu geodetem stavby jsou stávající konstrukce šikmé části o cca 10 – 12cm níže než předpokládal projekt. Bude doložen geodetický protokol.	Zhotovitel	Info

Zápis z 9. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“

2 HARMONOGRAM

09/2/1 Stavební práce probíhají dle harmonogramu stavby a schválené etapizace.

Probíhají práce:

- Sanační práce v kabelovém prostoru a v klenbě ET
- Zpětná montáž nových zontů klenby a levé stěny
- Montáž kabelových tras ve vestibulu
- Montáž VZT klapky a stěnových uzávěrů v UP a UPV
- Montáž suchovodu a výtlačku v ET
- Výztuž a bednění nosných konstrukcí v ET

09/2/2 Práce plánované na budoucí období:

- Montáže kabelových tras v podchodu
- Sanace v kabelovém prostoru a v klenbě ET + napínací komora
- Zpětná montáž nových zontů
- Betonáž nosných konstrukcí v ET a další postup ve strojovně
- Osazování prvků VZT
- Montáž suchovodu a výtlačku v ET
- Monolitické konstrukce v hygi buňkách
- Zazdívky komponentů VZT

3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- Zhotovitel informoval o nutné změně trasy kabelových konstrukcí v kabelovém kanále v ET. RDS předložena a odsouhlasena č. v. 537
- Byla odsouhlasena změna vyztužení a tvaru konzol v napínací komoře SO 01 č.v. 604
- Byla odsouhlasena PS 91-1 č.v 23 a 24 – napájení VZT jednotek
- Byla schválena VD rozebiratelného stropu ve strojovně
- Byla schválena další část VD zámečnických konstrukcí – sloup v ET, kotevní trny a strop instalačního kanálu
- Změna výztuže stropu – č.v 603

4 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zápis z 9. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“

5 koordinátor BOZP			
09/5/1	Koordinátor BOZP konstatoval, že při pravidelných kontrolách prováděných sanačních prací v ET nebylo zjištěno porušení předpisů a požadavků spojených s BOZP a jsou dodržovány zásady BOZP pro tyto práce, které jsou uvedeny v plánu BOZP a pracovníci používají OOPP.	Zhotovitel KooBOZP	info
09/5/2	Koordinátor BOZP upozorňuje jednotlivé zhotovitele na nutnost dodržovat opatření vlády ČR ohledně koronavirové krize (používání roušek a respirátorů, zvýšená hygiena, atd.).	Zhotovitel KooBOZP	Trvale
04/5/3	Koordinátor BOZP upozorňuje jednotlivé zhotovitele na nutnost vyvěšovat prodlužovací elektro kabely, které jsou používány na jednotlivých pracovištích.	Zhotovitel KooBOZP	Trvale
07/5/2	Koordinátor BOZP upozorňuje zhotovitele na nutnost udržovat podlahy na pracovištích bez zbytků vybouraného materiálu a konstrukcí.	Zhotovitel KooBOZP	Trvale
6 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI			
7 OTEVŘENÉ ZÁLEŽITOSTI Z PŘEDEŠLÝCH KD včetně aktuálního KD Stavby			
01/1/1	Zhotovitel provedl demontáž reklamních panelů z eskalátorového tunelu ze smaltovaných plechů – typ B1. Zástupce DPP [redacted] prověří komu se tyto reklamní panely protokolárně předají. KD č. 4 ze dne 17.12.2020 – reklamní panely typ B1 budou dle informace [redacted] likvidovány na skládce [redacted] zapíše tuto informaci do stavebního deníku.	Zhotovitel DPP	Info
01/1/5	Investor upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.8 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)	Zhotovitel DPP	Trvale
02/1/3	Zástupce 850 120 [redacted] zašle Interní sdělení na zástupce odboru Investic se specifikací aktuálních potřeb místnosti 6/442. Po doprojektování a fin. vyčíslení bude rozhodnuto o případné realizaci v rámci této IA KD č. 6 ze dne 20.1.2021 - Zástupce investora informuje, že již obdržel zmíněné IS - požadavek byl obratem předán dodavateli stavby s dotazem na fin. vyčíslení (vč. dopadu do termínu). Zhotovitel v součinnosti s projektantem dopřesňuje technické řešení, po dopřesnění následně bude předložen odborný cenový odhad	Zhotovitel Metroprojekt	
	KD č. 8 ze dne 17.2.2021– zhotovitel k datu konání KD stavby předložil odborný cenový odhad	Zhotovitel DPP	Info – vypouští se

Zápis z 9. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“

KD č. 9 - proběhlo šetření za účasti [redacted] na místnosti předprodeje [redacted] potvrdila platnost požadavku na doplnění klimatizace

05/1/3	Zhotovitel informoval o jednání ve věci vzorkování podhledů a dalších prvků. Zhotovitel připraví plán vzorkování, kde bude uvedený termín a předmět vzorkování. KD č. 7 ze dne 3. 2. 2021 – dnešního dne proběhlo vzorkování prvků – viz příloha č. 2 (vzorkovací listy č. 2- 5). Investor připomíná zhotoviteli požadavek zástupce 811120 ohledně dodání seznamu náhradních dílů ke schváleným (na stavbě montovaným) svítidlům vč. ukázky jejich výměny.	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info
06/1/1	Zhotovitel požaduje potvrzení možnosti kompletního odpojení pultu PM – výstup Na Knížecí Aktuální stav – k datu konání KD není kompletně odpojeno Stav k datu KD č. 9 – pult odpojen	Zhotovitel DPP	Info Info
06/1/2	Bylo dohodnuto, že bude prověřena možnost obnovení přívodu vody pro údržbu odvodňovacích kanálků u pevných schodišť v podchodu, není součástí odsouhlasené RDS. DPP – JPM [redacted] prověří potřebu obnovy, aktuálně není používáno [redacted] KD č. 7 ze dne 3.2.2021 – dle informace od [redacted] – DPP – JPM – nebude obnoven přívod vody pro údržbu odvodňovacích kanálků u pevných schodišť v podchodu. Zachovají se pouze stávající nerezová dvířka kryjící vodovodní kohouty. Dále bylo dohodnuto, že v místě oblouku u nově budovaného hydrantu umístěného u vstupu do hygi buněk bude nově zřízen výtok vody v nice ve stěně + nerezová dvířka. Projektant zpracuje návrh. KD č. 8 ze dne 17.2.2021 – Projektant zpracoval návrh doplnění vodovodní výtokové armatury v podchodu (viz příloha č. 2). [redacted] – DPP – JPM doplnění projektu odsouhlasil.	DPP Metroprojekt	Info info Vypouští se
06/1/4	Zhotovitel informoval o větším rozsahu demolovaných konstrukcí nabetonávky v šikmé části ET, zkontrolováno AD, TDI a zapsáno v SD. Bude sledován skutečný stav v dalších částech ET. Kontroly probíhají průběžně pro ověření skutečně zastíženého stavu	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info
07/1/1	Dle požadavku zástupce investora při dopracování RDS (po dnešním upřesnění [redacted] budou doplněny do výkladců el. rozvody: velký uprostřed – vývod světelný + 2 x zásuvka, malý – vývod + 1xzásuvka	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info
07/1/2	Měsíc před dokončením stavby, na základě výzvy zhotovitele, zprovozní jednotku EKV AN-ESK-302 včetně připojení na EPS firma Analogie [redacted]	Zhotovitel DPP	Trvale
07/1/3	Zástupce investora důrazně upozorňuje zhotovitele na zákaz parkování vozidel v terminálu bus. V případě opakovaných/přetrvávajících porušení bude napříště přizvána Policie ČR.	Zhotovitel DPP Metroprojekt	Trvale

Zápis z 9. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“

08/1/2	Zhotovitel k datu konání KD stavby předložil cenový návrh na doplnění osvětlení ve vestibulu dle požadavků. Na základě rozhodnutí technického ředitele Kóprivy byl udělen pokyn zhotoviteli k zpracování RDS dle návrhu „linie svítidel ve vestibulu“	Zhotovitel DPP	info	
08/1/3	Metroprojekt připravuje změnu vyztužení stropu v úrovni vestibulu – jedná se o řešení stavu po odbourání trámů pro uložení stropních desek, kdy výztuž trámů není zrealizována dle archivní dokumentace RDS zpracována – viz projektová dokumentace	Zhotovitel DPP Metroprojekt	info	Zhotovitel

Příští KD se bude konat ve středu 17.3.2021 od 13:00 hod – sraz účastníků - vestibul stanice Anděl/Na Knížecí. S ohledem na aktuální pandemickou situaci prosíme o účast pouze nezbytných zástupců. Běžnou agendu/kontrolu je možné vykonávat v jiných dnech.

Zapsal Ing. TDS a koordinátor BOZP

Verifikace:

Tento zápis z kontrolního dne platí jako písemnost a termíny v něm uvedené jsou závazné. Zápis z kontrolního dne je zaslán na uvedené e-mailové adresy uvedené v rozdělovníku. Námitky proti uvedeným ustanovením musí být sděleny písemně formou revizí patrných přímo v předmětném zápisu z kontrolního dne, nejpozději však do 48 hod. od odeslání definitivní podoby, jinak se má zápis za schválený a platný. Vyskytnou-li se sporné připomínky, schvaluje se zápis po projednání připomínek na následujícím kontrolním dni nebo jednání.

Vysvětlivky pojmů pro zápis:

DPP	Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. - investor
IDS	Inženýring dopravních staveb a.s.. - Příkazník, TDS, koordinátor BOZP
Zhotovitel	Společnost Eskalátory Anděl/Na Knížecí – HOCHTIEF - SYNER - zhotovitel
Metroprojekt	METROPROJEKT Praha a.s. - projektant
KD	kontrolní den
TDS	technický dozor stavebníka
ZS	zařízení staveniště
SoD	smlouva o dílo
HMG	harmonogram
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
KooBOZP	koordinátor BOZP
TP	technologický postup
ŽB	železobeton
SP	stavební povolení
SÚ	stavební úřad
PBŘ	požárně-bezpečnostní řešení stavby
CHÚC	chráněná úniková cesta
DOSS	dotčený orgán státní správy nebo samosprávy

Zápis z 9. kontrolního dne stavby

„Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“


OIP
SD
CN

Oblastní inspektorát práce
stavební deník
cenová nabídka

Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 140, 147 00 Praha 4

Prezenční listina účastníků KD č. 9


akce: Modernizace PS č. 274 až 276 a revitalizace vestibulu Anděl/Na Knížecí
místo jednání : vestibul Na Knížecí
datum : 3. 3. 2021

<u>JMÉNO</u>	<u>ORGANIZACE</u>	<u>TELEFON</u>	<u>E-MAIL</u>	<u>PODPIS</u>
				

Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 140, 147 00 Praha 4

Prezenční listina účastníků KD č. 9

akce: Modernizace PS č. 274 až 276 a revitalizace vestibulu Anděl/Na Knížecí
místo jednání : vestibul Na Knížecí
datum : 3. 3. 2021

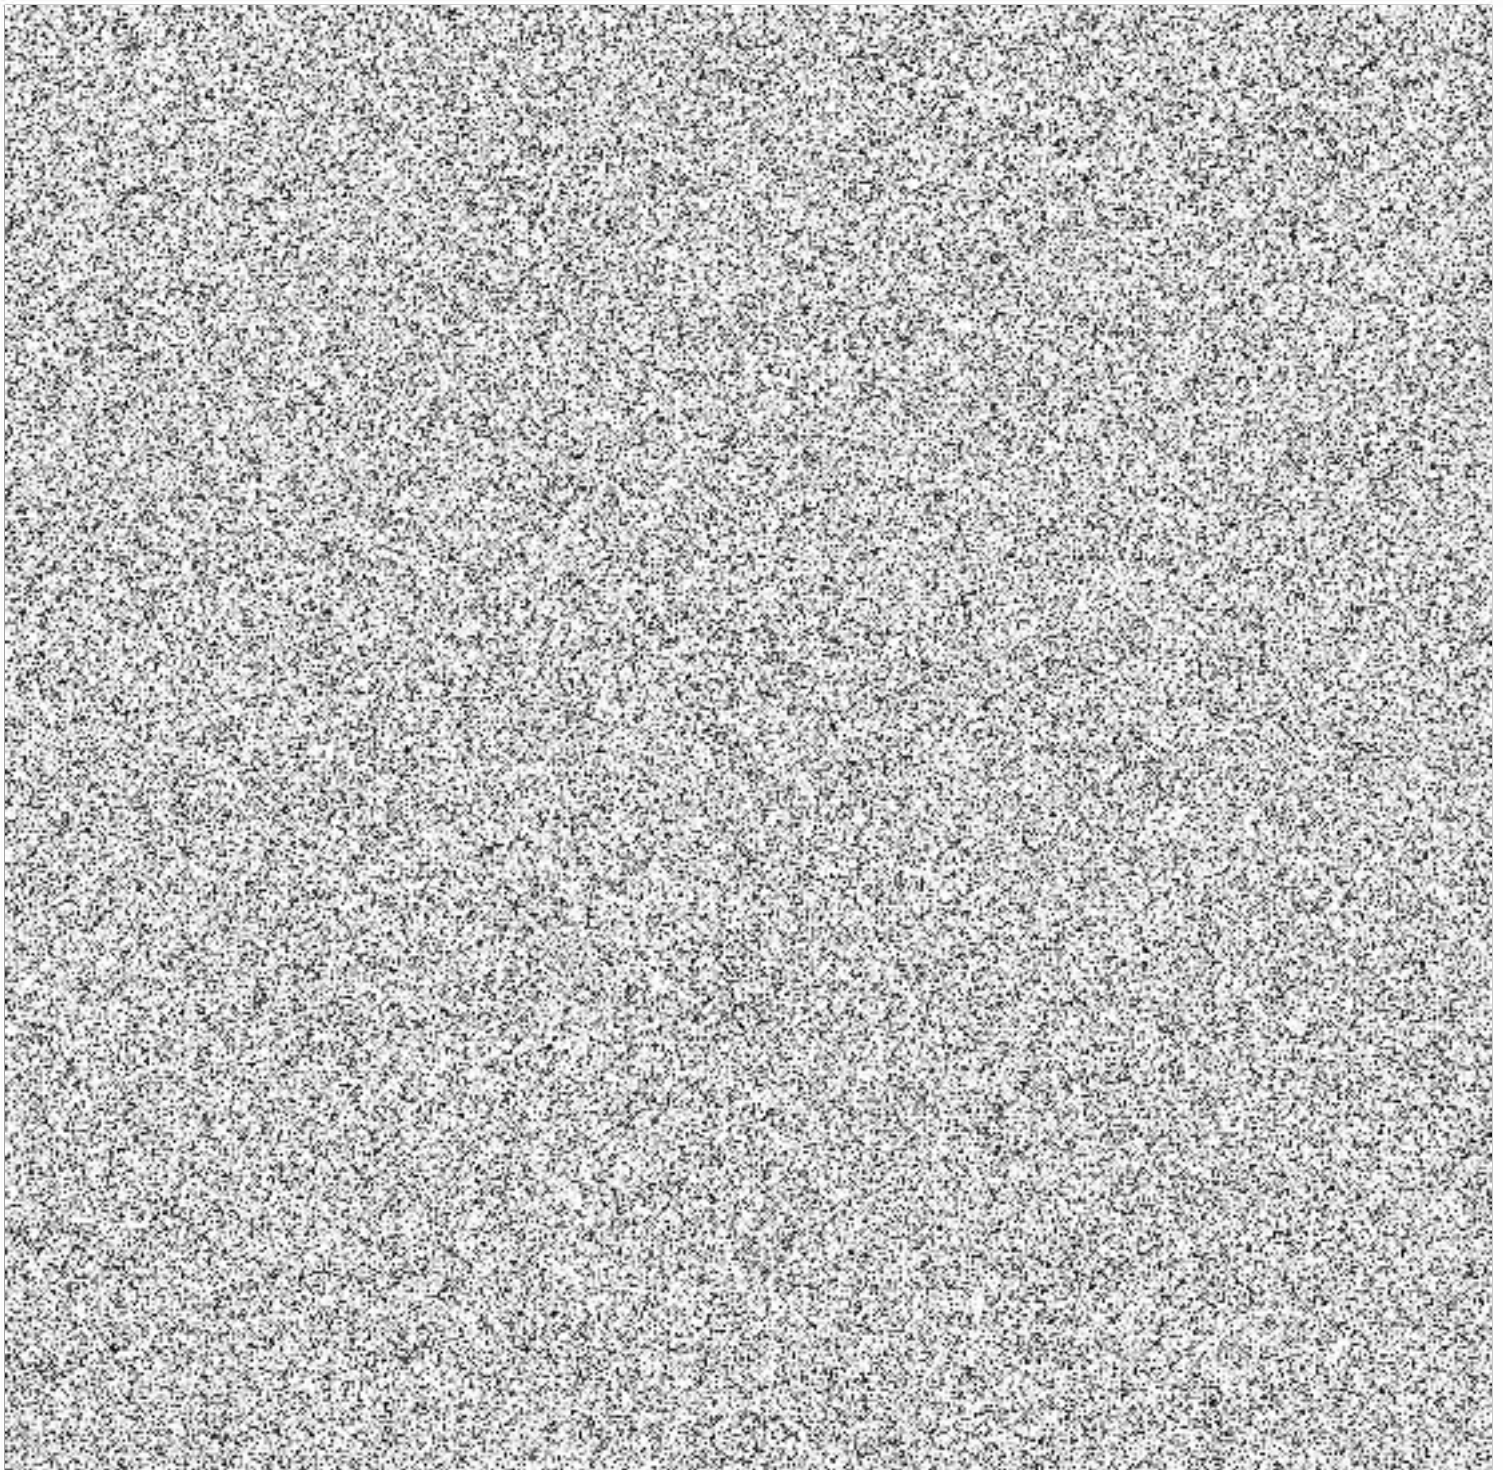
<u>JMÉNO</u>	<u>ORGANIZACE</u>	<u>TELEFON</u>	<u>E-MAIL</u>	<u>PODPIS</u>
				

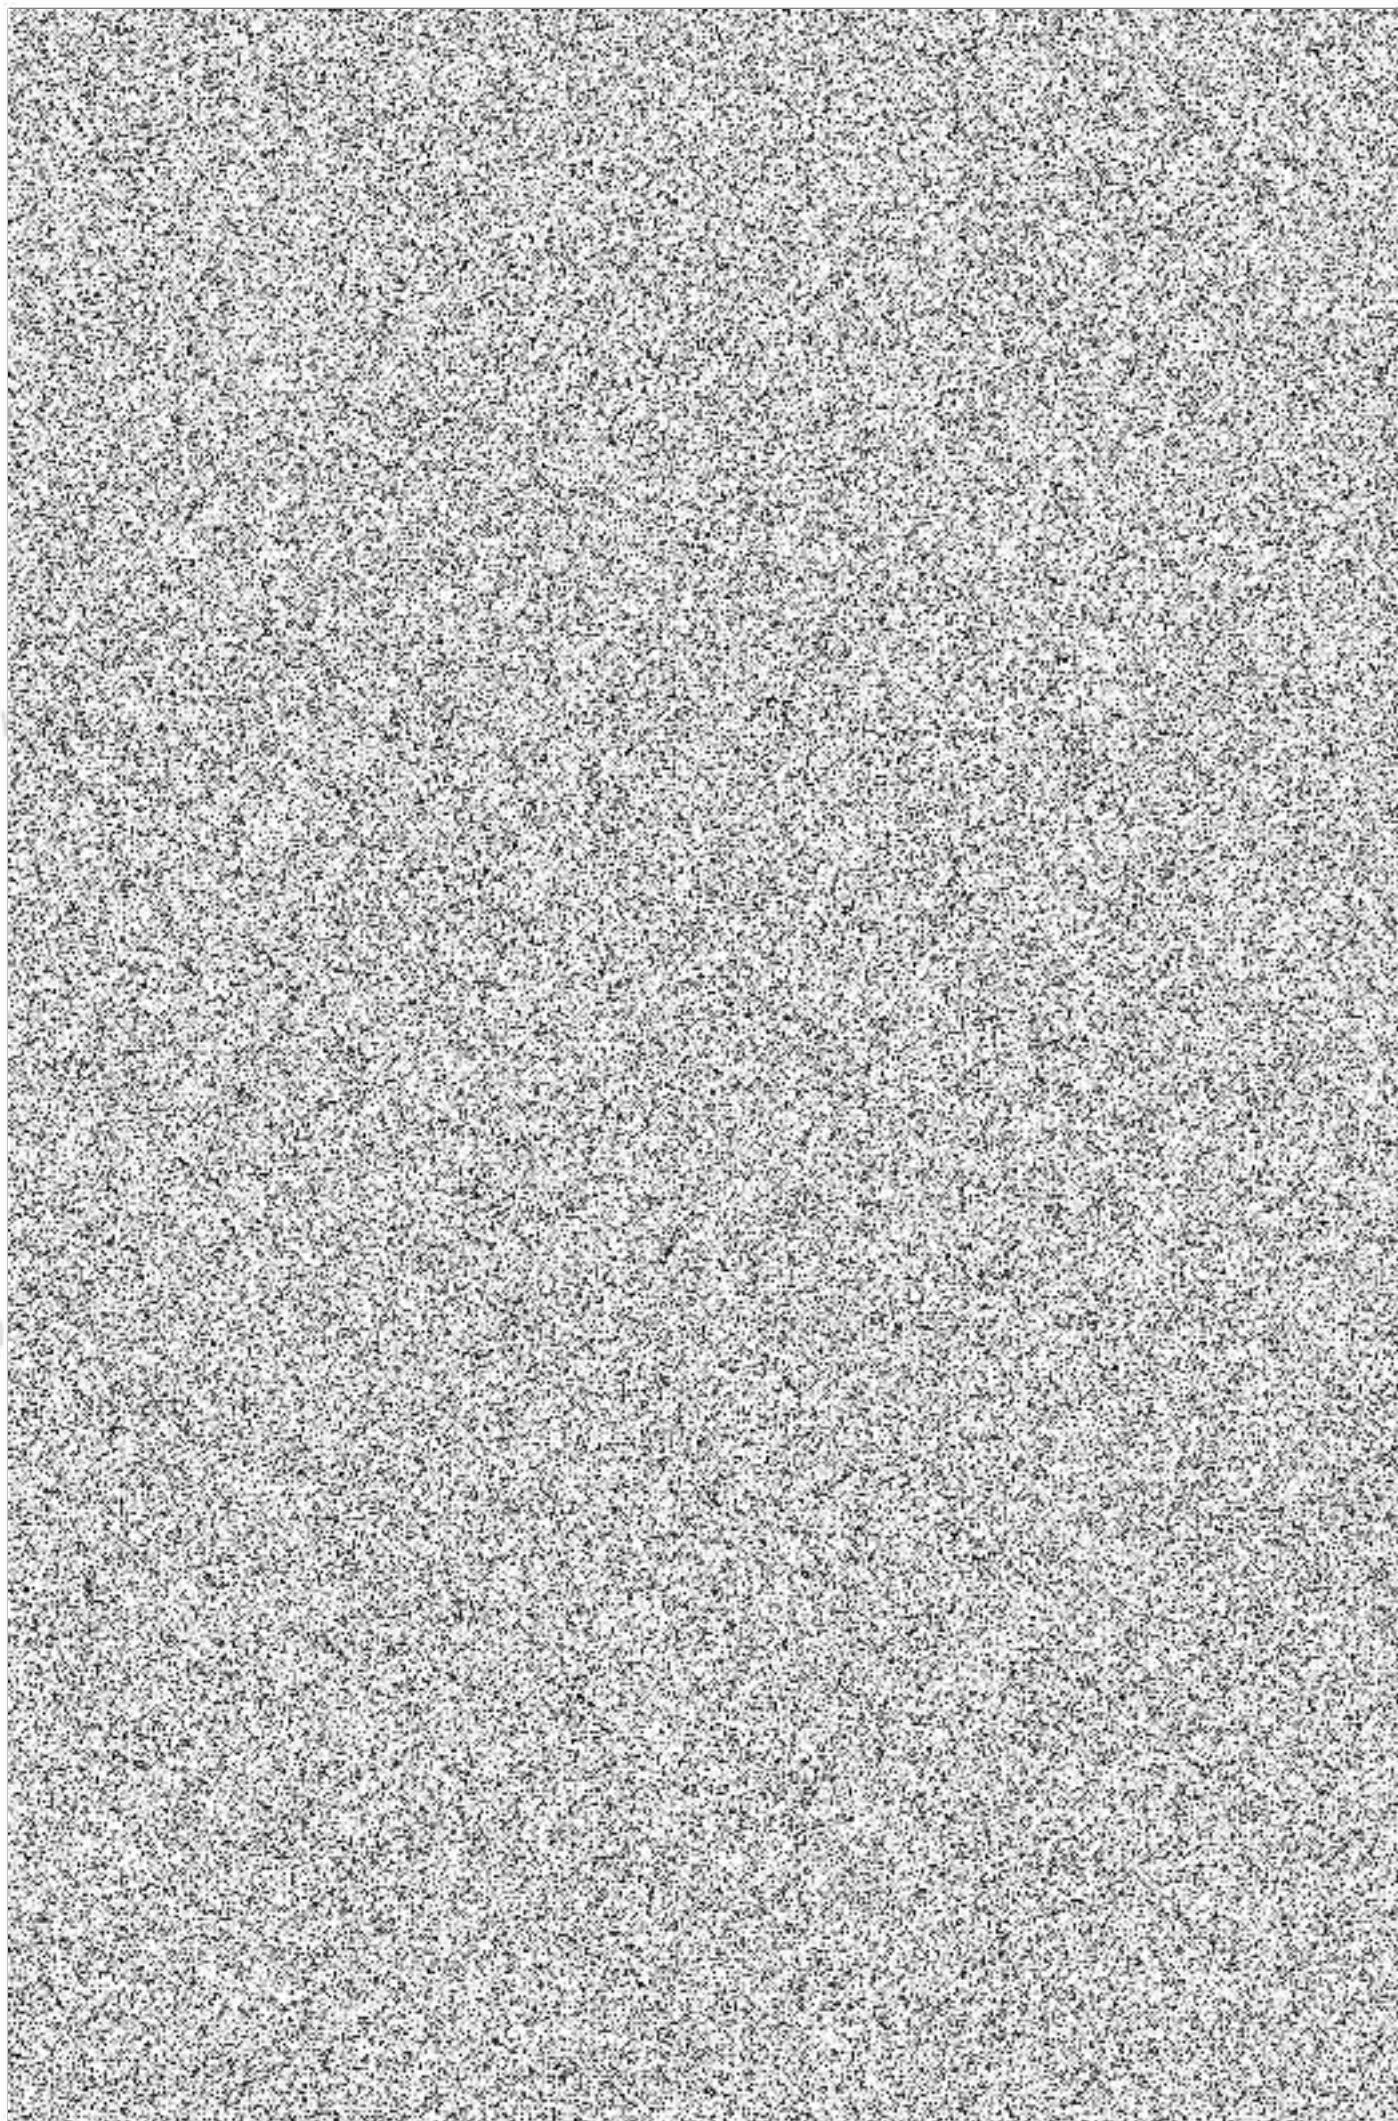
Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 140, 147 00 Praha 4

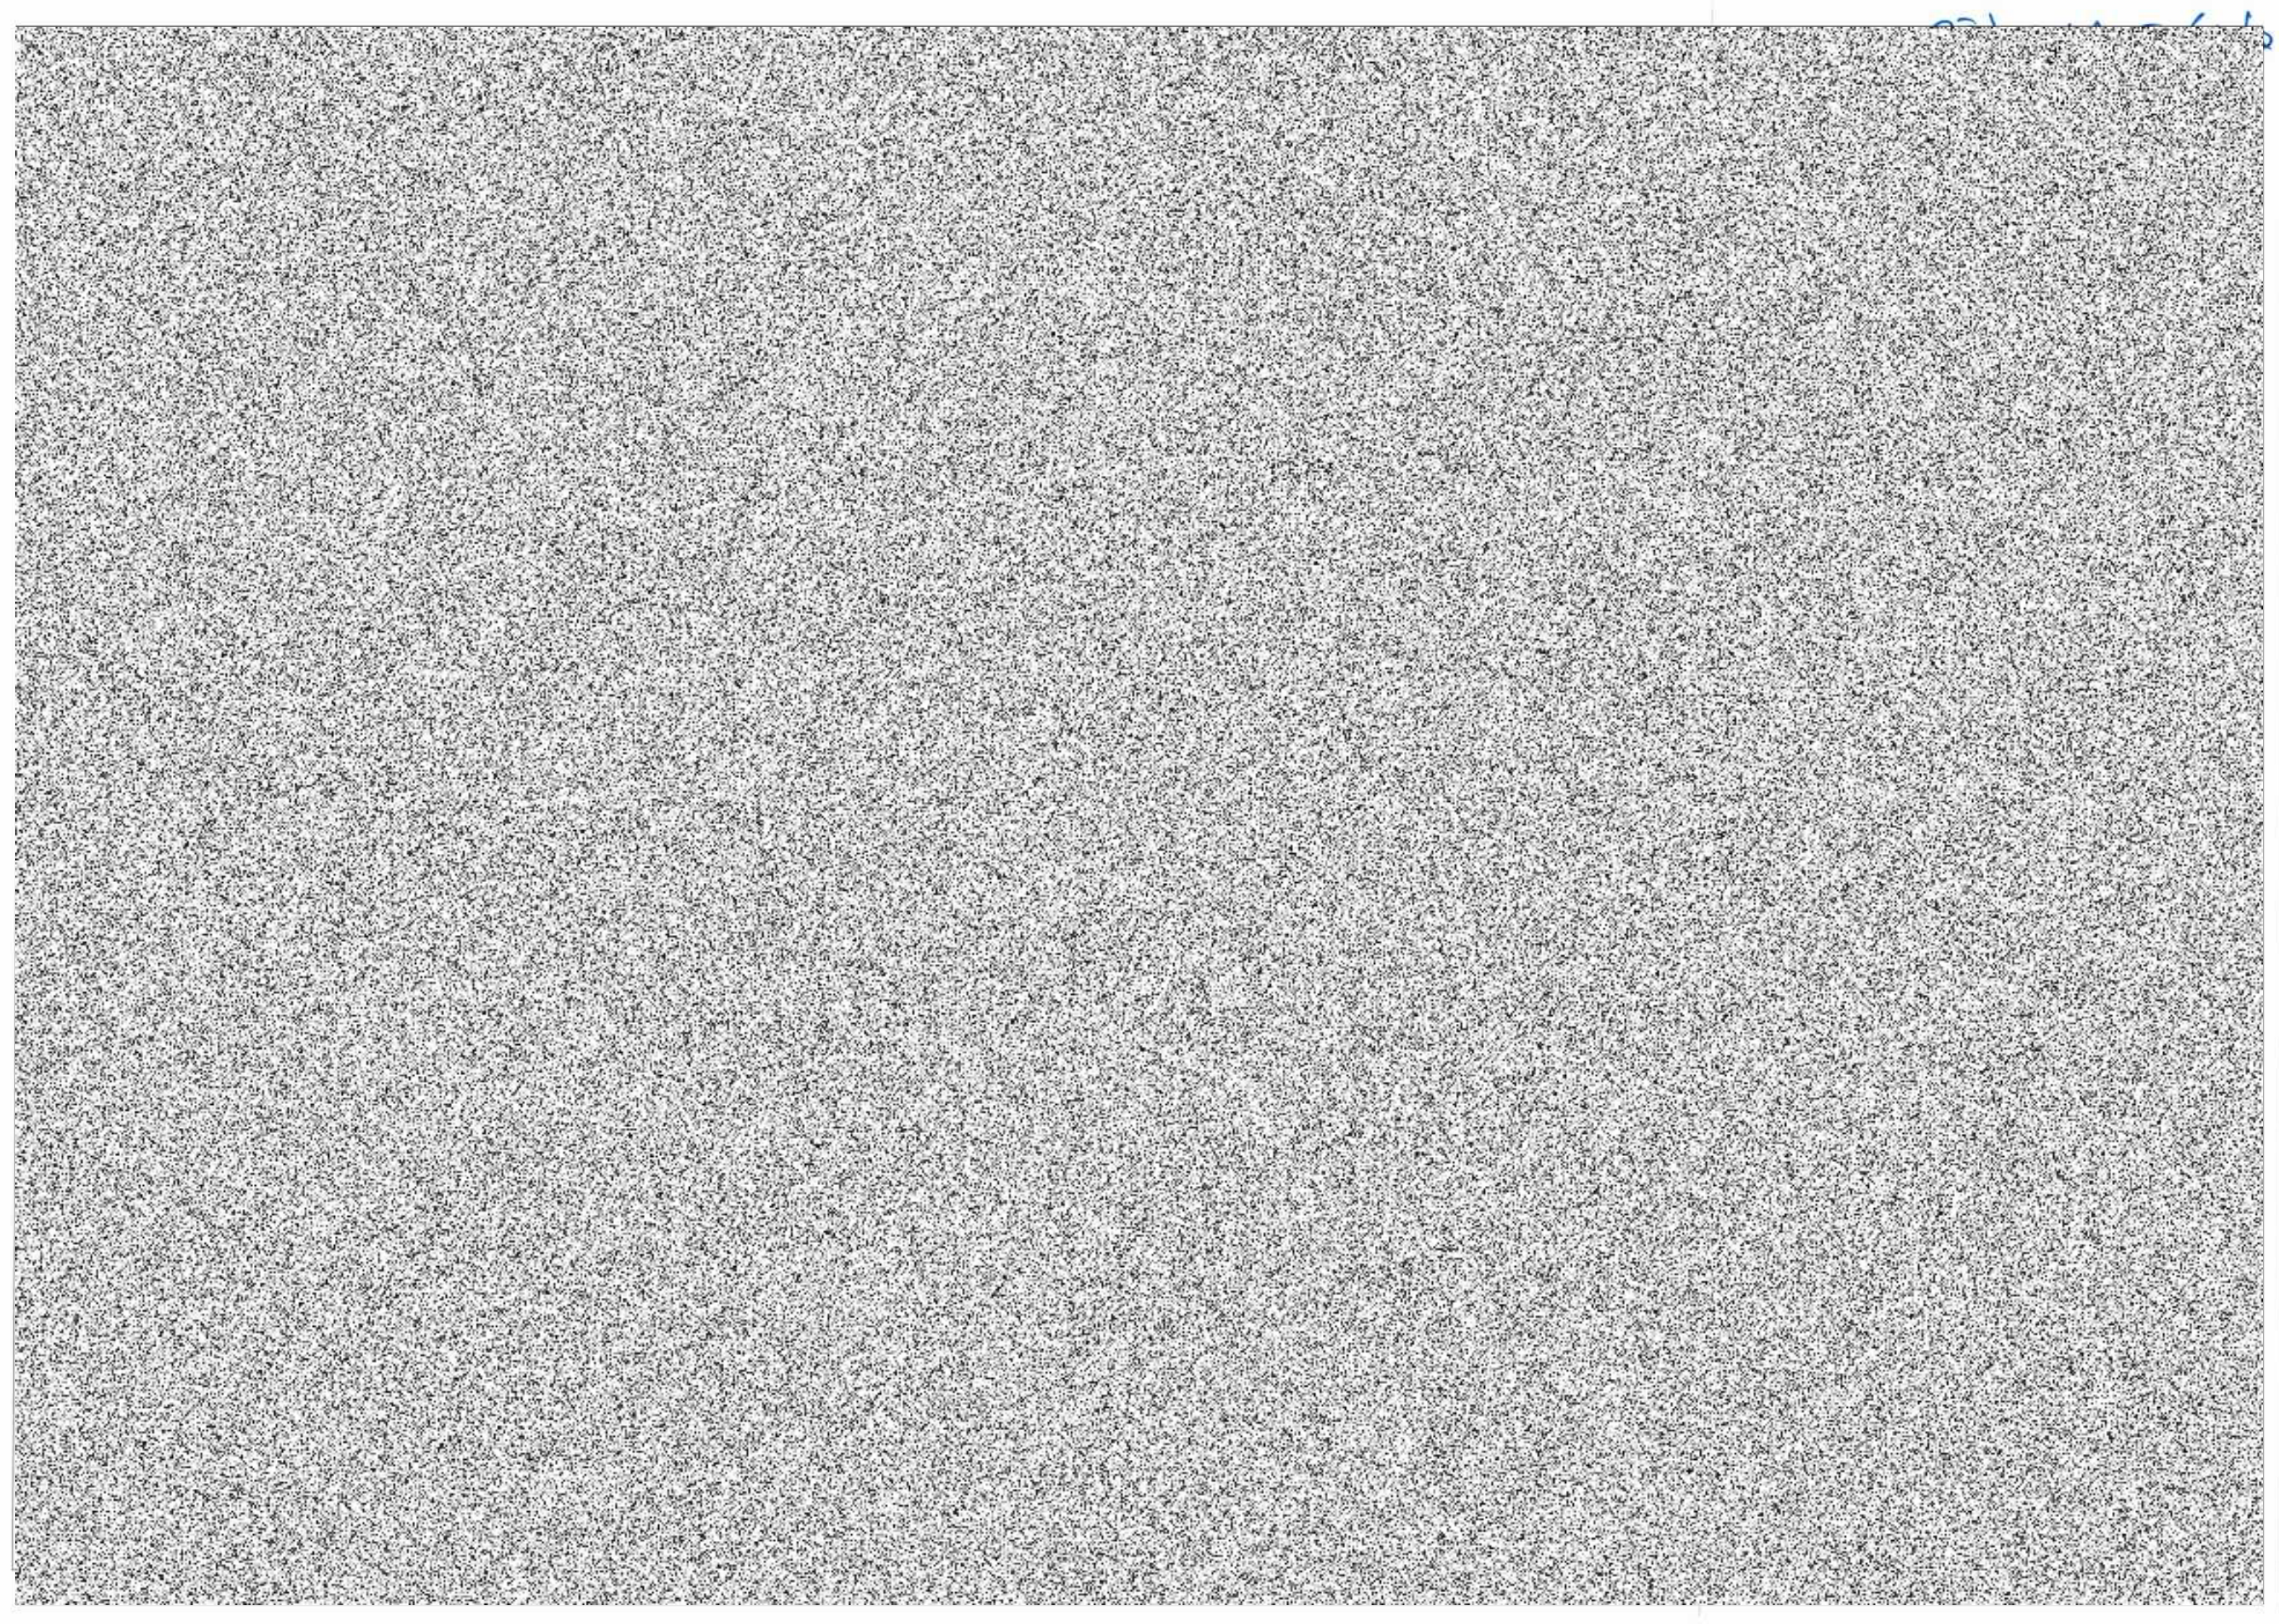
Prezenční listina účastníků KD č.9

akce: Modernizace PS č. 274 až 276 a revitalizace vestibulu Anděl/Na Knížecí
místo jednání : vestibul Na Knížecí
datum : 3. 3. 2021

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	E-MAIL	PODPIS












HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

Cenová nabídka:

Změna osvětlení ve vestibulu, akce „Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl / Na Knížecí“

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku ze dne 21.01.2021 Vám zasíláme termínovou a cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace dle požadavku  na doplnění linií svítidel ve vestibulu.

1. Vypracování podkladů pro odborný odhad – časová náročnost vypracování 3 dny, cena 
2. Vypracování realizační dokumentace Osvětlení, ASDŘ_O, Stavební část – časová náročnost vypracování 3 týdny, cena 

V Praze 22.01.2021



Hlavní inženýr projektu
METROPROJEKT Praha a.s.
