



TSKRP008JWUS

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo  
**„Barrandovský most - celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní  
stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1“**

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5800/013/1

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.0041161DKO

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Věra Bartošová - technik oddělení strategických investic

(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel: 1) EUROVIA CS, a.s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní a doručovací adresa:

Odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitel závodu Praha západ  
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ  
Ing. Libor Gaida, vedoucí technické skupiny

(mimo podpisu SOD a následných dodatků)

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obch.náměstek

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Daniel Kováč

**2) FREYSSINET CS, a.s.**

Královická 267, 250 61 Zápý

IČO: 61673048

DIČ: CZ61673048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 3720  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. ú.: 141840185/0100  
zastoupena: Miroslavem Havlíčkem, předsedou představenstva a Ing Petrem  
Kalabisem, členem představenstva

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Miroslav Havlíček, předseda představenstva  
Ing. Petr Kalabis, člen představenstva

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 13.3.2020 ve „**Společnost EUROVIA – FREYSSINET, Barrandovský most**“ se správcem společnosti: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Barrandovský most - celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1**“ ze dne 03.08.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o provedení nepředvídatelných dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které spočívají v navýšení prací z následujících důvodů:

- nutnost doplnění výztuže dobetonování kotevních oblastí,
- nutnost tryskání vodorovného povrchu horního stupně základů pilířů č. 4 a 5 - práce pod vodou,
- nutnost zřízení zavěšeného lešení na pilířích č. 4 a 5,
- nutnost odstranění graffiti nátěrů,
- nutnost obnovy těžkého kamenného záhozu pilířů.

Práce, které nebylo nutno v rámci plnění díla provést (méněpráce) spočívají v:

- snížení rozsahu sanace pilířů,
- snížení rozsahu bourání a dobetonování kotevních oblastí a sanace kotev předpínací výztuže na svislém povrchu příčl. pilířů,
- snížení rozsahu vlastního těžení a sanačních prací pod vodou,
- nerealizace lešení postaveného na pevném základu na pilířích č. 4 a 5.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Aktualizované soupisy prací, kterými jsou ZBV č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

**III.**  
**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. Smlouvy se mění takto:

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Původní cena bez DPH:                        | 63 258 671,18 Kč        |
| Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:     | -4 457 564,72 Kč        |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:     | 5 447 888,32 Kč         |
| <b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b> | <b>64 248 994,78 Kč</b> |

2. Celková hodnota změny závazu ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
6. Příloha č. 1 – Plná moc Ing. Petra Tesaře k podpisu smlouvy (Dodatku)  
Příloha č. 2 – ZBV 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 včetně rozpisu ocenění změn položek  
Příloha č. 3 – Aktualizovaný harmonogram prací

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

za Objednatele:

Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Josef  
Richtr

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2021.11.16  
10:54:52 +01'00'

.....

Filip  
Hájek

Digitálně podepsal  
Filip Hájek  
Datum: 2021.11.16  
11:24:13 +01'00'

.....

za Zhotovitele:

Společnost EUROVIA –  
FREYSSINET, Barrandovský most

Ing. Petr  
Tesař

Digitálně podepsal Ing. Petr  
Tesař  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-45274924,  
o=EUROVIA CS, a.s.,  
ou=18304137, cn=Ing. Petr  
Tesař, sn=Tesař,  
givenName=Petr,  
serialNumber=P486136  
Datum: 2021.11.12 10:11:19  
+01'00'

.....  
Za EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař  
ředitel závodu Praha západ  
na základě plné moci

Bc. Miroslav  
Havlíček

Digitálně podepsal  
Bc. Miroslav Havlíček  
Datum: 2021.11.12  
09:29:10 +01'00'

.....

Za FREYSSINET CS, a.s.

Miroslav Havlíček  
předseda představenstva

Ing. Petr  
Kalabis

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kalabis  
Datum: 2021.11.12  
09:33:31 +01'00'

.....

Za FREYSSINET CS, a.s.

Ing. Petr Kalabis  
člen představenstva

## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem a  
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva a finančním ředitelem

(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,

**Ing. Petrovi Tesařovi**

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby zastupoval Společnost při jednání v rámci její účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a při realizaci veřejné zakázky **“Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1”** jejímž zadavatelem je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 63834197.

Zmocněnec je oprávněn za Společnost podepsat žádost o účast, prokázání splnění kvalifikace, a dále zejména nabídku do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, návrh smlouvy o dílo včetně příloh, jakož i činit další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné, vč. přebírání písemností.

Zmocněnec je rovněž oprávněn podepsat i smlouvu o dílo vč. následných dodatků a dále činit úkony spojené s realizací veřejné zakázky.

V Praze dne **06-03-2020**

**EUROVIA CS, a.s.**

**Ing. Martin Borovka**  
předseda představenstva  
a generální ředitel

místo

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **105155\_003541**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **IVANA POLÁKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 515**

**Česká pošta, s.p.** dne **11.06.2020**



129487463-202291-200611102453

**PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)**

### Názov a evidenčný číslo študijného

[illegible]

5/2/2013 1:21

# Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

|                                                      |                                                                                                       |                                  |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo stavby:                      | Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                     | 201 / 1                          |            |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost EUROVIA - FREYSSINET, Barrandovský most, správce: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

| Přílohy změnového listu:        | Paré č. | Příjemce  |
|---------------------------------|---------|-----------|
| (a) Rozpis ocenění změn položek | 1       | Zadavatel |
| (b) Přehled změn stavby         | 2       | Dodavatel |
| (c) Specifikace výztuže         |         |           |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

rozšíření výztuže do betonových čel pilířů

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projekt DVZ předpokládá zachování stávající výztuže v místě zaoblených konců pilířů, resp. jen její následné narovnání a opravu poté, co bude provedeno odbourání betonu a sanace kotev. Z dostupných pramenů nebyl znám její přesný průběh.

Zdůvodnění změny:

- V průběhu odbourávání betonových čel bylo zjištěno, že rozmístění stávající výztuže je natolik husté, že znemožňuje provedení jak prací na vlastním odbourávání, tak i pak na následné sanaci kotev. Přístup ke kotevním čelům bez odstranění stávající výztuže byl nemožný.
- Pro umožnění přístupu bylo tedy nezbytné stávající výztuž odříznout a následně, po provedení sanačních prací na kotvách, osadit výztuž novou, kterou projektant zpracoval jako dodatek RDS.

Technický popis nového řešení:

Doplnění cca 0,48 tuny výztuže do betonávky čel pilířů č. 3, 4, 5 a 6 (viz příloha).

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                           |                        |                        |                               |

Podpis vyjadřuje schválení změny a

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na těchto listech jsou podrobně popsány, zdůvodněny a potvrzeny změny. Tento list je zároveň záznamem o změně závazného zastoupení Objednatele a Zhotovitele své

Objednatel (Náměstek GŘ, sekce investic)

Zhotovitel

# Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evicenční číslo a název stavby:

Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1

Číslo a název SO/PS:

SO 201 / Barrandovský most V031.1 a V031.2

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 201 / 1

Změna položek podle §222 odst. 6 ZZ/Z

| Poř. č.<br>pol. | Kód<br>položky | Název položky | m.j. | Množství<br>ve Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena<br>celkem ve<br>Smlouvě v<br>Kč | Cena<br>vypuštěných<br>h prací v Kč | Cena<br>dodatečných<br>h prací v Kč | Cena<br>celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl<br>cen<br>celkem v<br>% |
|-----------------|----------------|---------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|-----------------|----------------|---------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Za Zhotovitele:

Datum: 4. 10.

Za Objednatele:

Datum:

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
H.M. PRAHY, a.s.  
Rásovkova 770/8, 110 00 PRAHA 1  
29

# Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

|                                                      |                                                                                                       |                                  |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Název a evidenční číslo stavby:                      | Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                     | 201 / 2                          | 2         |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řádnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost EUROVIA - FREYSSINET, Barrandovský most, správce: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

| Přílohy změnového listu:                                         | Paré č. | Příjemce  |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| (a) Rozpis ocenění změn položek                                  | 1       | Zadavatel |
| (b) Přehled změn stavby                                          | 2       | Dodavatel |
| (c) Výpočet kubatury záhozu a výměr sanačních prací              |         |           |
| (d) Zaměření štětovnic a záhozu po odtěžení - potápěčský průzkum |         |           |
| (e) Tvar kamenného záhozu                                        |         |           |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu prací pod vodou u základů pílů

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projekt DVZ předpokládal, že štětovnice byly v době výstavby mostu odříznuty v úrovni horní plochy spodního stupně základu.

Zdůvodnění změny:

a) V průběhu provádění těžení kamenného záhozu u pílí č. 4 a u pílí č. 5 byly kolem spodního stupně základu obou pílí zjištěny ocelové štětovnice. Štětovnice dle potápěčského průzkumu a zaměření vyčnívají v průměru 0,4 m nad horní plochu spodního stupně základu. Štětovnice neumožňují odtěžení záhozu v plné míře.

b) Vyčnívající štětovnice a boční hrana horního základového bloku vymezují pás kolem celého dílku šířky cca 1,6 m, který neumožňuje odtěžení záhozu běžnou technikou (tj. použitím drapáku). Horní plocha spodní části základového bloku byla navíc trvale záhozem chráněna a s ohledem na skutečnost, že i nechráněné části základu vykazují jen malé závady, lze odůvodněně předpokládat, že tato plocha má vyhovující kvalitu a nevyžaduje žádná sanační opatření. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o nedotěžení záhozu a tím snížení rozsahu vlastního těžení a sanačních prací pod vodou.

c) Oproti předpokladu v DVZ bylo provedeno tryskání vodorovného povrchu horního stupně základů pílí č. 4 a 5.

Technický popis nového řešení:

Snížení rozsahu odtěžení kamenného záhozu o cca 90 m3 (dle výpočtu v příloze) a snížený rozsah sanačních prací pod vodou u pílí č. 4 a 5.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                           |                        |                        |                               |

Podpis vyjadřuje schválení změny a

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny. list je zároveň záznamem o změně závazného zastoupení Objednatel a Zhotovitele sv

Objednatel (Náměstek GR, sekce investic)

Zhotovitel

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2                                                                                           |                |               |      |                        |                      |                     |                         | Změna rozsahu prací SO/PS podle Změny 2/18 |                                   |                                   |                                 |                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby:<br>Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 |                |               |      |                        |                      |                     |                         | ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)                |                                   |                                   |                                 |                              |                             |
| Číslo a název SO/PS:<br>SO 201 / Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                       |                |               |      |                        |                      |                     |                         | č. 201 / 2                                 |                                   |                                   |                                 |                              |                             |
|                                                                                                                                          |                |               |      |                        |                      |                     |                         | Změna položek podle §222 odst. 6 ZZVZ      |                                   |                                   |                                 |                              |                             |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                          | Kód<br>položky | Název položky | m.j. | Množství<br>ve Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč          | Cena<br>vypuštěných<br>prací v Kč | Cena<br>dodatečných<br>prací v Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |

Za Zhotovitele:

Datum:

Poslední zastupitelství  
závod Praha zápis č. 1946  
156 00 Praha 5 - Smolná

Za Objednatele:

Datum:

26

# Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

|                                                      |                                                                                                       |                                  |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo stavby:                      | Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                     | 201 / 3                          |            |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řádnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost EUROVIA - FREYSSINET, Barrandovský most, správce: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, K Hájem 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

| Přílohy změnového listu:        | Paré č. | Příjemce  |
|---------------------------------|---------|-----------|
| (a) Rozpis ocenění změn položek | 1       | Zadavatel |
| (b) Přehled změn stavby         | 2       | Dodavatel |
| (c) Příčný řez lešením          |         |           |
| (d) Fotodokumentace             |         |           |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna závěšeného lešení

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b></p> <p>Projekt DVZ uvažuje s použitím běžného dílcového lešení, postaveného na pevném povrchu bez jakéhokoli dalšího rozlišení jeho umístění u jednotlivých pilířů. Předpokládala se tedy i jeho instalace na plovoucí pontony u pilířů č. 4 a 5 situovaných ve vodním toku Vltavy.</p> <p><b>Zdůvodnění změny:</b></p> <p>Povodňový plán předepisuje povinnost neprodleného přerušení prací na vodě a uvolnění koryta řeky při průtoku vody odpovídajícímu třetímu stupni povodňové aktivity (stav ohrožen). Velá voda musí mít zajištěn volný průchod bez jakýchkoli překážek - vyžaduje tedy úplné vyklizení staveniště.</p> <p>Schválený povodňový plán k realizaci stavby (ze dne 3.11.2020, č.j. P4/569182/20/OKAT/PAN) se liší od návrhu povodňového plánu v dokumentaci DVZ zpřísněním hodnoty průtoku na odečtu Velká Chuchle z hodnoty 1000 m3/s na 600 m3/s, čímž ve svém důsledku znamená větší pravděpodobnost povinnosti uvolnění staveniště (tj. urychlené demontáže lešení z pontonů a odvoz pontonů). Splnění tohoto požadavku není možno zajistit jinak, než zavěšením lešení ke spodní desce mostu tak, aby nespočívalo pontonech a aby lešení bylo zcela nezávislé na případné manipulaci s pontony. Spodní hrana zavěšeného lešení je ve výšce 3,5 m nad hladinou vody při standardním průtoku, tím je zajištěno, že v době zvýšeného průtoku nebude vyžadovat jeho demontáž a postačí pouze odvoz pontonů.</p> <p><b>Technický popis nového řešení:</b></p> <p>Použití závěšeného dílcového lešení na pilířích č. 4 a 5 ve výměře cca 2400 m2 náhradou za použití lešení postaveného na pevném podkladu.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|

Podpis vyjadřuje schválení změny

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec



Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že jsou podrobně popsány, zdůvodněny a list je zároveň záznamem o změně zastoupení Objednatel a Zhotovitel

Objednatel (Náměstek GR, sekce inv)

Zhotovitel

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2                                                                                           |                |               |      |                        |                      |                     |                   |                                           |                     |                     |                           |                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby:<br>Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 |                |               |      |                        |                      |                     |                   | ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 201 / 3 |                     |                     |                           |                        |                           |
| Číslo a název SO/PS:<br>SO 201 / Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                       |                |               |      |                        |                      |                     |                   | Změna položek podle §222 odst. 6 ZZVZ     |                     |                     |                           |                        |                           |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                          | Kód<br>položky | Název položky | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v | Cena celkem<br>ve Smlouvě                 | Cena<br>vypuštěných | Cena<br>dodatečných | Cena celkem<br>ve Změně v | Rozdíl cen<br>celkem v | Rozdíl<br>cen<br>celkem v |

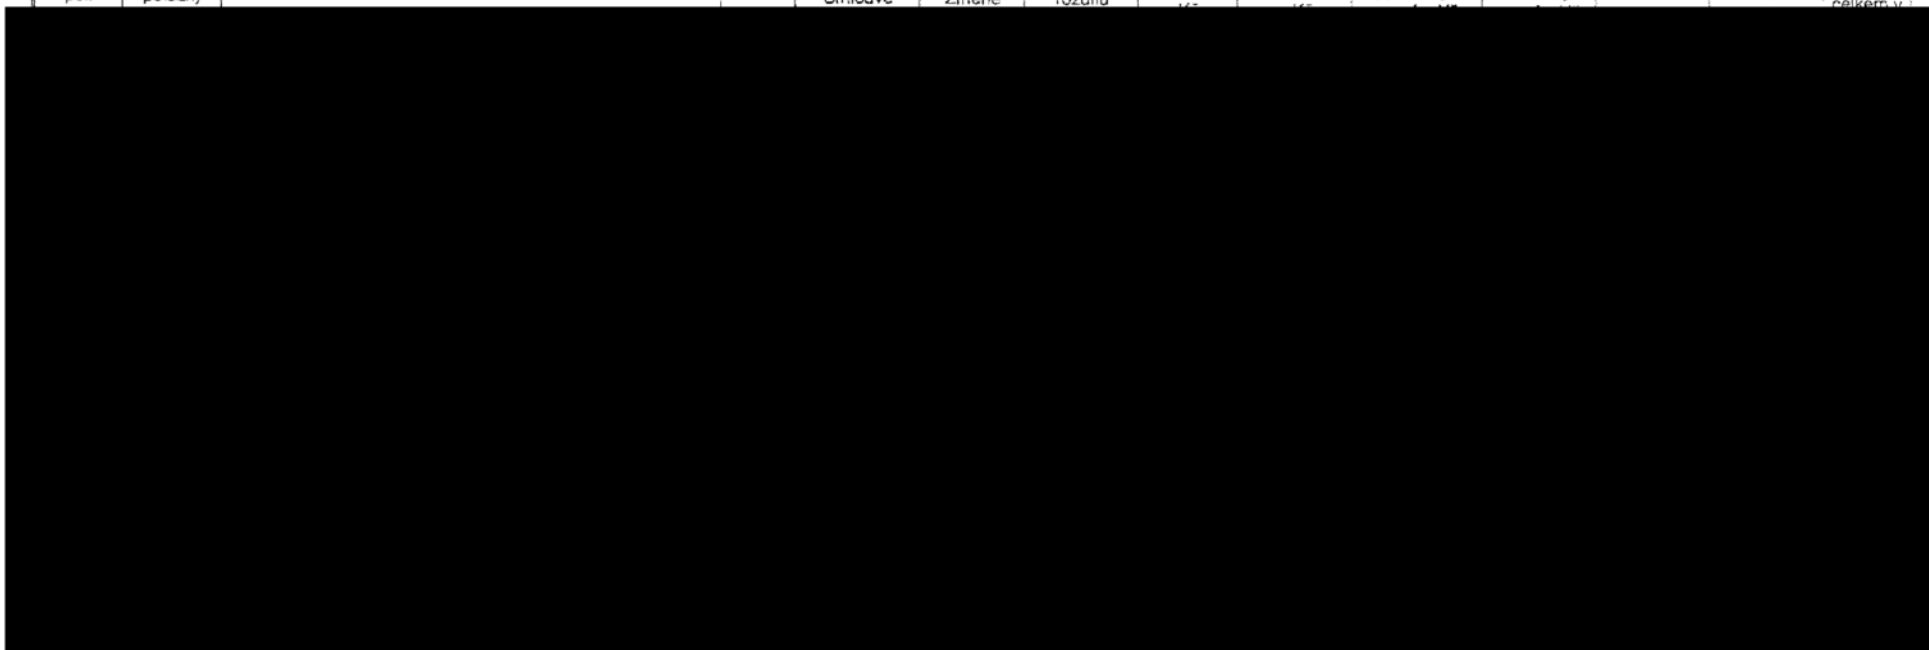

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řádnovka 770/15 110 00

# Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

|                                                      |                                                                                                       |                                  |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo stavby:                      | Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                     | 201 / 4                          | 4          |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost EUROVIA - FREYSSINET, Barrandovský most, správce: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, K Hájm 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

| Přílohy změnového listu:                                 | Paré č. | Příjemce  |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|
| (a) Rozpis ocenění změn položek                          | 1       | Zadavatel |
| (b) Přehled změn stavby                                  | 2       | Dodavatel |
| (c) Výpočet rozvinuté plochy trapézy                     |         |           |
| (d) Fotodokumentace (použité technologie a určení výměr) |         |           |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Odstěrnání graffiti nátěry

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V projektu DVZ bylo navrženo očištění pilířů tryskáním VVP do 1250bar, pískováním sušeným křemičitým pískem a ručním dočištěním ocelovými kartáči.

Zdůvodnění změny:

V průběhu provádění byly na površích pilířů zastiženy nátěry graffiti. V některých případech se jednalo o několikanásobné překrytí ve více přes sebe jdoucích vrstvách - oproti předpokladu z DVZ se jednalo o relativně velkou tloušťku nátěrů. Pro jejich odstranění byly neúspěšně vyzkoušeny technologické postupy předpokládané v DVZ: zkušební zvýšení tlaku až na 2500 barů vedlo k poškození nedegradovaného povrchu pilíře a vytváření vrypů; od očištění povrchu sušeným pískem, kartáči a odsekáním sekerkami bylo opuštěno z důvodu značné prašnosti na přilehlých cyklostezkách (viz fotodokumentace).

Technický popis nového řešení:

K úplnému odstranění nátěrů graffiti (o celkové výměře cca 1500 m2) byla úspěšně vyzkoušena technologie tryskání vodním páprskem s přídavkem abraziva.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                        |                        |                        |

Podpis vyjadřuje schválení změny a závr

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výš

jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, do

list je zároveň záznamem o změně závazku p

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své po

Objednatel (Náměstek GŘ, sekce investiční)

Zhotovitel

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4                                                                                           |                |               |      |                        |                      |                     |                         |                                       |                                   |                                   |                                 |                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby:<br>Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 |                |               |      |                        |                      |                     |                         | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)           |                                   |                                   |                                 |                              |                                |
| Číslo a název SO/PS:<br>SO 201 / Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                       |                |               |      |                        |                      |                     |                         | č. 201 / 4                            |                                   |                                   |                                 |                              |                                |
|                                                                                                                                          |                |               |      |                        |                      |                     |                         | Změna položek podle §222 odst. 5 ZZVZ |                                   |                                   |                                 |                              |                                |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                          | Kód<br>položky | Název položky | m.j. | Množství<br>ve Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě<br>v Kč     | Cena<br>vypuštěných<br>prací v Kč | Cena<br>dodatečných<br>prací v Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl<br>cen<br>celkem v<br>% |

Za Zhotovitele:

Datum:

4.10.2020

Za Objednatele:

Datum:

hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
29

# Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

|                                                      |                                                                                                       |                                  |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo stavby:                      | Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                     | 201 / 5                          |            |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost EUROVIA - FREYSSINET, Barrandovský most, správce: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, K Háji 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

| Přílohy změnového listu:                 | Paré č. | Příjemce  |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| (a) Rozpis ocenění změn položek          | 1       | Zadavatel |
| (b) Přehled změn stavby                  | 2       | Dodavatel |
| (c) Vyjádření povodí Vltavy              |         |           |
| (d) Fotodokumentace vytěženého materiálu |         |           |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Odměna těžkého kamenného záhozu pilířů

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projekt DVZ předpokládá odtěžení a zpětné navrácení původního těžkého kamenného záhozu.

Zdůvodnění změny:

a) V průběhu provádění těžení kamenného záhozu u pilíře č. 4 a u pilíře č. 5 bylo zjištěno, že původní kamenný zához je značně znečištěn štěrky, usazeninami a dále stavebním odpadem (dřevo, ocel) a proto a v souladu s požadavkem Povodí Vltavy není vhodný k navrácení a použití jako ochrana pilířů.

b) Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto nákupu nového těžkého kamenného záhozu, který bude použit jako ochrana pilířů. Zároveň je nutné původní kamenný zához zlikvidovat.

Technický popis nového řešení:

Odvoz a likvidace 420 m3 původního nevhodného těžkého kamenného záhozu, nákup a navedení nového těžkého kamenného záhozu.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                           |                        |                        |                               |

Podpis vyjadřuje schválení změny a z

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na jev jsou podrobně popsány, zdůvodněny, list je zároveň záznamem o změně závazku zastoupení Objednatele a Zhotovitele své Objednatel (Náměstek GR, sekce investič

Zhotovitel



### Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

|                                                      |                                                                                                       |                                  |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo stavby:                      | Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                     | 201 / 6                          |            |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost EUROVIA - FREYSSINET, Barrandovský most, správce: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, K Háji 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

| Přílohy změnového listu:        | Paré č. | Příjemce  |
|---------------------------------|---------|-----------|
| (a) Rozpis ocenění změn položek | 1       | Zadavatel |
| (b) Přehled změn stavby         | 2       | Dodavatel |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

*Snižování rozsahu sanace pilířů*

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

U všech pilířů byl předpokládán rozsah sanačních prací odborným odhadem.

Zdůvodnění změny:

Celkově na všech pilířích došlo ke snížení rozsahu sanačních prací. Celkový součet postupů S10 a S50 je oproti DVZ nižší. Protože pilíře č. 6 a 9 vykazovaly menší počet lokálních závad, neboť v roce 2010 byla provedena sanace materiálem PERMATECH, snížily se výměry čištění povrchu a výměry ochranného nátěru výztuže.

Technický popis nového řešení:

Snížení rozsahu sanačních prací cca o 30%.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                           |                        |                        |                               |

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznam

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše

jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doklad

list je zároveň záznamem o změně závazku pro

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své pod


Objednatel (Náměstek GR, sekce investiční)

Zhotovitel

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8                                                                                           |             |               |      |                           |                      |                     |                         |                                       |                                   |                                   |                                 |                              | Snižování rozsahu zakreslení |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Evidenční číslo a název stavby:<br>Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 |             |               |      |                           |                      |                     |                         | ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)           |                                   |                                   |                                 |                              |                              |  |
| Číslo a název SO/PS:<br>SO 201 / Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                       |             |               |      |                           |                      |                     |                         | č. 201 / 6                            |                                   |                                   |                                 |                              |                              |  |
|                                                                                                                                          |             |               |      |                           |                      |                     |                         | Změna položek podle §222 odst. 5 ZZVZ |                                   |                                   |                                 |                              |                              |  |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                          | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství<br>ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě<br>v Kč     | Cena<br>vypuštěných<br>prací v Kč | Cena<br>dodatečných<br>prací v Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>%  |  |




**EUROVIA**®  
 EUROVIA CS s.r.o.  
 004 001 / závod celostátní ústředí  
 závod Praha západ N. Hájem 846  
 155 00 Praha 5 - Smolický



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
 hl.m. PRAHY, a.s.  
 Rásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
 29

# Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

|                                                      |                                                                                                       |                                  |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo stavby:                      | Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                     | 201 / 7                          |            |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost EUROVIA - FREYSSINET, Barrandovský most, správce: EUROVIA CS a.s., odstěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

| Přílohy změnového listu:        | Paré č. | Příjemce  |
|---------------------------------|---------|-----------|
| {a} Rozpis ocenění změn položek | 1       | Zadavatel |
| {b} Přehled změn stavby         | 2       | Dodavatel |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Bylo předpokládáno kompletní odbourání a odhalení kotev předpínací výztuže pilířů P3 - P6, jejich sanaci a následné dobetonování kotevních oblastí.

Zdůvodnění změny:

a) V průběhu prací na pilíři P3, kde bylo odbourání, zabetonování a sanace kotev provedeno v plné míře, bylo zjištěno a ověřeno, že kotvy na svislém okraji příčle pilíře jsou v nejhorším, ale přijatelném stavu v první dvou spodních řadách, třetí řada je téměř v pořádku a kotvy ve čtvrté a vyšších řadách jsou v naprostém pořádku a nevyžadují sanační zásah.

b) Na základě výše uvedeného zjištění byly na dalších pilířích P4 až P6 odhaleny dvě spodní řady kotev, tyto byly prohlédnuty TDI a AD a bylo rozhodnuto, vzhledem ke stavu kotev, o odhalení dalších dvou řad. Na základě prohlídky a stavu kotev bylo rozhodnuto o ponechání zbývajících dobetonávek a neodhalování dalších řad kotev.

c) Zároveň byl počet kotev na pilíři P4 upraven na skutečné množství. Došlo k navýšení kotev na spodním okraji příčle o  $(8+6) \cdot 2 = 28$  ks, které nebyly uvedeny v projektu DVZ.

Technický popis nového řešení:

Snížení rozsahu bourání a dobetonování kotevních oblastí a sanace kotev předpínací výztuže na svislém povrchu příčle pilířů.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                           |                        |                        |                               |

Podpis vyjadřuje schválení změny a zá

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na vý jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, do list je zároveň záznamem o změně závazku zastoupení Objednatele a Zhotovitele své p

Objednatel (Náměstek GR, sekce investiční)

Zhotovitel

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7                                                                                           |             |               |      |                           |                      |                     |                         | Změna a účel změn (Změna a účel změn) |                                   |                                   |                                 |                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby:<br>Barrandovský most – celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 |             |               |      |                           |                      |                     |                         | ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS)           |                                   |                                   |                                 |                              |                                |
| Číslo a název SO/PS:<br>SO 201 Barrandovský most V031.1 a V031.2                                                                         |             |               |      |                           |                      |                     |                         | č. 201 / 7                            |                                   |                                   |                                 |                              |                                |
|                                                                                                                                          |             |               |      |                           |                      |                     |                         | Změna položek podle §222 odst. 5 ZZVZ |                                   |                                   |                                 |                              |                                |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                          | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství<br>ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě<br>v Kč     | Cena<br>vypuštěných<br>prací v Kč | Cena<br>dodatečných<br>prací v Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl<br>cen<br>celkem v<br>% |

Za Zhotov

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Za Objednatele:

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
s.r.o. PRAHY, a.s.  
Řádnovka 770/8 110 00 PRAHA 1  
29

# HARMONOGRAM Barrandovský most - celková rekonstrukce, I. etapa sanace spodní stavby, Praha 4 a 5, č. akce 999174/1 (1511.0041161DKO)

| Název úkolu                         | Zahájení úkolu | Dokončení úkolu | DATUM              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                |                 | Doba trvání<br>DNY | Doba trvání<br>TÝDNY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| přejímka pilířů P2+P3               | 13.04.2021     | 13.04.2021      | 1                  |                      | 1 24.03-30.03.2021<br>2 31.03-06.04.2021<br>3 07.04-13.04.2021<br>4 14.04-20.04.2021<br>5 21.04-27.04.2021<br>6 28.04-04.05.2021<br>7 05.05-11.05.2021<br>8 12.05-18.05.2021<br>9 19.05-25.05.2021<br>10 26.05-01.06.2021<br>11 02.06-08.06.2021<br>12 09.06-15.06.2021<br>13 16.06-22.06.2021<br>14 23.06-29.06.2021<br>15 30.06-06.07.2021<br>16 07.07-13.07.2021<br>17 14.07-20.07.2021<br>18 21.07-27.07.2021<br>19 28.07-03.08.2021<br>20 04.08-10.08.2021<br>21 11.08-17.08.2021<br>22 18.08-24.08.2021<br>23 25.08-31.08.2021<br>24 01.09-07.09.2021<br>25 08.09-14.09.2021<br>26 15.09-21.09.2021<br>27 22.09-28.09.2021<br>28 29.09-05.10.2021<br>29 06.10-12.10.2021<br>30 13.10-19.10.2021<br>31 20.10-26.10.2021<br>32 27.10-02.11.2021<br>33 03.11-09.11.2021<br>34 10.11-16.11.2021<br>35 17.11-23.11.2021<br>36 24.11-30.11.2021<br>37 01.12-07.12.2021 |
| pilíř P4                            | 24.03.2021     | 20.09.2021      | 181                | 26                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| práce nad vodou                     | 24.03.2021     | 14.07.2021      | 113                | 16                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| práce pod vodou                     | 15.07.2021     | 20.09.2021      | 68                 | 10                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pilíř P5                            | 15.04.2021     | 31.10.2021      | 200                | 29                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| práce pod vodou                     | 15.04.2021     | 14.07.2021      | 91                 | 13                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| práce nad vodou                     | 15.07.2021     | 31.10.2021      | 109                | 16                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pilíř P6                            | 30.03.2021     | 30.09.2021      | 185                | 26                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pilíř P9                            | 29.09.2021     | 30.11.2021      | 63                 | 9                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| zpětný zásyp základových konstrukcí | 06.11.2021     | 12.11.2021      | 7                  | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| zaměření dna po ukončení prací      | 12.11.2021     | 15.11.2021      | 4                  | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| vyklizení ZS                        | 15.11.2021     | 30.11.2021      | 16                 | 2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| předání díla                        | 30.11.2021     | 30.11.2021      | 1                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
